PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado da Paraíba

Proponente: Estado da Paraíba
Processo SEI: 03101.000063/2026-63
Código do pleito: 2663785330/2026
Versão: 3

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 54.500.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 5.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 07
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 07
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 08
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 10
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 11
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 11
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 13
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 13
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 14
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 16
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 17
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 18
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 19
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 20
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 21
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 21
1. 4. 19. Informações do 19° indicador 22
1. 4. 20. Informações do 20° indicador 23
1. 4. 21. Informações do 21° indicador 23
1. 4. 22. Informações do 22° indicador 24
1. 4. 23. Informações do 23° indicador 24
1. 5. Componentes 25
1. 5. 1. Informações do 1° componente 25
1. 5. 2. Informações do 2° componente 27
1. 5. 3. Informações do 3° componente 28
1. 5. 4. Informações do 4° componente 29
1. 5. 5. Informações do 5° componente 30
1. 6. Beneficiários 30
1. 7. Anexos 32
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 33
2. 1. Áreas estratégicas 33
2. 2. Anexos 34
3. GESTÃO 36
3. 1. Arranjo institucional 36
3. 1. 1. Descrição 36
3. 1. 2. Orgãos Executores 37
3. 1. 3. Estrutura Operacional 37
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 38

3. 2. Operacionalização e Manutenção 38
3. 3. Planejamento Estratégico 39
3. 4. Anexos 40
4. RISCOS 42
4. 1. Informações do 1° risco 42
4. 2. Informações do 2° risco 42
4. 3. Informações do 3° risco 43
4. 4. Informações do 4° risco 44
4. 5. Informações do 5° risco 44
4. 6. Informações do 6° risco 45
4. 7. Informações do 7° risco 46
4. 8. Informações do 8° risco 46
4. 9. Informações do 9° risco 47
4. 10. Informações do 10° risco 47
4. 11. Anexos 48
5. FINANCIAMENTO 49
5. 1. Condições Financeiras da Operação 49
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 49
5. 2. Cronograma de Desembolso 51
5. 3. Contragarantias 52
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 52
6. ETAPAS REALIZADAS 53
6. 1. Etapas realizadas 53
6. 2. Anexos 54
7. Baixar todos os anexos 56
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado da Paraíba
Sigla: PROFISCO III PB
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado da Paraíba

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

A Paraíba possui uma população estimada em 4,16 milhões de habitantes em 2025, ocupando a 14ª posição nacional (IBGE). A densidade demográfica é de 70,39 hab./km², com forte concentração urbana em João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e Patos, enquanto 140 municípios têm menos de 10 mil habitantes, refletindo desafios na oferta de serviços públicos.

O **IDH estadual é de 0,698** (IBGE - 2021), abaixo da média nacional. O rendimento domiciliar per capita foi de R$1.401 em 2024, inferior ao Brasil, e o Índice de Gini (0,513) permanece entre os mais altos do país (IBGE – Mapa de Pobreza e Desigualdade da Paraíba. A pobreza caiu de 47,5% em 2023 para 38,7% em 2024, mas ainda coloca a Paraíba entre os estados com maior proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza.

A taxa de analfabetismo é de 13,1% (Censo 2022), superior à média nacional (5,6%). O IDEB 2023 mostra avanços nos anos iniciais (5,7 pontos), mas resultados abaixo da meta nos anos finais (4,5) e no ensino médio (4,0) (QEdu). Na saúde, a expectativa de vida é de 75,2 anos, próxima à média nacional, mas o gasto público per capita (R$ 2.500 em 2023) é inferior ao recomendado (Painel Saúde).

Estrutura Econômica e Produtiva

O PIB estadual foi de R$ 96,96 bilhões (IBGE- 2023), com crescimento de 3,0%. A economia é diversificada: serviços (70%), indústria (25%) e agropecuária (5%). Destaques incluem agroindústria, energias renováveis, TIC e turismo. Este último, especialmente nas regiões litorâneas e no interior, apresenta potencial crescente, impulsionado por investimentos em infraestrutura e promoção do destino Paraíba.

Mercado de Trabalho

A taxa de desocupação caiu para 8,7% em 2025, abaixo da média nordestina (9,4%) (Novo CAGED). O saldo de empregos formais foi de +26.493 postos entre janeiro e setembro de 2025. Contudo, a informalidade ainda atinge cerca de 45% da força de trabalho (IBGE/PNAD). O rendimento médio dos ocupados foi de R$ 2.124 em 2024, inferior à média nacional.

Desafios Fiscais

A Paraíba apresenta um quadro de finanças públicas equilibrado, com destaque para a excelência na gestão fiscal e na transparência contábil. Em 2024, a receita bruta foi de R$ 26,5 bilhões e as despesas empenhadas de R$ 20,1 bilhões, resultando em superávit. O coeficiente da dívida consolidada (DC) dividida pela receita corrente líquida (RCL apresenta a seguinte evolução nos últimos 3 anos: 29,7% (2022), 28,4% (2023) e 27,1 % (2024). O rating “brAAA” atribuído pela S&P Global Ratings em 2025 reforça a credibilidade do estado no mercado de crédito, permitindo acesso a financiamentos externos com condições favoráveis. A Paraíba obteve nota máxima CAPAG A+ em 2025, sendo o único estado do Nordeste a manter cinco anos consecutivos de excelência fiscal (Tesouro Nacional).

O ICMS responde por cerca de 70% da receita própria estadual. Entretanto, sua elevada complexidade — marcada por múltiplas alíquotas, regimes especiais, benefícios fiscais e regras divergentes entre os estados — impõe custos de conformidade significativos aos contribuintes e à administração tributária. Essa complexidade contribui para a formação de um contencioso volumoso, com alta litigiosidade fiscal, baixa taxa de recuperação de créditos e morosidade na solução de conflitos. A necessidade de modernizar processos, ampliar automação, fortalecer a autorregularização e reduzir o estoque de processos administrativos e judiciais torna-se central para melhorar o ambiente de negócios e aumentar a eficiência arrecadatória.

A Reforma Tributária do Consumo (EC 132/2023 e PLP 108/2024) representa uma oportunidade para enfrentar essas distorções, mas exige forte adaptação institucional. A transição para o IBS requer integração de sistemas, harmonização de cadastros, revisão de processos, capacitação de equipes e fortalecimento da governança federativa. O TCE-PB destaca ainda a obrigatoriedade da NFS-e nacional a partir de 2026 e a integração ao Sinter, reforçando a necessidade de investimentos tecnológicos.

Análise Situacional

O contexto da Paraíba combina avanços em gestão fiscal, competitividade e infraestrutura com desafios persistentes em pobreza, desigualdade, educação e informalidade. O PROFISCO III é estratégico para:

- Modernizar a administração tributária e adequá-la ao IBS.

- Qualificar a gestão fiscal e reduzir a dependência de transferências.

- Ampliar transparência e cidadania fiscal.

- Promover inclusão produtiva e redução das desigualdades.

Para informações mais detalhadas vide **Anexo 01 - Diagnóstico Socioeconômico e Fiscal da Paraíba.**

Fontes de Referências oficiais:

IBGE – Paraíba

IBGE – Mapa de Pobreza e Desigualdade da Paraíba

Tesouro Nacional – CAPAG

TCE-PB – Reforma Tributária

Novo CAGED – Ministério do Trabalho

Para enfrentar estes desafios, o Estado pleiteia operação para a linha de crédito do PROFISCO III, cujos desafios da gestão fiscal subnacional e diretrizes do Programa são apresentados no **Anexo 02 - Marco de Referência do PROFISCO III.**

1. 2. 2. **Problema:**

Nos últimos anos, o Estado da Paraíba avançou na modernização da gestão fiscal, revisando processos e aprimorando serviços ao contribuinte por meio dos projetos Profisco I e II. A aplicação da MD-GEFIS em 2019 revelou fragilidades nos pilares estratégico, tributário e financeiro, que o Profisco II PB buscou atacar, vide **Anexo 03 – Relatório MD-GEFIS 2019 – PB e Anexo 04 – Correlação e Sinergias entre o Profisco III PB com o Profisco II PB**. Em 2025 foram realizadas discussões internas e identificados a persistência de desafios estruturais, como: baixa integração institucional, sistemas fragmentados, elevada complexidade tributária, maturidade digital limitada e transparência insuficiente. Somam-se entraves ao ambiente de negócios, baixa participação cidadã e a necessidade de adaptação à RTC para assegurar eficiência e sustentabilidade fiscal.

Essas questões foram organizadas conforme apresentado no **Anexo 05 – Lógica Horizontal de Resultados do PROFISCO III PB**, permitindo uma abordagem integrada e orientada à superação dos entraves que comprometem a eficiência da gestão fiscal estadual.

Nesse contexto foram identificados os seguintes desafios estratégicos:

D.1 - O planejamento e a governança fiscal ainda apresentam fragilidades, sem visão de longo prazo, política fiscal clara, modelo de gestão de riscos, avaliação de políticas públicas e compras públicas não centralizadas, o que compromete a previsibilidade, a transparência e a sustentabilidade fiscal do Estado.

D.2 – A necessidade de ampliação da infraestrutura e do uso de tecnologias digitais, associadas a limitações da força de trabalho limitam a eficiência dos processos da gestão fiscal, resultando em serviços públicos de menor qualidade, custos adicionais ao contribuinte e à administração pública.

D.3 A harmonização da Administração Tributária estadual à Reforma Tributária do Consumo (RTC) é um dos grandes desafios para a gestão fiscal e crucial para a criação de um sistema nacionalmente mais eficiente, simplificando o cumprimento das obrigações fiscais e fortalecendo a cooperação federativa.

D.4 O ICMS continuará como principal fonte de receita estadual até 2032, quando será substituído pelo IBS. Sua complexidade atual — com múltiplas alíquotas e regras distintas de 27 legislações estaduais— onera contribuintes e a administração, elevando custos de conformidade, litigiosidade e evasão fiscal, com perdas significativas de arrecadação.

D.5 A ausência de integração e modernização dos sistemas de planejamento, execução orçamentária e gestão contábil-financeira limita a produção de informações confiáveis e tempestivas, dificultando decisões estratégicas e

comprometendo a sustentabilidade fiscal. A fragmentação dos sistemas gera alocação ineficiente de recursos, reduz a capacidade de monitoramento e amplia os riscos fiscais do Estado.

D.6 A limitada adoção de tecnologias digitais e a cultura de inovação ainda incipiente reduzem a eficiência da gestão fiscal, resultando em serviços menos qualificados e maiores custos ao contribuinte. O estudo do BID (2024) classificou a Paraíba como “Iniciante” em maturidade digital, evidenciando a urgência de modernizar processos, ampliar capacidades tecnológicas e acelerar a transformação digital do Estado. Vide **Anexo 06 – Avaliação de Maturidade de Análise Avançada de Dados PB.**

D.7 A complexidade das obrigações tributárias, somada à baixa automação dos processos, torna o ambiente de negócios pouco favorável e eleva os custos de conformidade. Esse contexto intensifica inconformidades, estimula a litigância e alimenta um contencioso fiscal de baixa recuperação, reduzindo a eficiência arrecadatória e comprometendo a previsibilidade para contribuintes e para o Estado.

D.8 A participação cidadã na gestão fiscal segue baixa devido à limitação das ferramentas digitais, à complexidade das informações orçamentárias e à falta de canais modernos de consulta e debate. Os portais oficiais, incluindo o da transparência, não atendem a diferentes perfis de usuários, dificultando o acesso a dados, o engajamento público e a fiscalização social.

1. 2. 3. **Solução:**

Para enfrentar os desafios estruturais da Gestão Fiscal do Estado, especialmente diante das transformações impostas pela Reforma Tributária sobre o Consumo (RTC) e da adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, propõem-se as seguintes soluções, organizadas conforme os eixos estratégicos:

1. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL (GF)

1.1 Implementar o MPGP - Modelo de Governança Pública - para integrar órgãos, alinhar decisões e otimizar ativos, fortalecendo gestão por resultados, governança digital, riscos e contratações públicas. (D.1)

1.2 Implementar modelo integrado de riscos, criar unidade especializada, capacitar equipes e operar plataforma com alertas e dashboards para ampliar resiliência fiscal. (D.1)

1.3 Redimensionar força de trabalho, estruturar banco de talentos, ofertar trilhas de capacitação, especialmente para a RTC e uso avançado de dados, promovendo bem-estar e eficiência administrativa. (D.2)

1.4 Modernizar infraestrutura de TI, integrar sistemas, reforçar segurança da informação, atualizar o PDTI – Plano Diretor de TI e capacitar servidores para apoiar a transformação digital e a RTC. (D.2)

1.5 Padronizar compras, centralizar aquisições e aplicar IA na gestão de riscos, promovendo sustentabilidade, transparência e participação de fornecedores locais. (D.1)

1.6 Aprimorar o Portal da Transparência com BI, dados abertos, criar canais e fóruns e promover educação fiscal com ênfase na implantação da RTC. (D.8)

1.7 Aplicar IA, machine learning e big data para analisar dados, automatizar processos e apoiar decisões estratégicas alinhadas à reforma tributária. (D.6)

2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)

2.1 Implantar portal de benefícios fiscais e painel analítico para avaliar impactos, garantindo transparência e melhor gestão dos gastos tributários. (D.6)

2.2 Integrar-se ao PNR - Portal Nacional Redesim 2.0, adotar identificador único (CNPJ Alfanumérico), integrado ao cadastro RFB, sanear cadastros e criar visão 360º do contribuinte para reduzir fraudes e fortalecer o controle fiscal. (D.3)

2.3 Automatizar controles, personalizar réguas de cobrança e integrar ao PCCE-PUCOMEX para ampliar eficiência arrecadatória e conformidade. (D.3 e D.4)

2.4 Modernizar fiscalização com métricas, automação, análise de riscos e inovação tecnológica, ampliando alcance e celeridade. (D.3 e D.4)

2.5 Digitalizar o contencioso, aplicar IA na triagem e priorização, acelerar julgamentos e fortalecer segurança jurídica e previsibilidade. (D.7)

2.6 Expandir canais digitais, integrar ao Portal Único do estado, usar chatbots e personalizar serviços para melhorar experiência e aumentar conformidade voluntária. (D.4)

2.7 Preparar a SEFAZ para o IBS, integrando pessoas, normas e sistemas ao ambiente nacional, através do Comitê Gestor do IBS, e ajustando processos ao novo modelo de arrecadação. (D.3)

3 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO (AF)

3.1 Atualizar o ciclo orçamentário, integrar SIPGR – Sistema Integrado de Planejamento e Gestão para Resultados, revisar PPA e GIP – Gestão de Investimentos Públicos, adotar MOMP – Marco Orçamentário de Médio Prazo e aplicar metodologias macroeconômicas para projeções fiscais. (D.1)

3.2 Automatizar gestão do caixa, padronizar procedimentos e permitir simulações e cenários fiscais para apoiar decisões estratégicas. (D.5)

3.3 Automatizar lançamentos, integrar sistemas, aplicar IA e big data e ampliar precisão, transparência e capacidade analítica contábil. (D.6)

3.4 Avaliar ativos, riscos e participações, controlar fundos e criar modelo para mensurar ativos de infraestrutura com precisão e conformidade. (D.5)

3.5 Aprimorar apuração de custos, integrar sistemas e capacitar servidores para decisões mais eficientes e orientadas ao valor público. (D.5)

3.6 Robotizar rotinas, usar dados em tempo real, ampliar transparência e modernizar tesouraria com tecnologias avançadas. (D.5)

4 GESTÃO JURÍDICA PARA A SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)

4.1 Modernizar cobranças, automatizar processos, aplicar IA contra fraudes e fortalecer governança de dados para elevar recuperação fiscal. (D.7)

4.2 Automatizar fluxos, aplicar inteligência de dados e digitalizar comunicação para ampliar controle, celeridade e transparência. (D.7)

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do projeto representa um avanço estratégico para a sustentabilidade fiscal da Paraíba, promovendo melhorias significativas na gestão das receitas próprias e na eficiência do gasto público. Estudo de avaliação de impacto do Profisco I, realizado pelo BID, no **Anexo 07 – Estudo de Avaliação de Impacto do Profisco I**, estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles sem projeto.

Os resultados esperados estão organizados conforme os seguintes eixos:

1. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL (GF)

1.1 A governança fiscal será fortalecida com processos integrados, decisões alinhadas e visão estratégica, ampliando previsibilidade, transparência e eficiência das políticas públicas;

1.2 A gestão de riscos será institucionalizada, permitindo antecipar ameaças, monitorar vulnerabilidades e apoiar decisões mais seguras, aumentando a resiliência fiscal;

1.3 A força de trabalho será modernizada, gestão por competências, com capacitação voltada à RTC, transformação digital e banco de talentos estruturado;

1.4 A infraestrutura tecnológica será ampliada e modernizada, garantindo segurança, integração de sistemas e suporte às demandas da transformação digital e do IBS;

1.5 As compras públicas serão mais eficientes e sustentáveis, com processos padronizados, centralização estratégica e tecnologias que ampliam transparência e reduzem riscos;

1.6 A transparência fiscal será ampliada com portais acessíveis, dados abertos e novos canais digitais de diálogo, fortalecendo o controle social e a participação cidadã;

1.7 A administração fiscal será orientada por dados, com uso de IA, machine learning e big data para análises avançadas, automação e decisões mais precisas.

2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)

2.1 A gestão dos benefícios fiscais será mais transparente e eficiente, com monitoramento contínuo e avaliação de impactos, promovendo justiça tributária;

2.2 O cadastro fiscal será mais confiável e integrado à RFB, com visão 360° do contribuinte, redução de fraudes e maior efetividade no controle e conformidade;

2.3 A cobrança e a arrecadação serão mais eficientes, com automação, autorregularização, integração ao comércio exterior e estratégias personalizadas que ampliam a recuperação de receitas;

2.4 A fiscalização será modernizada com análises baseadas em risco, automação e maior alcance operacional, reduzindo evasão e fortalecendo a justiça fiscal;

2.5 O contencioso fiscal será mais ágil e digital, com IA para triagem e priorização, garantindo segurança jurídica, previsibilidade, redução do estoque de processos e aumento da recuperação de créditos tributários;

2.6 O atendimento ao contribuinte será mais acessível e digital, com múltiplos canais, chatbots e serviços personalizados, ampliando conformidade voluntária e melhorando o ambiente de negócios;

2.7 A SEFAZ estará preparada para o IBS, com processos, sistemas e equipes alinhados ao novo modelo nacional, garantindo transição segura e simplificação das obrigações.

3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO (AF)

3.1 O planejamento e o orçamento serão mais integrados e estratégicos, com metodologias modernas, projeções macroeconômicas e maior capacidade de monitorar políticas e investimentos;

3.2 A gestão financeira será mais eficiente, com caixa automatizado, cenários fiscais atualizados e maior controle sobre fluxos, fortalecendo decisões e sustentabilidade fiscal;

3.3 A contabilidade pública será modernizada com automação, integração de sistemas e uso de IA garantindo precisão, transparência e maior capacidade analítica;

3.4 A gestão de ativos e passivos será mais precisa e integrada, com avaliação de riscos, controle de fundos e mensuração adequada de ativos de infraestrutura;

3.5 A gestão de custos será aprimorada com sistemas integrados, capacitação e cultura institucional voltada à eficiência, permitindo decisões mais qualificadas;

3.6 A tesouraria será modernizada com automação, dados em tempo real e maior transparência, reduzindo falhas e fortalecendo a governança financeira.

4. GESTÃO JURÍDICA PARA A SUSTENTABILIDADE FISCAL (GJ)

4.1 A recuperação de créditos será ampliada com automação, IA e governança de dados, reduzindo prescrição, combatendo fraudes e aumentando a eficiência fiscal;

4.2 A gestão de precatórios e passivos contingentes será mais ágil e transparente, com automação, inteligência de dados e comunicação digital, garantindo maior controle e previsibilidade.

1. 3. Objetivo

1.3.1. Objetivo Geral

O objetivo do Projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado da Paraíba, garantindo um sistema fiscal e tributário confiável, previsível e justo, incentivando a expansão de investimentos e acelerando a transformação digital para melhorar a rapidez e a capacidade de entrega de resultados à população.

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Objetivos Específicos (OE)

1.1. Melhoria da eficácia da gestão das receitas próprias.

Aprimoramento da eficácia da gestão das receitas próprias, através da simplificação do cumprimento fiscal, da diminuição dos litígios fiscais, do incremento da arrecadação e da transformação digital, com estímulo à inovação, a transparência e à participação cidadã, contribuindo para o aprimoramento do ambiente de negócios e promoção da justiça fiscal.

1.2. Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos.

Aprimoramento da eficácia da gestão dos gastos públicos, através da melhoria dos procedimentos de planejamento, execução e avaliação dos gastos públicos, para a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos e o aumento dos investimentos.

2. Objetivos Específicos Complementares (OEC)

2.1. Aperfeiçoar a governança fiscal através de um maior alinhamento com a estratégia governamental e um modelo de administração de pessoas, tecnologia e inovação, reforçando as habilidades institucionais para uma entrega de resultados mais eficaz à população.

2.2. Implementar a reforma tributária do consumo harmonizando a gestão fiscal entre os entes federados, fortalecendo a cooperação federativa, minimizando impactos para os contribuintes na transição e promovendo segurança jurídica e melhor prestação de serviços públicos.


2.3. Ampliar a produtividade e a competitividade da economia, melhorar o ambiente de negócios e promover maior justiça fiscal, por meio da simplificação tributária, da redução de custos de conformidade tributária e da litigiosidade fiscal.

2.4. Aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos, por meio do aperfeiçoamento do planejamento, execução e avaliação do gasto, contribuindo para a sustentabilidade do regime fiscal e a qualidade do gasto público.

2.5. Intensificar a transformação digital e progredir no uso de dados para fortalecer receitas e despesas públicas, auxiliar na sustentabilidade do sistema fiscal e aprimorar o ambiente de negócios no Estado, expandindo a habilidade de entregar resultados à população.

2.6. Ampliar a transparência fiscal, o controle social e a democracia participativa na gestão fiscal, por meio da modernização do Portal de Transparência, do fortalecimento da participação social na tomada de decisão, das ações de educação fiscal.

Profisco III PB - Visão da lógica da vinculação entre os objetivos geral, específicos e específicos complementares

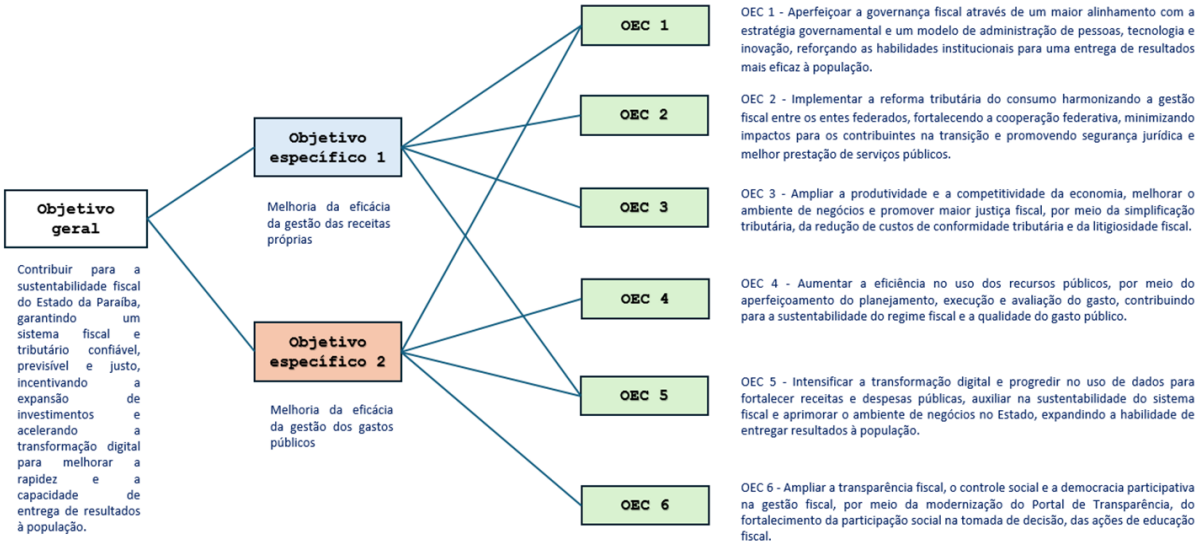

O objetivo geral – OG - Contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado se desdobra em dois objetivos específicos – OE 1 Melhoria da eficácia da gestão das receitas próprias e OE 2- Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos, que se desdobram em seis objetivos específicos complementares e estes se conectam, de forma mais direta com os

componentes e seus produtos. Ao longo deste documento será demonstrado com maior detalhamento a vinculação entre os objetivos, componentes, produtos, indicadores e as áreas estratégicas do PPA Federal 2024-2027.

1. 4. Indicadores

1. 4. 1. Informações do 1° indicador:

Nome: Índice de Governança, Sustentabilidade e Inovação (iESGo)

Descrição:
Iniciativa de avaliação desenvolvida pelo TCU que engloba os processos de governança e gestão com os de sustentabilidade ambiental e social. Já é amplamente utilizado em organizações públicas federais e de outros entes jurisdicionados ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Vinculações:
Áreas Estratégicas: 205, 301, 302 303 e 306
Objetivos Específicos Complementares: OEC 1, OEC 3

Fórmula: Questionário composto por práticas avaliadas por meio de itens de verificação relacionados a Liderança, Estratégia, Controle, Gestão de Pessoas, Gestão de Tecnologia da Informação e da Segurança da Informação, Gestão de Contratações, Gestão Orçamentária, Sustentabilidade Ambiental e Sustentabilidade Social.

Meta:
Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2026): Inexistente

Meta Intermediária (Ano 3): Intermediário (50%)

Meta Final (Ano 5): Aprimorado (75%)

Fonte: Diretoria Executiva de Governança e Desenvolvimento Institucional da SEFAZ/PB

1. 4. 2. Informações do 2° indicador:

Nome: Taxa de crescimento anual de empresas no Estado da Paraíba

Descrição:
Com a finalidade de impulsionar a produtividade e a competitividade da economia por meio do reforço dos ciclos produtivos, a SEFAZ/PB busca contribuir através da desburocratização dos processos fiscais. Isso permite a criação de um cenário mais favorável ao empreendedorismo, viabilizando o crescimento sustentável do número de empresas no Estado.

Vinculações:
Objetivo Específico Complementar: OEC 3
Área Estratégica: 205

Dados:
Quantidade de empresas ativas no Estado da Paraíba: 273.948 (1º quadrimestre de 2024) e 290.655 (1º quadrimestre de 2025)

Fórmula de Cálculo:
[(Qtde de empresas ativas no ano / Qtde de empresas ativas no ano anterior) -1] x 100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (1ª quad. 2025 / 1ª quad. 2024): 6,06%

Análise de características SMART:
Específico: Monitora o crescimento anual de empresas ativas.
Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
Atingível: baseado em histórico de crescimento do estado
Relevante: Relaciona-se com o estímulo ao empreendedorismo.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:

Visando atingir as expectativas de expansão anual do número de empresas no estado, definiu-se uma meta de 6,90% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, tal como detalhado no cronograma a seguir.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 6,06% (Meta Inicial)

Ano 2: 6,06%

Ano 3: 6,30% (Meta Intermediária)

Ano 4: 6,42%

Ano 5: 6,90% (Meta Final)

Fonte: Baseado em dados do Mapa das Empresas - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (1o quadrimestre 2025)

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-1o-quadrimestre-2024.pdf/view

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Percentual de Servidores capacitados em assuntos relacionados com a Reforma Tributária

Descrição:
Este indicador mede o grau de alinhamento das competências dos servidores com a Reforma Tributária. Ele é expresso como uma porcentagem que reflete a proporção de servidores que foram capacitados com as novas diretrizes da Reforma Tributária. Até a implementação total da Reforma Tributária, esperada em 5 anos.

Fórmula: (Número de Servidores Capacitados / Número Total de Servidores envolvidos com a Reforma Tributária) × 100

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 301, 302, 303 e 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC1, OEC2

Análise SMART:

Específico: Mede o percentual de servidores envolvidos com a Reforma Tributária que receberam capacitação específica sobre o tema.

Mensurável: Percentual calculado a partir do número de servidores capacitados em relação ao total de servidores envolvidos.

Atingível: Metas graduais compatíveis com a capacidade de formação da ESAT-PB e o horizonte de implantação da Reforma Tributária.

Relevante: Relaciona-se ao fortalecimento das competências institucionais necessárias à implementação da Reforma Tributária.

Temporal: Medido anualmente, com linha de base no ano zero e metas intermediária (Ano 3) e final (Ano 5).

Meta:
Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (Ano zero): 0%

Meta Intermediária (Ano 3): 50%

Meta Final (Ano 5): 80%

Fonte: Escola de Administração Tributária do Estado da Paraíba (ESAT-PB)

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Índice de Gestão de Tecnologia da informação e da Segurança da Informação (iGTSI)

Descrição:
Parte específica da planilha de avaliação do iESGo (TCU) avalia a gestão de TI e a segurança da informação nas organizações públicas, com base em um questionário que abrange planejamento de TI, serviços de TI, riscos de TI e riscos de segurança da informação, políticas de responsabilidades, processos e atividades e o desenvolvimento de soluções e inovação.

Fórmula: Nota referente às respostas do questionário.

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 205, 301, 302, 303, 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC1, OEC5

Meta:
Unidade de Medida: Percentual (%)

Linha de Base (2026): Inexistente

Meta Intermediária (Ano 3): 25%

Meta Final (Ano 5): 50%

Análise SMART:

Específico: Avalia o nível de maturidade da gestão de TI e da segurança da informação na SEFAZ/PB.

Mensurável: Pontuação percentual obtida a partir de questionário padronizado integrante do iESGo, conforme metodologia do TCU.

Atingível: Evolução factível, considerando o estágio inicial e as ações de fortalecimento da governança de TI previstas no projeto.

Relevante: Contribui para a modernização institucional, a confiabilidade dos sistemas e a proteção das informações fiscais.

Temporal: Avaliado periodicamente, com metas definidas para o Ano 3 e o Ano 5 do projeto.

Fonte: Diretoria Executiva de Tecnologia e Inovação

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Cumprimento das metas do planejamento estratégico da SEFAZ/PB

Descrição:
O aumento da relação entre as metas de planejamento estratégico cumpridas e o total de metas planejadas demonstra melhora na governança fiscal e na capacidade institucional da SEFAZ/PB em todas as áreas administrativas e operativas, o que contribui para um melhor ambiente institucional para manter o equilíbrio fiscal.

A metodologia inclui a participação ativa das diversas áreas da Secretaria, além do alinhamento do planejamento aos objetivos estratégicos definidos pela instituição. Além disso, realiza-se um trabalho de difusão de conhecimento das diretrizes estratégicas definidas pela Alta Gestão, incluindo o mapa estratégico da SEFAZ/PB, de forma a ampliar a integração e o engajamento de todas as áreas com os objetivos estratégicos definidos pela cúpula da Secretaria.

Vinculações:

Objetivo Específico Complementar: OEC 1

Área Estratégica: 302

Dados:

Planos de ação a serem executados para alcance das diretrizes estratégicas em plano estratégico concebido pela SEFAZ para o período 2024 a 2028.

Fórmula de Cálculo: (Metas cumpridas / Total de metas planejadas) *100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2025): 0, pois o plano estratégico será realinhado no primeiro ano de projeto

Análise de características SMART:

Específico: Melhoria da Nota de avaliação do Estado.

Mensurável: Utiliza metodologia e unidade de medida.

Atingível: As metas são incrementais e realistas, considerando a linha de base atual.

Relevante: Relaciona-se com a governança fiscal e a transparência pública.

Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados após a elaboração do plano iniciará seu monitoramento, os resultados ocorrerão conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas acumuladas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 7% (Meta Inicial)

Ano 2: 16%

Ano 3: 33% (Meta Intermediária)

Ano 4: 57%

Ano 5: 85% (Meta Final)

Fonte: Relatório de Monitoramento do Planejamento Estratégico, elaborado pela SEFAZ/PB

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Aprimoramento da Divulgação das Informações Fiscais do Estado

Descrição:
Aprimorar a divulgação das informações fiscais do Estado, com vistas a um melhor entendimento por parte da sociedade, garantindo transparência e clareza.

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 301, 302, 303, 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC4, OEC 6

Fórmula: Posição do Estado da Paraíba no ranking Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro)

Análise SMART:

Específico: Avalia a qualidade da divulgação das informações fiscais do Estado da Paraíba.

Mensurável: Classificação e percentual atribuídos ao Estado no ranking do Siconfi, conforme metodologia do Tesouro Nacional.

Atingível: Meta factível, considerando o desempenho atual do Estado e as melhorias previstas nos processos de transparência fiscal.

Relevante: Relaciona-se ao fortalecimento da transparência pública, do controle social e da credibilidade fiscal.

Temporal: Avaliado anualmente, com linha de base em 2024 e meta estabelecida para o final do ciclo do projeto.

Meta:
Unidade de Medida: Classificação no ranking Siconfi

Linha de Base (2024): 95,64% (Classificação "A")

Meta Final (Ano 5): 97% (Classificação "A")

Fonte: Tesouro Nacional e Sistema Siconfi (https://ranking-municipios.tesouro.gov.br/ranking_estados)

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Taxa de Atendimento on-line (percentual de serviços totalmente digitais)

Descrição:
Com o objetivo melhorar a prestação de serviços públicos de qualidade, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de aprimorar a relação fisco-contribuinte, através da ampliação dos canais de comunicação e de serviços disponibilizados on-line. Essa ação proporcionará a ampliação da capacidade da SEFAZ/PB em prestar serviços de qualidade aos seus contribuintes ao mesmo tempo reduzindo o custo de prestação de serviços à sociedade.

Vinculações:

Objetivo Específico Complementar: OEC 5

Área Estratégica: 303

Dados:

Quantidade de atendimentos on-line:**59**

Quantidade de serviços de atendimento disponibilizados ao contribuinte:**87**

Fórmula de Cálculo:

(Qtde de serviços de atendimento ao contribuinte on-line / Qtde de serviços de atendimento disponibilizados) x 100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 68%

Análise de características SMART:

Específico: Monitora o crescimento anual do atendimento on-line.

Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.

Atingível: Baseado em dados de atendimento e serviços disponíveis.

Relevante: Relaciona-se com a prestação de serviço com qualidade.

Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados de crescimento anual da disponibilização de serviços on line foi definida uma meta de 95 % a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 74% (Meta Inicial)

Ano 2: 80%

Ano 3: 85% (Meta Intermediária)

Ano 4: 90%

Ano 5: 95% (Meta Final)

Fonte: Unidade de Atendimento da SEFAZ/PB

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**

Nome: Eficiência no custo para arrecadar tributos

Descrição:
Com o objetivo melhorar eficiência da gestão fiscal, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de implantar um Plano de Governança, com a capacitação, dimensionamento e realocação de servidores com foco em processos, e estabelecendo diretrizes estratégicas para a inovação e transformação digital.

Vinculação:

Objetivo Específico Complementar: OEC 1, OEC 2, OEC 3, OEC 4, OEC 5

Área Estratégica: 306

Dados:

R$ milhões

	2023	**2024**
Pessoal (31 – Pessoal e Encargos Sociais) e custeio (33 – Outras despesas Correntes)	352	391
Receita de Impostos Bruta	8.747	10.385
(Execução orçamentária da SEFAZ/PB com pessoal e custeio – U.O. 20101;102;103;104;105;106;107; e 902) / (Receita de Impostos Bruta) x 100	4,03%	3,76%

Fórmula de Cálculo:

(Execução orçamentária da SEFAZ/PB com pessoal e custeio / Receita de Impostos Bruta) x 100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 3,76%

Análise de características SMART:

Específico: Foca a eficiência do custo para arrecadar.

Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.

Atingível: Baseado em dados disponíveis no Balanço Geral do Estado.

Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal.

Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 3,64% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 3,75% (Meta Inicial)

Ano 2: 3,73%

Ano 3: 3,71% (Meta Intermediária)

Ano 4: 3,68 %

Ano 5: 3,64% (Meta Final)

Fonte: Anexos 9 e 10 - fiscal e seguridade

https://siaf.cge.pb.gov.br/CGE/jspServMenuPrincipal?opcao=2&EXERCICIO=2024

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Incremento da Arrecadação em relação ao PIB

Descrição:
Com o objetivo melhorar assegurar um regime fiscal e tributário sustentável, que promova maior justiça social e ampliação dos investimentos públicos, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de garantir um crescimento constante da arrecadação tributária.

Vinculações:
Objetivo Específico Complementar: OEC 1, OEC 2, OEC 3, OEC 4, OEC 5
Área Estratégica: 306

Dados:
Valor do PIB do Estado da Paraíba (fonte IBGE/SEPLAG)
Receita de Impostos Bruta (RIB), considerando os impostos ICMS, IPVA e ITCMD. O IBS quando arrecadado para compensar a redução do ICMS (período de transição).
A informação é a disponibilizada no anexo 10 fiscal e seguridade https://siaf.cge.pb.gov.br/CGE/jspServMenuPrincipal?opcao=2&EXERCICIO=2024. Esta informação no anexo 10 é líquida, sendo, assim, haverá o ajuste de: Valor do ICMS (conta nº 1114.50.1.0) / 0,6; Valor do IPVA (conta nº 1112.51.0.0) / 0,4; e Valor do ITCMD (conta nº 1112.52.0.0) / 0,8.

Fórmula de Cálculo:
(Receita de Impostos Bruta-PB / Produto Interno Bruto-PB) x 100

Unidade de Medida: Percentual
Histórico:
Para 2023, RIB = R$ 8.747 milhões, PIB = R$ 96.963 milhões e indicador = 9,02%
Para 2024, RIB = R$ 10.385 milhões, PIB = R$ 108.480 milhões e indicador = 9,57%

Linha de Base (2024): 9,57%

Análise de características SMART:
Específico: Foca a eficiência da gestão fiscal.
Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
Atingível: Baseado em dados disponíveis no Balanço Geral do Estado e IBGE.
Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal e a sustentabilidade.
Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 9,90% a ser alcançada ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 9,60 % (Meta Inicial)

Ano 2: 9,65%

Ano 3: 9,72% (meta intermediária)

Ano 4: 9,81%

Ano 5: 9,90% (Meta Final)

Fonte: Arrecadação dos Impostos Bruta (SEFAZ PB). Para o PIB estadual (IBGE/SEPLAG) é o publicado pelo IBGE (disponibilizados até 2023), assume-se o PIB estadual fornecido pela SEPLAG/PB para os demais anos.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**

Nome: Taxa de recuperação da dívida ativa

Descrição:
Com o objetivo melhorar assegurar um regime fiscal e tributário sustentável, que promova maior justiça social e ampliação dos investimentos públicos, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de garantir uma maior recuperação dos créditos tributários inscritos em Dívida Ativa, contribuindo para o equilíbrio fiscal e o incremento de receitas.

Vinculações:

Objetivo Específico Complementar: OEC 2 e OEC 3

Área Estratégica: 306

Dados:

Valor dos créditos inscritos em D.A. previstos de recuperação (desconsiderando anistia).

Arrecadação anual projetada da D.A. (desconsiderando anistia).

Fórmula de Cálculo:

(Arrecadação da Dívida Ativa / Estoque da Dívida Ativa) x 100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): **0,98%**

Valor do Estoque da Dívida Ativa Tributária 2023: R$ 12.717.724.542,54

Valor arrecadado 2023**:** R$ 124.183.114,85

Análise de características SMART:

Específico: Foca na recuperação de dívidas.

Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.

Atingível: Baseado em dados disponíveis.

Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal e a sustentabilidade.

Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 1,5% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 1,1% (Meta Inicial)

Ano 2: 1,2%

Ano 3: 1,3% (Meta Intermediária)

Ano 4: 1,4%

Ano 5: 1,5% (Meta Final)

Fonte: Procuradoria Geral do Estado – PGE

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Integração dos sistemas da SEFAZ/PB ao Comitê Gestor do IBS - Grau de prontidão para o IBS

Descrição:

A implantação da Reforma Tributária sobre o Consumo e a substituição do ICMS pelo IBS exigem ações coordenadas entre União, estados e municípios para adequar processos, modernizar sistemas e integrar plenamente as administrações tributárias ao Comitê Gestor do IBS. Para isso, a SEFAZ/PB deverá estabelecer integrações tecnológicas que permitam intercâmbio de dados, harmonização tributária e processamento do novo tributo. O indicador acompanha o avanço dessa integração, refletindo o fortalecimento da cooperação federativa, a ampliação das capacidades estatais e a prontidão do Estado para operar o novo modelo, com mais agilidade, eficiência e coesão nacional.

Vinculações:

Objetivo Específico Complementar: OEC 2

Área Estratégica: 302 e 306

Dados:

Sistemas da SEFAZ/PB integrados ao Comitê Gestor do IBS.

Fórmula de Cálculo:

(Quantidade de integrações implementadas / Quantidade de integrações planejadas) x 100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 0%

Dados:

Lista de sistemas a serem desenvolvidos e integrados ao Comitê Gestor do IBS.

Em 2025 há 0 sistemas integrados num universo avaliado em 12 integrações necessárias, quais sejam:

1. Cadastro Nacional Integrado de Contribuintes - Integração do sistema cadastral estadual com o Cadastro Único com CNPJ alfanumérico como identificador único e base compartilhada, permitindo troca de informações qualificadas sobre contribuintes.

2. Sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NFe/CTe/SS e derivados) - Integração de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas com a base nacional do IBS, para validar eventos, registrar transações e permitir a apuração correta do imposto no destino.

3. Sistema de Escrituração Digital - Comunicação com o ambiente nacional de escrituração (ex.: SPED atualizado para IBS), para alimentação automática de dados fiscais e contábeis que subsidiem a apuração, crédito e não cumulatividade.

4. Plataforma de Arrecadação e Recolhimento - Integração dos sistemas de cálculo, geração de documento de arrecadação para recolhimento do IBS e transmissão de informações ao Comitê Gestor para consolidação nacional e interoperabilidade com outras UFs.

5. Sistema de Gestão de Crédito Fiscal / *Split Payment* - Interoperabilidade que permita a execução do mecanismo de *split payment* do IBS entre estados e municípios, com reconciliação centralizada e compartilhada com o Comitê Gestor.

6. Base de Riscos e Inteligência Fiscal - Integração com o repositório nacional de auditorias, cruzamentos e indicadores, permitindo análises de conformidade e detecção de inconsistências.

7. Serviço de Comunicação de Eventos Fiscais (*Webservices* padronizados) - Integração via webservices do Comitê Gestor para troca estruturada de eventos fiscais (apuração, créditos, compensações, regimes especiais etc.).

8. Portal do Contribuinte / Autoatendimento - Integração dos portais estaduais com o ambiente de serviços do IBS, possibilitando ao contribuinte consultar saldos, guias e histórico de pagamentos em ambiente nacional.

9. Gestão de Restituições, Compensações e Incentivos - Integração para tratamento compartilhado de incentivos fiscais, restituições e compensações previstas no IBS, com fluxo autorizado pelo Comitê Gestor.

10. Integração com Redes de Pagamento e Bancos - Comunicação com serviços financeiros nacionais para regulamentar débitos, compensações e liquidações em tempo real.

11. Sistema Nacional de Cashback do IBS - Integra a SEFAZ/PB ao módulo nacional de *cashback*, permitindo identificar beneficiários, calcular devoluções do IBS e processar pagamentos com validação do Comitê Gestor.

12. Auditoria Integrada de Arrecadação, Recolhimento e Repasses - Permite auditar arrecadação, recolhimentos e repasses do IBS em tempo real, conciliando dados fiscais e financeiros para fortalecer transparência e governança federativa.

Análise de características SMART:

Específico: Foca na integração dos sistemas da SEFAZ/PB ao Comitê Gestor do IBS.

Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.

Atingível: Baseado em dados disponíveis.

Relevante: Relaciona-se com integração dos Sistemas.

Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 100% de integração dos sistemas a serem alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 0% (Meta Inicial)

Ano 2: 20%

Ano 3: 40% (Meta Intermediária)

Ano 4: 70%

Ano 5: 100% (Meta Final)

Fonte: Diretoria Executiva de Tecnologia e Inovação

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Taxa anual de Julgamento de processos em 1ª Instância

Descrição:
Com o objetivo de agilizar a apreciação dos processos administrativos tributários, serão realizadas ações no Projeto orientadas à inovação e resultados com o objetivo de disponibilizar sistema para julgamento, com peças processuais produzidos automaticamente, para serem utilizados pelos julgadores na produção de relatórios e votos eletrônicos, com o auxílio de Inteligência Artificial, contribuindo para a transformação digital da SEFAZ/PB.

Vinculações:

Objetivo Específico Complementar: OEC 3 e OEC 5

Área Estratégica: 303 e 306

Dados:

Processos julgados em 1ª Instância Administrativa

Fórmula de Cálculo:

(Qtde de processos julgados no exercício / qtde de processos em estoque ao final do exercício + recebidos no exercício) x 100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 65%

Estoque final em 2023: 401

Entrada de novos processos em 2024: 456
Processos julgados: 519**nálise de características SMART:**

Específico: Foca na agilidade dos PAT.

Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.

Atingível: Baseado em dados disponíveis.

Relevante: Relaciona-se com a modernização da gestão.

Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 85% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 68% (Meta Inicial)

Ano 2: 72%

Ano 3: 78% (Meta Intermediária)

Ano 4: 82%

Ano 5: 85% (Meta Final)

Fonte: Gerência Executiva de Julgamento de Processos Fiscais

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Implantação das funcionalidades de Integração ao Portal Único do Comércio Exterior - PUCOMEX

Descrição:
Com o objetivo de contribuir para a melhoria do ambiente de negócios e aumentar a competitividade da economia nacional, através do projeto nacional PCCE-PUCOMEX, via redução do tempo de liberação de mercadorias no processo de importação, o produto prevê a realização de 5 (cinco) funcionalidades de integração da SEFAZ ao PCCE (Pagamento Centralizado do Comércio Exterior) PUCOMEX:

Integração API DUIMP;

Integração API PCCE;

Integração API Anexação;

Cálculo ICMS Pagamento; e

Cálculo ICMS Exoneração

Vinculações:

Objetivo Específico Complementar: OEC 2, OEC 3 e OEC 5

Área Estratégica: 302

Dados: Nota Técnica - Documento de Especificações/Requisitos Funcionais para a Avaliação de Cumprimento de Produto Obrigatório do PROFISCO II (**Anexo 09 - Integração ao PCCE**) e Pesquisas realizadas pela OMA - Organização Mundial das Aduanas e Receita Federal do Brasil - RFB. Segundo este estudo o tempo médio de liberação de mercadorias no processo de importação no país é de 7,4 dias, incluindo os modais aéreo, terrestre e marítimo. O mesmo estudo estima a meta de redução média no Brasil de 2,0 dias considerando todas as fases que compreendem o desembaraço aduaneiro: registro da Declaração Única de Importação (DUIMP), parametrização, apuração dos tributos, envio para a Alfândega, inspeção e liberação. Portanto, a integração dos sistemas da Administração Tributária estadual ao PCCE - PUCOMEX **contribui para a meta global do país**, **constituindo-se num exemplo de integração federativa e cooperação nacional**. Maiores detalhes podem ser obtidos em

https://www.gov.br/siscomex/pt-br/informacoes/demais-noticias-de-comercio-exterior/importacao/projeto-piloto-do-pagamento-centralizado-de-comercio-exterior-pcce

Fórmula de Cálculo: Cinco funcionalidades do PUCOMEX implantadas.

Unidade de Medida: Quantidade de funcionalidades

Linha de Base (2023): Zero

Análise de características SMART:

Específico: Foca na implantação de funcionalidades nos sistemas da SEFAZ para a integração ao PUCOMEX

Mensurável: Avalia quantidade de funcionalidades a serem implantadas.

Atingível: A meta é realista baseada na competência técnica de execução da DETI.

Relevante: Relaciona-se com a melhoria do ambiente de negócios e a competitividade nacional.

Temporal: Define uma meta final específica de implantação até o 3º ano do projeto.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 100% das cinco funcionalidades de integração dos sistemas da SEFAZ PB ao PUCOMEX a ser alcançada até o 3º ano de execução do Projeto. Deve-se destacar que essa iniciativa contribui para a melhoria do ambiente de negócios e o aumento da competitividade da economia nacional, mediante a agilização dos procedimentos de liberação de mercadorias com redução de 2 dias, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 20% (Meta Inicial)

Ano 2: 70%

Ano 3: 100% (Meta final)

Fonte: Relatório da Diretoria Executiva de Tecnologia e Inovação (DETI)

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos - Poupança Corrente da CAPAG

Descrição:
Com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia do gasto público, serão realizadas ações no Projeto para o acompanhamento da evolução da poupança corrente, permitindo avaliar o impacto dessas ações na saúde fiscal do estado. Uma redução consistente nesse indicador, resultante de uma gestão mais eficiente, reflete o sucesso das políticas implementadas pelo PROFISCO III PB, evidenciando um compromisso com a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das finanças públicas.

Vinculações:

Objetivo Específico Complementar: OEC 1, OEC 4 e OEC 5

Área Estratégica: 306

Dados:

Receitas e Despesas correntes

Fórmula de Cálculo:

(Despesa corrente / Receita corrente ajustada) x 100

Unidade de Medida: Percentual

Histórico: 2021 = 89,47%; 2022 = 86,52%; 2023 = 84,54%; 2024 = 84,66%

Linha de Base (2024): 84,66%

Análise de características SMART:

Específico: Foca na eficácia da gestão dos gastos públicos.

Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.

Atingível: Baseado em dados disponíveis.

Relevante: Relaciona-se com a eficiência na gestão pública.

Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta que mantenha os bons patamares do histórico recente, pois sinalizarão a boa sustentabilidade fiscal do Estado. Assim, planeja-se a manutenção do indicador em até 85%.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: <= 85% (Meta Inicial)

Ano 5: <= 85% (Meta Final)

Fonte: Balanços anuais, Demonstrativos de Contas Anuais e os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária Tesouro Estadual) e Portaria Normativa MF nº 1.583/2023 do Ministério da Fazenda obtido nos sites: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-mf-n-1.583-de-13-de-dezembro-de-2023-530597625 e https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: Taxa de recuperação de créditos tributários regularizados por autorregularização antes da autuação

Descrição:
Serão implementadas ações estruturadas de conformidade tributária que permitirão ao contribuinte corrigir inconsistências previamente identificadas pela Administração Tributária, mediante notificação orientativa, via DTe – Domicílio Tributário eletrônico, antes de qualquer medida coercitiva e sem aplicação de multa de ofício. Esse modelo, alinhado às melhores práticas nacionais, promove um relacionamento mais cooperativo entre Fisco e contribuinte, reduz autuações desnecessárias, estimula o cumprimento voluntário das obrigações e contribui para um ambiente fiscal mais sustentável, transparente e com menor litigiosidade.

Experiências consolidadas em diversas unidades da federação demonstram a eficácia dessa abordagem:

SEFAZ-SP – Programas de autorregularização no âmbito do *Nos Conformes*, com notificações prévias e possibilidade de regularização sem penalidades., https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nosconformes/Paginas/Autorregularização.aspx

SEFAZ-RS – Programas de autorregularização e malhas fiscais eletrônicas orientativas, com foco em conformidade e prevenção de litígios. https://atendimento.receita.rs.gov.br/regulariza

SEFAZ-MG – Ações de malha fiscal e comunicação preventiva com contribuintes. https://www.fazenda.mg.gov.br/

SEFAZ-BA – Uso de NF-e e SPED para identificação de divergências e envio de alertas antes da autuação. https://www.sefaz.ba.gov.br/

SEFAZ-CE – Programas de conformidade e monitoramento eletrônico com comunicação orientativa: https://www.sefaz.ce.gov.br/

SEFAZ-SC – Programas de conformidade tributária e estímulo à regularização voluntária: https://www.sef.sc.gov.br/

Essas iniciativas comprovam que a atuação preventiva, baseada em dados e comunicação orientativa, fortalece a confiança mútua, melhora a arrecadação sem aumento de carga tributária e reduz significativamente o contencioso fiscal.

Vinculações:

Objetivo Específico Complementar: OEC 2 e OEC 3

Área Estratégica: 306

Dados:

Quantidade de notificações enviadas e autorregularizadas.

Quantidade de notificações enviadas via DTe.

Fórmula de Cálculo:

(Quantidade de notificações enviadas e autorregularizadas / quantidade de notificações enviadas) x 100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2025): **0%**

Análise de características SMART:

Específico: mede exatamente os créditos tributários identificados em malhas fiscais e regularizados voluntariamente pelo contribuinte antes da lavratura de auto de infração

Mensurável: Calculado com fórmula definida e dados obtidos de sistemas de malha fiscal, arrecadação espontânea e registros administrativos do fisco.

Atingível: A meta é realista porque outros fiscos estaduais já atingem patamares próximos com ações semelhantes, depende de ações sob controle da administração tributária (comunicação, análise de dados, regras de penalidade) e evolui de forma gradual.

Relevante: O indicador é estratégico porque aumenta arrecadação espontânea, sem elevar carga tributária, reduz litigiosidade e custos administrativos e melhora a percepção de justiça fiscal;

Temporal: Possui linha de base definida (2025), metas intermediárias e meta final em horizonte de 5 anos.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 50% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o ciclo de execução do projeto:

Ano 1: 10% (Meta Inicial)

Ano 2: 18%

Ano 3: 26% (Meta Intermediária)

Ano 4: 34%

Ano 5: 50% (Meta Final)

Fonte: Diretoria Executiva de Administração Tributária.

1. 4. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: Índice de Crescimento de Produtividade das Empresas da Paraíba

Descrição:
Mede a variação percentual da produtividade média das empresas no Estado da Paraíba, definida como a razão entre o faturamento total das empresas e a População Economicamente Ativa (PEA), tomando como referência o ano-base do projeto. O indicador reflete os efeitos indiretos das ações de modernização da gestão fiscal, simplificação de processos e melhoria do ambiente de negócios promovidas pelo projeto, que contribuem para maior eficiência econômica e competitividade empresarial.

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 205, 302, 303 e 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC 2, OEC 3

Fórmula de cálculo: [(Faturamento Total Empresas PB (ano x) / População Economicamente Ativa (ano x)) / (Faturamento Total Empresas PB (ano 0) / População Economicamente Ativa (ano 0)) – 1] x 100

Análise SMART:

Específico: Avalia a evolução da produtividade média empresarial no Estado.

Mensurável: Calculado por fórmula objetiva, com dados oficiais de faturamento e PEA.

Atingível: Baseado em dados históricos e crescimento esperado do ambiente econômico.

Relevante: Relaciona-se diretamente à melhoria do ambiente de negócios e competitividade.

Temporal: Medido anualmente, com metas para os anos 3 e 5.

Meta:
Unidade de Medida: %

Linha de Base (2025): 0%

Meta Intermediária (Ano 3): 10%

Meta Final (Ano 5): 20%

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba e IBGE

1. 4. 17. **Informações do 17° indicador:**
Nome: Índice de Maturidade e Automação da Administração Tributária

Descrição:
Avalia o grau de maturidade e automação da administração tributária estadual, com base no percentual de atendimento aos requisitos definidos pela Metodologia de Avaliação da Maturidade e Desempenho da Gestão Fiscal (MD-GEFIS). O indicador acompanha a evolução institucional decorrente da implantação de sistemas, automação de processos e integração de dados promovidas pelo projeto.

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 205, 302, 303, 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC 2, OEC 3, OEC 5

Análise SMART:

Específico: Mede o nível de maturidade e automação dos processos tributários.

Mensurável: Percentual de requisitos atendidos segundo metodologia padronizada.

Atingível: Evolução gradual compatível com o cronograma de implantação.

Relevante: Fortalece a capacidade institucional da SEFAZ/PB.

Temporal: Avaliação periódica com metas intermediária e final.

Meta:
Unidade de Medida: %

Linha de Base (2025): 50%

Meta Intermediária (Ano 3): 60%

Meta Final (Ano 5): 67%

Fonte: Diretoria Executiva de Administração Tributária

1. 4. 18. **Informações do 18° indicador:**
Nome: Índice de Capacitação em Transformação Digital

Descrição:
Mede o percentual de servidores da SEFAZ/PB capacitados em temas relacionados à transformação digital, inovação, governança de dados e uso de tecnologias aplicadas à gestão fiscal. O indicador reflete os esforços do projeto na formação de competências necessárias à modernização institucional e à sustentabilidade das soluções digitais implantadas.

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 205, 302, 303, 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC 2, OEC 3, OEC 5

Fórmula: (Nº de Servidores Capacitados / Nº Total de Servidores) × 100

Ajuste na Análise SMART (proposta):

Específico: Capacitação de servidores em transformação digital.

Mensurável: Percentual calculado por base cadastral de capacitações.

Atingível: Compatível com a capacidade anual da ESAT-PB.

Relevante: Sustenta a efetividade das soluções tecnológicas do projeto.

Temporal: Metas graduais em horizonte de 5 anos.

Meta:
Unidade de Medida: %

Linha de Base (2025): 0%

Meta Intermediária (Ano 3): 30%

Meta Final (Ano 5): 60%

Fonte: Escola de Administração Tributária do Estado da Paraíba (ESAT-PB)

1. 4. 19. **Informações do 19° indicador:**
Nome: Índice de Maturidade dos Serviços Prestados

Descrição:
Mensura a proporção de serviços da SEFAZ/PB que atingem elevado nível de satisfação dos usuários, com base em pesquisas padronizadas de avaliação de serviços. O indicador expressa a maturidade da prestação de serviços públicos, refletindo melhorias decorrentes da digitalização, simplificação de processos e foco no usuário promovidos pelo projeto.

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 205, 301, 303, 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC 2, OEC 3, OEC 5

Fórmula: (Nº de serviços avaliados com satisfação > 90% / Nº Total de Serviços)

Ajuste na Análise SMART (proposta):

Específico: Avalia a maturidade dos serviços a partir da satisfação do usuário.

Mensurável: Percentual de serviços com satisfação superior a 90%.

Atingível: Evolução progressiva do portfólio de serviços.

Relevante: Relaciona-se à qualidade do atendimento ao contribuinte.

Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Unidade de Medida: %

Linha de Base (2025): 0

Meta Intermediária (Ano 3): 10%

Meta Final (Ano 5): 30%

Fonte: Relatório da Diretoria Executiva de Administração Tributária

1. 4. 20. **Informações do 20° indicador:**
Nome: Índice de Produtividade da Fiscalização

Descrição:
Mede a eficiência das ações de fiscalização tributária, relacionando o valor efetivamente recuperado com o valor total lançado ou constituído nas ações fiscais realizadas. O indicador reflete ganhos de produtividade decorrentes do uso de inteligência fiscal, automação e priorização de riscos promovidos pelo projeto.

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 205, 301, 303, 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC 2, OEC 3 e OEC 5

Fórmula: (Valor Recuperado / Valor das Ações Fiscais) × 100

Ajuste na Análise SMART (proposta):

Específico: Avalia eficiência econômica das ações fiscais.

Mensurável: Percentual com base em valores registrados.

Atingível: Evolução compatível com aprimoramento dos métodos de fiscalização.

Relevante: Contribui para aumento de arrecadação com menor custo.

Temporal: Medição anual.

Meta:
Unidade de Medida: %

Linha de Base (2025): 10%

Meta Intermediária (Ano 3): 25%

Meta Final (Ano 5): 50%

Fonte: Relatório da Diretoria Executiva de Administração Tributária

1. 4. 21. **Informações do 21° indicador:**
Nome: Indicador da Qualidade da Informação Contábil Estadual

Descrição:
O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que avalia a qualidade das informações e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais enviados pelos entes federativos (União, estados e municípios) ao Tesouro Nacional por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 205, 301, 302, 303, 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC 4, OEC 6

Fórmula: Nota do Estado da Paraíba no ranking Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro)

Análise SMART:

Específico: Avalia a qualidade e a consistência das informações contábeis e fiscais do Estado da Paraíba.

Mensurável: Classificação atribuída ao Estado no ranking Siconfi, segundo metodologia oficial da STN.

Atingível: Factível, considerando o histórico recente de classificação “A” e os processos já implantados.

Relevante: Relaciona-se à transparência fiscal, à governança contábil e à credibilidade institucional.

Temporal: Avaliado anualmente, com linha de base em 2024 e meta ao final do ciclo do projeto.

Meta:
Unidade de Medida: Classificação no ranking Siconfi

Linha de Base (2024): A

Meta Final (Ano 5): A

Fonte: Siconfi (https://ranking-municipios.tesouro.gov.br/ranking_estados)

1. 4. 22. **Informações do 22° indicador:**
Nome: Utilização de soluções de apoio à tomada de decisão baseada em dados

Descrição:
Objetiva-se avaliar de forma quantitativa, nos próximos 05 (cinco) anos, a evolução e sucesso das iniciativas de desenvolvimento e implantação de soluções de apoio à tomada de decisão baseadas em dados.

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 205, 301, 302, 303, 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC 5

Fórmula: Quantidade de ferramentas de Business Intelligence implantadas.

Análise SMART:

Específico: Monitora a implantação de soluções de apoio à tomada de decisão baseadas em dados.

Mensurável: Número de ferramentas de Business Intelligence efetivamente implantadas.

Atingível: Compatível com a capacidade técnica e o cronograma de execução do projeto.

Relevante: Contribui para o fortalecimento da gestão orientada por evidências e para a eficiência decisória.

Temporal: Possui linha de base definida (2026), com metas intermediária (Ano 3) e final (Ano 5)

Meta:
Unidade de Medida: Número

Linha de Base: 0 (em 2026)

Ano 3: 2 (meta intermediária)

Ano 5: 4 (meta final)

Fonte: Relatórios das Diretorias da SEFAZ-PB

1. 4. 23. **Informações do 23° indicador:**
Nome: Apuração de custos nas unidades da administração direta e transparência e informações à sociedade

Descrição:
Objetiva-se avaliar de forma quantitativa, nos próximos 05 (cinco) anos, a implantação da sistemática de apuração e gestão de custos públicos na prestação de serviços.

Vinculações:

Áreas Estratégicas: 301, 302, 303, 306

Objetivos Específicos Complementares: OEC 3, OEC 4, OEC 5, OEC 6

Fórmula: Quantidade de órgãos da administração direta com sistemática de custos implantada e com informações publicadas.

Análise de características SMART:

Específico: Avalia a implantação da sistemática de apuração e divulgação de custos públicos.

Mensurável: Número de órgãos da administração direta com custos apurados e informações publicadas.

Atingível: Evolução gradual, compatível com a complexidade institucional e metodológica.

Relevante: Relaciona-se à eficiência do gasto público e ao fortalecimento da transparência governamental.

Temporal: Medido ao longo do ciclo de execução do projeto, com metas no Ano 3 e Ano 5.

Meta:
Unidade de Medida: Número

Linha de Base: 0 (em 2026)

Ano 3: 2 (meta intermediária)

Ano 5: 3 (meta final)

Fonte: Relatórios da Controladoria Geral do Estado

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III PB, vide o **Anexo 08 - Indicadores Propostos.**

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 24.888.250,00

Descrição:
O Componente I contribui para uma transformação abrangente da gestão fazendária da Paraíba ao integrar governança, gestão de riscos, desenvolvimento institucional, tecnologia, compras públicas, transparência e uso avançado de dados em uma agenda única de fortalecimento estatal. A modernização da governança aprimora a coordenação entre órgãos e qualifica a tomada de decisão, enquanto o modelo de riscos amplia a previsibilidade fiscal e protege o Estado diante de pressões estruturais sobre arrecadação, despesas, previdência e clima. Paralelamente, o investimento na força de trabalho — com trilhas de capacitação e banco de talentos — reforça o compromisso com uma administração pública mais inclusiva, diversa e preparada para atuar em um ambiente digital. A modernização tecnológica contribui para a implantação de bases sólidas para a transformação digital contínua, com sistemas integrados, segurança cibernética robusta e infraestrutura sustentável, ampliando a agilidade do Estado e fortalecendo a cooperação federativa.

Essa arquitetura institucional se completa com a modernização das aquisições públicas, que padroniza processos, reduz riscos, estimula fornecedores locais e amplia oportunidades para microempreendedores, contribuindo para dinamizar a economia regional. O fortalecimento da transparência, por meio do Observatório Fiscal e de portais modernizados, amplia o controle social, melhora o ambiente de negócios e aproxima a sociedade das decisões públicas, enquanto ações de educação fiscal se alinham com as estratégias nacionais de implantação do IBS. Por fim, a implantação do uso avançado de dados consolida uma cultura analítica capaz de prever tendências, otimizar operações e garantir segurança da informação. Assim, o Componente I entrega à sociedade uma administração fazendária mais moderna, transparente, inclusiva e eficiente, capaz de promover justiça fiscal, ampliar investimentos e elevar a qualidade dos serviços públicos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P1.1 Governança Pública fortalecida – US$ 1.900.000

O produto objetiva apoiar a Paraíba na implementação do Modelo de Governança Pública (MPGP), estruturado em três níveis — estratégico, tático e operacional — para integrar órgãos, harmonizar decisões e otimizar ativos, com foco na gestão por resultados, disciplina fiscal, modernização de contratações, governança digital e PPPs. Dessa forma promovendo maior eficiência administrativa, melhor coordenação institucional e capacidade de implementar políticas públicas de forma mais estratégica e sustentável.

P1.2 Modelo de Riscos da gestão Fiscal Fortalecido – US$ 2.200.000

O produto tem como objetivo a implementação de um Modelo de Riscos da Gestão Fiscal que envolva o monitoramento dos riscos relacionados à arrecadação, despesa, pessoal, previdência, dívida pública, clima e conformidade. Objetiva, ainda, a criação de uma unidade especializada, programas de capacitação, políticas específicas e uma plataforma com registros, alertas e dashboards, assegurando transparência e resiliência para o fortalecimento da gestão fiscal do Estado da Paraíba.

P1.3 Gestão de Pessoas aprimorada – US$ 1.558.450

O produto visa implementar ações estruturantes para o fortalecimento da gestão de pessoas e do desempenho organizacional. A iniciativa contempla o redimensionamento da força de trabalho, a criação de um banco de talentos e a estruturação de trilhas de capacitação estratégica, abrangendo inovação, governança, análise de dados e gestão da mudança. Além da modernização da infraestrutura de formação, o plano foca no bem-estar integral do servidor para ampliar o engajamento e a eficiência administrativa. Adicionalmente o produto prevê: ampliação do programa de qualidade de vida dos funcionários, desenvolvimento de trilhas de capacitação para a Reforma Tributária e uso avançado de dados com os servidores.

P1.4 Gestão de Tecnologia da Informação Aprimorada – US$ 12.968.000

O produto tem como objetivo modernizar a infraestrutura tecnológica dos órgãos responsáveis pela gestão fiscal da Paraíba, atualizando o parque tecnológico com equipamentos e softwares de baixo consumo energético para atender às demandas da Reforma Tributária. A iniciativa prioriza a integração de sistemas, o reforço da segurança cibernética e a adequação do datacenter, impulsionando a transformação digital e assegurando conformidade com LGPD, LAI e LRF em uma infraestrutura sustentável. Para viabilizar essas mudanças, será contratada consultoria especializada para apoiar estrategicamente e atualizar o PDTI. Também serão implementados um programa de capacitação de servidores e um Modelo de Gestão de Riscos, fortalecendo a governança de dados, a eficiência no uso dos ativos e a segurança da informação.

P1.5. Gestão Sustentável de Aquisições e Materiais– US$ 2.224.350

Este produto visa consolidar a modernização e a governança das aquisições públicas da Paraíba, especialmente em TIC, por meio da padronização de processos, centralização de compras e integração de inteligência artificial para otimizar a gestão de riscos e o gasto público. Com o suporte de consultoria especializada e foco na capacitação de servidores, a iniciativa busca elevar a maturidade institucional e a segurança jurídica, promovendo a sustentabilidade, a transparência e o desenvolvimento econômico regional ao estimular a participação de fornecedores locais no ciclo de contratações.

P1.6 Gestão da Transparência e Educação Fiscal Fortalecidas – US$ 2.067.450

O Portal da Transparência será aprimorado com o uso tecnologia de Business Intelligence para oferecer dados abertos de receitas e despesas. Será implementado o Observatório Fiscal da Paraíba que vai reunir, analisar e divulgar informações sobre arrecadação e desempenho fiscal, ampliando a transparência, fortalecendo o controle social e promovendo um ambiente de negócios mais previsível. Serão realizadas ações de Educação Fiscal harmonizadas com as iniciativas do Comitê Gestor do IBS para a disseminação e gestão da mudança sobre o novo tributo, considerando comunidade empresarial, contabilistas e sociedade em geral.

P1.7 Uso de Dados Avançado na Gestão Fiscal Implantado – US$ 1.970.000

O produto prevê a implantação de uma gestão fiscal orientada a dados permitirá a elevação da eficiência, transparência e a capacidade de adaptação às exigências da reforma tributária. A iniciativa integrará, de forma coordenada: o fortalecimento do planejamento e da estratégia, o desenvolvimento de um portfólio analítico, a consolidação das bases técnicas, a promoção de uma cultura orientada por dados e a formação de equipes especializadas. Esse conjunto de ações permitirá aplicar análises inteligentes, prever tendências e otimizar operações, assegurando simultaneamente a conformidade regulatória, a proteção da privacidade e a rigorosa segurança da informação.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 20.537.950,00

Descrição:
Os produtos da Administração Tributária estruturam uma agenda integrada de modernização que fortalece capacidades estatais, acelera a transformação digital e consolida um regime fiscal mais previsível e sustentável. O conjunto de iniciativas avança na qualificação da gestão tributária ao aprimorar o controle de benefícios fiscais, integrar cadastros e obrigações acessórias, modernizar procedimentos de cobrança e elevar o padrão da fiscalização. A implantação de mecanismos analíticos, painéis de monitoramento e sistemas interoperáveis amplia a capacidade do Estado de planejar, avaliar e agir com maior precisão, reforçando a cooperação federativa e a qualidade dos serviços prestados à população.

A transformação digital permeia todo o componente, com destaque para a automação de processos, o uso intensivo de inteligência artificial e a integração a plataformas nacionais como PNR – Portal Nacional Redesim, PCCE/PUCOMEX e integração ao Cadastro Nacional com a RFB (CNPJ Alfanumérico). Essas ações reduzem burocracias, aceleram respostas e ampliam a agilidade operacional, criando um ambiente mais favorável ao contribuinte e ao desenvolvimento econômico. A modernização do contencioso fiscal, com plataformas digitais e sumarização automatizada, fortalece a segurança jurídica e melhora a previsibilidade das decisões, enquanto o atendimento multicanal e personalizado aproxima o cidadão da Administração Tributária e estimula a conformidade voluntária.

Ao preparar a SEFAZ para a transição do ICMS para o IBS, o componente consolida bases sólidas para um sistema tributário mais simples, justo e transparente. A adoção de tecnologias como *split payment* e *cashback*, aliada ao fortalecimento da gestão de riscos e ao combate qualificado às fraudes, contribui para um regime fiscal mais equilibrado e confiável, capaz de ampliar investimentos e promover justiça social. Assim, os produtos da AT formam um eixo estratégico de modernização que eleva a eficiência estatal, fortalece a integração federativa e entrega à sociedade uma administração tributária mais moderna, ágil e orientada a resultados.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P2.1 Modelo de Gestão Tributária Aprimorada para Melhoria do Ambiente de Negócios – USD 400.000

A iniciativa contempla o desenvolvimento de mecanismos de controle sobre os benefícios fiscais concedidos através da implantação do Portal de Registro dos Incentivos e Benefícios Tributários (produto obrigatório Profisco III) e mediante o uso de modelos analíticos de dados avançados, a implantação de painéis analíticos para impacto de regimes especiais e simulação de renúncia fiscal. Isso permitirá maior transparência e avaliação contínua dos impactos desses incentivos sobre a arrecadação e aperfeiçoamento de um modelo de gestão de gastos tributário que incluem aspectos sociais, econômicos e ambientais.

P2.2 Gestão Cadastral e Obrigações Acessórias Aperfeiçoadas – USD 1.675.000

Este produto prevê a integração ao PNR – Portal de Negócios Redesim (RFB); o uso do Identificador Único (CNPJ alfanumérico) integrado ao cadastro da RFB, (ambos produtos obrigatórios do Profisco III); implantação de um sistema antifraude robusto; saneamento cadastral com algoritmos de qualidade de dados; a criação de uma visão 360 graus do contribuinte, o que otimiza o controle fiscal. Para suportar essas mudanças, serão realizadas ações de capacitação de servidores em análise de dados, garantindo um controle fiscal mais eficaz, a redução de fraudes e a adaptação completa às exigências da Reforma Tributária.

P2.3 Procedimentos de Cobrança Aperfeiçoados – USD 1.812.000

O produto implementa controles automatizados e réguas de cobrança personalizadas conforme o perfil do devedor, usando dados atualizados para ampliar a eficácia da arrecadação e restituição. Prevê soluções digitais para automatizar análises, integrar sistemas e definir estratégias de cobrança baseadas no histórico do contribuinte, classificação de débitos e devedores e IA para cobrança automatizada. Inclui ainda a integração com o PCCE/PUCOMEX, permitindo pagamento centralizado de tributos e alinhamento à nova lógica da Reforma Tributária. (produto obrigatório Profisco III).

P2.4 Fiscalização Tributária e a Inteligência Fiscal Modernizadas – USD 3.600.000

O produto ampliará malhas fiscais e mecanismos avançados de detecção de fraudes, utilizando algoritmos de IA, ferramentas de conformidade e processos de autorregularização, além da criação de um laboratório de análise forense voltado ao enfrentamento do crime tributário. A iniciativa elevará o nível da fiscalização ao incorporar gestão de riscos, automação, métricas mais precisas e auditoria fortalecida. As ações de conformidade — com identificação do perfil de risco do contribuinte, notificações eletrônicas e possibilidade de autorregularização sem autuação —

favorecem a redução do litígio, promovem justiça fiscal e contribuem para um ambiente de negócios mais seguro e competitivo.

P2.5 Contencioso Fiscal Modernizado – USD 1.620.000

O produto moderniza o contencioso fiscal administrativo ao integrar todas as etapas em uma plataforma digital avançada, com uso intensivo de IA para sumarização de processos com IA generativa e o monitoramento digital de processos. As iniciativas aceleram julgamentos, reforça a segurança jurídica e automatiza processos, fortalecendo o planejamento e a fiscalização. Também amplia o controle e a previsibilidade da gestão tributária, alinhando o sistema às diretrizes da Reforma Tributária.

P.2.6 Atendimento ao Contribuinte Aperfeiçoado – USD 970.000

A Administração Tributária implementa uma estratégia de modernização e transformação digital focada na experiência do contribuinte. O objetivo é ampliar e diversificar os canais de atendimento, digitalizando serviços e simplificando interações. Essa iniciativa inclui a integração ao Portal Único do Estado com introdução de chatbots e aplicativos móveis, além de um atendimento personalizado. Complementam o modelo a capacitação dos servidores para a gestão digital, visando promover maior confiança e colaboração, reduzindo a burocracia e melhorando o ambiente de negócios. O resultado esperado é o aumento da conformidade voluntária e um relacionamento fiscal mais transparente, ágil e eficiente."

P2.7 Harmonização da AT com a Reforma Tributária – US$ 10.460.950

O produto prepara a SEFAZ para os impactos da reforma tributária, que redistribuirá competências entre os entes federativos e introduzirá novos modelos de arrecadação, gestão e fiscalização. A iniciativa consolida investimentos em processos, tecnologia e capacitação, promovendo a integração de pessoas, normas e sistemas às novas exigências e garantindo que o Estado esteja plenamente alinhado à transição do ICMS para o IBS. Entre os benefícios esperados estão a redução da complexidade e dos custos para as empresas, o fortalecimento do ambiente de negócios e a adoção de tecnologias como *split payment*, que reduz a evasão, e *cashback*, que devolve tributos à população de baixa renda. Essas ações tornam o sistema tributário mais simples, justo e eficiente, reforçam a cooperação entre os entes federativos, ampliam a transparência e contribuem para elevar a competitividade econômica nacional.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO
Valor estimado em Dólar (USD): 9.725.050,00

Descrição:
Os produtos da Administração Financeira estruturam uma agenda integrada de modernização que fortalece a capacidade do Estado de planejar, gerir e entregar políticas públicas com maior qualidade. A atualização do processo orçamentário — com revisão do PPA, adoção de metodologias baseadas em evidências, integração à Plataforma SIPGR e aprimoramento da gestão de investimentos — cria bases mais sólidas para decisões governamentais, ampliando a coerência entre planejamento, execução e resultados. A gestão do caixa orientada a cenários, a contabilidade modernizada e a gestão integrada de ativos, passivos e custos reforçam a previsibilidade fiscal, qualificam o gasto público e ampliam a segurança das decisões financeiras.

A transformação digital permeia todo o componente, com automação de rotinas críticas, integração de sistemas, uso de Big Data, painéis gerenciais e inteligência artificial aplicada à tesouraria, o que aumenta a agilidade operacional, reduz falhas e libera equipes para atividades analíticas de maior valor.

Em conjunto, os produtos deste componente consolidam uma administração financeira mais inteligente, transparente e orientada por dados, capaz de apoiar políticas públicas mais eficazes, ampliar a confiança social e criar um ambiente fiscal propício ao desenvolvimento econômico e social.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P3.1 Modernização do Processo de Planejamento e Execução Orçamentária– US$ 4.500.000

produto contempla a modernização da estrutura integrada de planejamento e execução orçamentária, incluindo o monitoramento e a avaliação de políticas públicas e projetos estratégicos, de forma integrada à Plataforma SIPGR. Prevê, ainda, a definição da metodologia de revisão do gasto público baseada em evidências e o Marco Orçamentário de Médio Prazo (MOMP), bem como a revisão do Plano Plurianual (PPA) e Gestão de Investimentos Públicos (GIP). Adicionalmente, uma metodologia macroeconômica para estimativas do PIB estadual e projeções fiscais, subsidiando a elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento.

P3.2 Políticas, Programação e Execução Financeira aperfeiçoados – US$ 1.012.000

Implementa um sistema de gestão do caixa com operação automatizada, que inclui a uniformização de procedimentos e a capacidade de criação de cenários fiscais. Essa ferramenta viabiliza a realização de simulações e a elaboração de projeções financeiras, o que se torna um suporte fundamental para as deliberações estratégicas. Adicionalmente, o escopo abrange a capacitação dos colaboradores e a integração com os sistemas de contabilidade e de planejamento orçamentário, resultando em um aumento do controle e na maior eficácia na administração dos fundos governamentais.

P3.3 – Gestão Contábil Modernizada – US$ 801.000

A iniciativa integra sistemas contábeis e corporativos, customiza funcionalidades, assegura conformidade normativa e adota ferramentas de previsão, monitoramento, Big Data e painéis fiscais, além de metodologias de análise por cenários. Como resultado, o Estado ganha maior precisão, agilidade, transparência e capacidade analítica na gestão fiscal, fortalecendo a eficiência e a qualidade das informações contábeis, além de contribuir para ampliar a disponibilidade, a qualidade e a inteligibilidade das informações públicas.

P3.4 Gestão de Ativos e Passivos Modernizada – US$ 500.000

O produto estabelece um modelo integrado de Gestão de Ativos e Passivos voltado ao desenvolvimento de políticas públicas, à redução do déficit previdenciário e ao controle do gasto. Baseia-se em modelagem financeira, análises de custo-benefício e avaliação de riscos para garantir precisão e sustentabilidade fiscal. Inclui a supervisão das participações societárias do Estado, a implementação de um sistema centralizado de controle dos fundos e repasses a PPPs e concessões, além da criação de um modelo para avaliar e quantificar os ativos de infraestrutura da rede viária estadual.

P3.5 Gestão de Custos e Qualidade do Gasto Público – US$ 1.812.050

Evolução e aperfeiçoamento do Processo de Gestão de Custos dos Serviços Públicos, promovendo a integração entre sistemas, evolução/otimização do módulo de custos e a ampliação dos serviços públicos com custos apurados. O roadmap de implantação prevê a apuração de custos para educação, saúde e sistema prisional, o uso avançado de dados permitirá análise comparativas de prestação de serviços públicos com qualidade versus custos, provendo maior efetividade. As ações envolvem a capacitação de servidores e promoção de uma cultura voltada para a gestão de custos precisa, integrada e orientada às necessidades sociais. Sobre a qualidade do gasto, mediante o uso de técnicas de análise avançada de dados, prevê-se a realização de análises comparativa com despesas de energia elétrica, água e serviços terceirizados para todos os órgãos da administração direta. Finalmente, prevê-se que as informações e relatórios gerados com as análises relacionadas a custos e qualidade do gasto público serão publicadas no Portal de Transparência fomentando a transparência e um maior controle social.

P3.6 Gestão do Tesouro Orientada a Dados e à Transformação Digital – US$ 1.100.000

O produto moderniza a gestão do Tesouro ao incorporar tecnologias avançadas, automação inteligente e análise massiva de dados para elevar a eficiência, a precisão e a transparência das operações financeiras. A iniciativa robotiza rotinas de tesouraria — como conciliações, pagamentos e gestão de caixa — reduzindo falhas e aumentando a produtividade. O uso de IA permite prever fluxos de caixa, detectar anomalias, classificar eventos financeiros e apoiar decisões com análises em tempo real. Sistemas integrados ampliam a transparência e o monitoramento de riscos, com painéis dinâmicos e Big Data. A coleta instantânea de informações torna as deliberações mais assertivas, enquanto a automação libera equipes para atividades estratégicas. A capacitação contínua garante domínio das novas ferramentas e sustenta a transformação digital do Tesouro.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: GESTÃO JURÍDICA PARA A SUSTENTABILIDADE FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 4.098.750,00

Descrição:
Os produtos deste componente contribuem para o fortalecimento da capacidade estatal ao modernizar a recuperação de créditos públicos e a gestão de passivos, com processos mais eficientes, equipes qualificadas e governança de dados aprimorada. A automação, a análise de riscos, a jurimetria e a inteligência artificial tornam os fluxos digitais mais ágeis e seguros, ampliando a capacidade de resposta do Estado. A priorização de ações com maior retorno, a previsão de impactos e a comunicação digital reforçam a credibilidade fiscal e contribuem para uma gestão mais sustentável e orientada a resultados.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P4.1 – Contencioso Judicial e Gestão da Dívida Ativa Aperfeiçoados – US$ 1.998.750

O produto promove uma modernização abrangente da recuperação de créditos públicos ao modernizar a gestão de TI, na PGE, com foco em segurança, integração, inovação e suporte digital, incorporando práticas avançadas de análise de riscos, jurimetria e segmentação inteligente de devedores. A estratégia combina infraestrutura tecnológica ecoeficiente, automação de rotinas de cobrança, protestos e transações, além do uso de inteligência artificial para identificar fraudes, mapear grupos econômicos e priorizar ações com maior potencial de retorno. Modelos preditivos permitem estimar recuperabilidade, orientar estratégias diferenciadas e reduzir o estoque de processos de baixa efetividade. O atendimento digital sem papel, aliado ao fortalecimento da governança de dados e à capacitação contínua das equipes, eleva a maturidade digital da instituição e amplia a eficiência fiscal, resultando em um contencioso mais estratégico, transparente e orientado a resultados.

P4.2 – Gestão de Passivos Contingentes e Precatórios Aperfeiçoada - US$ 2.100.000

O produto moderniza a gestão de passivos contingentes e precatórios ao adotar tecnologias de ponta e metodologias de inteligência de dados que ampliam a precisão e a previsibilidade das decisões. A automação de fluxos e a digitalização integral dos procedimentos aumentam a celeridade e reduzem riscos operacionais, enquanto ferramentas analíticas permitem mapear padrões de litigância, prever impactos financeiros e identificar fatores que influenciam a formação de passivos. A aplicação de jurimetria possibilita estimar probabilidades de perda, apoiar acordos estratégicos e orientar a alocação eficiente de recursos para quitação de débitos. A comunicação digital com credores, somada à qualificação técnica do corpo funcional e ao estabelecimento de parcerias institucionais, fortalece a governança, amplia a transparência e assegura maior controle sobre a evolução dos passivos, contribuindo para uma gestão fiscal mais sustentável e inteligente.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROJETO
Valor estimado em Dólar (USD): 750.000,00

Descrição:
As ações deste componente visam fornecer os recursos necessários para que a Unidade de Coordenação do Projeto - UCP possa realizar as atividades de execução do PROFISCO III PB, através da capacitação e visitas técnicas dos servidores envolvidos; da contratação de serviços especializados; da realização de Avaliação Intermediária do Projeto; e, da realização de eventos.

A implementação dessas ações trarão, como resultado para os membros da UCP e servidores envolvidos na execução do Projeto melhor capacitação; necessidades de áreas específicas do projeto atendidas por consultores especializados; Avaliação Intermediária do Projeto realizada; participação de membros em reuniões ordinárias da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ), do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (GEFIN) ou do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (ENCAT); e, a realização de Seminário de divulgação dos resultados do PROFISCO III.

Descrição de subcomponentes e produtos:

A1 – Monitoramento e Avaliação – USD 500.000

O produto assegura a disponibilidade de recursos para que a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) execute plenamente suas atividades de gestão. Isso abrange o financiamento de ações essenciais como capacitação e visitas técnicas para servidores, além da contratação de consultores especializados nas áreas de aquisições, finanças e monitoramento. Está prevista também a realização de uma consultoria específica para a Avaliação Intermediária do Projeto, garantindo a análise e o acompanhamento do progresso.

A2 – Auditoria – US$ 250.000

Este produto visa a contratação de serviço especializado de consultoria para a realização de Auditoria Externa Independente das demonstrações financeiras, registros, transações e atividades ocorridas durante a execução do PROFISCO III.

1. 6. **Beneficiários**

A implementação do PROFISCO III PB beneficiará um conjunto amplo de públicos, refletindo a natureza transversal do projeto e sua capacidade de fortalecer a gestão fiscal, aprimorar serviços públicos, promover inclusão produtiva e ampliar a cooperação federativa. Os beneficiários diretos e indiretos são apresentados a seguir.

1. Beneficiários Diretos

Servidores dos órgãos participantes (SEFAZ, CGE, SEAD, SEPLAG e PGE) - Incluem equipes de gestão fazendária, administração tributária, fiscalização, atendimento, contabilidade, planejamento, tecnologia da informação, contencioso administrativo e jurídico. Serão beneficiados pela modernização de processos, automação, integração de sistemas, capacitações e fortalecimento da governança.

Empresas da Paraíba: O Estado possui 302.553 empresas - www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-2o-quadrimestre-2025.pdf/view. O PROFISCO III PB foca na simplificação das obrigações fiscais, redução da burocracia e suporte tecnológico às empresas. A modernização tecnológica e a preparação para a Reforma Tributária proporcionarão um ambiente de negócios mais competitivo, favorecendo o crescimento econômico e novos investimentos.

Usuários dos serviços tributários e financeiros do Estado, que passarão a contar com maior simplificação das obrigações, atendimento digital ampliado, autorregularização, redução de custos de conformidade e maior previsibilidade fiscal.

Micro e Pequenas Empresas - Segmento mais sensível à complexidade tributária, beneficiado pela integração ao PNR-REDESIM, melhoria cadastral, automação da cobrança, serviços digitais personalizados e simplificação de processos.

Empresas Exportadoras e Importadoras - Beneficiadas pela integração ao PCCE/PUCOMEX, que reduz prazos logísticos, amplia previsibilidade e fortalece o ambiente de comércio exterior.

Público atendido por ações de educação fiscal, emissão de NF-e avulsa, capacitação e políticas de inclusão econômica, contribuindo para autonomia financeira e equidade de gênero.

Pessoas Inscritas no CadÚnico - Cerca de 2,5 milhões de paraibanos serão beneficiados pela implementação do mecanismo de cashback do IBS, ampliando justiça fiscal e capacidade de consumo das famílias de baixa renda. Esse mecanismo, previsto na Reforma Tributária, atuará como um benefício econômico e socialmente relevante pois prevê um aumento de renda para populações de baixa renda e vulneráveis mediante a devolução parcial ou total do valor do imposto, especialmente com a inclusão de filtros sociais e de renda. Fonte - https://cecad.cidadania.gov.br/painel01.php?p_ibge=25&mu_ibge=#

Usuários dos Serviços Digitais da SEFAZ/PB

Cidadãos e empresas que utilizam chatbots, aplicativos, portal do contribuinte e demais serviços eletrônicos, beneficiados por maior agilidade, disponibilidade e qualidade no atendimento.

Usuários do Portal da Transparência e do Observatório Fiscal - Jornalistas, pesquisadores, estudantes, organizações da sociedade civil e cidadãos interessados em controle social terão acesso ampliado a dados abertos, painéis analíticos e informações qualificadas.

2. Beneficiários Institucionais

Órgãos de Controle e Fiscalização - Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), Controladoria-Geral do Estado (CGE), Controladoria-Geral da União (CGU) e demais instituições que utilizam dados fiscais, contábeis e orçamentários serão beneficiadas pela melhoria da qualidade da informação, automação contábil e maior transparência.

Servidores Municipais e Federais Envolvidos na Cooperação Federativa - A integração ao PNR-REDESIM, ao CNPJ alfanumérico, ao PCCE/PUCOMEX e ao Comitê Gestor do IBS fortalece a atuação conjunta entre União, estados e municípios, beneficiando equipes técnicas que operam sistemas compartilhados.

Servidores do Contencioso Administrativo e Judicial - Beneficiados pela digitalização de processos, automação de fluxos, jurimetria e análise preditiva, que ampliam eficiência, celeridade e segurança jurídica.

3. Beneficiários Econômicos e Produtivos

Setores Produtivos do Estado - Indústria, comércio, serviços, agronegócio e TIC serão beneficiados pela simplificação tributária, redução de litígios, melhoria do ambiente de negócios e maior previsibilidade fiscal.

Fornecedores e Participantes de Compras Públicas - Beneficiados pela padronização, centralização e maior transparência dos processos de aquisição, ampliando competitividade e reduzindo assimetrias.

4. Beneficiários Indiretos

Sociedade Paraibana - Os 4,16 milhões de habitantes do Estado serão beneficiados pela melhoria da gestão fiscal, maior eficiência do gasto público, ampliação da transparência, sustentabilidade ambiental e fortalecimento da capacidade estatal de entrega de serviços públicos de qualidade.

1. 7. **Anexos**

Anexo 03 - Relatório da MD-GEFIS 2019 PB

Anexo 04 - Correlação e Sinergias entre o Profisco III PB com o Profisco II PB

Anexo 05 - Lógica Horizontal de Resultado do PROFISCO III PB

Anexo 06 - Avaliação de Maturidade de Análise Avançada de Dados PB

Anexo 07 - Estudo de Avaliação de Impacto PROFISCO I

Anexo 08 - Indicadores Propostos

Anexo 01 - Diagnóstico Socioeconômico e Fiscal Paraíba

Anexo 02 - Marco de Referência do PROFISCO III

Anexo 09 - Integração ao PCCE - PUCOMEX - Pagamento Centralizado do Comercio Exterior

Anexo 08 B - Indicadores Propostos (Em substituição ao Anexo 08 do pleito original)

Anexo 04 B - Correlação e Sinergias entre o Profisco III PB com o Profisco II PB (Em substituição ao Anexo 04 do pleito original)

Anexo 05 B - Lógica Horizontal de Resultado do PROFISCO III PB (Em substituição ao Anexo 5 do pleito original)

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O PROFISCO III PB estrutura-se em quatro componentes — Gestão Fazendária (GF), Administração Tributária (AT), Administração Financeira (AF) e Gestão Jurídica (GJ) — que se desdobram em 22 produtos e 23 indicadores. O **Anexo 10 – Mapa Resumo de Aderência** evidencia, de forma sistemática, como o projeto contribui para as áreas estratégicas do PPA Federal 2024–2027, demonstrando coerência técnica, impacto e alinhamento às prioridades nacionais.

(205) Produtividade e Competitividade

O projeto apresenta forte aderência ao objetivo de ampliar a produtividade e a competitividade ao modernizar processos fiscais, simplificar obrigações e reduzir custos operacionais. A Reforma Tributária, integrada ao PROFISCO III PB, cria um ambiente regulatório mais previsível, reduz litigiosidade e fortalece a segurança jurídica, estimulando investimentos e dinamizando cadeias produtivas. A integração ao PNR-REDESIM, ao CNPJ alfanumérico e ao PCCE/PUCOMEX reduz barreiras de entrada, acelera fluxos logísticos e melhora a interação entre empresas e o Estado

Impacto: Alto.

% do projeto: 12,02% (USD 7.123.968).

Público-alvo: 290 mil empresas; usuários dos serviços digitais; sociedade paraibana (4,16 milhões).

(301) Democracia Participativa, Transparência e Controle Social

A aderência é elevada, com ações que ampliam a transparência fiscal, fortalecem o controle social e qualificam a comunicação pública. O produto P1.6 moderniza o Portal da Transparência com BI e implanta o Observatório Fiscal, tornando dados mais acessíveis, inteligíveis e utilizáveis. A criação de novos canais digitais, como chatbots e aplicativos, facilita a participação cidadã e o acompanhamento de demandas. Produtos como P3.1, P3.3 e P3.5 aprimoram a qualidade das informações contábeis e de custos, permitindo maior escrutínio público sobre políticas e gastos.

Impacto: Elevado.

% do projeto: 10,10% (USD 5.983.743).

Público-alvo: Órgãos de controle, jornalistas, pesquisadores, sociedade civil e população em geral.

(302) Capacidades Estatais e Cooperação Federativa

O projeto contribui de forma decisiva para a ampliação e o aperfeiçoamento das capacidades estatais ao modernizar a gestão tributária, financeira e administrativa, revisando processos, fortalecendo a gestão orientada por dados e ampliando a automação. A capacitação de servidores e a modernização do contencioso elevam a maturidade institucional, enquanto a integração a plataformas nacionais — PNR-REDESIM, PCCE/PUCOMEX, Cadastro Nacional e sistemas federativos — harmoniza procedimentos e reduz assimetrias entre entes. Ao aprimorar planejamento, execução e avaliação do gasto, o projeto reforça a cooperação federativa e sustenta um regime fiscal mais eficiente, capaz de entregar serviços públicos de maior qualidade à população.

% do projeto: 21,45% (USD 12.710.683).

Público-alvo: Empresas, usuários de serviços digitais, servidores estaduais e municipais, população paraibana.

(303) Transformação Digital no Setor Público

O PROFISCO III PB promove transformação digital abrangente, redesenhando processos e sistemas para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados. A modernização tecnológica inclui interoperabilidade entre bases de dados, uso de inteligência artificial para automação fiscal, malhas inteligentes, serviços digitais avançados e Big Data para decisões financeiras. A digitalização do contencioso com jurimetria e fluxos eletrônicos aumenta eficiência e reduz prazos.

Impacto: Elevado.

Vínculo técnico: Modernização tecnológica, interoperabilidade, IA para automação fiscal, digitalização de serviços, Big Data na gestão financeira e jurimetria no contencioso.

% do projeto: 24,60% (USD 14.577.875).

Público-alvo: Empresas, contribuintes, servidores e cidadãos usuários de serviços digitais.

(306) Regime Fiscal e Tributário Sustentável

É a área estratégica mais fortemente atendida pelo projeto. A iniciativa revisa processos, moderniza sistemas e capacita servidores para a implantação da Reforma Tributária, consolidando um regime fiscal ancorado em credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade. A adoção do IBS simplifica obrigações, reduz custos de conformidade, amplia a justiça fiscal e cria um ambiente mais estável para decisões econômicas. A governança fazendária é fortalecida por práticas estruturadas de gestão de riscos, qualificação contínua da força de trabalho e infraestrutura tecnológica robusta, capaz de sustentar operações críticas com maior segurança e eficiência.


Paralelamente, a gestão financeira e contábil torna-se mais precisa, integrada e responsiva, com automação de rotinas, uso de dados em tempo real e planejamento baseado em evidências, o que aprimora a capacidade do Estado de antecipar cenários, ajustar políticas e assegurar maior eficiência no gasto público.

Impacto: Elevado.

% do projeto: 31,82% (USD 18.853.733).

Público-alvo: Empresas de todos os setores, contribuintes do IBS, beneficiários do cashback, população de 4,16 milhões.

Profisco III PB - Diagrama de Conexão Lógica entre Áreas Estratégicas, Objetivos Específicos Complementares e Componentes

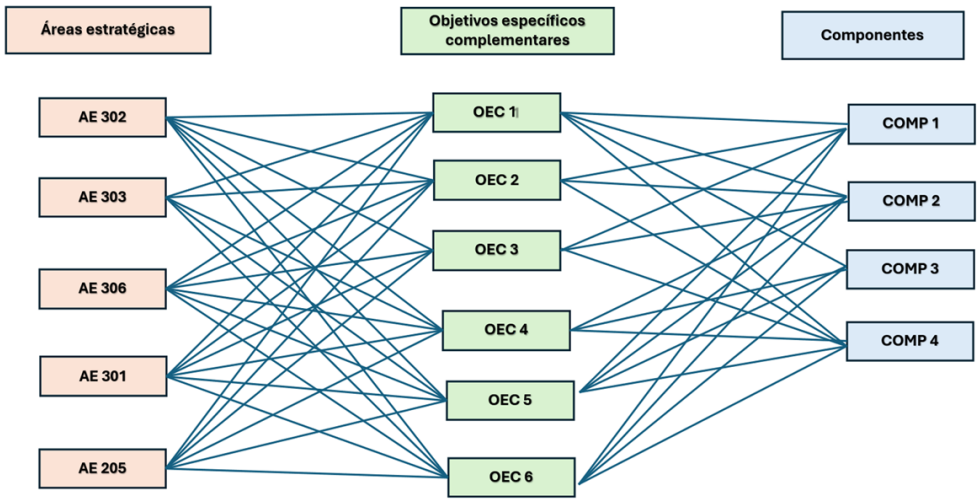

O diagrama evidencia uma rede ampla e integrada: cada área estratégica se conecta a múltiplos objetivos complementares, que por sua vez se vinculam simultaneamente aos quatro componentes. O resultado é uma estrutura fortemente interligada e coerente entre prioridades, objetivos e entregas.

2. 2. **Anexos**

Anexo 10 B - Mapa Resumo de Aderência entre Áreas Estratégicas PPA 2024-2027 e Componentes e Produtos (Em substituição ao Anexo 10 do pleito original)

Anexo 11 B - Demonstrativo de Relevância Financeira dos Componentes e Produtos com as AEs do PPA Federal 2024-2027 (Em substituição ao Anexo 11 do pleito original)

Anexo 10 - Mapa Resumo de Aderência entre Áreas Estratégicas PPA 2024-2027 e Componentes e Produtos

Anexo 11 – Demonstrativo de Relevância Financeira de Componentes e Produtos com AEs PPA 2024-2027

Anexo 12 - Diagrama de Conexão Lógica entre AE x OE x OEC


Anexo 12 B - Diagrama de Conexão Lógica entre AE x OE x OEC (Em substituição ao Anexo 12 do pleito original)

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A execução do PROFISCO III PB envolverá a atuação de diversos órgãos, cabendo a cada um destes um papel institucional em relação ao cumprimento atividades específicas em cada etapa da execução do Projeto, conforme o descrito no Organograma do Arranjo Institucional abaixo.

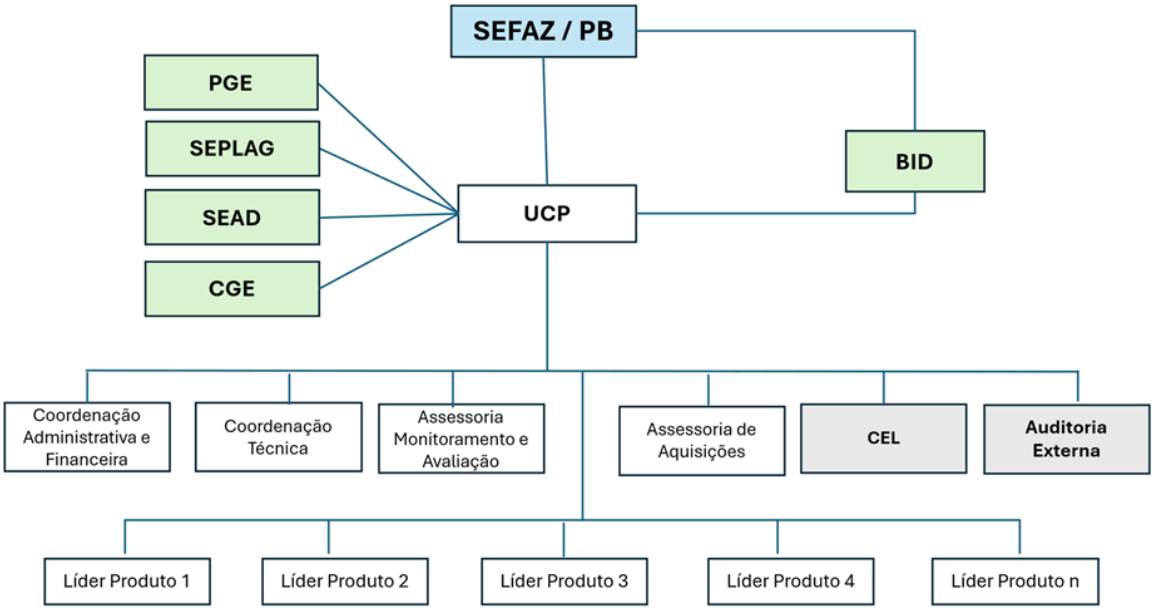

1. Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ / PB

O Governo do Estado da Paraíba será o mutuário da operação de crédito, sendo a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ/PB o Órgão Executor do Projeto. A execução do PROFISCO III PB contará com o apoio de unidades do órgão no desempenho de funções no Projeto.

A Unidade de Coordenação do Projeto – UCP, vinculada à SEFAZ/PB, será a instância responsável pela coordenação geral do PROFISCO III PB, pela interface operacional com o BID e pelo acompanhamento da execução física e financeira, conforme detalhado no item III.1.3 e no Anexo 13 – Arranjo Operacional.

2. Órgãos Parceiros Executores – PGE, SEPLAG, SEAD, CGE

A execução de determinados produtos envolverá órgãos parceiros, que atuarão mediante Termo de Cooperação firmado com a SEFAZ/PB. Cada órgão será responsável pela execução das atividades previstas no cronograma e na Matriz de Responsabilidades.

Procuradoria Geral do Estado da Paraíba - PGE/PB será beneficiada no PROFISCO III PB através da execução dos produtos P4.1 - Contencioso Judicial e Gestão da Dívida Ativa Aperfeiçoados e P4.2 - Gestão de Passivos Contingentes e Precatórios Aperfeiçoada.

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG/PB será beneficiada com os produtos P1.1 Governança Pública Fortalecidas e P3.1 Modernização do Processo de Planejamento e Execução Orçamentária.

A Secretaria de Estado da Administração – SEAD/PB, através do produto P1.5 Gestão Sustentável de Aquisição e Materiais.

A Controladoria Geral do Estado da Paraíba – CGE/PB, através dos produtos P1.6 Gestão da Transparência e Educação Fiscal fortalecidas, P3.3 Gestão Contábil Modernizada e P1.7 Uso de Dados Avançado na Gestão Fiscal.

3. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID será o organismo financiador do PROFISCO III PB, por meio de linha de financiamento no âmbito do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO). O BID possui expertise em gestão fiscal e experiência acumulada em programas como PNAFE e PROFISCO I e II, oferecendo suporte técnico à implantação, acompanhamento e avaliação dos projetos.

O Banco manterá relacionamento institucional com a SEFAZ/PB e relacionamento operacional com a UCP, para o acompanhamento da execução, a análise de aquisições, os desembolsos e a avaliação de resultados.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/PB
Órgãos parceiros:
Secretaria de Estado da Administração – SEAD/PB
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG/PB
Controladoria Geral do Estado da Paraíba – CGE/PB
Procuradoria Geral do Estado da Paraíba – PGE/PB

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A execução do PROFISCO III PB, centralizada na SEFAZ/PB, será conduzida por uma estrutura operacional integrada, composta pela Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), pelas áreas técnicas da SEFAZ/PB e de órgãos parceiros, pelos comitês de governança e pelos mecanismos de controle e auditoria. Esse arranjo assegura coordenação estratégica, execução eficiente, conformidade com as políticas do BID e sustentabilidade institucional.

A SEFAZ/PB já dispõe de equipe técnica e estrutura institucional consolidadas para conduzir programas de modernização fiscal. O corpo técnico designado acompanhou de forma integral a implementação do PROFISCO II e parte dos profissionais já havia participado também do primeiro PROFISCO, acumulando experiência prática e conhecimento profundo das metodologias, instrumentos de gestão e mecanismos de acompanhamento exigidos em operações dessa natureza. Esse histórico garante elevada capacidade institucional para a gestão do novo projeto, com equipe habituada às rotinas de planejamento, execução, monitoramento e prestação de contas junto ao BID e aos órgãos federais de controle.

Uma vez que a execução do Projeto será plenamente centralizada na SEFAZ/PB, não haverá repasse de recursos aos demais órgãos participantes. Dessa forma, não haverá necessidade de utilização de instrumentos jurídicos para descentralização de recursos, assegurando maior agilidade, padronização de processos e eficiência no uso dos recursos contratados.

1. Unidade de Coordenação do Projeto – UCP

A UCP será responsável pela coordenação geral do PROFISCO III PB. Sua equipe será capacitada nas políticas de aquisições, salvaguardas e gestão financeira do BID, desempenhando as seguintes funções:

- planejar, coordenar, monitorar e avaliar a execução dos produtos;

- representar o Mutuário junto ao BID e órgãos federais;

- elaborar relatórios financeiros, de progresso e instrumentos de monitoramento;

- realizar prestação de contas e solicitar aportes financeiros;

- encaminhar ao BID os relatórios de auditoria externa;

- acompanhar as unidades responsáveis por licitações, gestão de contratos, recebimento e tombamento de bens, registro contábil e pagamentos;

- apoiar a análise técnica e jurídica dos processos licitatórios e de pagamentos.

A UCP será composta por servidores da SEFAZ/PB, com competências detalhadas no **Anexo 13 – Arranjo Operacional.**

2. Estrutura Técnica de Implementação

A execução dos componentes será realizada pelas áreas finalísticas da SEFAZ/PB e pelos órgãos parceiros:

- Gestão Fazendária (GF): governança, riscos, planejamento, gestão de pessoas, compras públicas, transparência e transformação digital.

- Administração Tributária (AT): cadastro, fiscalização, inteligência fiscal, cobrança, atendimento e harmonização com a RTC.

- Administração Financeira (AF): orçamento, tesouraria, contabilidade, gestão de ativos, custos e sustentabilidade ambiental.

- Gestão Jurídica (GJ): contencioso fiscal, precatórios, passivos contingentes e automação de fluxos jurídicos.

Cada área será responsável pela execução técnica dos produtos sob sua competência, com apoio metodológico e gerencial da UCP.

3. Gestão de Mudança e Comunicação

Será implementado um plano de gestão de mudanças com ações de comunicação interna, capacitação contínua, orientação ao contribuinte e campanhas educativas, especialmente no contexto da Reforma Tributária.

4. Comitês de Governança

4.1 Comitê Gestor do PROFISCO III PB (nível estratégico)

Composto pelo Secretário da Fazenda, Secretário Executivo, dirigentes das áreas finalísticas e coordenação da UCP. Responsável por definir diretrizes, validar planos de trabalho, deliberar sobre riscos críticos e garantir alinhamento com a política fiscal.

4.2 Comitê Técnico do Projeto (nível operacional)

Formado por gerentes e líderes de produtos. Responsável por acompanhar a execução dos produtos, validar entregas técnicas, monitorar indicadores e propor ajustes.

5. Estrutura Organizacional do projeto

A SEFAZ/PB possui fluxos processuais definidos para contratação de bens e serviços, distribuídos da seguinte forma:

- Comissão Especial de Licitações (CEL): realiza licitações do Projeto conforme políticas do BID, utilizando o ComprasGov.

- Líderes de Produtos: responsáveis pela prospecção de soluções, elaboração de especificações técnicas, avaliação de propostas e gestão da execução dos produtos.

- Núcleo IBS: equipe especializada que atuará junto à UCP, responsável por articulação com o Comitê Gestor do IBS, pela coordenação da transição ICMS para IBS, pela integração de sistemas e capacitação específica.

- Controle Interno: responsável pela análise técnica dos processos licitatórios e de pagamentos.

6. Sustentabilidade Institucional

O arranjo operacional foi concebido para garantir continuidade após o encerramento do PROFISCO III PB, por meio da institucionalização de processos, capacitação permanente, integração sistêmica, governança consolidada e monitoramento contínuo das entregas e resultados.

As responsabilidades detalhadas da UCP, dos Líderes de Produtos e da Comissão Especial de Licitações estão descritas no **Anexo 14 - Matriz Responsabilidades Institucionais - Matriz RACI**.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 14 – Matriz de Responsabilidades Institucionais - Matriz RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A execução do PROFISCO III PB prevê investimentos em bens (hardware, software, veículos e outros equipamentos), serviços técnicos especializados, consultorias e obras de infraestrutura. Esses ativos exigirão manutenção e reposição ao longo do tempo, em razão do desgaste natural, da obsolescência tecnológica e da necessidade de atualização contínua. Os custos associados à sustentabilidade operacional serão considerados nos Termos de Referência, contemplando transferência de conhecimento, aumento de produtividade e redução de despesas recorrentes.

Com base no valor total dos investimentos previstos, foi estimado um custo anual de manutenção de **US$ 885.433**, correspondente a **1,48%** do valor global do Projeto. Esse cálculo considera as categorias de bens e infraestrutura contempladas no PROFISCO III PB e aplica a taxa média anual de depreciação, conforme demonstrado no **Anexo 15 – Custos de Sustentação do Projeto**.

A SEFAZ/PB já possui experiência consolidada na manutenção de bens e sistemas adquiridos com recursos do Tesouro Estadual. Os contratos anuais vigentes para manutenção de equipamentos, sistemas e infraestrutura estão listados no **Anexo 16 – Contratos de Manutenção**. Os recursos necessários para essas despesas estão previstos no orçamento de custeio da SEFAZ/PB para o exercício de 2026, conforme demonstrado no **Quadro de Detalhamento da Despesa da LOA 2026 – SEFAZ e FADAT,** https://instrumentosplanejamento.pb.gov.br/2026/loa/qdd.pdf (páginas 139 a 156).

Além disso, a sustentabilidade dos investimentos será reforçada pelo **Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Administração Tributária – FADAT**, instituído pela Lei Estadual nº 8.445/2007. O Fundo é composto por recursos provenientes de convênios, operações de crédito, doações e, no mínimo, 25% da arrecadação das multas por infração à legislação tributária. Entre suas finalidades estão:

financiar programas de modernização institucional;

promover formação e capacitação de servidores;

contratar serviços e adquirir equipamentos e softwares para modernização tecnológica;

apoiar ações de educação fiscal.

Os recursos do FADAT estão assegurados na Lei Orçamentária Anual de 2026, conforme demonstrado no **Anexo 18 – LOA 2026 SEFAZ/FADAT**.

Esse conjunto de instrumentos — previsão orçamentária, contratos de manutenção vigentes e o FADAT — garante a sustentabilidade institucional e financeira necessária para a continuidade dos investimentos realizados no âmbito do PROFISCO III PB.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Plano Plurianual do Estado da Paraíba (PPA), aprovado pela Lei nº 13.548/2025, (disponível em https://instrumentosplanejamento.pb.gov.br/2025), estabelece as ações que definem as diretrizes, metas e objetivos do governo para o período 2024-2027.

No “Anexo I – PROGRAMAS TEMÁTICOS” do PPA (**Anexo 19 - PPA 2024-2027 - SEFAZ/PB**), encontramos os programas e objetivos que demonstram perfeito alinhamento com o Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado da Paraíba – PROFISCO III PB:

Eixo: Paraíba em Boa Governança

Tipo de Programa: Temático

Programa: 5292 – Modernização da Gestão Fiscal do Estado

Objetivo: 1033 – Ampliar a arrecadação do Estado.

Público-alvo Órgãos do Governo, Cidadãos Paraibanos

Órgão responsável: Secretaria de Estado da Fazenda / Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Administração Tributária - FADAT

Eixo: Paraíba em Boa Governança

Tipo de Programa: Temático

Programa: 5001 – Gestão Dinâmica e Eficiente

Objetivo: 1084 – Ampliar a arrecadação do Estado.

Público-alvo: População do Estado da Paraíba; Órgãos da Adm. Direta e Indireta do Estado da Paraíba

Órgão responsável: Secretaria de Estado da Fazenda

Eixo: Paraíba em Boa Governança

Tipo de Programa: Temático

Programa: 5001 – Gestão Dinâmica e Eficiente

Objetivo: 1085 – Aprimorar a eficiência da gestão pública por meio de auditorias, consultorias, monitoramentos contínuos e orientações para o alcance de objetivos governamentais, da transparência, integridade e conformidade com regulamentos.

Público-alvo: População do Estado da Paraíba; Órgãos da Adm. Direta e Indireta do Estado da Paraíba

Órgão responsável: Controladoria Geral do Estado

Eixo: Paraíba em Boa Governança

Tipo de Programa: Temático

Programa: 5001 – Gestão Dinâmica e Eficiente

Objetivo: 1129 – Dotar o estado de ferramentas estratégicas para melhoria da gestão de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação.

Público-alvo: População do Estado da Paraíba; Órgãos da Adm. Direta e Indireta do Estado da Paraíba

Órgão responsável: Secretaria de Estado da Administração

Eixo: Paraíba em Boa Governança

Tipo de Programa: Temático

Programa: 5001 – Gestão Dinâmica e Eficiente

Objetivo: 1199 – Implantar o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão por Resultados - SIPGR, como sistema único e informatizado, em plataforma web, modular, integrado e integrável aos sistemas transacionais, em conformidade com a LGPD, com suporte técnico e metodológico.

Público-alvo: População do Estado da Paraíba; Órgãos da Adm. Direta e Indireta do Estado da Paraíba

Órgão responsável: Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

As ações do PROFISCO III PB possuem aderência com o Plano Estratégico de longo prazo do Estado da Paraíba – PARAÍBA 2040 (**Anexo 20 - Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado da Paraíba - Paraíba 2040**), com ações de médio e longo prazo voltadas a uma gestão dinâmica eficiente, através da garantia do equilíbrio fiscal e melhora da qualidade e eficiência dos serviços públicos, a fim de proporcionar uma economia dinâmica, competitiva, com crescimento sustentável. O Plano Estratégico Paraíba 2040 encontra-se disponível em:

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-planejamento-orcamento-e-gestao/planos-estrategicos.

3. 4. **Anexos**

Anexo 18 B - LOA 2026 - SEFAZ-FADAT (Em substituição ao Anexo 18 do pleito original)

Anexo 13 - Arranjo Operacional do Projeto

Anexo 15 - Custos Posteriores de Operação e Sustentação do Projeto

Anexo 16 - Contratos de Manutenção

Anexo 17 - Lei 8.445-2007 - FADAT

Anexo 19 - PPA 2024-2027 - SEFAZ-PB

Anexo 18 - LOA 2025 - SEFAZ-FADAT

Anexo 20 - Plano Estratégico de longo prazo do Estado da Paraíba - Paraíba 2040

Anexo 15 B - Custos Posteriores de Operação e Sustentação do Projeto (Em substituição ao Anexo 15 do pleito original)

Anexo 16 B - Contratos de Manutenção (Em substituição ao Anexo 16 do pleito original)

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Não aprovação dos atos legais da Operação de Crédito
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba que permita ao Estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a Carta Consulta pela COFIEX.

Na análise da mensagem para a contratação da operação de crédito a Assembleia Legislativa observará a situação das receitas e despesas da administração estadual, quanto aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a conformidade e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

A não aprovação legislação resultará na não continuidade do processo de contratação da operação de crédito pleiteada.

Impacto Potencial

Impossibilidade de contratação da operação de crédito.

Suspensão do cronograma de execução.

Perda de oportunidade de modernização fiscal e digital.

Todos os produtos seriam afetados.

Comprometimento da credibilidade institucional junto ao BID.

Prevenção e Mitigação:
Para assegurar a aprovação dos atos legais necessários à contratação da operação de crédito do Projeto PROFISCO III PB, a SEFAZ/PB promoverá uma articulação institucional estratégica com a Assembleia Legislativa, por meio de reuniões técnicas e políticas voltadas ao esclarecimento dos objetivos, benefícios e impactos positivos do projeto para o Estado. Essa mobilização envolverá lideranças políticas e técnicas da Secretaria, com o propósito de sensibilizar os parlamentares e construir consenso em torno da proposta. Serão elaborados materiais técnicos e informativos que subsidiem a tramitação legislativa, reforçando a transparência e a fundamentação das ações previstas. O projeto será alinhado ao Plano Plurianual e às diretrizes estratégicas do Governo do Estado, garantindo coerência com os instrumentos de planejamento oficial. No que se refere aos atos infralegais, como decretos, portarias e instruções de serviço, o Poder Executivo Estadual detém plena governabilidade sobre sua edição, contando com equipes capacitadas para sua concepção e redação. A criação da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) será formalizada por meio de decreto estadual, assegurando sua institucionalização e funcionamento regular.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Execução das atividades do Projeto e Fluxo Processual
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A execução das atividades do projeto pode ser comprometida por entraves operacionais e administrativos, como atrasos em processos de contratação, aquisições e tramitação interna de documentos. A complexidade dos fluxos processuais, aliada à eventual sobrecarga das equipes técnicas e à necessidade de articulação entre múltiplos setores da SEFAZ/PB, pode impactar o cumprimento dos cronogramas e a entrega dos produtos previstos.

Impacto Potencial

Atrasos na implementação dos produtos dos componentes I. GF, II. AT e III. AF.

Risco de descumprimento de metas e indicadores pactuados com o BID.

Redução da efetividade das ações de transformação digital, reforma tributária e modernização da gestão fiscal.

Comprometimento da imagem institucional e da credibilidade do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Para assegurar a execução eficiente e coordenada do Projeto PROFISCO III PB, a SEFAZ/PB implementará um conjunto estruturado de ações voltadas ao fortalecimento da gestão técnica e administrativa. A primeira iniciativa será a implantação de um Escritório de Projetos e Processos (P1.1), com foco na gestão da mudança, no monitoramento contínuo das atividades e na padronização dos fluxos operacionais. Essa estrutura funcionará como núcleo estratégico de governança, promovendo maior integração entre os componentes do projeto e assegurando a conformidade com os prazos e metas estabelecidos.

A Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) e as equipes técnicas envolvidas serão capacitadas em metodologias de gestão de projetos, com apoio de assessoria especializada, visando ampliar o domínio sobre ferramentas de planejamento, controle e execução. O uso de soluções digitais será intensificado, com a adoção de plataformas específicas para o gerenciamento de prazos, automação de processos administrativos e acompanhamento de entregas, promovendo maior eficiência e transparência.

Como parte das ações de aprimoramento da gestão, o processo administrativo de licitações será redesenhado, com definição clara de papéis e responsabilidades, incluindo a participação ativa da Procuradoria Jurídica em todas as etapas. Serão estabelecidos prazos específicos para cada fase do processo, desde a elaboração dos termos de referência até a homologação dos contratos, com acompanhamento rotineiro pela UCP e pela alta gestão. Essa medida visa garantir maior previsibilidade, celeridade e segurança jurídica nas contratações, reduzindo riscos operacionais e assegurando o cumprimento dos cronogramas pactuados.

Além disso, serão estabelecidos cronogramas realistas e pactuadas responsabilidades entre as áreas envolvidas, garantindo clareza na distribuição de tarefas e maior comprometimento institucional. O acompanhamento sistemático será realizado por meio de painéis de indicadores e reuniões periódicas de monitoramento, permitindo a identificação precoce de desvios, a tomada de decisões ágeis e a promoção de ajustes táticos sempre que necessário. Essas medidas integradas visam consolidar uma cultura de gestão orientada por resultados, fortalecer a capacidade institucional da SEFAZ/PB e garantir a entrega qualificada dos produtos previstos no projeto.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Gestão Pública e Governabilidade
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Mudanças na gestão estadual, especialmente em contextos de transição política, podem afetar a continuidade do projeto, a priorização das ações e o comprometimento institucional com os objetivos pactuados. A rotatividade de lideranças e a reorientação de políticas públicas podem gerar descontinuidade, afetando a execução dos produtos e a sustentabilidade dos investimentos.

Impacto Potencial

Descontinuidade de ações estratégicas.

Redefinição de prioridades governamentais.

Redução do apoio político e institucional ao projeto.

Afetaria transversalmente todos os produtos do projeto.

Comprometimento da governança fiscal e da transformação digital

Prevenção e Mitigação:
Será promovido o alinhamento institucional com as lideranças da SEFAZ/PB, reforçando o compromisso com a continuidade do projeto independentemente de alterações na gestão política. A documentação técnica e os registros de decisões estratégicas serão sistematizados e organizados de forma acessível, permitindo que o novo corpo diretivo tenha pleno conhecimento dos objetivos, dos resultados esperados e dos compromissos assumidos com o organismo financiador.

Essas ações serão complementadas pela formalização de compromissos institucionais por meio de decretos, resoluções e pela inclusão do projeto no Plano Plurianual, garantindo sua vinculação às políticas de Estado. A capacitação da UCP e das lideranças técnicas será intensificada para assegurar a continuidade operacional, enquanto mecanismos de transição e documentação dos processos críticos serão estabelecidos, promovendo estabilidade, governabilidade e execução regular dos componentes e produtos, mesmo diante de cenários de instabilidade política.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Resistência às mudanças
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
A implementação de ações de transformação digital, reforma tributária e modernização da gestão pública pode enfrentar resistência interna (servidores, gestores) e externa (contribuintes, sociedade civil). A resistência pode se manifestar por meio de baixa adesão, críticas públicas, dificuldades de adaptação e conflitos institucionais.

Impacto Potencial

Redução da efetividade das ações de mudança.

Atrasos na implementação de produtos.

Desmotivação das equipes técnicas.

Reações negativas da sociedade e dos contribuintes.

Pode-se destacar os produtos que seriam mais afetados como: P1.1, P1.2, P1.4, P1.7, P2.2, P2.4, P3.1, P3.6 e P4.2

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de resistência às mudanças durante a execução do Projeto PROFISCO III PB, a SEFAZ/PB adotará uma estratégia de comunicação clara, contínua e orientada à transparência, com foco no engajamento do corpo funcional e na construção de um ambiente institucional receptivo às transformações propostas. Serão promovidas campanhas informativas, capacitações e espaços de diálogo sobre os impactos da Reforma Tributária, da transformação digital e das inovações previstas, criando oportunidades para escuta ativa e esclarecimento de dúvidas.

A participação dos servidores será incentivada desde as fases iniciais do projeto, fortalecendo o sentimento de pertencimento e reduzindo inseguranças frente às mudanças. Para isso, serão implementadas ações de valorização de boas práticas e criado um comitê de acompanhamento da mudança, responsável por monitorar o clima organizacional e propor ajustes táticos sempre que necessário. A capacitação técnica dos servidores (P1.3) incluirá temas como gestão da mudança, uso de dados e inovação, preparando-os para os novos desafios institucionais.

Além do público interno, serão realizadas ações de sensibilização junto aos contribuintes e à sociedade civil, destacando os benefícios da reforma tributária e da digitalização dos serviços. O envolvimento dos stakeholders será promovido desde o planejamento, por meio de fóruns, oficinas e consultas públicas, garantindo que as decisões reflitam as expectativas da sociedade e ampliem a legitimidade do projeto. Essas medidas integradas visam assegurar maior adesão às mudanças, promover uma cultura de inovação e consolidar uma gestão pública mais eficiente, participativa e moderna.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Sustentabilidade dos investimentos
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A sustentabilidade dos investimentos realizados no âmbito do projeto, especialmente em relação à manutenção de sistemas, infraestrutura tecnológica e capacitação continuada, representa um risco relevante. A ausência de recursos para custeio e atualização pode comprometer a perenidade dos resultados alcançados.

Impacto Potencial

Obsolescência de sistemas e equipamentos.

Descontinuidade de serviços digitais.

Redução da capacidade institucional da SEFAZ-PB.

Dentre os produtos mais afetados pode-se citar: P1.4, P1.7, P2.7.

Perda de eficiência fiscal e arrecadatória

Prevenção e Mitigação:
A SEFAZ/PB tem assegurado, por meio dos instrumentos legais de planejamento, a previsão e disponibilização de recursos voltados à manutenção e à modernização da Administração Fazendária. Essa prática será reforçada ao longo da execução do Projeto PROFISCO III PB, com a inclusão sistemática dos recursos necessários no orçamento anual da Secretaria, conforme estabelecido na Lei Orçamentária Anual, garantindo regularidade e previsibilidade financeira para cada exercício.

Desde 2007, a SEFAZ/PB conta com o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Administração Tributária - FADAT, instituído pela Lei nº 8.445/2007, que tem, entre suas finalidades, custear programas de modernização institucional e de investimento no aperfeiçoamento da Administração Tributária. Os recursos do FADAT, também previstos na Lei Orçamentária Anual, serão utilizados como fonte de financiamento recorrente para assegurar a continuidade dos investimentos estratégicos iniciados pelo projeto.

Além da garantia orçamentária, os sistemas e processos modernizados serão incorporados ao planejamento estratégico da SEFAZ/PB, assegurando sua institucionalização e alinhamento às diretrizes de longo prazo. Para sustentar essa evolução, serão firmados contratos de suporte técnico e atualização tecnológica, assegurando a manutenção dos ativos e a adaptação às novas demandas. Complementarmente, será promovida a capacitação continuada das equipes técnicas, fortalecendo as competências institucionais e garantindo a sustentabilidade dos resultados alcançados.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Contrapartida
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Este risco está diretamente ligado à execução financeira do projeto. A ausência ou insuficiência de recursos de contrapartida estadual pode comprometer a liberação dos recursos do BID e a implementação dos produtos.

Impacto Potencial

Atrasos na execução financeira.

Redução do escopo das ações.

Comprometimento da conformidade com o BID.

Todos os produtos dos componentes I.GF, II.AT, III.AF e IV. CJ seriam afetados, especialmente os que envolvem aquisição de bens e serviços.

Risco de suspensão da operação

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atrasos nas aquisições e contratações decorrentes de dificuldades no aporte da contrapartida estadual, o Governo de Paraíba adotará medidas rigorosas de controle financeiro e orçamentário, assegurando o equilíbrio fiscal necessário à plena execução do Projeto PROFISCO III PB. As ações previstas serão incorporadas ao Plano Plurianual (PPA) e contempladas na Lei Orçamentária Anual, garantindo previsibilidade, disponibilidade e alocação adequada dos recursos ao longo do ciclo de execução.

Como instrumento estratégico para viabilizar a contrapartida local, será reforçado o aporte ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Administração Tributária - FADAT, instituído pela Lei nº 8.445/2007, que permitirá maior flexibilidade na cobertura das despesas vinculadas ao projeto. A Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) realizará o acompanhamento contínuo da execução orçamentária, articulando-se com os setores responsáveis para antecipar ajustes e assegurar que os compromissos financeiros sejam cumpridos sem comprometer o cronograma pactuado com o organismo financiador.

Esse conjunto de medidas será complementado por um planejamento orçamentário com reserva específica de recursos para a contrapartida, pela pactuação entre a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e a

Secretaria de Estado da Fazenda para priorização das alocações, e pelo monitoramento sistemático da execução financeira, promovendo segurança, transparência e regularidade na condução das atividades do projeto.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Monitoramento e Prestação de Contas
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Falhas nos processos de monitoramento, avaliação e prestação de contas podem comprometer a transparência, a conformidade com o BID e a credibilidade institucional da SEFAZ-PB.

Impacto Potencial

Risco de glosas e suspensão de desembolsos.

Comprometimento da imagem institucional.

Dificuldades na gestão de indicadores e metas.

Todos os produtos seriam afetados.

Redução da capacidade de tomada de decisão baseada em evidências.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atrasos decorrentes de falhas no planejamento e monitoramento do Projeto PROFISCO III PB, a SEFAZ/PB adotará um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da capacidade de gestão da equipe técnica. A primeira medida será a capacitação da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) em gestão de projetos, com ênfase na utilização eficiente do Módulo Projeto — ferramenta digital que permitirá o acompanhamento detalhado da execução orçamentária e financeira. Essa plataforma será responsável pela geração dos relatórios de prestação de contas e das solicitações de desembolso ao organismo financiador, assegurando maior controle, transparência e conformidade.

Complementarmente, será desenvolvida uma planilha estruturada ou contratada uma solução tecnológica de mercado para apoiar o monitoramento contínuo das ações, metas e indicadores do projeto. A equipe contará ainda com suporte técnico especializado para a elaboração dos relatórios e prestação de contas, garantindo qualidade e precisão nas informações.

Por fim, serão estabelecidas rotinas de monitoramento e avaliação com periodicidade definida, promovendo uma cultura de acompanhamento sistemático e correção preventiva de falhas. Essas medidas integradas visam reduzir riscos operacionais, assegurar o cumprimento dos prazos pactuados e consolidar uma gestão eficiente e orientada por resultados.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Impactos ambientais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Embora o projeto não envolva obras civis ou intervenções físicas de grande porte, algumas ações previstas podem gerar impactos ambientais indiretos como o P1.4 (infraestrutura de TI). O risco é relevante apenas para esses produtos. Pode-se citar ações necessárias como: o descarte de equipamentos de Tecnologia da Informação (TI), o consumo energético das novas infraestruturas digitais e a necessidade de adequação às normas ambientais vigentes. A adoção de práticas sustentáveis é essencial para garantir que os investimentos em modernização tecnológica e infraestrutura não resultem em passivos ambientais ou em descumprimento de legislações.

Impacto Potencial

Geração de resíduos eletrônicos sem destinação adequada.

Aumento do consumo energético nas unidades fazendárias.

Risco de não conformidade com normas ambientais.

Comprometimento da imagem institucional em relação à sustentabilidade.

Prevenção e Mitigação:
A adoção de medidas ambientais no âmbito do Projeto PROFISCO III PB tem como propósito minimizar os impactos das atividades da SEFAZ/PB sobre o meio ambiente, os servidores e a população em geral. Ao incorporar práticas de gestão ambiental sustentável, a Secretaria reforça seu compromisso com a responsabilidade socioambiental, fortalecendo sua imagem institucional como um órgão público que atua de forma consciente e comprometida com a preservação dos recursos naturais.

Entre as ações previstas, destaca-se a aquisição de equipamentos com certificação ambiental e baixo consumo energético (P1.4), promovendo maior eficiência no uso de recursos. Também deverá ser estabelecida uma política de descarte e reciclagem de equipamentos obsoletos, com base em contratos com empresas especializadas, assegurando a destinação ambientalmente adequada dos resíduos tecnológicos.

Além disso, os servidores deverão ser capacitados em práticas sustentáveis e gestão ambiental, fortalecendo a cultura organizacional voltada à sustentabilidade. Por fim, os indicadores de consumo e descarte serão monitorados de forma contínua e integrados aos painéis de gestão do projeto, permitindo o acompanhamento dos resultados e a tomada de decisões baseadas em evidências. Essas iniciativas consolidam uma abordagem ambientalmente responsável e alinhada aos princípios de eficiência, transparência e inovação na administração pública.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Impacto Social
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A percepção da sociedade sobre o projeto pode influenciar diretamente sua aceitação, legitimidade e efetividade, especialmente considerando o objetivo complementar 2.6 (transparência fiscal e controle social). A ausência de mecanismos de comunicação, participação cidadã e inclusão social pode gerar distanciamento entre o Fisco e os contribuintes. O risco social também envolve a possibilidade de não se alcançar os objetivos de equidade e inclusão previstos nos produtos P1.3 e P1.6.

Impacto Potencial

Baixa adesão às ações de Educação Fiscal.

Dificuldade de engajamento de grupos sociais prioritários.

Reações negativas à modernização tributária e digital.

Redução da legitimidade institucional da SEFAZ-PB.

Prevenção e Mitigação:
Para fortalecer a inclusão social e a transparência fiscal, o projeto prevê a implementação de ações de Educação Fiscal para fortalecer a implantação da RTC. O Portal da Transparência será atualizado com uma estrutura de Business Intelligence e canais de escuta ativa, permitindo maior interação com a sociedade e acesso facilitado às informações públicas (P1.6). A criação de fóruns de debate e repositórios digitais acessíveis à população ampliará o diálogo entre governo e sociedade. Por fim, deverá ser realizado o monitoramento contínuo de indicadores sociais e de inclusão, com avaliações periódicas dos impactos gerados, assegurando que as ações promovam efetivamente a justiça fiscal e a democratização da gestão pública.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Atraso na transição do ICMS para o IBS na Reforma Tributária
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A transição do ICMS para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), prevista para ocorrer até 2032, envolve etapas complexas de regulamentação, integração de sistemas e adaptação institucional. A eventual demora na definição de normas federativas, na operacionalização do Comitê Gestor do IBS ou na disponibilização de sistemas nacionais pode comprometer as entregas vinculados à Reforma Tributária (RTC), especialmente os previstos no produto P2.7 (Harmonização da AT com a RTC), P2.5 (Contencioso Fiscal Modernizado) e P2.2 (Gestão Cadastral e Obrigações Acessórias Aperfeiçoadas)

Impacto Potencial

Atrasos na integração da SEFAZ-PB ao ambiente nacional do IBS.

Dificuldade na adaptação dos sistemas e processos tributários.

Risco de obsolescência de soluções desenvolvidas localmente.

Redução da efetividade das ações de simplificação fiscal e justiça tributária

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atrasos na transição do ICMS para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a SEFAZ/PB adotará uma estratégia integrada que combina atuação institucional proativa, modernização tecnológica e capacitação técnica. A primeira medida consiste na intensificação da participação da Secretaria nos principais fóruns nacionais de regulamentação e harmonização da Reforma Tributária, como CONSEFAZ, CONFAZ, COGEF, ENCAT e GEFIN. Essa presença ativa permitirá acompanhar de forma tempestiva os avanços normativos e operacionais, assegurando o alinhamento do Estado com os marcos legais e com as diretrizes do Comitê Gestor do IBS.

Paralelamente, será promovida a mobilização de diferentes áreas técnicas da SEFAZ/PB, com a designação de servidores especializados para acompanhar os desdobramentos da reforma e contribuir com a construção de soluções compartilhadas entre os entes federativos. Essa abordagem colaborativa visa fortalecer a interoperabilidade dos sistemas e garantir uma transição coordenada e segura.

No campo tecnológico, serão realizados investimentos estratégicos no desenvolvimento e implantação de sistemas compatíveis com os padrões federativos, com destaque para o produto P2.7. Essas soluções serão desenhadas para permitir integração plena com os sistemas nacionais, reduzindo riscos de descontinuidade e assegurando a fluidez das operações fiscais no novo ambiente tributário.

Além disso, será estabelecido um cronograma interno de transição, com marcos de adaptação gradual que permitam à SEFAZ/PB ajustar seus processos, capacitar suas equipes e testar as novas funcionalidades de forma progressiva. A capacitação técnica dos servidores será intensificada, com foco em temas como IBS, cooperação federativa e gestão de mudanças, preparando a força de trabalho para os desafios da nova estrutura tributária.

Por fim, será implementado um sistema de monitoramento contínuo das decisões do Comitê Gestor, garantindo que as ações do projeto estejam permanentemente alinhadas às diretrizes nacionais e que eventuais ajustes possam ser realizados de forma ágil e coordenada. Essa combinação de medidas visa assegurar uma transição eficiente, transparente e confiável, preservando a estabilidade fiscal e a confiança da sociedade e do setor produtivo.

Considerações finais sobre item IV – RISCOS

O projeto não prevê desapropriações, reassentamentos populacionais ou intervenções em imóveis que justifiquem a inclusão desse possível risco. Todas as ações serão realizadas em instalações já existentes ou em ambientes digitais, sem impacto físico direto sobre comunidades ou propriedades privadas.

Um possível risco sobre catástrofes ambientais e saúde pública não apresenta relação direta com os produtos propostos no Profisco III PB, pois este não envolve obras civis, intervenções físicas ou ações que possam gerar impactos significativos em saúde pública ou em ecossistemas naturais.

4. 11. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	54.500.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	5.500.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	300	360

Juros aplicáveis:
5,50% a.a. composta de: taxa SOFR diária: 4,29% a.a. + spread de 1,21% (margem de captação + margem de empréstimo)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,50% a.a
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Não Aplicável

Outras Informações:

Não Aplicável

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
895.977,00	99.553,00	4.031.897,00	447.989,00	5.823.851,00	647.095,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.943.822,00	771.536,00	4.703.879,00	522.651,00		

Nome do componente					
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
821.518,00	0,00	3.696.830,00	0,00	5.339.867,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.366.765,00	0,00	4.312.970,00	0,00		

Nome do componente					
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
268.555,00	120.447,00	1.208.498,00	542.012,00	1.745.608,00	782.906,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.081.299,00	933.464,00	1.409.914,00	632.347,00		

Nome do componente					
GESTÃO JURÍDICA PARA A SUSTENTABILIDADE FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
163.950,00	0,00	737.775,00	0,00	1.065.675,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.270.613,00	0,00	860.737,00	0,00		

Nome do componente					
GESTÃO DO PROJETO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
30.000,00	0,00	135.000,00	0,00	195.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
232.500,00	0,00	157.500,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Anexo 21 O-CSC-CBR-8-2026 - Manifestação de Interesse - BID

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A seguir, apresentam-se as principais ações já executadas no âmbito do PROFISCO II PB que constituem a base institucional, tecnológica e metodológica necessária para a implementação do PROFISCO III PB. Essas iniciativas consolidaram capacidades essenciais, modernizaram processos e fortaleceram a governança fiscal, permitindo que o novo ciclo avance para soluções mais integradas, inteligentes e alinhadas à Reforma Tributária.

1. Estruturação Institucional e Governança

Implantação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão por Resultados (SIPGR), base para o aprimoramento do planejamento no PROFISCO III.

Desenvolvimento de metodologias de gestão de riscos fiscais, auditoria interna e integridade governamental.

Criação de metodologias de monitoramento de metas e indicadores do PPA/LOA.

Estruturação de uma Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) experiente, capacitada e plenamente familiarizada com normas BID e modelos de execução.

Estabelecimento de parcerias interinstitucionais com CGE, PGE, SEAD e SEPLAG, fortalecendo a governança integrada para o PROFISCO III.

2. Modernização da Administração Tributária

Implantação de sistemas de fiscalização eletrônica massiva, malhas fiscais e integração ao Portal Único de Comércio Exterior.

Desenvolvimento de metodologias de cálculo do hiato tributário e tabelas de preços de referência.

Implantação de sistemas de cadastro, IPM e controle do Simples Nacional, base para a visão 360° do contribuinte no PROFISCO III.

Implantação do e-Processo administrativo e judicial, integrando SEFAZ e PGE.

Modernização do atendimento ao contribuinte, com portal de serviços, fluxos padronizados e centrais presenciais.

3. Infraestrutura Tecnológica e Segurança da Informação

Implantação do datacenter corporativo, com soluções de backup e segurança cibernética.

Renovação do parque tecnológico com desktops, notebooks, servidores e ferramentas de auditoria.

Contratação de fábrica de software para desenvolvimento de sistemas corporativos e tributários.

Atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), que será novamente revisado no PROFISCO III.

4. Gestão Financeira, Contábil e de Custos

Automação do fluxo de caixa do Tesouro, com sistemas de controle de desembolsos e consolidação diária.

Avanço na convergência contábil, saneamento patrimonial e implantação de metodologias de custos.

Implantação de sistemas de supervisão das empresas estatais e de controle da dívida pública.

Reforma e modernização da infraestrutura física da gestão fiscal, incluindo a nova sede integrada.

5. Capacitação, Cooperação Técnica e Desenvolvimento de Pessoas

Promoção de treinamentos em legislação tributária, atendimento ao público, sistemas internos, auditoria, gestão de pessoas e rotinas administrativas, fortalecendo a capacidade técnica das equipes.

Participação ativa em grupos técnicos nacionais (ENCAT, COGEF, GEFIN, GDFAZ), permitindo troca de experiências, alinhamento às melhores práticas e acompanhamento da Reforma Tributária.

Implantação de programas de gestão por competências, inovação e formação continuada.

Essas ações estruturantes consolidaram bases sólidas para que o PROFISCO III PB avance para um novo patamar de modernização, com foco em integração sistêmica, inteligência de dados, automação avançada, sustentabilidade fiscal e alinhamento pleno à Reforma Tributária. O Estado chega ao novo ciclo com infraestrutura, metodologias, equipes e governança já maduras — condição essencial para acelerar a transformação fiscal pretendida.

6. 2. **Anexos**

Anexo 04 – Correlação e Sinergias entre o Profisco III PB com o Profisco II PB

Anexo 04 B – Correlação e Sinergias entre o Profisco III PB com o Profisco II PB (Em substituição ao Anexo 04 do pleito original)

7. **Baixar todos os anexos**

Download
