PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Revitalização e Obras de Cascavel

Proponente: Município de Cascavel
Processo SEI: 03101.000086/2026-78
Código do pleito: 6423305042/2026

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 57.927.200,00 **Valor da Contrapartida:** USD 14.481.800,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 05
1. 2. 4. Resultados 07
1. 3. Objetivo 08
1. 4. Indicadores 10
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 10
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 11
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 12
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 12
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 13
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 13
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 14
1. 5. Componentes 15
1. 5. 1. Informações do 1° componente 15
1. 5. 2. Informações do 2° componente 19
1. 5. 3. Informações do 3° componente 24
1. 6. Beneficiários 26
1. 7. Anexos 26
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 27
2. 1. Áreas estratégicas 27
2. 2. Anexos 30
3. GESTÃO 31
3. 1. Arranjo institucional 31
3. 1. 1. Descrição 31
3. 1. 2. Orgãos Executores 33
3. 1. 3. Estrutura Operacional 33
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 34
3. 2. Operacionalização e Manutenção 34
3. 3. Planejamento Estratégico 35
3. 4. Anexos 36
4. RISCOS 37
4. 1. Informações do 1° risco 37
4. 2. Informações do 2° risco 37
4. 3. Informações do 3° risco 37
4. 4. Anexos 38
5. FINANCIAMENTO 39
5. 1. Condições Financeiras da Operação 39
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 39
5. 2. Cronograma de Desembolso 40
5. 3. Contragarantias 41
5. 4. Anexos 41
6. ETAPAS REALIZADAS 42
6. 1. Etapas realizadas 42
6. 2. Anexos 42

7. CONTATOS . . . . . .
7. 1. Contatos . . . . . .
7. 2. Anexos . . . . . .
8. Baixar todos os anexos 44
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Revitalização e Obras de Cascavel
Sigla: PRO Cascavel
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Cascavel

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Contexto geral:

O Município de Cascavel está situado na região oeste do Paraná, sendo um núcleo regional de atratividade por sua importante posição geográfica e é um dos principais municípios do Estado, com um PIB per capita de R$46.976,49 conforme dados referentes ao ano de 2021 do IBGE.

A localização estratégica da cidade de Cascavel permite que a mesma seja entrada para os países vizinhos do Mercosul, proporcionando acesso aos maiores centros consumidores do país, já que nela se situa um dos mais importantes entroncamentos rodoviários do Brasil. As rodovias que se conectam à cidade são as rodovias federais BR 277, BR 369 e BR 467 e as rodovias estaduais PR 163 e PR 180. Além disso possui aeroporto regional com voos regulares que chegam aos maiores aeroportos do país e terminal ferroviário que tem ligação ao Porto de Paranaguá.

Cascavel possui 2.091,199 km² de território municipal, com população total, conforme dados do Censo de 2022 do IBGE, de 348.051 habitantes, apresentando uma densidade demográfica de 166,44 hab/km². A estimativa para o ano de 2025 é de 368.195 habitantes.

Contexto Social e Econômico:

O Município de Cascavel destaca-se como um dos principais polos regionais do Oeste do Paraná, exercendo forte influência econômica, educacional e de serviços sobre os municípios do entorno. Com uma população urbana majoritária, Cascavel apresenta dinâmica socioeconômica marcada pelo crescimento contínuo, impulsionado principalmente pelos setores do agronegócio, comércio, serviços, logística e indústria de transformação, consolidando-se como um centro estratégico de desenvolvimento regional.

A base econômica local é fortemente associada à cadeia do agronegócio, com destaque para a produção agroindustrial, cooperativismo e atividades correlatas, que geram emprego, renda e atração de investimentos. Paralelamente, o município possui um setor terciário diversificado, com oferta relevante de serviços de saúde, educação superior, comércio especializado e tecnologia, contribuindo para a ampliação das oportunidades econômicas e para a fixação da população no território urbano.

Do ponto de vista social, Cascavel apresenta desafios típicos de cidades médias em expansão, como a necessidade de redução das desigualdades socioespaciais, ampliação do acesso à infraestrutura urbana, mobilidade, áreas verdes e equipamentos públicos. O crescimento populacional e a expansão urbana demandam políticas públicas integradas que promovam inclusão social, qualidade de vida e equilíbrio entre desenvolvimento econômico e bem-estar da população.

Contexto Ambiental e Urbano:

O território urbano de Cascavel caracteriza-se por um processo contínuo de expansão, que exige planejamento criterioso para garantir a ocupação ordenada do solo e a preservação dos recursos naturais. A cidade está inserida em uma região com significativa rede hidrográfica, o que torna a gestão da drenagem urbana, das áreas de preservação permanente e do manejo das águas pluviais um aspecto central do planejamento urbano e ambiental.

A estrutura urbana do município apresenta contrastes entre áreas consolidadas e setores em expansão, demandando investimentos constantes em infraestrutura viária, sistemas de drenagem, parques urbanos e espaços públicos de convivência. A qualificação do espaço urbano, aliada à ampliação das áreas verdes e à valorização das funções ambientais da cidade, é fundamental para enfrentar os efeitos da impermeabilização do solo, das ilhas de calor e dos eventos climáticos extremos.

Nesse contexto, torna-se essencial a adoção de soluções integradas que articulem infraestrutura urbana e ambiental, promovendo a sustentabilidade do crescimento urbano. A implementação de sistemas de drenagem eficientes, corredores verdes, parques lineares e vias estruturantes contribui para a resiliência urbana, para a melhoria da paisagem e para a elevação da qualidade ambiental e urbanística de Cascavel.

Contexto Político-Institucional e Tecnológico:

Cascavel possui uma estrutura político-institucional consolidada, com órgãos técnicos e conselhos municipais atuantes nas áreas de planejamento urbano, desenvolvimento territorial, meio ambiente e habitação. A atuação integrada entre o Poder Público, conselhos participativos e demais instituições fortalece os processos decisórios e amplia a transparência e a legitimidade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano.

O município vem avançando na modernização da gestão pública, com a adoção de instrumentos de planejamento, regulamentação urbanística e gestão territorial alinhados às diretrizes federais e estaduais. A articulação entre planos, programas e políticas setoriais constitui um elemento fundamental para garantir coerência nas ações públicas e eficiência na aplicação dos recursos, especialmente em projetos estruturantes de infraestrutura urbana.

No campo tecnológico, observa-se a ampliação do uso de ferramentas digitais, sistemas de informação geográfica, bases de dados integradas e soluções tecnológicas aplicadas ao planejamento urbano e à gestão municipal. Esses avanços possibilitam maior precisão no diagnóstico territorial, no monitoramento das ações e na tomada de decisões, contribuindo para uma gestão urbana mais eficiente, inovadora e orientada por dados.

1. 2. 2. **Problema:**

Cascavel, apesar da sua localização estratégica no Oeste do Paraná, onde se situa um dos mais importantes entroncamentos rodoviários do Brasil, também enfrenta diversos desafios que são resultado da expansão do Perímetro Urbano e do crescimento populacional, o que acaba sobrecarregando os serviços públicos, a infraestrutura urbana, o sistema viário, causando impactos ambientais e influenciando na qualidade de vida de sua população.

Problema 1: Ausência de espaços públicos qualificados para atividades de lazer

Cascavel possui diversos espaços públicos destinados ao lazer, porém muitos deles encontram-se subutilizados e carecem de requalificação para que possam atender plenamente às necessidades da população. Além disso, há áreas verdes com grande potencial para se transformarem em locais de convivência, contemplação e lazer coletivo.

A ausência de espaços públicos qualificados para atividades de lazer impacta diretamente a vida do cidadão, limitando as oportunidades de convivência social, descanso e prática de atividades recreativas. Sem locais adequados, a população tende a se isolar mais, reduzindo o contato comunitário e o fortalecimento dos vínculos sociais, que são fundamentais para o bem-estar coletivo.

Essa carência também afeta a saúde física e mental, uma vez que dificulta a prática de atividades ao ar livre, o lazer acessível e momentos de descontração no cotidiano. Do ponto de vista social, a falta desses espaços contribui para o aumento das desigualdades, já que o lazer passa a depender de alternativas privadas, nem sempre acessíveis a todos, comprometendo a qualidade de vida e o direito à cidade.

No contexto da segurança da mulher, essa ausência torna-se ainda mais crítica. Espaços mal planejados, abandonados ou pouco utilizados tendem a apresentar baixa iluminação, pouca circulação de pessoas e falta de manutenção, fatores que aumentam a sensação de insegurança e o risco de violência. Como consequência, muitas mulheres deixam de utilizar determinados locais ou restringem seus horários e trajetos, o que compromete o direito ao lazer, à mobilidade e à ocupação plena do espaço urbano. A qualificação dos espaços públicos, portanto, é fundamental para promover cidades mais inclusivas, seguras e igualitárias.

Causas:

- Falta de investimentos em espaços públicos de lazer;
- Expansão urbana não considerou a integração de áreas verdes e meios de transporte alternativos;
- Subaproveitamento das áreas verdes existentes;
- Falta de espaços para convivência social;
- Falta de segurança nos espaços públicos.

Consequências:

- Limitação de espaços públicos voltados a atividades de lazer;
- Barreiras urbanísticas que dificultam o acesso e a participação plena de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
- Exclusão de parte da população que não tem acesso a outros locais de lazer devido a desigualdade social;
- Limitação na qualidade de vida, bem-estar físico e mental dos cidadãos;

- Baixa adesão da população aos espaços públicos.

Problema 2: Existência de pontos de alagamento nas vias urbanas

Com o aumento da urbanização, da impermeabilização dos lotes urbanos, retirada da arborização urbana sem o replantio, aumento das chuvas, foram identificados pontos de alagamento onde as galerias pluviais se encontram subdimensionadas, não dando vazão para o volume de chuva recebido.

O alagamento impacta de forma significativa a vida das pessoas, afetando não apenas o espaço físico, mas também o bem-estar social, econômico e emocional da população. Quando ocorrem alagamentos, a mobilidade urbana é prejudicada, dificultando o acesso ao trabalho, à escola e aos serviços essenciais. Muitas famílias têm suas casas invadidas pela água, resultando em perdas materiais, danos à infraestrutura e insegurança quanto às condições de moradia.

Além disso, os alagamentos aumentam os riscos à saúde pública, favorecendo a proliferação de doenças e expondo a população a ambientes insalubres. Socialmente, esse problema aprofunda desigualdades, pois atinge de forma mais intensa comunidades vulneráveis, que muitas vezes vivem em áreas com infraestrutura precária. O impacto emocional também é relevante, gerando estresse, medo e sensação de abandono, o que compromete a qualidade de vida e o convívio social.


Causas:

- Urbanização acelerada sem infraestrutura de drenagem proporcional;
- Aumento da impermeabilização dos lotes urbanos;
- Rede de drenagem sobrecarregada.

Consequências:

- Aumento do risco de inundações severas em períodos de chuvas intensas;
- Exposição da população a condições vulneráveis, insalubres e prejudiciais à saúde pública;
- Prejuízo à qualidade ambiental da cidade.

As figuras a seguir demonstram os pontos de alagamento nas ruas Salgado Filho, Vitória e Wenceslau Braz.

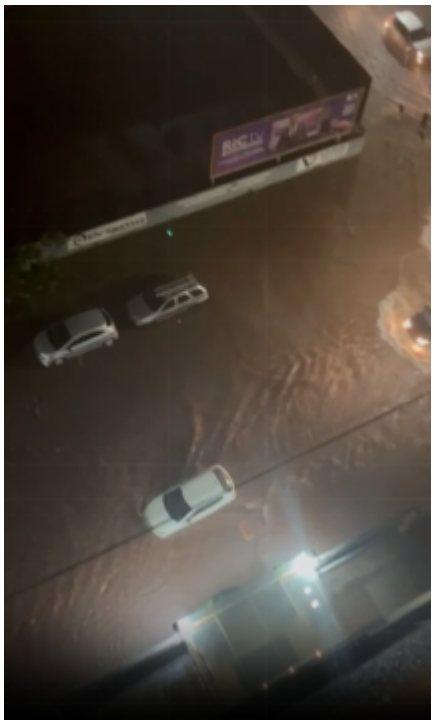

Alagamento Rua Salgado Filho - 24/10/24



Alagamento Rua Salgado Filho - 01/12/25



Alagamento Rua Vitória - 06/01/2018



Alagamento Rua Wenceslau Braz - 25/02/2025

Problema 3: Alto custo energético e necessidade de transição para fontes limpas e renováveis na infraestrutura municipal.

O Município ainda possui baixa capacidade de geração própria de energia para seu autoconsumo, dependendo quase que exclusivamente da energia fornecida pela concessionária de energia, sem critério plausível de aferição que diga quais as fontes primárias dessa energia e o modo de geração. O Município de Cascavel como entidade pública possui mais de 605 unidades consumidoras hoje ligadas em sua titularidade, em edificações e espaços públicos que atendem os diversos serviços para a população. Os valores despendidos no ano de 2025 com energia elétrica foram de R$ 11.262.491,17, sendo uma média de R$ 938.540,93 por mês.

Hoje o município já possui algumas usinas próprias, que geram energia renovável e injetam na rede da concessionária, gerando créditos para serem deduzidos nas faturas de energia em unidades da mesma titularidade. As usina existentes são: Usina Fotovoltaica do Aterro Municipal com capacidade instalada de 2.500 kWp, Usina a Biogás Aterro Municipal 300 kWp, Usina Fotovoltaica na CEAVEL 25 kWp, e pequenas centrais em 10 escolas da rede municipal com 341,55 kWp, totalizando hoje 3.166,55 kWp de potência instalada no total. O total de Unidades consumidoras municipais beneficiadas pela energia renovável gerada é de 202, com o valor economizado no mês de novembro de 2025 de R$ 311.362,04. (ANEXO 17)

Com o crescimento da cidade e aumento populacional torna-se necessária a ampliação da oferta de serviços públicos que por consequência aumenta a demanda energética municipal. Há uma tendência também a curto prazo, da gradual substituição dos veículos do transporte público e da frota municipal por modelos elétricos, promovendo a descarbonização dos transportes.

Com a atual conjuntura mundial no quesito do aquecimento global e das mudanças climáticas, melhorar a eficiência energética e buscar formas alternativas de geração e fornecimento de energia se fazem cruciais para reduzir os impactos humanos ao meio ambiente.

Causas:

- Alta demanda energética;
- Alto custo despendido com energia elétrica;
- Dependência do fornecimento pela concessionária.

Consequências:

- Dependência energética de outras fontes de energia;
- Impacto negativo para o meio ambiente;
- Locação de recursos públicos livres para pagamento de altos custos de energia.

Problema 4: Baixa conectividade viária e fluxo de tráfego insuficiente

O acelerado crescimento de Cascavel nos últimos anos impôs uma carga severa sobre a malha viária municipal, superando a capacidade de suporte das estruturas existentes. Esse dinamismo urbano, resultou em gargalos críticos no trânsito e na consolidação de vias com fluxo inadequado para a demanda atual.

Um dos principais agravantes dessa situação é a falta de integração em pontos estratégicos da cidade, causada pela presença de demasiadas barreiras físicas, notadamente as rodovias que circundam ou cortam o perímetro urbano, como a BR-467, BR-277, e a hidrografia em áreas de preservação permanente. Essas barreiras promovem o isolamento de regiões e geram uma descontinuidade do traçado urbano, tornando as transposições insuficientes ou inexistentes.

A mobilidade urbana está diretamente relacionada à qualidade de vida da população, especialmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Para esses grupos, o acesso eficiente e seguro ao transporte e à infraestrutura viária é fundamental para garantir direitos básicos, como o deslocamento ao trabalho, à escola, aos serviços de saúde e aos equipamentos públicos da cidade.

Quando a mobilidade urbana é precária, os impactos recaem de forma mais intensa sobre as populações vulneráveis, que muitas vezes dependem exclusivamente do transporte público ou de deslocamentos a pé e por bicicleta. Longos tempos de viagem, falta de acessibilidade, calçadas inadequadas e transporte insuficiente reforçam desigualdades sociais, dificultando o acesso a oportunidades e ampliando a exclusão urbana.

Por outro lado, políticas de mobilidade que priorizam o transporte coletivo, a acessibilidade universal e os modos ativos de deslocamento contribuem para uma cidade mais justa e inclusiva. Ao promover deslocamentos mais seguros, acessíveis e eficientes, a mobilidade urbana torna-se uma ferramenta de redução das desigualdades, fortalecendo a integração social e garantindo que todos os cidadãos possam usufruir plenamente do espaço urbano.

A qualificação da malha viária também resulta em maior segurança no trânsito, reduzindo a ocorrência de acidentes e oferecendo melhores condições de circulação para pedestres, ciclistas e motoristas. Do ponto de vista social e econômico, a melhoria das vias impulsiona o desenvolvimento local, fortalece o comércio e valoriza os bairros, promovendo a integração entre diferentes áreas da cidade e um convívio urbano mais organizado e acessível.

Causas:

- Falhas no planejamento de vias;
- Intenso crescimento da cidade com baixo ordenamento;
- Falha na identificação e proposição de soluções para Pólos Geradores de Tráfego - PGT.

Consequências:

- Prejuízos na fluidez do transporte público e individual;
- Demasiado tempo de deslocamento com viagens urbanas;
- Custo de vida elevado.

1. 2. 31. **Solução:**

O Programa PRO Cascavel articula um conjunto de intervenções estratégicas e sinérgicas, formuladas para enfrentar de modo incisivo os problemas e as carências diagnosticadas no território. Cada solução foi projetada para mitigar tanto as raízes quanto os efeitos dos obstáculos à mobilidade, à drenagem e ao desenvolvimento sustentável. As soluções planejadas encontram-se pormenorizadas a seguir, guardando estrita correlação com os eixos problemáticos descritos anteriormente.

Requalificação urbana dos espaços públicos de lazer

Para minimizar a falta de espaços públicos qualificados para atividades de lazer, o Componente 1 propõe a implantação de ciclovias nos parques que se conectarão à rede cicloviária futura proposta no Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

A implantação, ampliação e revitalização dos parques e a implantação do Jardim Botânico, transformarão essas áreas em espaços de convivência e bem-estar. Essas ações irão proporcionar novos locais de lazer e esporte,

resultando em uma maior qualidade de vida para a população.

OEs correlacionados:

- **OE 111:** Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- **OE 113:** Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.
- **OE 201:** Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- **OE 202:** Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.
- **OE 214:** Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.
- **OE 107:** Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.

Execução de macrodrenagem urbana

Diante das mudanças climáticas, torna-se primordial a busca por soluções relacionadas à drenagem nas vias urbanas de forma a minimizar os impactos causados pelas chuvas e possíveis enchentes.

Para solucionar os problemas de drenagem nas vias urbanas da cidade, será realizada a execução de macrodrenagens de algumas vias onde foram constatados pontos de alagamento e também a execução de emissários na Avenida Carlos Gomes, importante via da cidade.

OEs correlacionados:

- **OE 111:** Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- **OE 201:** Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- **OE 202:** Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

Transição energética e geração própria sustentável

Para enfrentar a baixa eficiência energética e a dependência de fontes externas poluidoras, o programa implementará o Subcomponente 1.2 - Energias Renováveis. Esta solução foca na autossuficiência energética de equipamentos públicos de alta demanda, atacando diretamente o alto custo operacional e a pegada de carbono do município.

A ação central consiste na instalação de sistemas fotovoltaicos em pontos estratégicos de grande porte, garantindo que o crescimento da oferta de serviços públicos não resulte em um aumento insustentável da despesa corrente.

OEs correlacionados:

- **OE 111:** Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- **OE 201:** Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- **OE 208:** Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

Melhoria do sistema de mobilidade urbana

O programa implementará um conjunto de intervenções estruturantes no âmbito do Componente 2 – Infraestrutura Urbana (Subcomponente 2.2 – Mobilidade Urbana). As soluções foram concebidas para romper o isolamento provocado pelas barreiras físicas, garantindo a continuidade do traçado urbano e a eficiência do fluxo viário.

Em busca da melhoria da mobilidade de Cascavel, serão implantados por meio do programa, diversas obras que impactarão na mobilidade da cidade, de forma a permitir um deslocamento mais eficaz e seguro para a população, promovendo a conexão com a malha viária existente.

Serão executados binários que proporcionarão maior fluidez para as vias, transposições que irão conectar partes da cidade que não possuíam conectividade, prolongamentos de vias possibilitando melhor acessibilidade a mais locais da cidade, e a revitalização de calçadas que dará maior conforto e segurança para os pedestres.

Além disso, o Plano de Mobilidade contempla a expansão da infraestrutura cicloviária (ANEXO 01). Nesse sentido, o PRO Cascavel tem como objetivo promover a conexão de determinados trechos de ciclovias, por meio da integração

entre áreas de parques e a infraestrutura viária existente.

Seguindo a lógica de que a mobilidade é um direito fundamental, estas intervenções priorizam a redução dos tempos de viagem e a segurança nos deslocamentos, beneficiando especialmente as populações em situação de vulnerabilidade. Ao conectar as periferias aos centros de emprego, saúde e educação, o programa reduz a exclusão urbana e promove a equidade social.

OEs correlacionados:

Melhoria do sistema de mobilidade urbana

O programa implementará um conjunto de intervenções estruturantes no âmbito do Componente 2 – Infraestrutura Urbana (Subcomponente 2.2 – Mobilidade Urbana). As soluções foram concebidas para romper o isolamento provocado pelas barreiras físicas, garantindo a continuidade do traçado urbano e a eficiência do fluxo viário.

Em busca da melhoria da mobilidade de Cascavel, serão implantados por meio do programa, diversas obras que impactarão na mobilidade da cidade, de forma a permitir um deslocamento mais eficaz e seguro para a população, promovendo a conexão com a malha viária existente.

Serão executados binários que proporcionarão maior fluidez para as vias, transposições que irão conectar partes da cidade que não possuíam conectividade, prolongamentos de vias possibilitando melhor acessibilidade a mais locais da cidade, e a revitalização de calçadas que dará maior conforto e segurança para os pedestres.

Além disso, o Plano de Mobilidade contempla a expansão da infraestrutura cicloviária (ANEXO 01). Nesse sentido, o PRO Cascavel tem como objetivo promover a conexão de determinados trechos de ciclovias, por meio da integração entre áreas de parques e a infraestrutura viária existente.

Seguindo a lógica de que a mobilidade é um direito fundamental, estas intervenções priorizam a redução dos tempos de viagem e a segurança nos deslocamentos, beneficiando especialmente as populações em situação de vulnerabilidade. Ao conectar as periferias aos centros de emprego, saúde e educação, o programa reduz a exclusão urbana e promove a equidade social.

OEs correlacionados:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades
- OE 205: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios.
- **OE 111:** Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;
- **OE 214:** Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades;
- **OE 205:** Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios.

1. 2. 50. **Resultado:**

Requalificação urbana dos espaços públicos de lazer:

- Ampliação das oportunidades de lazer, prática de esportes e convívio social em áreas verdes públicas revitalizadas, seguras e de fácil acesso, promovendo hábitos de vida saudáveis e contribuindo para o bem-estar físico e mental da população.
- Promoção da saúde e bem-estar com a criação de novos espaços para atividades físicas e contato direto com a natureza, incentivando hábitos de vida mais saudáveis.

- Desenvolvimento da mobilidade ativa e sustentável por meio da expansão da rede cicloviária e das pistas de caminhada, oferecendo alternativas sustentáveis de transporte.
- Valorização ambiental e conforto térmico por meio do aumento na taxa de áreas verdes por habitante, melhorando a qualidade do ar e proporcionando maior conforto térmico para os cidadãos.
- Promoção de acessibilidade universal por meio da criação de caminhos seguros, garantindo que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam usufruir plenamente de todos os novos espaços e equipamentos de lazer.
- Resiliência e desenvolvimento socioeconômico, pois os parques urbanos são concebidos para atuar de forma multiuso, integrando a preservação ambiental ao desenvolvimento econômico local.

Execução de macrodrenagem urbana

- Redução dos riscos de alagamentos e inundações severas em pontos críticos da malha urbana.
- Aumento da resiliência urbana frente a eventos climáticos extremos, garantindo que a cidade esteja preparada para suportar grandes volumes de chuva sem comprometer a segurança hídrica e mobilidade em vias estratégicas.
- Minimização de danos estruturais na pavimentação e infraestrutura urbana, causados por enxurradas recorrentes, resultando em menor custo de manutenção para o município.
- Fortalecimento da capacidade de resposta a desastres, alinhando o município às diretrizes de adaptação às mudanças climáticas e garantindo um ambiente urbano mais equilibrado e saudável para toda a população.

Transição energética e geração própria sustentável

- Aumento expressivo da capacidade de autogeração de energia limpa e renovável, elevando o percentual de atendimento da demanda municipal com energia para o autoconsumo, reduzindo a dependência da concessionária de energia.
- Mitigação da pegada de carbono do município, através da substituição de fontes da matriz energética.
- Promoção da resiliência da infraestrutura pública, assegurando que a expansão da oferta de serviços à população não resulte em um crescimento descontrolado dos gastos energéticos.
- Modernização tecnológica dos equipamentos, posicionando cascavel como uma cidade alinhada aos conceitos de cidades inteligentes e sustentáveis.
- Garantia de segurança energética local, com sistemas fotovoltaicos que conferem maior estabilidade e previsibilidade orçamentária frente às oscilações das tarifas de energia elétrica.

Melhoria do sistema de mobilidade urbana

- Melhoria da fluidez e eficiência viária com a execução dos binários e prolongamento de vias.
- Ruptura de barreiras físicas e conectividade com as obras de transposição, as quais conectarão partes da cidade que antes se encontravam isoladas, integrando as regiões periféricas à malha viária existente.
- Redução de tempo de deslocamento, beneficiando especialmente a população que residem em áreas mais afastadas.
- Aumento da segurança nos deslocamentos com a reestruturação viária, contribuindo para a redução de acidentes.
- Redução da exclusão urbana ao conectar comunidades vulneráveis a equipamentos comunitários e pólos econômicos

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:

Promover o desenvolvimento urbano sustentável de Cascavel por meio da ampliação da infraestrutura verde, da mobilidade urbana estruturante, da resiliência climática e da eficiência energética dos serviços públicos.

Objetivo Específicos:

01 Requalificar e ampliar áreas verdes urbanas e de preservação ambiental, como espaços públicos de lazer, mobilidade ativa e convivência, fortalecendo a biodiversidade, a arborização urbana e a segurança preventiva.

Componente relacionado:

- Componente 1: Sustentabilidade (Subcomponente Meio Ambiente)

Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 107: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.
- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 112 - Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial.
- OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

02 Ampliar a geração de energia renovável e limpa nos equipamentos públicos municipais, aumentando a eficiência energética e reduzindo custos operacionais e emissões.

Componente relacionado:

- Componente 1: Sustentabilidade (Subcomponente Energias Renováveis)

Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- OE 208: Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

03 Reduzir riscos de alagamentos em eixos viários estratégicos, aumentando a resiliência urbana frente a eventos climáticos extremos.

Componente relacionado:

- Componente 2: Infraestrutura Urbana (Subcomponente Drenagem Urbana)

Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

04 Ampliar a conectividade e a eficiência da mobilidade urbana, integrando regiões da cidade segregadas por barreiras físicas, reduzindo tempos de deslocamento, aumentando a segurança viária e promovendo acesso equitativo aos serviços urbanos.

Componente relacionado:

- Componente 2: Infraestrutura Urbana (Subcomponente Mobilidade Urbana)

Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 205: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios.

Lista de indicadores, conforme ANEXO 22:

- Indicador 1: Percentual de parques urbanos com sistema de videomonitoramento instalado.
- Indicador 2: Percentual de parques urbanos qualificados.
- Indicador 3: Área quadrada de parques no perímetro urbano por habitante.

- Indicador 4: Redução percentual dos gastos anuais com energia elétrica nas edificações e espaços públicos na titularidade do Município.
- Indicador 5: Potência instalada de geração própria de energia renovável.
- Indicador 6: Número de pontos críticos de alagamento com risco reduzido.
- Indicador 7: Percentual da população urbana residente a até 500 metros de ciclovias contínuas e conectadas.
- Indicador 8: Tempo médio de deslocamento viário.

1. 30. **Indicadores**

1. 30. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Percentual de parques urbanos com sistema de videomonitoramento instalado.

Descrição:
Este indicador quantifica a disponibilidade de parques urbanos com sistema de videomonitoramento instalado no perímetro urbano, em relação ao número total de parques, visa monitorar o aumento da disponibilidade de áreas de lazer com monitoramento, contribuindo para a segurança no local e o bem-estar da população.

Fórmula de cálculo: (x/y)*100

x = Quantidade de parques no perímetro urbano com sistema de videomonitoramento no Ano “X”

y = Quantidade total de parques no perímetro urbano no Ano “X”

Referência e coerência com o OBJETIVO ESPECÍFICO:

01 Requalificar e ampliar áreas verdes urbanas e de preservação ambiental, como espaços públicos de lazer, mobilidade ativa e convivência, fortalecendo a biodiversidade, a arborização urbana e a segurança preventiva.

Objetivos Estratégicos do PPA pertinentes:

- OE 107: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.
- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 112: Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial.

Dados a serem coletados: Quantitativo de parques urbanos existentes e quantitativo de parques urbanos com monitoramento.

Meta:
Valor da meta: 50%

Unidade de medida da meta: Porcentagem (%)

Ano de referência para atingimento da meta: 2033

Linha de Base: 0%

Ano da linha de Base: 2025

1. 30. 5. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Percentual de parques urbanos qualificados.

Descrição:
Este indicador quantifica a disponibilidade de parques urbanos qualificados, em relação ao número total de parques, visa monitorar o aumento da disponibilidade de áreas de lazer qualificadas contribuindo para a qualidade ambiental, o bem-estar da população e a resiliência climática das áreas verdes.

Fórmula de cálculo: (x/y)*100

x = Quantidade de parques no perímetro urbano qualificados no Ano “X”

y = Quantidade total de parques no perímetro urbano no Ano “X”

Referência e coerência com o OBJETIVO ESPECÍFICO:

01 Requalificar e ampliar áreas verdes urbanas e de preservação ambiental, como espaços públicos de lazer, mobilidade ativa e convivência, fortalecendo a biodiversidade, a arborização urbana e a segurança preventiva.

Objetivos Estratégicos do PPA pertinentes:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

Dados a serem coletados: Quantitativo de parques urbanos existentes e quantitativo de parques urbanos qualificados.

Meta:
Valor da meta: 100%

Unidade de medida da meta: Porcentagem (%)

Ano de referência para atingimento da meta: 2033

Linha de Base: 66%

Ano da linha de Base: 2025

1. 30. 8. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Área quadrada de parques no perímetro urbano por habitante.

Descrição:
Este indicador quantifica a área quadrada de parques disponíveis para cada habitante da área urbana de Cascavel, visa monitorar o aumento da disponibilidade de áreas de lazer qualificadas contribuindo para a qualidade ambiental, o bem-estar da população e a resiliência climática das áreas verdes.

Fórmula de cálculo: x/y

x = Área total de parque no perímetro urbano (m²) no Ano “X”

y = População total do perímetro urbano no Ano “X”

Referência e coerência com o OBJETIVO ESPECÍFICO:

01 Requalificar e ampliar áreas verdes urbanas e de preservação ambiental, como espaços públicos de lazer, mobilidade ativa e convivência, fortalecendo a biodiversidade, a arborização urbana e a segurança preventiva.

Objetivos Estratégicos do PPA pertinentes:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

Dados a serem coletados: Mapeamento geoespacial de todos os parques (novos e existentes), e dados populacionais do IBGE.

Meta:
Valor da meta: 6,04

Unidade de medida da meta: metro quadrado/habitante (m²/hab)

Ano de referência para atingimento da meta: 2033

Linha de Base: 6,91

Ano da linha de Base: 2025

1. 30. 11. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Redução percentual dos gastos anuais com energia elétrica nas edificações e espaços públicos na titularidade do Município

Descrição:
Este indicador visa quantificar a economia gerada sobre os gastos mensais com energia elétrica nos prédios públicos e espaços municipais, por meio da ampliação da geração própria de energia com fontes renováveis.

Fórmula de cálculo: (x/y)*100

x = Valor economizado no Mês “X”

y = Valor total no Mês “X”

Referência e coerência com o objetivo específico:

02 Ampliar a geração de energia renovável e limpa nos equipamentos públicos municipais, aumentando a eficiência energética e reduzindo custos operacionais e emissões.

Objetivos Estratégicos do PPA pertinentes:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- OE 208: Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

Dados a serem coletados: Gastos mensais de energia elétrica na titularidade do Município e valor economizado com geração própria.

Meta:
Valor da meta: R$ 600.000/ mês

Unidade de medida da meta: Reais (R$) Economizados

Ano de referência para atingimento da meta: 2033

Linha de Base: R$ 311.773,96/ mês

Ano da linha de Base: 2025

1. 30. 15. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Potência instalada de geração própria de energia renovável.

Descrição:
Este indicador visa medir a capacidade de geração própria de energia do município. Visando dobrar a potência instalada nos dias de hoje, para reforçar a utilização das fontes renováveis na matriz energética local.

Fórmula de cálculo: (x/y)*100

x = Potência pico de painéis fotovoltaicos instalados, ligados nas unidades geradoras, interligadas com o sistema de distribuição de energia

y = Potência pico existente instalada em usinas de energia limpa na titularidade do município.

Referência e coerência com o objetivo específico:

02 Ampliar a geração de energia renovável e limpa nos equipamentos públicos municipais, aumentando a eficiência energética e reduzindo custos operacionais e emissões.

Objetivos Estratégicos do PPA pertinentes:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

- OE 208**:** Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

Dados a serem coletados: Quantidade da potência pico de geração de energia limpa instalada no município.

Meta:
Valor da meta: 6.166.550 Wp

Unidade de medida da meta: Watts Pico (Wp) instalado

Ano de referência para atingimento da meta: 2033

Linha de Base: 3.166.550 Wp

Ano da linha de Base: 2025

1. 30. 19. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Número de pontos críticos de alagamento com risco reduzido.

Descrição:
Este indicador quantifica o número de locais no perímetro urbano que historicamente sofrem com alagamentos e inundações severas, demonstrando a diminuição dessas ocorrências como resultado das intervenções de drenagem urbana.

Fórmula de cálculo: (x)

x = Número de pontos de alagamentos documentados que sofreram intervenções com projetos de macrodrenagem com período de retorno compatível à natureza do projeto.

Referência e coerência com o objetivo específico:

03 Reduzir riscos de alagamentos em eixos viários estratégicos, aumentando a resiliência urbana frente a eventos climáticos extremos.

Objetivos Estratégicos do PPA pertinentes:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
- OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

Dados a serem coletados: Quantitativo de pontos de alagamentos documentados que sofreram intervenções com projetos de macrodrenagem com período de retorno compatível à natureza do projeto.

Meta:
Valor da meta: 3

Unidade de medida da meta: Pontos de Alagamento

Ano de referência para atingimento da meta: 2033

Linha de Base: 0

Ano da linha de Base: 2025

1. 30. 23. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Percentual da população urbana residente a até 500 metros de ciclovias contínuas e conectadas.

Descrição:
Este indicador mensura a quantidade de população residente próxima a infraestrutura cicloviária. A metodologia utilizada levou em consideração que os projetos em andamento de ciclovias/ciclofaixas serão considerados como já existentes.

Fórmula de cálculo: (x/y)*100

x = População a 500m da infraestrutura cicloviária no Ano “X”

y = População total no Ano “X”

Referência e coerência com o objetivo específico:

01 Requalificar e ampliar áreas verdes urbanas e de preservação ambiental, como espaços públicos de lazer, mobilidade ativa e convivência, fortalecendo a biodiversidade, a arborização urbana e a segurança preventiva.

04 Ampliar a conectividade e a eficiência da mobilidade urbana, integrando regiões da cidade segregadas por barreiras físicas, reduzindo tempos de deslocamento, aumentando a segurança viária e promovendo acesso equitativo aos serviços urbanos.

Objetivos Estratégicos do PPA pertinentes:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

Dados a serem coletados: Mapeamento geoespacial da área abrangida por ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, dados demográficos do IBGE e projeções populacionais oficiais.

Meta:
Valor da meta: 58,82

Unidade de medida da meta: Porcentagem (%)

Ano de referência para atingimento da meta: 2033

Linha de Base: 54,56

Ano da linha de Base: 2025

1. 30. 26. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Tempo de deslocamento viário.

Descrição:
Este indicador visa calcular o desempenho dos produtos de infraestrutura viária a serem desenvolvidos por este programa por meio do cálculo do tempo de deslocamento entre pontos de interesse pré fixados.

Fórmula de cálculo:

A metodologia aplicada considerou a utilização de rotas associadas aos produtos, utilizando pontos de interesse como conexão entre as rotas.

Os tempos e as distâncias de deslocamento foram calculados utilizando o “Google my Maps” para gerar as rotas de deslocamentos entre os pontos de interesse.

Referência e coerência com o objetivo específico:

04 Ampliar a conectividade e a eficiência da mobilidade urbana, integrando regiões da cidade segregadas por barreiras físicas, reduzindo tempos de deslocamento, aumentando a segurança viária e promovendo acesso equitativo aos serviços urbanos.

Objetivos Estratégicos do PPA pertinentes:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 205: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios.
- OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Dados a serem coletados: Cálculo de tempo e distância dos deslocamentos por meio do google my maps para as rotas pré fixadas.

Meta:
Valor da meta: 134

Unidade de medida da meta: Minuto (min)

Ano de referência para atingimento da meta: 2033

Linha de Base: 151

Ano da linha de Base: 2025

1. 31. **Componentes**

1. 31. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Sustentabilidade
Valor estimado em Dólar (USD): 20.931.000,00

Descrição:
Este componente visa garantir o desenvolvimento urbano da cidade alinhado com as diretrizes de preservação do meio ambiente, através da preservação de nascentes e córregos com a recuperação das áreas verdes, aliando o uso e apropriação pela população por meio de áreas de lazer e socioeducativas.

Além disso, visando o progresso da cidade de maneira sustentável, dentro deste componente há ações para geração de energias renováveis, aproveitando estruturas existentes para instalação de sistemas fotovoltaicos.

O ANEXO 12 apresenta a localização dos produtos abrangidos pelos componentes do Programa.

OEs relacionados:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;
- OE 208: Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética;

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S) 1.1 MEIO AMBIENTE

(P) 1.1.1 - Ampliação e Revitalização do Parque Vitória

O Parque Vitória (nome oficial Parque Ambiental Hilário Zardo) é uma área de preservação do Rio das Antas já consolidada, atualmente com área aproximada de 185.000m², fica localizado entre os bairros Country, Cancelli e Canadá, com acesso principal pela Rua Manaus. O parque conta com pista de caminhada, quadras de futebol e parquinho infantil.

A ampliação do parque visa estender sua área até a rua José de Sá Cavalcanti, de maneira linear, em aproximadamente 40.000,00 m², recuperando e protegendo áreas de preservação permanente existentes, abrindo vias paisagísticas e reestruturando entradas com acessibilidade.

O parque é uma área de mata fechada, o que ao mesmo tempo é sua melhor característica também é uma das razões para que o local seja pouco frequentado. Há muitos relatos de ocorrências criminais no local, principalmente com relação às mulheres, uma vez que, embora seja um parque público em área central, a mata fechada cria um ambiente de pouca visibilidade e pouca segurança.

Assim, mesmo o foco da intervenção sendo a ampliação do parque, há uma forte preocupação de tornar o local já existente em uma área pública de qualidade e segurança para os usuários. Será prevista a revitalização dos caminhos existentes, nova iluminação, implantação de sistema de monitoramento por câmeras, requalificação dos equipamentos esportivos e recreação existentes e criação de espaços atrativos para tornar o parque um local mais frequentado.

Metas físicas:

- Ampliação do parque em 40.000,00m²;
- Implantação de 800 metros lineares de via paisagística;
- Implantação de sistema de monitoramento (60 câmeras);
- Reforma de um playground;

- Reforma de uma quadra de futebol;
- Criação de espaço gramado de 1.200,00m² para eventos culturais e contemplação da natureza;
- Construção de 1.000 metros de pista de caminhada;
- Reforma da pista de caminhada existente;
- Reforma do sistema de iluminação existente.

Valor Estimado: $ 4.000.000,00

(P) 1.1.2 - Implantação do Parque da Pedreira no Guarujá

O bairro Guarujá é marcado pela proximidade com o aeroporto e com a BR 277, conhecido pela existência do grande cemitério existente e com pouca conexão viária com as demais áreas da cidade.

O Parque linear no bairro é uma área de preservação existente, de aproximadamente 14.000 m², com pista de caminhada e bancos, servindo de área de lazer dos moradores locais. Entretanto esta área de lazer encontra-se com em condições ruins de uso e acesso, necessitando reestruturações nas entradas e nos equipamentos de lazer existentes.

Diante disso, além de apenas revitalizar o espaço existente, observa-se uma necessidade de entregar à comunidade local um espaço de lazer mais abrangente e atrativo, que valorize a área de preservação e recuperando áreas degradadas.

Assim, na sequência do parque linear existente, há uma grande área do Município, próxima da área de preservação permanente e com alto grau de degradação, conhecida como Pedreira Municipal, sendo utilizada como depósito e pátio de máquinas da Secretaria de Obras e onde estão implantadas as usinas de asfalto. Com a implantação do Parque da Pedreira, a intenção é recuperar o espaço, criando um ambiente ecologicamente mais sustentável e com uso mais condizente com o entorno. Será implantado pistas de caminhada, ciclovia, lago, áreas de contemplação e socialização.

Metas físicas:

- Implantação de 100.000,00 m² de parque;
- Implantação de sistema de monitoramento;
- Implantação de playground;
- Implantação de quadras esportivas;
- Construção de 1.000 metros de pista de caminhada;
- Implantação de sistema de iluminação;
- Execução de um lago;
- Execução de ciclovia.

Valor Estimado:$ 1.800.000,00

(P) 1.1.3 - Implantação de Parque na Rua José de Sá Cavalcanti

O lote G11 da Quadra 221 da Gleba Cascavel, com 77.362.52m², é área resultante de abertura da rua José de Sá Cavalcanti, que conectou os bairros Recanto Tropical e Cancelli, de maneira direta, e se tornando uma importante via de deslocamentos entre os bairros da região noroeste da cidade, ligando o Parque Verde ao Canadá, e uma alternativa de distribuição do tráfego de quem entra na cidade através da BR 467.

O local, no entanto, é uma área de nascentes e com características de banhado, geralmente acumulando água em épocas de chuvas, sendo circundado por áreas urbanizadas consolidadas e, atualmente, sem uso.

A implantação do parque nesta área atenderá a questão da preservação das nascentes existentes aliado com um equipamento de lazer para os moradores dos bairros próximos, dando função social à área.

Metas físicas:

- Construção de sistema de retenção de água e dispersão da mesma de maneira controlada, associada à intervenção paisagística.
- Execução de áreas de grama para atividades diversas, conforme apropriação da população sobre o local;
- Execução de caminhos;
- Plantio de espécies de árvores adequadas para terrenos alagadiços, visando qualificação do espaço integrado a natureza.

Valor Estimado: $ 1.727.000,00

(P) 1.1.4 - Revitalização do Parque Tarquínio

O Parque Tarquínio, localizado no bairro Parque São Paulo, é um parque implantado no início dos anos 2000, em uma área arborizada já consolidada, com aproximadamente 71.000,00m², onde houve a implantação de pistas de caminhada, playground e um pequeno lago. O local é referência de área de lazer para os moradores, considerando que a área é altamente residencial, e é considerado um local agradável devido a arborização densa.

A demanda por uma revitalização no espaço vem da necessidade de renovar o local para qualificar a área de lazer e torná-la mais atrativa para mais pessoas utilizarem.

Assim, será implantada pista de ciclovia interna ao parque, reforma da pista de caminhada existente, cercamento da área de preservação na extensão do rio (hoje fora do limite do parque), reforma das áreas infantis e intervenção na área do pequeno lago para criação de áreas de convivência e contemplação.

Metas físicas:

- Execução de ciclovia interna ao parque;
- Reforma da pista de caminhada existente;
- Execução de cercamento da área de preservação ao longo do rio;
- Execução de reforma dos playgrounds existentes;
- Implantação de área de convivência e contemplação próximo ao lago.

Valor Estimado: $ 1.500.000,00

(P) 1.1.5 - Implantação do Território Verde FASE II: Restaurante e Palco do Lago

O local onde hoje encontra-se em funcionamento a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA possui potencial cênico e visual para se transformar em um dos grandes cartões postais de Cascavel e um dos principais atrativos do Parque Paulo Gorski. Com isso, a proposta visa implantar nesse local o Restaurante e Palco do Lago e transformar o espaço em uma área de atividades de cultura e lazer, ligadas à preservação do meio ambiente. Seus principais atrativos serão o palco sobre a água, o deck, o mirante e o restaurante/ café-bistrô. Esses elementos integram-se com outros usos que permanecem onde estão, tais como academia ao ar livre e playground.

O projeto inicialmente previa a reforma e reutilização da estrutura existente da SEMA. No entanto, foi constatada a impossibilidade de se utilizar a estrutura atual, o que demandará demolição e construção de uma nova edificação - a estrutura é muito antiga, não há documentação dos projetos executados e seria inviável economicamente o reaproveitamento da mesma, devido à necessidade de protensão da laje. Portanto, por questões técnicas, foi autorizada a demolição da estrutura e construção de uma nova edificação. O projeto consiste na criação de uma nova estrutura que estará localizada sobre a mesma área onde a SEMA se localiza e que dará lugar a um restaurante e café-bistrô.

O Palco do Lago foi idealizado para receber pequenas apresentações e shows, de forma a contribuir para a cultura e identidade local da cidade. Ele se volta de frente para a arquibancada de madeira e para o restaurante. As atividades desenvolvidas durante o funcionamento do Palco não trarão incômodo sonoro ou prejuízos ambientais à fauna local. O palco será estruturado de forma a flutuar sobre a água por tanques metálicos que serão ancorados e capazes de suportar grandes cargas (até 300kg/m², respeitando a NBR 6120/2019). O piso será de madeira e terá acessos para que possa ser feita a manutenção dos tanques flutuantes. Apesar de flutuar, o palco será fixo.

Metas físicas:

- Implantação do Restaurante do Lago (800m² de áreas cobertas);
- Execução do Palco do Lago (40m² de palco + 30m² de passarelas).

Valor Estimado: $ 6.210.000,00

(P) 1.1.6 - Implantação do Jardim Botânico de Cascavel

A fim de cumprir o que determina a Lei Municipal nº 6.482 de 20 de maio de 2015 das etapas do Plano de Arborização de Cascavel, e atender o que trata o Plano Diretor que define que deve-se criar viveiros disponibilizando mudas para recuperação da mata ciliar, o Município pretende implantar um viveiro florestal, para a produção de mudas de qualidade e em quantidade suficiente para atender o cronograma de plantio de mudas estipulado no Plano e possibilitar sua viabilização em longo prazo.

A necessidade de implantação do Viveiro Municipal surgiu com a aprovação do Plano de Arborização que prevê a implantação dessa estrutura. Contudo, o município ainda não direcionou recursos para a implantação deste, fazendo com que o Programa seja a oportunidade de oferecer mais esse serviço.

Além disso, considerando a importância da arborização urbana no perímetro urbano da cidade, torna-se imprescindível a implantação do Viveiro Municipal para suprir as dificuldades quanto às demandas de plantio e produção de mudas, pois o sucesso da arborização e do Plano fundamenta-se na produção de mudas com bases técnicas sólidas, já que todo o potencial do futuro plantio na cidade está na disponibilidade de mudas em quantidade suficiente, de boa qualidade, e a baixo custo. Para isso, o viveiro será associado ao Jardim Botânico de Cascavel.

Com intuito de criar na cidade ações de educação ambiental bem como incentivar estudos da flora local, o Jardim Botânico, com área aproximada de 200.000m², será um espaço de contemplação da natureza, funcionando como local de lazer atrelado ao conhecimento e divulgação da importância da vegetação no meio urbano, como catalisador da melhora do ar e qualificando vias. Deste modo, o Jardim Botânico será o local de produção de espécies próprias e nativas para o paisagismo de praças, parques e vias aliado a propagação educativa.

Diante disso, ainda dentro do Jardim Botânico, será implantada a Sede da Secretaria de Meio Ambiente que poderá fazer a gestão tanto do viveiro quanto do espaço educativo do Jardim Botânico de maneira integrada e segura.

Metas físicas:

- Construção de barracão (800m²) de produção do Viveiro Municipal, com áreas de apoio aos funcionários, depósitos de ferramentas, equipamentos e produtos e garagem para veículos e máquinas;
- Construção de estufas de sombrites (1.200m²) e de telas plásticas (3 unidades de 200m²) e canteiros para cultivo das espécies (950m²);
- Construção da Sede da Secretaria de Meio Ambiente;
- Construção da Estufa Principal do Jardim Botânico;
- Execução de jardins temáticos, caminhos, pontes e passarelas do Jardim Botânico;
- Construção de Museu Botânico/ Centro de Educação Ambiental;
- Execução de lago para o Jardim Botânico;
- Execução de áreas de estacionamentos.

Valor Estimado: $ 3.600.000,00

(P) 1.1.7 - Desapropriações

Realização de desapropriações e indenizações necessárias à integração de áreas em preservação permanente ao patrimônio público, indispensáveis à ampliação dos parques previstas no Subcomponente Meio Ambiente do programa, notadamente para a execução das obras de Ampliação e revitalização do Parque Vitória, Revitalização do Parque Tarquínio e Implantação do Jardim Botânico de Cascavel, assegurando a preservação dos rios e das áreas de matas existentes e a execução segura das intervenções.

Valor Estimado: $ 330.000,00

(S) 1.2 - ENERGIAS RENOVÁVEIS

(P) 1.2.1 - Instalação de sistemas fotovoltaicos para atender demanda de energia dos equipamentos públicos

Com a atual conjuntura mundial no quesito do aquecimento global e das mudanças climáticas, melhorar a eficiência energética e buscar formas alternativas de geração e fornecimento de energia se fazem cruciais para reduzir os impactos humanos ao meio ambiente.

O Município de Cascavel como entidade pública possui mais de 605 unidades consumidoras hoje ligadas em sua titularidade, em edificações e espaços públicos que atendem os diversos serviços para a população. Os valores despendidos no ano de 2025 com energia elétrica foram de R$11.262.491,17, sendo uma média de 938.540,93 por mês.

Visando a gradual transição energética, a descarbonização das edificações públicas e a redução dos gastos de recursos públicos com as faturas de energia, foi realizado o levantamento dos prédios com grandes áreas de cobertura, que tenham potencial de instalação de usinas de geração fotovoltaica, para geração e injeção de energia na rede da concessionária, para compensação do consumo em outras unidades consumidoras do município. As áreas escolhidas foram as dos 5 terminais urbanos de ônibus, os quais possuem estruturas relativamente novas que podem receber placas solares fotovoltaicas, e também as áreas de cobertura de arquibancadas de 2 estádios municipais. As capacidades previstas de potência instaladas no conjunto das 7 usinas seria na faixa de 3.000kW.

Metas físicas:

- Implantação de uma usina de geração de energia renovável fotovoltaica com capacidade instalada de 500 kW, na estrutura da cobertura do Terminal Urbano Oeste;

- Implantação de uma usina de geração de energia renovável fotovoltaica com capacidade instalada de 300 kW, na estrutura da cobertura do Terminal Urbano Leste;
- Implantação de uma usina de geração de energia renovável fotovoltaica com capacidade instalada de 300 kW, na estrutura da cobertura do Terminal Urbano Nordeste;
- Implantação de uma usina de geração de energia renovável fotovoltaica com capacidade instalada de 300 kW, na estrutura da cobertura do Terminal Urbano Sudoeste;
- Implantação de uma usina de geração de energia renovável fotovoltaica com capacidade instalada de 300 kW, na estrutura da cobertura do Terminal Urbano Sul;
- Implantação de uma usina de geração de energia renovável fotovoltaica com capacidade instalada de 1.000 kW, na estrutura da cobertura do Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta;
- Implantação de uma usina de geração de energia renovável fotovoltaica com capacidade instalada de 300 kW, na estrutura da cobertura do Estádio Municipal Amadores Theodoro Colombelli;

Valor Estimado: $ 1.764.000,00

1. 31. 48. **Informações do 2° componente:**
Nome: Infraestrutura Urbana
Valor estimado em Dólar (USD): 48.473.000,00

Descrição:
Este componente reúne ações de intervenção direta na infraestrutura urbana existente, com intenção de resolver problemas ocasionados pela defasagem das estruturas projetadas há muito tempo e pelas barreiras existentes na malha viária consolidada da cidade.

Deste modo, com os alagamentos recentes ocorridos devido a fortes precipitações, a infraestrutura de drenagem do centro da cidade se mostrou subdimensionada, uma vez que a cidade já não é mais a mesma de 30 anos atrás, com maior adensamento do Centro e grande tráfego de veículos nas principais vias de deslocamento entre bairros. Por isso, obras de macrodrenagem em pontos específicos resolverão grande parte dos pontos de alagamentos, garantindo segurança para comércios e residências nesses locais, bem como de quem necessita transitar por eles em situações climáticas adversas.

Ainda considerando o crescimento da cidade, tanto em população quanto de área urbana, muitas regiões sofrem com o aumento da frota de veículos e com a falta de opções para transitar entre diferentes áreas da cidade, mesmo entre bairros vizinhos. Assim, a implantação de binários visa organizar e melhorar o tráfego e as transposições das rodovias garantem maior possibilidades de trajetos, dando mais fluidez ao trânsito e reduzindo o tempo dos trajetos.

O ANEXO 12 apresenta a localização dos produtos abrangidos pelos componentes do Programa.

OEs relacionados:

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;
- OE 208: Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética;

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S) 2.1 - DRENAGEM URBANA

(P) 2.1.1 - Execução de macrodrenagem na Rua São Paulo

O subcomponente prevê a implantação de emissário de águas pluviais nas ruas Rio de Janeiro, Pio XII, Osvaldo Cruz, São Paulo, Salgado Filho e Presidente Bernardes, incluindo talvegue interno à quadra 402 do Centro, entre a Rua Manoel Ribas e a Avenida Brasil, atendendo a uma bacia de aproximadamente 89 ha.

A intervenção visa mitigar alagamentos recorrentes decorrentes da urbanização inicial do loteamento Centro, que desconsiderou a drenagem natural da área, impactando edificações em cotas mais baixas e o sistema viário, com inundação de vias coletoras e arteriais.

A solução contempla emissário em tubos e aduelas pré moldadas, com poços de visita e de queda, ampliação da captação por novas bocas de lobo e dissipador de energia no lançamento, garantindo o funcionamento em conduto

livre. O traçado ocupa vias públicas e parte de lotes privados da quadra 402, com necessidade de demolições pontuais, sem previsão de realocação de residências.

Metas físicas: Implantação de 1.093m de emissário.

Valor Estimado: $ 4.830.000,00

(P) 2.1.2 - Execução de macrodrenagem na Rua Vitória

O subcomponente prevê a implantação de emissário de águas pluviais nas ruas Sete de Setembro, Vitória, Cuiabá e Souza Naves, entre a Rua Sérgio Djalma de Holanda e o talvegue entre as ruas Vitória e Belo Horizonte, atendendo a uma bacia de aproximadamente 121 ha.

A intervenção busca mitigar alagamentos recorrentes resultantes da urbanização antiga da área, implantada antes da Lei Federal nº 6.766/1979, que levou à ocupação de áreas naturalmente suscetíveis a inundações. Os alagamentos atingem edificações em cotas mais baixas, especialmente na Vila Iguaçu, onde o emissário existente é subdimensionado, além de comprometer o sistema viário, com registros na Rua Vitória. A vazão preliminar estimada é da ordem de 34 m³/s.

A solução contempla a implantação de emissário em tubos e aduelas pré moldados, com dispositivos de inspeção, ampliação da captação por meio de novas bocas de lobo e dissipador de energia no lançamento, visando ao adequado funcionamento do sistema e à prevenção de erosões. O traçado ocupa vias públicas e parte de área pertencente ao Município de Cascavel.

Metas físicas: Implantação de 687 m de emissário;

Valor Estimado: $ 3.200.000,00

(P) 2.1.3 - Execução de emissários Av. Carlos Gomes - Parque Tarquínio

O subcomponente prevê a implantação de emissário de águas pluviais nas ruas Prudente de Morais, Carlos de Carvalho, Wenceslau Braz e área interna do Parque Tarquínio, atendendo a uma bacia de aproximadamente 57 ha.

A intervenção visa solucionar alagamentos recorrentes decorrentes do subdimensionamento da rede existente, agravados após a revitalização da Av. Carlos Gomes, que evidenciou o gargalo do emissário atual, com impactos no talvegue da bacia, especialmente na Rua Wenceslau Braz. Os alagamentos afetam edificações próximas, com destaque para a região entre as quadras 57 e 67 do Parque São Paulo, além de causar interferências pontuais no sistema viário, com interdição parcial da Rua Carlos de Carvalho.

O dimensionamento hidráulico considera vazão de aproximadamente 17,7 m³/s. A solução contempla emissário em tubos de concreto armado Ø1,50 m em linha dupla, com poços de visita e de queda, ampliação da captação por meio de novas bocas de lobo e dissipador de energia no lançamento, conforme projeto já elaborado pelo IPC. O traçado ocupa vias públicas e parte dos lotes 1K1B e 1C da quadra 67, de propriedade do Município de Cascavel.

Metas físicas: Implantação de 403m de emissário;

Valor Estimado: $ 930.000,00

(S) 2.2 - MOBILIDADE URBANA

(P) 2.2.1 - Implantação do Binário Manaus/Belém

Este produto consiste na implantação de binário entre as ruas Manaus e Belém, com o prolongamento da Rua Belém sobre área verde e afluente do Rio das Antas, no trecho entre as ruas Sete de Setembro e Afonso Pena, além da reestruturação da Rua Pedro Américo, entre as ruas Afonso Pena e Alfredo Andersen, incluindo prolongamento sobre área verde e afluente do Rio das Antas.

A intervenção tem como objetivo solucionar os congestionamentos da Rua Manaus, que realiza a ligação entre a região central e as regiões norte e nordeste da cidade. Essas regiões são separadas por afluentes do Rio das Antas, inseridos em áreas de preservação permanente, o que torna a Rua Manaus uma das poucas vias de ligação, concentrando grande volume de tráfego.

O projeto prevê a implantação da Rua Belém e a reestruturação da Rua Pedro Américo, com execução de pavimento em CBUQ, meio-fio com sarjeta, sistema de drenagem e captação de águas pluviais, calçadas acessíveis, sinalização viária e a transposição dos córregos por meio da construção de pontes sobre pilares.

Metas físicas:

· Execução de 3.190,00 metros de pavimentação;

· Reestruturação de 1.122,00 metros de via;

· Execução de 02 transposições de afluentes do Rio das Antas;

Valor Estimado: $ 8.253.000,00

(P) 2.2.2 - Urbanização da Av. Guaíra/Av Toledo

Este produto consiste na implantação da Avenida Guaíra, com a duplicação da via no trecho compreendido entre as ruas dos Pinheiros e São Luiz.

A intervenção tem como objetivo solucionar o problema de estrangulamento viário existente na Avenida Guaíra, importante eixo de ligação entre a BR-467 e a região central da cidade. Atualmente, o trecho da Avenida Guaíra entre a BR-467 e a Rua dos Pinheiros é estruturado em pista dupla, assim como sua continuidade pela Avenida Toledo. No entanto, o segmento compreendido entre as ruas dos Pinheiros e São Luiz permanece com pista simples, o que provoca gargalos e comprometimento do fluxo de veículos.

O projeto prevê a implantação de pista dupla, com execução de pavimento em CBUQ, meio-fio de concreto com sarjeta, sistema de drenagem com dispositivos de captação de águas pluviais, calçadas no passeio público, rampas de acessibilidade e sinalização viária.

Metas físicas: Execução de 1.500,00 metros de pavimentação, com duplicação de via.

Valor Estimado: $ 2.037.000,00

(P) 2.2.3 - Reestruturação e transposição da Av. Corbélia sobre a BR 467

Este produto consiste na implantação de um viaduto sobre a Rodovia BR-467 e na reestruturação viária da Avenida Corbélia, incluindo a implantação de ciclovia, com o objetivo de promover a conexão entre as regiões central e norte do município, abrangendo os bairros Pacaembu, Cataratas e Periolo, fortalecendo a integração urbana e a mobilidade regional.

A intervenção visa solucionar os problemas de conectividade viária entre a região norte e a região central, atualmente comprometida pela BR-467, que atua como barreira física ao deslocamento urbano. A limitada quantidade de dispositivos de transposição gera gargalos viários, aumento dos tempos de viagem, concentração de tráfego e redução da segurança. Nesse contexto, o viaduto da Avenida Corbélia configura-se como infraestrutura estratégica para melhorar a fluidez do tráfego local e regional, redistribuindo fluxos e reduzindo a sobrecarga do sistema viário. Em conjunto com o viaduto da Avenida Rocha Pombo, a nova estrutura formará um binário viário estruturante, ampliando a capacidade operacional, a segurança e a qualidade de vida da população.

O projeto contempla a implantação do viaduto sobre a BR-467, dimensionado para atender às demandas de tráfego urbano e intermunicipal, observando critérios técnicos, estruturais, geométricos e de segurança. Estão previstas obras de infraestrutura e superestrutura, incluindo fundações, encontros, pilares, vigas, lajes, drenagem superficial, guarda-corpos e barreiras de segurança, em conformidade com as normas vigentes.

Prevê-se ainda a reestruturação da Avenida Corbélia, no trecho entre as ruas Olindo Periolo e Serra da Mantiqueira, com adequação geométrica, requalificação do sistema viário e implantação de ciclovia segregada, incentivando a mobilidade ativa e a segurança dos ciclistas, além da adequação do greide da BR-467 nas áreas de interferência da obra.

As obras incluem pavimentação em CBUQ, com camadas dimensionadas conforme estudos de tráfego e características do subleito, implantação de meio-fio com sarjeta integrada e sistema completo de drenagem pluvial. O projeto contempla também calçadas acessíveis em ambos os lados da via, com rampas e piso tátil, além de sinalização horizontal e vertical e dispositivos de segurança viária, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e demais normas aplicáveis.

Metas físicas:

· Execução de 01 implantação de viaduto com área de 990,00 metros quadrados, sobre a rodovia BR-467;

· Reestruturação de 3.150,00 metros de via.

Valor estimado: $ 6.481.000,00

(P) 2.2.4 - Implantação do Binário Leonardo da Vinci/ Adolfo Garcia

Este produto consiste na implantação de um sistema viário em binário entre as ruas Leonardo da Vinci e Adolfo Garcia, contemplando o prolongamento da Rua Adolfo Garcia sobre área de propriedade particular, o que demandará processo de desapropriação, bem como a reestruturação do sistema viário existente.

A intervenção tem como objetivo solucionar o problema de congestionamento na Rua Leonardo da Vinci, importante eixo de ligação entre os bairros Brazmadeira e Interlagos. Atualmente, por se tratar de uma via de pista simples com fluxo bidirecional, a rua não apresenta condições físicas adequadas para absorver o volume de tráfego existente, resultando em recorrentes conflitos e prejuízos à fluidez viária.

O projeto prevê a implantação do binário no trecho compreendido entre as ruas Homero e Johannes Kepler, bem como a reestruturação da Rua Adolfo Garcia no segmento entre as ruas Poente do Sol e Sócrates, incluindo a execução de pavimento em CBUQ, meio-fio de concreto com sarjeta, sistema de drenagem com dispositivos de captação de águas pluviais, calçadas no passeio público, rampas de acessibilidade e sinalização viária.

Meta física:

· Execução de 220,00 metros de pavimentação;

· Execução de 1.060,00 metros de reestruturação de via;

Valor estimado: $ 741.000,00

(P) 2.2.5 - Prolongamento Rua Nereu Ramos/Binário Rua Jorge Lacerda

A região central do Município de Cascavel, em sua porção nordeste, apresenta restrições à mobilidade urbana em razão da presença de áreas verdes que interrompem a continuidade do sistema viário. Uma das poucas vias de ligação entre a região Nordeste e a região Central é a Rua Jorge Lacerda, que atravessa o núcleo urbano central.

A via caracteriza-se pela intensa presença de estabelecimentos comerciais, configurando-se como importante corredor de serviços, o que resulta em elevado volume de tráfego de veículos leves e pesados. Essa condição torna o deslocamento lento, especialmente nos horários de pico, uma vez que se trata de via simples, com duas faixas em fluxo duplo, atualmente subdimensionada para a demanda existente.

A Rua Jorge Lacerda possui caixa viária de 20 metros, composta por 12 metros de pista de rolamento e calçadas de 4 metros em ambos os lados, o que inviabiliza sua ampliação, tanto por restrições legais quanto pela inviabilidade técnica e econômica de desapropriações.

Diante desse cenário, a implantação de sentido único na Rua Jorge Lacerda apresenta-se como alternativa viável para aumento da capacidade viária e melhoria da fluidez. Essa solução demanda a implantação de sistema binário, com via paralela operando em sentido oposto, função para a qual a Rua Nereu Ramos se mostra adequada, por acompanhar toda a extensão da Rua Jorge Lacerda.

Para viabilizar o binário, estão previstas intervenções na Rua Nereu Ramos, entre as ruas Maria Dolores da Motta e Alfeu Viero, incluindo a implantação de aproximadamente 290,00 metros de pista com 12,00 metros de largura, o alargamento de cerca de 970,00 metros de pista de 7,00 para 12,00 metros, e de 1.045,00 metros de pista de 9,00 para 12,00 metros.

Para a execução do trecho de implantação, será necessária a desapropriação de área particular com aproximadamente 5.163,27 m². As intervenções propostas proporcionarão melhores condições de segurança, capacidade e fluidez viária, assegurando a adequada conexão entre as regiões Norte e Central do Município de Cascavel.

Metas físicas:

· Execução de 290,00 metros de pavimentação;

· Execução de 2015,00 metros de reestruturação de via;

Valor Estimado: $1.750.000,00

(P) 2.2.6 - Prolongamento da Avenida das Torres até a Rua Jorge Lacerda

Este produto consiste no prolongamento da Avenida das Torres, localizada nos bairros Recanto Tropical e Cancelli, por meio da implantação de um novo trecho de avenida entre as ruas Nilce Capello e Jorge Lacerda, incluindo a transposição de área verde sobre um afluente do Rio São Francisco.

A intervenção tem como objetivo promover a ligação, pela região oeste do município, entre importantes pontos do anel rodoviário da cidade, conectando o acesso à BR-467, pela Rua Jorge Lacerda, ao acesso à BR-163, pela Estrada Chaparral.

O projeto prevê a implantação de avenida com duas pistas de rolamento, cada uma com 9,00m (nove metros) de largura, com execução de pavimento em CBUQ, meio-fio de concreto com sarjeta, sistema de drenagem e dispositivos de captação de águas pluviais, calçadas no passeio público, rampas de acessibilidade e sinalização viária. Prevê-se ainda a transposição de afluente do Rio São Francisco, por meio da construção de dois bueiros.

Metas físicas:

· Implantação de 350,00 metros de avenida com pavimentação em CBUQ;

· Execução de 02 transposições de afluentes do Rio São Francisco.

Valor Estimado: $ 4.287.000,00

(P) 2.2.7 - Prolongamento e estruturação da Avenida das Torres entre os bairros 14 de Novembro e Santa Felicidade

Este produto consiste no prolongamento da Avenida das Torres, nos bairros 14 de Novembro e Santa Felicidade, por meio da implantação de novo trecho de via arterial entre a Estrada Municipal Pará Gramadinho e a Rua André de Barros, incluindo a transposição de área verde classificada como Área de Preservação Permanente (APP) e a travessia de córrego existente, garantindo a continuidade do sistema viário.

A obra tem como objetivo promover a integração viária e urbana da região sul do município, atualmente segregada pela APP e pela rodovia BR-277, que atuam como barreiras físicas à circulação entre os bairros. Essa configuração obriga os deslocamentos a ocorrerem pela região central, resultando em percursos mais longos, sobrecarga viária, aumento do tempo de viagem e prejuízos à mobilidade urbana e à qualidade de vida da população.

O projeto prevê a implantação de avenida com duas pistas de rolamento independentes, cada uma com largura de 9,00 m, dimensionadas para o tráfego urbano de veículos leves e pesados, com pavimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), composto por sub-base, base e revestimento asfáltico, assegurando durabilidade, conforto e segurança.

Estão previstas a execução de meio-fio de concreto pré-moldado com sarjeta integrada, sistema completo de drenagem pluvial, com galerias, bocas de lobo e caixas de ligação, bem como a implantação de calçadas acessíveis em ambos os lados da via, com rampas, piso tátil e demais elementos necessários à circulação segura de pedestres.

A sinalização viária compreenderá dispositivos horizontais e verticais, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, assegurando a organização do tráfego e a segurança dos usuários. A intervenção inclui, ainda, a construção de ponte para transposição da área verde e do córrego, devidamente dimensionada sob os aspectos estruturais, hidráulicos e ambientais, garantindo a continuidade da avenida, a manutenção da vazão natural e o atendimento às condicionantes ambientais aplicáveis.

Metas físicas: 1.850,00 metros de implantação de avenida com pavimentação em CBUQ, execução de ponte sobre córrego.

Valor Estimado: $ 4.630.000,00

(P) 2.2.8 - Implantação do Binário Jacarezinho/São Gabriel com transposição sobre a BR 467

Este produto consiste na implantação de um viaduto rodoviário sobre a BR-467, bem como na reestruturação do sistema viário urbano composto pelas ruas São Gabriel, Castro, Paranaguá, Clóvis Bevilacqua e Pontes de Miranda, além da implantação de novos trechos da Rua Jacarezinho e da Avenida das Torres. A intervenção visa promover a integração entre as regiões Central e Norte do município, abrangendo os bairros São Cristóvão, Brasília e Floresta, por meio da consolidação de um novo eixo estruturante de circulação urbana e regional.

O objetivo principal é solucionar os problemas de conectividade viária entre as regiões norte e central, atualmente limitadas pela BR-467, que atua como barreira física à circulação. A escassez de dispositivos de transposição gera concentração de fluxos, sobrecarga viária, aumento dos tempos de deslocamento e redução da segurança. Nesse contexto, o novo viaduto da Rua São Gabriel configura-se como infraestrutura estratégica para ampliar a capacidade

de transposição, redistribuir os fluxos e melhorar a fluidez do tráfego. Em conjunto com o viaduto da Rua Jacarezinho, a estrutura integrará um binário viário formado pelas ruas Paranaguá, Castro, Clóvis Bevilacqua, Pontes de Miranda e pela Avenida das Torres, que atuarão como vias de ligação entre os eixos principais, promovendo maior eficiência operacional, segurança e qualidade de vida aos usuários.

O projeto contempla a implantação do viaduto sobre a BR-467, dimensionado sob critérios geométricos, estruturais, hidráulicos e de segurança, incluindo obras de infraestrutura e superestrutura, como fundações, encontros, pilares, vigas, lajes, drenagem superficial, guarda-corpos, barreiras de proteção e sinalização específica, além da adequação do greide da rodovia nas áreas de interferência.

No âmbito da reestruturação viária, prevê-se o alargamento das ruas São Gabriel, Castro, Paranaguá, Clóvis Bevilacqua e Pontes de Miranda para largura total de 12,00 m, com adequação geométrica e melhoria das condições de circulação. Incluem-se a implantação de novos trechos da Rua Jacarezinho e da Avenida das Torres, bem como o recape e a adequação da sinalização no trecho existente da Rua Jacarezinho, assegurando a integração do sistema viário.

As obras abrangem pavimentação em CBUQ, com camadas estruturais dimensionadas conforme estudos de tráfego e características do subleito, implantação de meio-fio com sarjeta integrada e sistema completo de drenagem pluvial. O projeto contempla ainda calçadas acessíveis ao longo de todo o trecho, com rampas e piso tátil, além de sinalização horizontal e vertical e dispositivos de segurança viária, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e demais normas aplicáveis.

Metas físicas:

· 01 implantação de viaduto sobre a rodovia BR-467;

· Reestruturação de 3.098,00 metros de via;

· Recape e adequação de sinalização de 2.190,00 metros de via;

· Implantação de 980,00 metros de via;

Valor Estimado: $ 9.259.000,00

(P) 2.2.9 - Desapropriações

Realização de desapropriações e indenizações necessárias à liberação de faixas de domínio e áreas estratégicas, indispensáveis à implantação das intervenções de infraestrutura urbana previstas no programa, notadamente para a execução das obras: Implantação do Binário Manaus / Belém, Urbanização da Av. Guaíra / Av. Toledo, Reestruturação e transposição da Av. Corbélia sobre a BR 467, Implantação do Binário Leonarda Da Vinci / Adolfo Garcia, Prolongamento da Rua Nereu Ramos / Binário Rua Jorge Lacerda, Prolongamento da Av. das Torres até a Rua Jorge Lacerda, Prolongamento e estruturação da Av. das Torres entre os bairros 14 de Novembro e Santa Felicidade, Implantação do binário Jacarezinho / São Gabriel com transposição sobre a BR 467 (conforme ANEXO 19), assegurando a continuidade do traçado viário, a integração territorial e a execução segura das intervenções.

Valor Estimado: $ 2.075.000,00

1. 31. 52. **Informações do 3° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 3.005.000,00

Descrição:
Este componente financiará os gastos da Unidade de Coordenação do Programa (UCP), Auditoria Externa e Comissão de Financiamento apresentada pelo Organismo Financiador. Contempla atividades relacionadas à gestão do Programa com o objetivo de garantir gestão integrada e efetiva dos recursos financeiros, técnicos e institucionais aplicados, contribuindo diretamente para o alcance dos objetivos e resultados esperados observando os cronogramas físico-financeiros definidos. Visa assegurar a implementação eficiente, transparente e efetiva do Programa, por meio de estruturas e mecanismos adequados de governança, acompanhamento técnico e auditoria independente. Este componente contribui diretamente para a mitigação dos riscos associados à gestão pública, maximizando a eficácia das ações, promovendo transparência e permitindo o alcance dos resultados esperados de melhoria da mobilidade urbana, resiliência climática, recuperação ambiental e sustentabilidade urbana no município de Cascavel/PR.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) 3.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social

A supervisão técnica e ambiental das obras será feita por empresa de consultoria técnica contratada, que fornecerá pessoal e equipamentos necessários para a supervisão das obras e serviços do Programa. Emitirá relatórios técnicos e subsidiará a fiscalização durante a execução dessas obras e serviços, compreendendo:

- Fornecimento de equipe técnica especializada, além de pessoal de apoio, para acompanhar a implantação e a execução das obras e serviços do Programa;
- Acompanhamento e controle das obras e serviços;
- Fornecimento de equipe técnica e equipamentos de topografia, para acompanhamento e aferição da implantação e execução das obras e serviços, em conformidade com as normas técnicas e projetos executivos;
- Disponibilização de laboratório de análise de serviços de terraplenagem e pavimentação, e equipe técnica para acompanhamento dos serviços, coleta de amostras e realização de ensaios, com a emissão de relatórios, com vistas à execução dos serviços em conformidade com as especificações dos projetos e normas técnicas exigidas;
- Disponibilização de laboratório de análise de concreto e equipe técnica para acompanhamento dos serviços, coleta de amostras e realização de ensaios, com a emissão de relatórios, com vistas à execução dos serviços em conformidade com as especificações dos projetos e normas técnicas exigidas;
- Emissão de laudos técnicos relativos aos serviços e obras executadas;
- Elaboração de relatórios de quantidades e serviços executados, em conformidade com os projetos executivos e especificações técnicas;
- Emissão de relatórios mensais de acompanhamento, com todas as informações sobre o desenvolvimento das obras e serviços, resultados dos ensaios laboratoriais efetuados, contemplando também a análise dos serviços e obras executadas com as quantidades previstas no cronograma de execução;
- Comunicação à Unidade de Coordenação do Programa (UCP) imediatamente, em caso de problemas que ocorreram na execução das obras, para que sejam tomadas as devidas providências, em atendimento aos projetos, normas técnicas e legislação vigente;
- Subsidiar a UCP e a Fiscalização sobre as etapas desenvolvidas e a desenvolver;
- Elaborar relatórios mensais de acompanhamento das obras do Programa.

Valor estimado: $ 1.500.000,00

(P) 3.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Este produto destina-se a fortalecer o Município de uma Unidade de Coordenação e Gerenciamento do Programa, objetivando assegurar as ações e procedimentos, desenvolvidos na forma estabelecida no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto a CAF.

Valor estimado: $ 350.000,00

(P) 3.3 - Auditoria Externa

Este produto irá financiar os gastos de Auditoria Externa independente, que terá a responsabilidade de conferir a contabilidade financeira do Programa, apresentando relatórios anuais durante sua execução. A auditoria realizará análises financeiras, operacionais e administrativas, emitindo relatórios anuais com recomendações e avaliações claras, que servirão de base para eventuais ajustes na execução e garantirão transparência junto às instituições financiadoras e à sociedade civil.

Valor estimado: $ 100.000,00

(P) 3.4 - Estudos e Projetos

Neste produto estão concentrados estudos de avaliação econômica, social, ambiental e técnicos e projetos necessários para implantação/execução dos projetos, obras e ações do programa.

Valor estimado: $ 1.055.000,00

1. 32. **Beneficiários**

Beneficiários diretos:

- Cerca de 27 mil usuários de bicicletas compartilhadas, segundo dados do Programa Vai de Bici;
- População que estará próxima da nova infraestrutura cicloviária, cerca de 15.700 pessoas (previsão para o ano de 2033);
- Estimativa de 280 mil veículos (2024/2025) que poderão usufruir dos binários, das transposições de vias e dos prolongamentos viários;
- Cerca de 179.325 mulheres conforme Censo IBGE 2022 serão beneficiadas com a instalação de sistema de videomonitoramento nos parques urbanos;
- Em torno de 3.091 pessoas residentes nas proximidades dos pontos de alagamento que receberão obras de drenagem.

Beneficiários indiretos:

- Toda a população de Cascavel/PR, estimada em 348.051 habitantes (IBGE, 2022), que se beneficiará da melhoria da infraestrutura urbana, da redução dos gastos públicos com energia, da requalificação e ampliação dos parques urbanos, da maior segurança gerada pelo sistema de videomonitoramento, da redução dos trajetos e maior fluidez do tráfego e da eliminação dos pontos de alagamentos.

1. 39. **Anexos**

teste 2

teste

ANEXO 01 - MAPA MALHA CICLOVIÁRIA

ANEXO 15 - MEMORIA DE CÁLCULO INDICADORES CAF

ANEXO 17 - Descontos energia injetada Município de Cascavel - Nov 2025

ANEXO 12 - MAPA DAS OBRAS

ANEXO 19 - ÁREAS DE DESAPROPRIAÇÃO INFRAESTRUTURA

ANEXO 22 - PLANILHA DE INDICADORES CAF CASCAVEL

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

A seguir apresenta-se as áreas estratégicas do PPA da União (2024-2027) abrangidos pelo Programa de Revitalização e Obras de Cascavel - PRO CASCAVEL.

- **OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.**

Descrição:

O Programa PRO CASCAVEL tem impacto direto neste objetivo, pois seus dois componentes se relacionam diretamente com as áreas ambientais e na infraestrutura urbana.

Os 4 objetivos do programa estão voltados para este OE:

- há preocupação de garantir o uso sustentável do meio urbano, especialmente com o uso adequado das áreas de preservação permanente e o uso de energias renováveis para redução de gastos públicos;
- há obras importantes para garantir mobilidade entre bairros, reduzindo tempo de deslocamentos e ampliando possibilidades de trajetos, bem como organizando o tráfego e;
- há intenção de se resolver problemas de alagamentos no Centro da cidade que prejudicam a trafegabilidade e causam transtornos aos moradores e comerciantes dessas áreas em dias de eventos climáticos extremos, através de redimensionamento das infraestruturas de drenagem antigas;

Componente relacionado: 1, 2

Objetivo específico relacionado: 1, 2, 3, 4

Indicadores relacionados: Indicador 2, Indicador 4, Indicador 5, Indicador 6, Indicador 7, Indicador 8

Pessoas beneficiadas: Toda a população de Cascavel/PR, estimada em 348.051 habitantes (IBGE, 2022), que direta ou indiretamente se beneficiará.

Representatividade do investimento para este OE: 32,08%

- **OE 107: Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência**

Descrição:

O Programa PRO CASCAVEL atinge esse objetivo devido à preocupação de reduzir casos de violência contra as mulheres em áreas públicas, em especial nos parques com matas fechadas.

Para isso, todos os parques listados nos produtos do programa terão instalação de sistema de videomonitoramento, com intuito de inibir ações criminosas ou possibilitar a identificação dos criminosos, uma vez que há muitos relatos de mulheres sendo vítimas de abusos nos parques, o que gera muita insegurança e as afasta desses locais.

Componente relacionado: 1

Objetivo específico relacionado: 1

Indicadores relacionados: Indicador 1

Pessoas beneficiadas: 179.325 mulheres conforme censo IBGE 2022

Representatividade do investimento para este OE: 3,48%

-

OE 112 - Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial

Descrição:

Este Objetivo Estratégico é atingido pelo PRO CASCAVEL através da implantação de sistema de videomonitoramento nos parques a serem revitalizados e construídos, visando garantir mais segurança para os frequentadores dos espaços públicos e garantir o pleno uso desses locais, evitando assim a rápida degradação e abandono dos parques.

Além disso, o videomonitoramento nesses locais possibilitará rapidez na ação policial, garantindo maiores resultados para a promoção da segurança pública, refletindo assim em espaços seguros a população de Cascavel e inibindo ação criminosa e depredação do patrimônio público.

Componente relacionado: 1

Objetivo específico relacionado: 1

Indicadores relacionados: Indicador 1

Pessoas beneficiadas: Toda a população de Cascavel/PR, estimada em 348.051 habitantes (IBGE, 2022), que direta ou indiretamente se beneficiará.

Representatividade do investimento para este OE: 3,48%

- **OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida**

Descrição:

O PRO CASCAVEL amplamente foca neste OE, no que tange o desenvolvimento da qualidade de vida da população por meio das atividades físicas e dos momentos de lazer.

Embora não haja obra exclusiva para esportes específicos no programa, a recuperação das áreas de proteção ambiental através da revitalização e implantação de parques tem como objetivo qualificar espaços públicos para garantir áreas de lazer aos moradores da cidade.

O objetivo é atingido através da implantação de ciclovias, pistas de caminhadas, playgrounds e quadras esportivas nos parques.

Componente relacionado: 1

Objetivo específico relacionado: 1

Indicadores relacionados: Indicador 3, Indicador 7

Pessoas beneficiadas: Toda a população de Cascavel/PR, estimada em 348.051 habitantes (IBGE, 2022), que direta ou indiretamente se beneficiará.

Representatividade do investimento para este OE: 2,41%

- **OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.**

Descrição:

O PRO CASCAVEL tem como objetivo geral este OE, uma vez que um de seus componentes foi chamado de “Sustentabilidade” abrangendo o “Meio Ambiente” e “Energias Renováveis” em seus dois subcomponentes. Além disso, o Componente “Infraestrutura urbana” está indiretamente relacionado ao uso sustentável do meio ambiente através das obras estruturantes de drenagem urbana.

Dentro do programa a execução e revitalização de parques urbanos tem objetivo direto de conservar nascentes, córregos e rios além de restaurar e conservar a mata nas áreas de preservação permanente, fazendo o uso adequado desses espaços de forma sustentável, agregando o lazer da população de maneira responsável a esses locais.

O programa prevê também a instalação de sistemas fotovoltaicos para geração de energia para atender a demanda dos equipamentos públicos, reduzindo gastos com energia fornecida pela concessionária, além de otimizar a utilização da energia de maneira correta e sustentável.

Ainda, devido a eventos climáticos intensos, pontos de alagamentos se tornaram um problema para a cidade e o programa visa solucionar essa questão através da readequação do sistema de drenagem antigo da cidade, influenciando indiretamente o uso adequado do espaço urbano com o meio ambiente.

Além disso, as obras de mobilidade urbana e de parques ampliam a malha cicloviária da cidade, ampliando a segurança para o uso de meios de transportes não motorizados, reduzindo assim emissões de poluentes devido ao uso de combustíveis nos veículos motorizados.

Componente relacionado: 1, 2

Objetivo específico relacionado: 1, 2, 3

Indicadores relacionados: Indicador 2, Indicador 3, Indicador 4, Indicador 5, Indicador 6, Indicador 7

Pessoas beneficiadas: Toda a população de Cascavel/PR, estimada em 348.051 habitantes (IBGE, 2022), que direta ou indiretamente se beneficiará.

Representatividade do investimento para este OE: 13,45%

- **OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas**

Descrição:

Este OE é atendido pelo PRO CASCAVEL através das obras de drenagem no centro da cidade, pois conforme os eventos e mudanças climáticas recentes, muitos pontos críticos de alagamento acarretaram em problemas de mobilidade urbana e em transtornos aos moradores e comerciantes próximos, mostrando a fragilidade do sistema de drenagem existente.

É notável que eventos climáticos intensos tem se tornado mais frequentes nos últimos anos em todo o planeta e cada cidade enfrenta problemas distintos relacionados a eles. O Centro de Cascavel possui sistema de drenagem antigo, dimensionado para uma realidade de adensamento urbano que não é mais condizente visto que a cidade tem crescido muito e de maneira acelerada nos últimos anos, sendo necessária a readequação dos sistemas de drenagem para evitar alagamentos que afetam, de alguma maneira, todas as pessoas da cidade.

Componente relacionado: 2

Objetivo específico relacionado: 1, 3

Indicadores relacionados: Indicador 6

Pessoas beneficiadas: Toda a população de Cascavel/PR, estimada em 348.051 habitantes (IBGE, 2022), que direta ou indiretamente se beneficiará.

Representatividade do investimento para este OE: 6,96 %

- **OE 205: Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios**

Descrição:

Este OE é atingido pelo programa através das obras de mobilidade urbana pois um dos objetivos é redução tempo e garantir segurança para os deslocamentos entre regiões da cidade, viabilizando maior fluidez no trânsito permitindo maior acesso a empregos, serviços de saúde e de educação, e indiretamente, melhorando o fluxo também do transporte público, reduzindo exclusão urbana e promovendo a equidade social.

Componente relacionado: 2

Objetivo específico relacionado: 4

Indicadores relacionados: Indicador 8

Pessoas beneficiadas: Toda a população de Cascavel/PR, estimada em 348.051 habitantes (IBGE, 2022), que direta ou indiretamente se beneficiará.

Representatividade do investimento para este OE: 18,63%

- **OE 208: Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética**

Descrição:

Um dos subcomponentes do PRO CASCAVEL é justamente alinhado com esse OE, uma vez que o Município enfrenta muita contratação superdimensionada de energia da concessionária local além de possuir muitos equipamentos públicos o que gera um grande valor gasto anualmente com energia elétrica.

Diante desse cenário, o programa visa implantar sistemas fotovoltaicos em pontos estratégicos, em edificações públicas robustas com grandes áreas de telhado, para gerar energia renovável e contribuir para a segurança e eficiência energética do país.

Componente relacionado: 1

Objetivo específico relacionado: 2

Indicadores relacionados: Indicador 4, Indicador 5

Pessoas beneficiadas: Toda a população de Cascavel/PR, estimada em 348.051 habitantes (IBGE, 2022), que direta ou indiretamente se beneficiará.

Representatividade do investimento para este OE: 0,88%

- **OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades**

Descrição:

O PRO CASCAVEL visa qualificar a mobilidade urbana da cidade, especialmente com a ligação entre regiões e bairros populosos, segregados por rodovias ou por vias sem continuidade de interligação.

Portanto, o programa busca reduzir barreiras para o acesso de toda a população a todos os serviços básicos existentes bem como oportunidades de empregos em regiões mais distantes do local de moradia das pessoas através de deslocamentos mais rápidos e seguros, e indiretamente, na melhoria das rotas do transporte público.

Componente relacionado: 2

Objetivo específico relacionado: 4

Indicadores relacionados: Indicador 7, Indicador 8

Pessoas beneficiadas: Toda a população de Cascavel/PR, estimada em 348.051 habitantes (IBGE, 2022), que direta ou indiretamente se beneficiará.

Representatividade do investimento para este OE: 18,63%

2. 14. **Anexos**

ANEXO 11 - ALINHAMENTO OEs PPA UNIÃO

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O Município de Cascavel/PR, mutuário da operação, terá como o órgão executor do Programa de Revitalização e Obras de Cascavel – PRO Cascavel, a Secretaria da Casa Civil e o seu gerenciamento será realizado pela Unidade de Coordenação do Programa – UCP. O Município também contará com apoio de unidades organizacionais próprias da Administração Direta e de unidades da Administração Indireta, listadas abaixo, cuja estrutura, competências e incumbências constam na Lei nº 6792/2017 e alterações (ANEXO 24):

- SECRETARIA DA CASA CIVIL - no que tange ao PRO Cascavel, é a unidade administrativa que tem a incumbência de desenvolver as competências previstas no Art. 23 da Lei Municipal nº 6792/2017, sendo responsável pela gestão e execução do Programa com apoio das unidades operacionais próprias da Administração Direta e de unidades da Administração Indireta.
- SESOP (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) – no que tange ao PRO Cascavel, é a unidade administrativa que tem a incumbênica de desenvolver as competências previstas no Art. 35 da Lei Municipal nº 6792/2017, sendo responsável pela fiscalização/acompanhamento/supervisão das obras e elaboração/preparação da documentação necessária à realização das licitações dos empreendimentos alocados na Secretaria (administrativamente e operacionalmente) em consonância com o estabelecido. Devendo repassar os documentos e informações à UCP, para registro no Programa.

- SEMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) - no que tange ao PRO Cascavel, é a unidade administrativa que tem a incumbênica de desenvolver as competências previstas no Art. 31 da Lei Municipal nº 6792/2017, cabendo a unidade a elaboração/preparação da documentação necessária à realização das licitações dos empreendimentos alocados na Secretaria (administrativamente e operacionalmente) em consonância com o estabelecido, em especial a gestão das licenças ambientais. Devendo repassar os documentos e informações à UCP, para registro no Programa.

- SEPLAG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão) – no que tange ao PRO Cascavel, é a unidade administrativa que tem a incumbênica de desenvolver as competências previstas no Art. 17 da Lei Municipal nº 6792/2017, tendo as atribuições relativas à elaboração/preparação da documentação necessária à realização das desapropriações que forem necessárias para a execução das obras do PRO Cascavel, bem como executar os trâmites necessários às licitações dos empreendimentos elencados no Programa, em consonância com o estabelecido. Devendo repassar os documentos e informações à UCP, para registro no Programa.

- PGM (Procuradoria Geral do Município) - no que tange ao PRO Cascavel, unidade administrativa responsável por exercer a representação judicial do Município e desenvolverá as competências previstas no Art. 15 da Lei Municipal nº 6792/2017, incluindo-se os pareceres em processos licitatórios e os referentes aos contratos administrativos firmados no âmbito do Programa. Devendo repassar os documentos e informações à UCP, para registro no Programa, quando não estiverem contemplados nos processos.

- SEFIN (Secretaria Municipal de Finanças) - no que tange ao PRO Cascavel, unidade administrativa responsável por desenvolver as competências previstas no Art. 19 da Lei Municipal nº 6792/2017, no que couber em consonância com o estabelecido. Devendo repassar os documentos e informações à UCP, para registro no Programa.

- GABINETE DO PREFEITO - no que tange ao PRO Cascavel, responsável por desenvolver as competências previstas no Art. 9 da Lei Municipal nº 6792/2017.

- IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) – no que tange ao PRO Cascavel, unidade da Administração Indireta responsável pela elaboração dos projetos básicos e executivos, incluindo as alterações se necessário, apoio na elaboração dos termos de referência, se solicitado e apoio nos processos de desapropriações, se necessário.

As unidades organizacionais próprias da Administração Direta, constantes no ANEXO 13, atuarão diretamente no PRO Cascavel.

Gerenciamento do Programa:

As atividades próprias do gerenciamento geral do Programa estarão a cargo da Unidade de Coordenação do Programa (UCP), por um período de cinco anos, que será subordinada a Secretaria da Casa Civil, a ser criada no âmbito institucional por meio de ato próprio do executivo municipal via decreto, cujas atividades serão descritas no próprio decreto que conterá, entre outras informações ou instruções, os termos, às condições e os procedimentos para a execução dessas funções;

A finalidade da UCP é de assegurar que as ações do Programa sejam desenvolvidas na forma estabelecida no contrato de empréstimo a ser celebrado com o organismo financiador. De forma mais específica, a UCP tem por objetivo planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados (efeitos e impactos) intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos e principalmente dos objetivos e metas do empreendimento em conjunto com as atribuições/competências dos demais órgãos da administração municipal, dando apoio na elaboração/execução nas diversas atividades para cumprimento das ações do PRO Cascavel.

- Objetivos e responsabilidade:

A estrutura organizacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) descrita a seguir, tem como objetivo atender à preparação e coordenação do Programa de Revitalização e Obras de Cascavel – PRO Cascavel, em conformidade com as políticas do organismo financiador e os rituais administrativos do Município de Cascavel.

O objetivo específico da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) é coordenar, gerir e acompanhar operacionalmente e financeiramente a execução do Programa e será composta por profissionais técnicos com conhecimentos precípuos das áreas afins.

- Competência da UCP:

A Unidade de Coordenação do Programa (UCP) será a responsável pela implementação e acompanhamento do Programa, constituída pelas seguintes competências:

I Coordenar, administrar, acompanhar e avaliar permanentemente as ações do Programa;

II Representar o Mutuário junto a CAF, bem como junto aos órgãos de controle interno, às auditorias da CAF e ao órgão responsável pelas auditorias do Programa;

III Elaborar e encaminhar a CAF o Plano Operacional Anual (POA) e o Plano de Aquisições (PA), nos prazos estipulados contratualmente;

IV Coordenar e acompanhar o processo técnico de preparação, análise e aprovação dos projetos setoriais e suas atualizações, quando for o caso;

V Apoiar a preparação dos processos licitatórios no âmbito do Programa e acompanhar os processos;

VI Elaborar e encaminhar as propostas orçamentárias anuais do Programa às áreas competentes;

VII Elaborar a programação financeira e solicitar a liberação de recursos da contrapartida local às áreas competentes;

VIII Elaborar e encaminhar a CAF as prestações de contas do Programa e as solicitações de liberação de desembolsos do financiamento;

IX Manter os registros financeiros e contábeis adequados que permitam identificar apropriadamente os recursos do empréstimo e de outras fontes do Programa; e

X Elaborar e encaminhar a CAF os Relatórios de Progresso, Demonstrativos Financeiros Anuais Auditados e demais documentos do Programa, segundo as disposições do respectivo Contrato de Empréstimo;

- Das áreas da Unidade de Coordenação do Programa – UCP

Para executar suas funções, a UCP será integrada por um Coordenador(a) Executivo(a) e por profissionais das seguintes áreas:

II – Jurídica;


III– Administrativa;

IV - Financeira;

V - Infraestrutura;

VI - Socioambiental.

ARRANJO INSTITUCIOANL - PRO Cascavel

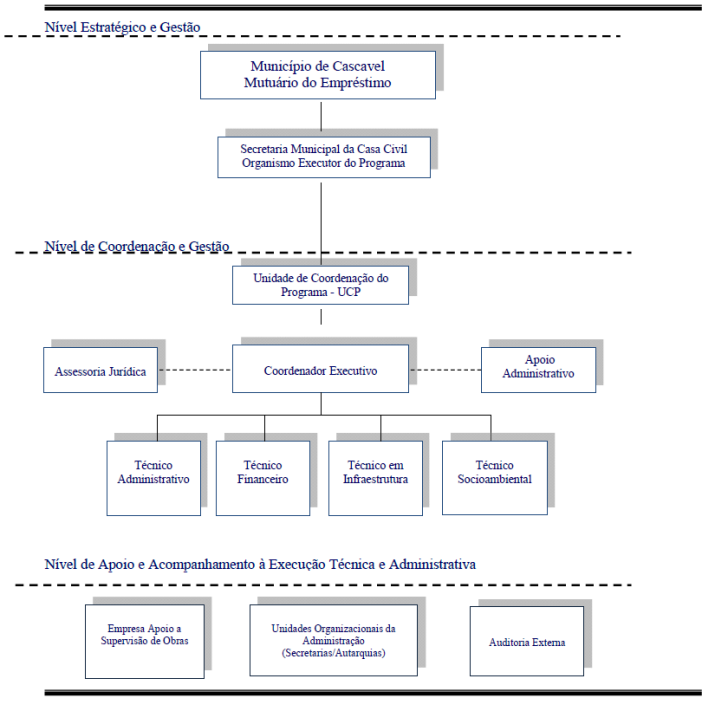

3. 1. 13. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal da Casa Civil, Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção – Secretaria da Casa Civil.
Órgãos parceiros:
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG
Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas – SESOP
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA
Procuradoria Geral do Município – PGM
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Instituto de Planejamento de Cascavel – IPC

3. 1. 14. **Estrutura Operacional:**

A estrutura operacional para acompanhamento e execução do Programa contará com equipe técnica experiente e capacitada, com a atuação principal da Secretaria Municipal da Casa Civil, Transparência, Prevenção e Combate a Corrupção – Secretaria da Casa Civil, responsável por coordenar os projetos estratégicos de governo, em conjunto com as secretarias envolvidas, contribuindo especialmente na fase de planejamento, supervisionando a fase de execução e efetivando a fase de avaliação, através da Unidade de Coordenação do Programa – UCP, que possui equipe técnica capacitada e experiente em gerenciamento de programas com financiamento externo desde 2013. Contará com apoio de unidades organizacionais próprias da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta, listadas abaixo:

A SEPLAG, responsável pelo planejamento operacional e a execução da política administrativa no que compreende prover os órgãos da Administração Direta Municipal de suporte administrativo nas áreas de gestão de pessoas, aquisições e suprimentos, desenvolvimento institucional, tecnologia da informação, e planejamento estratégico, orçamentário e captação de recursos, possui equipe técnica experiente e preparada para apoio a execução do Programa, cabendo destaque à Diretoria de Planejamento, Orçamento e Captação de Recursos com o acompanhamento de projetos estratégicos e a gestão de contratos, desde a elaboração do orçamento (PPA, LDO,

LOA), planejamento e gestão de projetos com foco na busca de melhores soluções e otimização de resultados e mobilização e gestão de recursos para os programas governamentais do município. Através da Diretoria de Gestão de Aquisições Públicas, possui equipe técnica capacitada para gerir e controlar os processos de aquisições públicas, em conformidade com a legislação vigente e através da Divisão de Gestão do Patrimônio Municipal, em conjunto com o IPC, conduzir os processos de desapropriações.

A SESOP (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) possui equipe técnica especializada (engenheiros e arquitetos), sendo responsável pela fiscalização/acompanhamento/supervisão das obras.

A SEMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) possui equipe técnica especializada (engenheiro químico, engenheiro ambiental e engenheiro florestal) responsável por realizar ações administrativas de licenciamento ambiental, florestal e de fiscalização ambiental de atividades, empreendimentos e obras.

O IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) – possui equipe técnica especializada (arquitetos, engenheiros) responsável pela elaboração dos projetos básicos e executivos, incluindo as alterações se necessário, apoio na elaboração dos termos de referência e apoio nos processos de desapropriações.

Nesse contexto, é válido destacar que o município possui o Selo CAIXA Gestão Sustentável desde 2023, com certificação no nível Safira (ANEXO 23), uma iniciativa nacional que reconhece os municípios que se destacam na aplicação de boas práticas de Governança, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental (ESG) na administração pública local.

Para fins de demonstrar a experiência do Município na elaboração de pleitos e condução de instrumentos de repasse financeiro junto ao Governo Federal, elenca-se a seguir as principais informações desta seara, referente ao período compreendido entre 2020 e 2025: 120 propostas de emendas parlamentares, cadastradas no Transfere.gov, que totalizam o valor de R$ 64.998.032,32, nas áreas de saúde, educação, esportes, agricultura, assistência social e infraestrutura.

36 propostas cadastradas no PAC 2023 a 2025, que totalizam o valor de R$ 248.143.063,97, das quais 20 são da área de Saúde (R$100.314.829,70), 8 de Educação (R$ 37.411.676,03), 3 de Esporte/Lazer (R$ 4.500.000,00) e 4 de Infraestrutura (R$ 105.926.558,24). Dentre essas, destaca-se ainda que 16 estão habilitadas, 14 selecionadas e 3 enviadas para análise, sendo que 3 não foram habilitadas.

Em relação a pleitos e instrumentos firmados junto ao Governo do Estado do Paraná, destaca-se o montante que totalizou R$129.574.951,81 entre 2020 e 2025.

Em relação a pleitos com recursos de financiamento externo, destaca-se o montante de US$28.750 milhões junto ao BID (2013 a 2019) e US$27.500 milhões junto ao FONPLATA (2022 a 2027).

Ademais, declaramos que não haverá repasse de recursos entre órgãos participantes.

3. 1. 15. **Matriz de Responsabilidade:**

ANEXO 13 - MATRIZ RACI - PRO Cascavel.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Durante a execução do programa, a UCP fará o acompanhamento da operacionalização das ações previstas, em conjunto com as secretarias e órgãos da administração Municipal, a fim de garantir o cumprimento de prazos, custos e padrões de qualidade esperados. Concluída a implementação das atividades do Programa, os diversos órgãos da administração Municipal, conforme atribuição inerente a cada uma, serão responsáveis pela gestão e manutenção das obras/ações executadas e os custos pós-projeto serão incorporados ao orçamento anual com previsibilidade e segurança, preservando a responsabilidade fiscal e a qualidade dos serviços públicos.

Para isso, as despesas serão incluídas no PPA Municipal, detalhando metas e limites na LDO e alocação de dotações na LOA, com a devida vinculação por fonte de recurso, categoria econômica e elemento de despesa, com definição das Secretarias e órgãos responsáveis pela execução e acompanhamento de cada componente dos custos.

A continuidade operacional será garantida por manutenção dos espaços, com definição de níveis de serviços claros, cronogramas de manutenção preventiva e corretiva, suporte e atualizações quando aplicável e gestão de insumos, incluindo aquisições de materiais e serviços necessários para operacionalização e manutenção.

As contratações, quando necessárias, observarão a Lei Federal 14.133/2021, com previsibilidade contratual assegurada por: definição no edital/contrato de vigência, hipóteses de prorrogação, critérios de reajuste, revisão e,

quando couber, repactuação; matriz de riscos; e cronograma físico-financeiro.

Os custos anuais de operação e manutenção pós-projeto foram estimados considerando a manutenção da qualidade e longevidade das obras, bem como a operacionalização dos serviços e aquisição dos insumos/serviços necessários.

A previsão de custos de operação e manutenção (anual), por componente (C) é:

A previsão de custos de operação e manutenção (anual), por componente (C) é:

(C) 1 – Sustentabilidade: $1.200.00,00

(C) 2 – Infraestrutura urbana: $200.000,00

(C) 3 – Gestão do programa: $70.000,00

Moeda: Dólar (USD)

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Os projetos apresentados encontram-se devidamente previstos e alinhados aos instrumentos formais de planejamento do Município, especialmente quanto ao Plano Plurianual – PPA 2026–2029, instituído pela Lei nº 7.820/2025 (ANEXO 03), contemplando seus programas, objetivos, metas e alinhamento aos ODS. Além disso, os projetos estão em consonância com o:

- Plano de Governo 2025–2028 (ANEXO 02);
- Objetivos Estratégicos da Gestão Municipal (ANEXO 04);
- Plano Diretor, instituído pela Lei Complementar nº 91/2017 (ANEXO 05);
- Plano de ações e investimentos – PAI (ANEXO 06); e
- Plano de Mobilidade Urbana, instituído pela Lei nº 7.657/2024 (ANEXOS 07, 08, 09).

A seguir, apresenta-se o detalhamento dos projetos por eixo estratégico, conforme descrito na Matriz de Componentes (ANEXO 10), indicando o alinhamento de cada projeto aos respectivos instrumentos de planejamento:

Componente SUSTENTABILIDADE: Subcomponente Meio Ambiente

- PPA: Programa 023 – Cascavel: uma cidade limpa, melhor e mais sustentável.
- Plano de Governo: Parques Ambientais; Território Verde; Projeto Território Verde. Objetivos Estratégicos: nº 44 e nº 45.
- Plano Diretor: Art. 59, incisos II, XI
- PAI: E2.003; E2.002; 4. Criar o Jardim Botânico, revitalizando o Parque Ecológico Paulo Gorski e seus acessos.

Componente SUSTENTABILIDADE: Subcomponente Energias Renováveis

- PPA: Programa 023 – Cascavel: uma cidade limpa, melhor e mais sustentável.
- Plano de Governo: Usina Fotovoltaica; Zero Energy; Programa Escola Sustentável; Unidades de Saúde mais Sustentáveis; Cascavel Smart City. Objetivo Estratégico: nº 43.

Componente INFRAESTRUTURA URBANA: Componente Drenagem Urbana

- PPA: Programa 0031 – Programa de Aumento da Infraestrutura Urbana.
- Plano de Governo: Microdrenagem e Impermeabilização do Solo.
  Objetivo Estratégico: nº 58.

Componente INFRAESTRUTURA URBANA: Componente Mobilidade Urbana

- PPA: Programa 0031 – Programa de Aumento da Infraestrutura Urbana.
- Plano de Governo: Transposição da Avenida Corbélia; Expansão da Avenida das Torres; Transposição São Gabriel.
  Objetivo Estratégico: nº 58.
- Plano de Mobilidade: Obras 12, 19, 20, 21, 24, 30, 33, 34

3. 20. **Anexos**

ANEXO 23 - SELO CAIXA GESTÃO SUSTENTÁVEL NÍVEL SAFIRA

ANEXO 09 - PLANO DE OBRAS - PLANO DE MOBILIDADE

ANEXO 10 - MATRIZ COMPONENTES E CRONOGRAMA CASCAVEL

ANEXO 02 - PLANO DE GOVERNO 2025-2028 - segmentado

ANEXO 03 - PPA 2026-2029 - segmentado

ANEXO 04 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO MUNICIPAL - segmentado

ANEXO 05 - PLANO DIRETOR DE CASCAVEL - LEI COMPLEMENTAR 91-2017

ANEXO 06 - PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS DO PLANO DIRETOR

ANEXO 07 - PLANO DE MOBILIDADE - LEI 7657-2024

ANEXO 08 - MAPA DO PLANO DE OBRAS - PLANO DE MOBILIDADE

ANEXO 24 - Lei 6792-2017 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MUNICIPIO

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

Nome: Atraso nas desapropriações
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A ampliação do parque Vitória com recuperação e proteção de áreas de preservação permanente existentes e a implantação de binário entre as ruas Manaus e Belém, com o prolongamento da rua Belém sobre área verde e afluente do Rio das Antas podem demandar processos de desapropriação. Há o risco de atrasos ou judicialização desses processos, podendo causar aumento de custos e significativo atraso na execução das obras.

Prevenção e Mitigação:

- Planejamento antecipado: Realizar levantamento detalhado nas áreas de implantação das obras e antecipar os processos de desapropriação.
- Assessoria técnica/jurídica especializada: Contar com equipe técnica e jurídica dedicada para condução dos processos de desapropriação e eventuais litígios, assegurando a conformidade legal e minimizando impasses.
- Previsão orçamentária específica: Assegurar dotação orçamentária suficiente e dedicada para as indenizações, evitando atrasos por falta de recursos.

4. 5. **Informações do 2° risco:**

Nome: Risco de atrasos em licenciamentos e autorizações ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O processo de licenciamento ambiental é inerente a diversas obras e intervenções do Programa (especialmente aquelas que envolvem a implantação de parques ambientais com recuperação de APPs, obras de macrodrenagem e de transposição de corpo hídrico). A complexidade dos trâmites, a necessidade de licenças e autorizações e a capacidade de análise dos órgãos ambientais podem gerar atrasos significativos na obtenção das permissões, impactando o cronograma físico-financeiro do projeto.

Prevenção e Mitigação:

- Planejamento e antecipação: Elaborar projetos e estudos ambientais para iniciar os processos de licenciamento com a máxima antecedência possível, garantindo tempo hábil para todas as etapas de análise e tramitação sem comprometer o cronograma físico das intervenções.
- Equipe especializada e multidisciplinar: Contar com equipe técnica multidisciplinar e/ou consultoria especializada para a elaboração de estudos, cumprimento de exigências e acompanhamento contínuo dos processos junto aos órgãos ambientais.
- Estudos ambientais robustos: Elaborar estudos e planos ambientais detalhados e de alta qualidade,minimizando a necessidade de complementações e retrabalhos, e garantindo a conformidade com a legislação.
- Articulação contínua: Manter comunicação constante e estratégica com os órgãos ambientais competentes para esclarecimento de dúvidas, alinhamento de expectativas e celeridade de análises.
- Previsão orçamentária: Assegurar a previsão de recursos nos cronogramas físico-financeiros para eventuais condicionantes ambientais.

4. 11. **Informações do 3° risco:**

Nome: Falta de articulação entre partes interessadas e continuidade política
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Desalinhamento entre secretarias municipais, falta de apoio legislativo ou popular, ou mudanças administrativas no governo municipal podem afetar a continuidade e a efetivação do programa, comprometendo seus resultados de longo prazo.

Prevenção e Mitigação:

-

Formalização e institucionalização do Programa: Assegurar que o programa esteja formalizado em planos estratégicos de longo prazo, incluindo o PPA Municipal, e buscar apoio legislativo amplo e transversal para garantir sua perenidade.

- Efetivação da Matriz de Responsabilidades: Observar as atribuições definidas na Matriz de Responsabilidades, com rotinas de comunicação contínuas e reuniões periódicas entre os envolvidos para garantir a execução das ações nos prazos estabelecidos. A Unidade de Coordenação do Programa (UCP) desempenhará um papel central nesta coordenação.

- Coordenação institucional: A UCP deverá manter uma rotina de diálogo constante e coordenação eficaz entre os órgãos e parceiros envolvidos, garantindo a eficácia na execução das ações e a resolução proativa de conflitos.

- Apoio da liderança política: Garantir o apoio e acompanhamento contínuo da alta liderança política municipal para celeridade nas decisões e resolução eficiente de problemas.

4. 16. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	57.927.200,00	72.409.000,00	72.409.000,00	14.481.800,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado.
Comissão de Avaliação:
USD$50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento

Outras Informações:

-

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Sustentabilidade					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
432.000,00	108.000,00	2.867.280,00	716.820,00	5.045.520,00	1.261.380,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.620.000,00	1.155.000,00	3.780.000,00	945.000,00		

Nome do componente					
Infraestrutura Urbana					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.251.920,00	1.062.980,00	9.617.880,00	2.404.470,00	13.174.840,00	3.293.710,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.325.280,00	1.581.320,00	5.408.480,00	1.352.120,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
507.000,00	126.750,00	527.000,00	131.750,00	527.000,00	131.750,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
527.000,00	131.750,00	316.000,00	79.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas à Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anexos**

Carta Anuência CAF

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Determinados projetos das intervenções previstas encontram-se em níveis diferentes de planejamento, conforme consta no ANEXO 14 e listados abaixo:

- (P) 1.1.5 - Implantação do Território Verde FASE II: Restaurante e Palco do Lago

PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO (ANEXOS: 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G E 16H)

ANEXO 16 C - 03 ARQUITETONICO TERRITORIO VERDE RESTAURANTE

ANEXO 16 D - 04 ARQUITETONICO TERRITORIO VERDE RESTAURANTE

ANEXO 16 E - 05 ARQUITETONICO TERRITORIO VERDE RESTAURANTE

ANEXO 16 F - 06 ARQUITETONICO TERRITORIO VERDE RESTAURANTE

ANEXO 16 G - 07 ARQUITETONICO TERRITORIO VERDE RESTAURANTE

ANEXO 16 H - 08 ARQUITETONICO TERRITORIO VERDE PALCO

- (P) 2.1.2 - Execução de macrodrenagem na Rua Vitória

ESTUDO PRELIMINAR (ANEXO 18)

ANEXO 18 - MACRODRENAGEM RUA VITORIA

- (P) 2.1.3 - Execução de emissários Av. Carlos Gomes - Parque Tarquínio

PROJETOS EXECUTIVOS (ANEXOS: 20A E 20B)

ANEXO 20 A - 01 MACRODRENAGEM TARQUINIO

ANEXO 20 B - 02 MACRODRENAGEM TARQUINIO

- (P) 2.2.3 - Reestruturação e transposição da Av. Corbélia sobre a BR 467

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE PROJETOS (ANEXO 21)

- (P) 2.2.8 - Implantação do Binário Jacarezinho/São Gabriel com transposição sobre a BR 467

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE PROJETOS (ANEXO 21)

ANEXO 21 - EDITAL PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PROJETOS

6. 7. Anexos

ANEXO 14 - ETAPAS REALIZADAS PRO CASCAVEL

ANEXO 16 A - 01 ARQUITETONICO TERRITORIO VERDE RESTAURANTE

ANEXO 16 B - 02 ARQUITETONICO TERRITORIO VERDE RESTAURANTE
