PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável - Vida Nova no Morro Niterói/RJ

Proponente: Município de Niterói - RJ
Processo SEI: 03101.000989/2025-78
Código do pleito: 3852640862/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 04
1. 2. 3. Soluções 08
1. 2. 4. Resultados 09
1. 3. Objetivo 11
1. 4. Indicadores 14
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 14
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 15
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 17
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 18
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 19
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 21
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 23
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 25
1. 5. Componentes 27
1. 5. 1. Informações do 1° componente 27
1. 5. 2. Informações do 2° componente 29
1. 5. 3. Informações do 3° componente 31
1. 5. 4. Informações do 4° componente 33
1. 5. 5. Informações do 5° componente 35
1. 6. Beneficiários 36
1. 7. Anexos 37
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 38
2. 1. Áreas estratégicas 38
2. 2. Anexos 40
3. GESTÃO 41
3. 1. Arranjo institucional 41
3. 1. 1. Descrição 41
3. 1. 2. Orgãos Executores 42
3. 1. 3. Estrutura Operacional 43
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 43
3. 2. Operacionalização e Manutenção 43
3. 3. Planejamento Estratégico 45
3. 4. Anexos 46
4. RISCOS 47
4. 1. Informações do 1° risco 47
4. 2. Informações do 2° risco 47
4. 3. Informações do 3° risco 47
4. 4. Informações do 4° risco 47
4. 5. Informações do 5° risco 48
4. 6. Informações do 6° risco 48
4. 7. Informações do 7° risco 48
4. 8. Informações do 8° risco 48
4. 9. Informações do 9° risco 49
4. 10. Anexos 49
5. FINANCIAMENTO 50

5. 1. Condições Financeiras da Operação 50
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 50
5. 2. Cronograma de Desembolso 52
5. 3. Contragarantias 53
5. 4. Anexos 53
6. ETAPAS REALIZADAS 54
6. 1. Etapas realizadas 54
6. 2. Anexos 55
7. CONTATOS 56
7. 1. Contatos 56
7. 2. Anexos 57
8. Baixar todos os anexos 58

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável - Vida Nova no Morro Niterói/RJ
Sigla: PVNM
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Niterói - RJ

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O **Programa Vida Nova no Morro (PVNM)** é uma ação integrada e territorializada em resposta aos principais desafios enfrentados pelas comunidades e favelas de Niterói. O Programa se propõe a atuar por meio da **requalificação urbana e habitacional, da inclusão socioeconômica e territorial, do fortalecimento comunitário e do aprimoramento da capacidade institucional**.

Contexto Social:

Niterói é uma cidade de médio porte, situada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com população de 481.749 habitantes (IBGE, 2022). Da década de 1970 para 2020, Niterói apresentou um salto populacional de 200 mil habitantes (IBGE 2010).

A cidade destaca-se pelo elevado Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), sendo o maior do estado do Rio de Janeiro (0,837) e o sétimo do Brasil (Ranking do IDHM base PnadC-IBGE, 2012-2021). O IDHM avalia indicadores de educação, longevidade e renda. Apesar disso, cerca de **18% da população reside em comunidades e favelas**, totalizando aproximadamente 86.983 pessoas, esse valor representa mais que o dobro do que é apresentado na realidade brasileira (8,1%). Essa população é na sua maioria de mulheres (52,6%), das quais 72,7% se identificam como pretas ou pardas, e expressiva presença de crianças e jovens: 44% têm até 29 anos (IBGE, 2022).

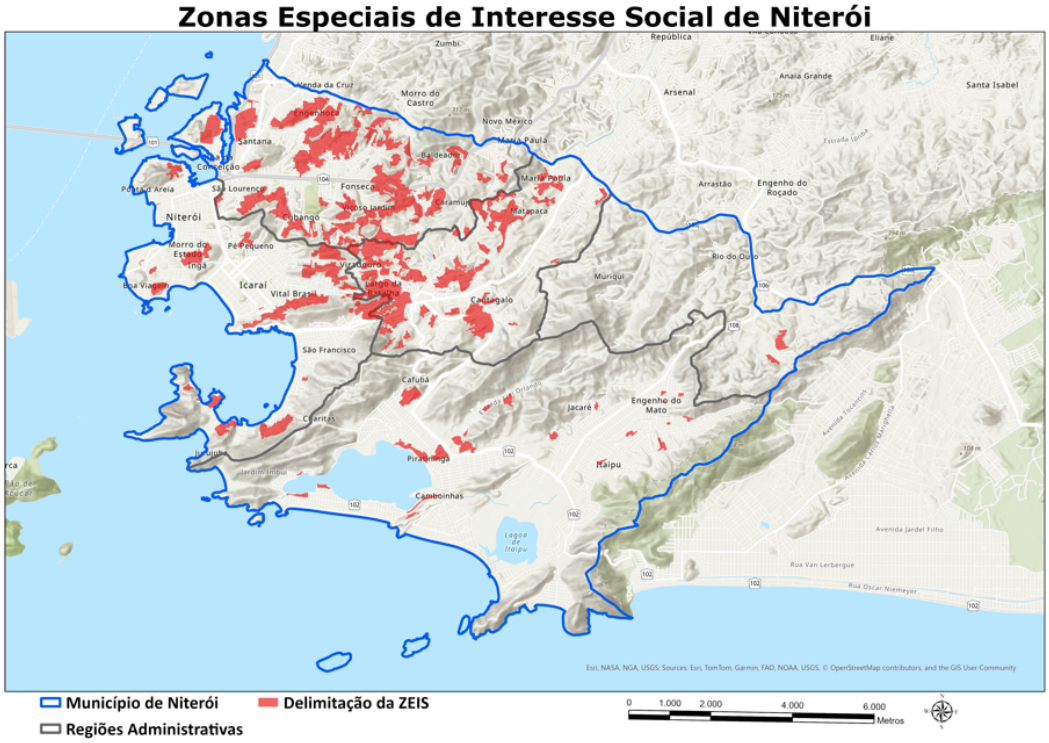


Figura 1: Mapa de ZEIS de Niterói, onde as comunidades e favelas estão inseridas.

Fonte: Dados da Lei Urbanística de Niterói, 2024

Contexto Econômico:

Niterói possui o terceiro maior PIB (R$ 46.553.203) e o sétimo maior PIB per capita no estado (R$ 90.643,80) (IBGE, 2019).

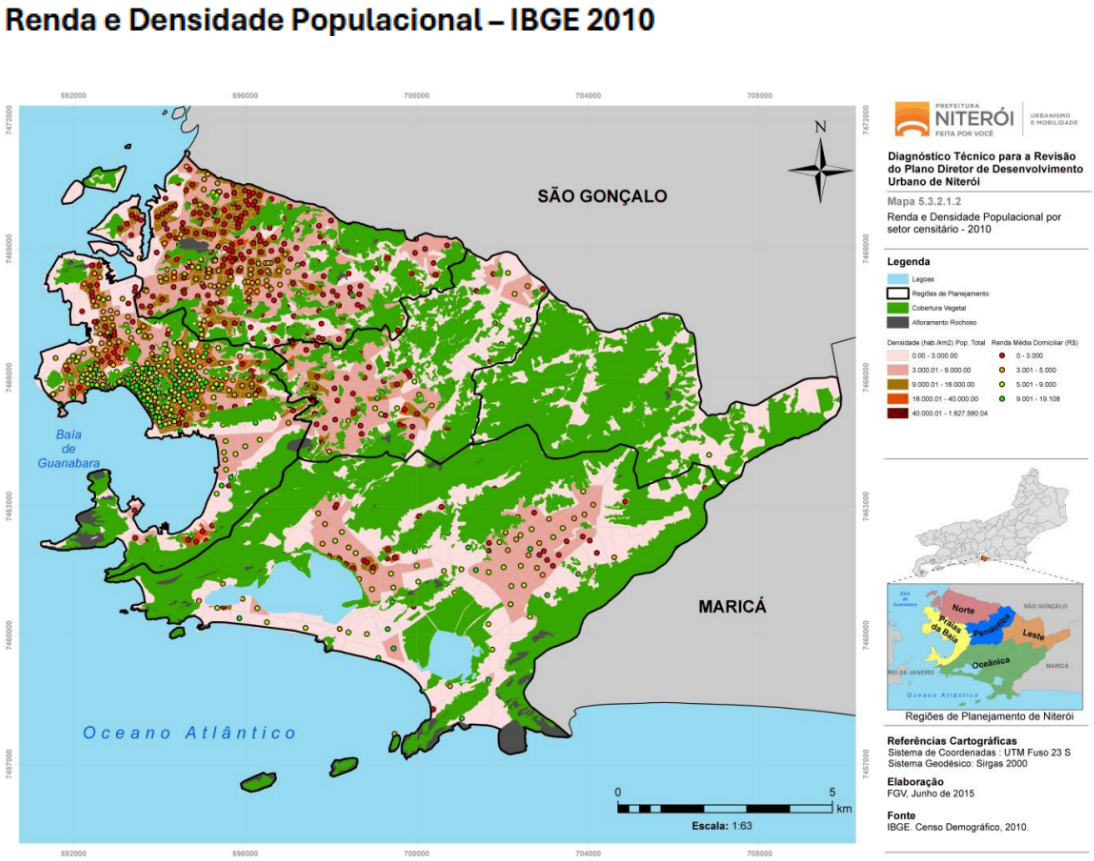


Figura 1: Renda e Densidade Populacional – IBGE 2010

Fonte: Diagnóstico FGV, 2015

Por outro lado, o Mapa de rendimento domiciliar per capita (FGV, 2015) e o Índice Gini (0,598) demonstram a **desigualdade no município** (FUNDAÇÃO CEPERJ, 2019). Este índice aponta a concentração de renda em determinado grupo, e avalia a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos em determinado local. O valor varia de zero a um, e quanto menor o índice, menos igualitária a sociedade analisada.

Em relação ao **trabalho e renda**, Dados do Cadastro Único (2025) indicam que mais de 64 mil famílias vivem com renda de até um salário-mínimo, e somente 43% das famílias cadastradas possuem pelo menos uma pessoa empregada. Em 2021, o salário médio mensal era de 3,1 salários-mínimos, e a população ocupada representava um percentual de 37,7% em relação à população total (IBGE, 2021). Por outro lado, segundo dados do Censo do IBGE de 2010, 29,5% da população vive em domicílios com rendimentos mensais per capita de até meio salário-mínimo por pessoa (IBGE, 2010), reforçando a desigualdade apontada pelo Índice de Gini.

Conforme a pesquisa “A Incidência do Racismo sobre a Empregabilidade da Juventude em Niterói e São Gonçalo”, em 2019 32,7% dos jovens, entre 15 e 29 anos, estavam desempregados no município, sendo grande a oferta de vagas com exigências de nível superior. Segundo a reportagem, a cidade tem elevada **segregação racial**: 48% de jovens autodeclarados pretos estavam em busca de inserção no mercado de trabalho. Além disso, mulheres pretas são a única parcela da população do município que apresenta a taxa de desemprego (53%) maior que a taxa de emprego (47%) (QUAL PERFIL?, 2019).

Contexto Político-Institucional:

A gestão pública de **Niterói tem avançado significativamente na construção de instrumentos de planejamento e governança urbana**, com um conjunto integrado de marcos regulatórios, como o Plano Diretor Municipal (Lei nº 3.385 de 2019), a Lei Urbanística (Lei nº 3.905 de 2024), o Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência à Mudança do Clima (2023), o Plano de Contingência Verão da Defesa Civil (2024-2025) e o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (2012). Esses documentos orientam políticas com foco em sustentabilidade, resiliência, inclusão e justiça territorial.

Além disso, o município estruturou um plano estratégico de longo prazo, o “Niterói Que Queremos – Visão 2033”, que estabelece metas compatíveis com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Nova Agenda Urbana da ONU e os Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual Federal (PPA 2024–2027). Segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (2024), que mede o desempenho das cidades para atingir os ODS, Niterói tem pontuação de 58,40 de 100 e evidência como maiores desafios os objetivos:

- 5. Igualdade e Gênero;

- 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura;

-10. Reduzir Desigualdades;

- 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis.



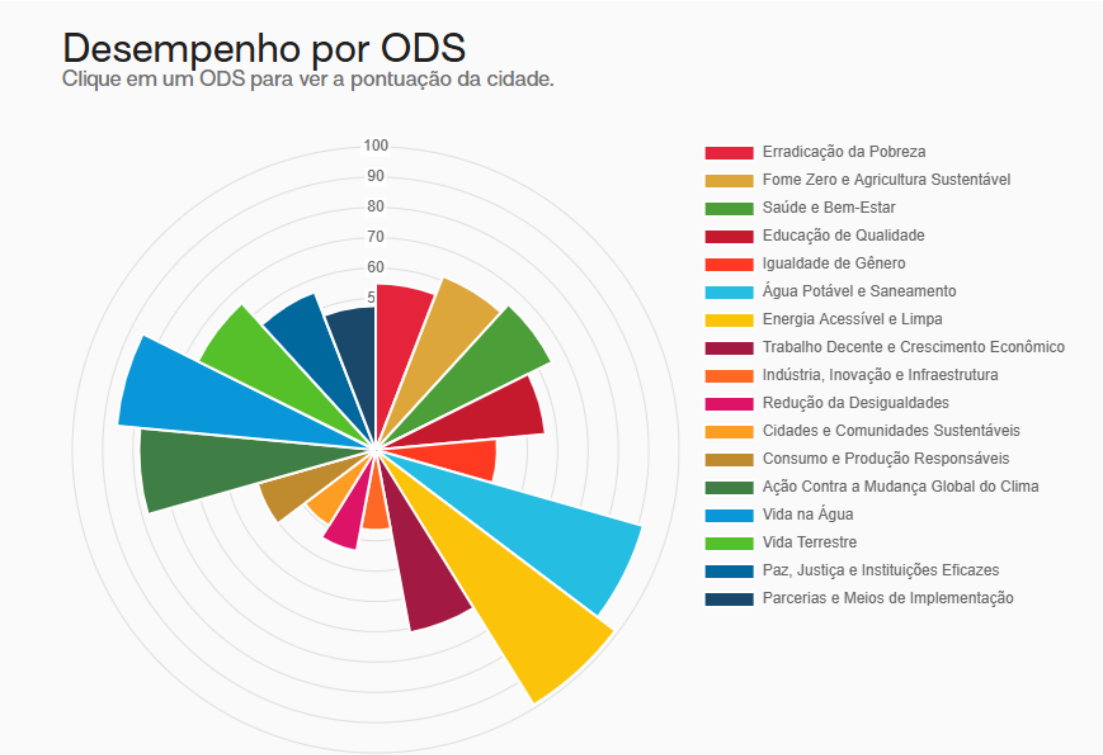


Figura 2: Painel do IDSC (Geral) e Desempenho por ODS do Município de Niterói

Fonte: https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/3303302/

Análise Situacional:

As comunidades enfrentam um acúmulo de vulnerabilidades: moradias precárias e inadequadas, carência de infraestrutura urbana, falta de espaços públicos adequados e ausência de apoio técnico especializado. Nesse cenário, o PVNM propõe uma **intervenção transversal e transformadora**, centrada na **requalificação dos territórios, promoção da dignidade habitacional, estímulo à inclusão econômica e fortalecimento das capacidades comunitárias e institucionais**. Ao reconhecer os territórios populares como espaços de potência, cultura e identidade, o programa posiciona-se como uma política pública inovadora, com alto potencial de replicação e impacto estrutural na cidade de Niterói.

1. 2. 2. **Problema:**

O **Programa Vida Nova no Morro (PVNM)** foi concebido para enfrentar um conjunto de **problemas estruturais** que afetam diretamente a qualidade de vida e os direitos da população residente em comunidades e favelas de Niterói. Esses problemas são multidimensionais, têm causas históricas e institucionais, e geram **consequências graves em termos de vulnerabilidade social, ambiental e urbana**.

Problemas e necessidades:

1. Desigualdade sociais, econômicas, de gênero e de raça.

A cidade de Niterói possui **expressivos contrastes socioeconômicos**. Embora o município possua IDHM e PIBs per capita com índices elevados quando comparados a outras cidades, mais de 64 mil famílias ainda vivem com renda de até um salário-mínimo (Cadastro Único, 2025).

As **desigualdades econômicas** refletem no acesso da população de menor renda a direitos fundamentais como moradia, educação, trabalho, cultura e lazer, aprofundando ciclos de pobreza e exclusão social. Esses desafios se agravam diante da sobreposição de vulnerabilidades associadas a gênero, raça, idade, classe e deficiência. Assim, se faz necessário que as políticas públicas atuem transversalmente, abordando não só a infraestrutura urbana e

habitacional, mas também a inclusão social e econômica integralmente.

2. Vulnerabilidade habitacional e déficit qualitativo de moradias

As desigualdades socioeconômicas são observadas também no acesso à moradia digna. No município de Niterói, em todo seu território, existem, segundo o Observatório do Cadastro Único (2023):

- 1.407 domicílios improvisados;

- 553 com piso de terra;

- 23.233 construções de alvenaria sem revestimento.

Tais dados indicam que um **número significativo de moradores vive em situação de inadequação e precariedade habitacional**, expostos a riscos físicos, sanitários e ambientais, como infiltrações, insalubridade, isolamento térmico inadequado e maior suscetibilidade a desastres climáticos.

3. Infraestrutura urbana incompleta

Nas comunidades e favelas de Niterói, dados do Censo do IBGE de 2022 mostram que 77,9% dos domicílios nas comunidades possuem esgotamento sanitário conectado à rede, 95,3% têm acesso à água canalizada e 87,8% têm coleta de lixo regular. Com cobertura inferior ao restante da cidade, esses sistemas, nas comunidades, enfrentam **limitações técnicas e operacionais que dificultam a universalização dos serviços**. Efluentes acabam sendo lançados diretamente na rede de drenagem, comprometendo a qualidade do tratamento e amplificando os impactos ambientais.

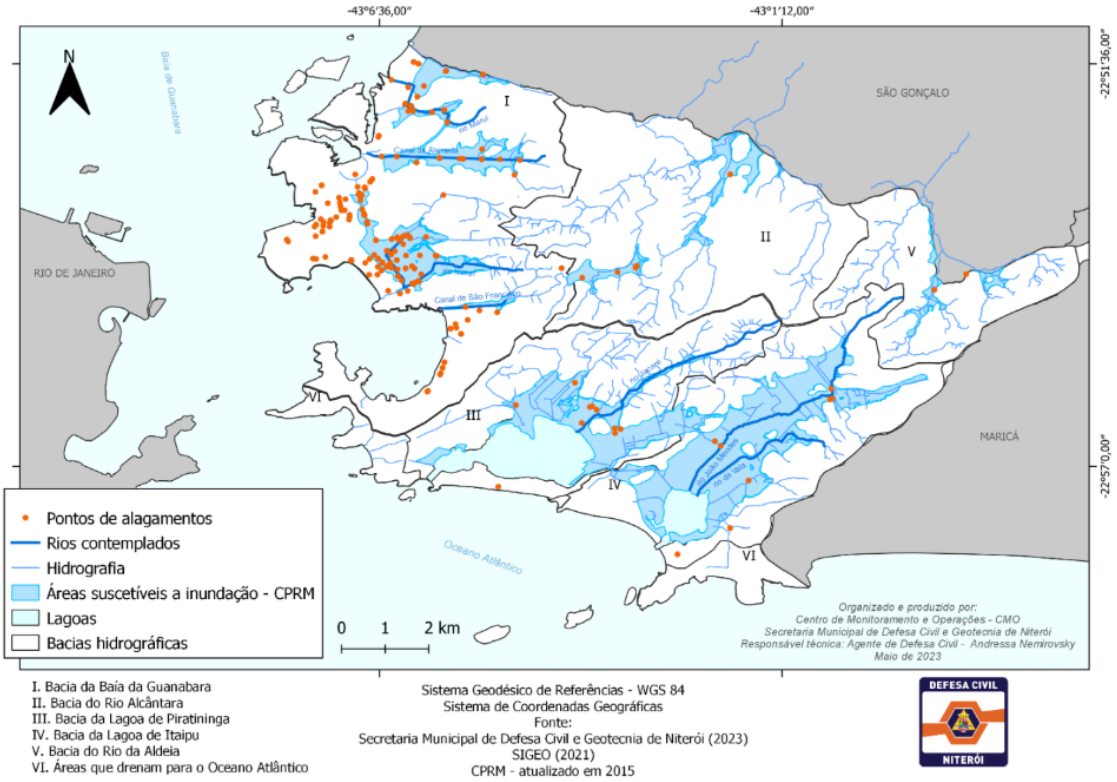


Figura 3: Mapa de alagamentos de Niterói registrados entre 2019 e 2023.

Fonte: Defesa Civil

Essas comunidades ainda contam com **trechos de ruas não pavimentadas, escadarias inseguras e falta de espaços públicos qualificados**. A ausência de soluções como micro drenagem, contenção de encostas e reflorestamento urbano comprometem a resiliência dos territórios, expondo as populações a riscos climáticos e ambientais.

4. Presença de população em áreas de risco geo-hidrológico

De acordo com levantamento realizado pela Casa Civil, 33.822 pessoas vivem em áreas de risco geohidrológico, mapeadas como suscetíveis a deslizamentos e enxurradas (2022). Em áreas de comunidade e favelas, a ocupação desordenada, a supressão da vegetação e a ausência de obras de contenção agravam a **exposição a desastres climáticos**.

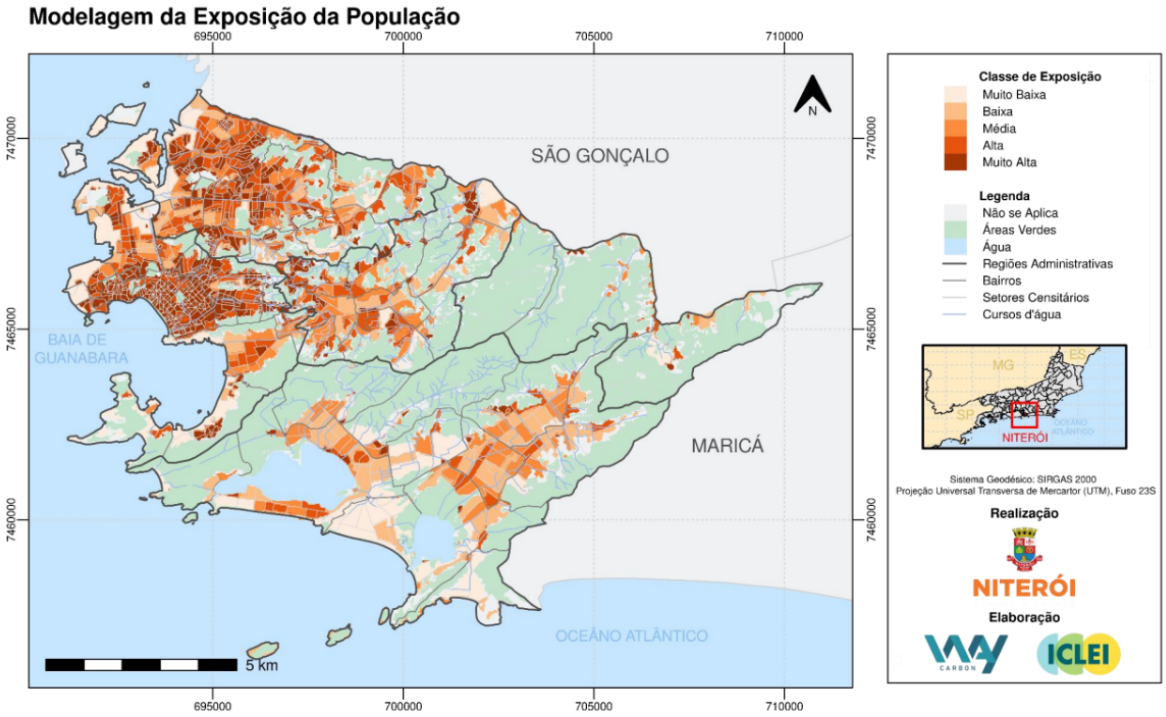


Figura 4: Modelagem da exposição da população no município de Niterói.

Fonte: Consórcio WayCarbon & ICLEI.

Esses riscos foram evidenciados em eventos como o **deslizamento no Morro do Bumba**, em 2010 e na comunidade **Boa Esperança**, em 2018.

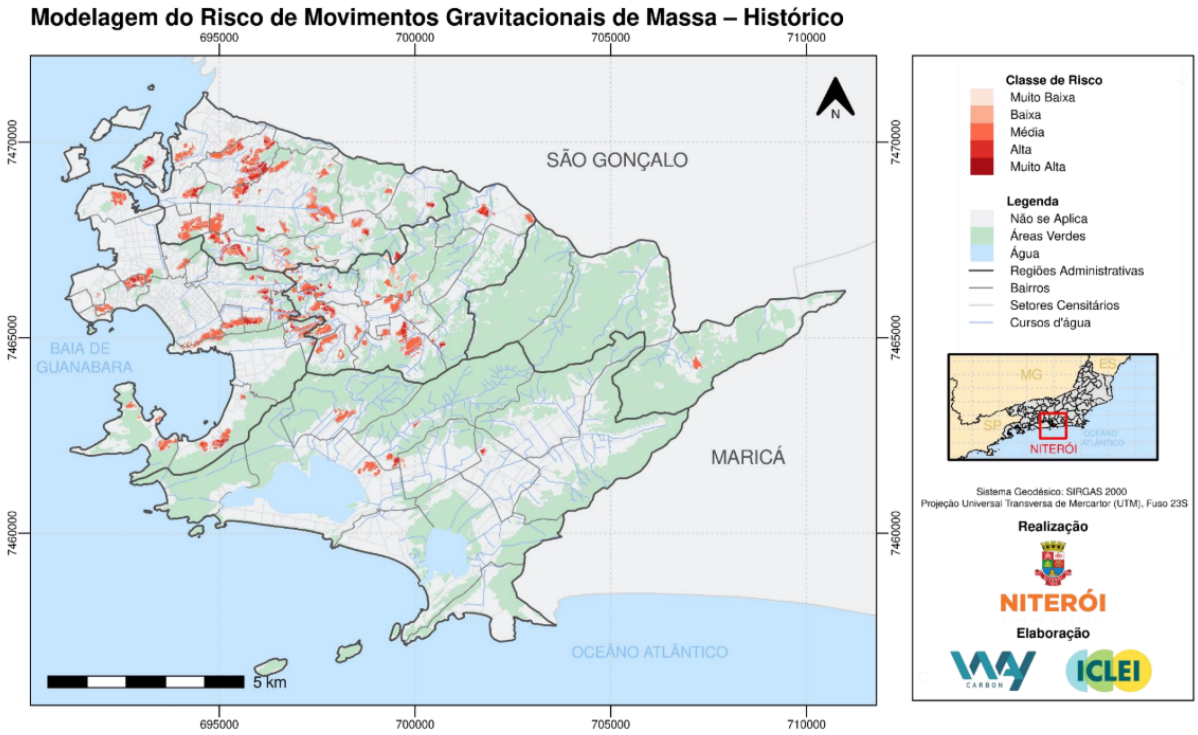


Figura 5: Modelagem do risco de movimentos gravitacionais de massa para o período histórico (1995-2014) nas áreas de comunidades.

5. Fragmentação das políticas públicas e ausência de instrumentos de planejamento territorial participativo

Faltam mecanismos efetivos de integração entre as políticas públicas setoriais no território. **Não há mapeamentos sistematizados com dados atualizados sobre as comunidades**, comprometendo o planejamento urbano e social.

Causas

Os problemas acima descritos têm origem em múltiplos fatores interdependentes:

- Desigualdade estrutural de renda, raça e gênero, gerada por processos históricos de negligência e invisibilização institucional.

- Histórico de urbanização excludente, com ocupações informais sem suporte do Estado;

- Descontinuidade e baixa articulação entre políticas públicas nos territórios;

Consequências

Esses problemas resultam em:

- Desigualdade no acesso à cidade, com milhares de pessoas vivendo em condições insalubres e inseguras;

- Crescimento da vulnerabilidade frente às mudanças climáticas;

- Reprodução da pobreza e da exclusão econômica, especialmente entre mulheres, jovens e trabalhadores informais;

- Ineficiência na alocação de recursos públicos, pela falta de dados, planejamento participativo e gestão integrada.

Situação atual a ser transformada:

O PVNM parte de uma realidade em que comunidades inteiras estão à margem dos benefícios da urbanização e do desenvolvimento local. A cidade de Niterói reconhece essas fragilidades e propõe, através do programa, transformar as comunidades em espaços seguros, resilientes, produtivos e dotados de infraestrutura adequada. **Desenvolvimento socioeconômico, intervenções urbanas, habitacionais e fortalecimento institucional serão pilares centrais da estratégia de atuação**.

1. 2. 3. **Solução:**

Cada componente reúne soluções voltadas ao **enfrentamento dos problemas diagnosticados**, alinhadas aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual da União 2024–2027, contribuindo para o desenvolvimento urbano inclusivo, justiça social, resiliência climática e fortalecimento institucional.

Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico
Problemas: exclusão produtiva, desigualdade de gênero, fragilidade das redes comunitárias e ausência de oportunidades econômicas.
Soluções: fortalecimento do capital humano, empreendedorismo popular, participação cidadã e redes de apoio comunitário.

Ações:

- Criação de espaços públicos de apoio ao trabalho e renda (ex: Galpão das Oportunidades e Incubadora para negócios comunitários e solidários);

- Implantação do Centro de Formação Popular Vida Nova;

- Capacitação e empoderamento econômico com foco em juventudes e mulheres;

- Programas de igualdade de gênero e autonomia feminina, com formação de Agentes Vida Nova de Cuidados Comunitários (ACC);

- Núcleos de zeladoria urbana com participação comunitária;

- Promoção da cultura e identidade local com ações permanentes de mobilização, comunicação e participação.

Alinhamento PPA 2024–2027: OE 101; OE 105; OE 107; OE 207; OE 214.

Componente 2 – Melhorias Habitacionais
Problemas: moradias precárias, insalubridade, ausência de assistência técnica, exposição a riscos e vulnerabilidade climática.

Ações:

- Reformas em moradias com carências qualitativas (banheiros, coberturas, paredes, pisos, ventilação, iluminação, acessibilidade, armazenamento de água, etc.), com foco sustentável;

- Implantação do programa “Arquiteto de Família”, com assessoria técnica especializada, personalizada e participativa;

- Reassentamento de famílias em risco (Compra Assistida, indenização, construção de unidades habitacionais com subsídio de aluguel, permuta de imóveis, entre outros).

Alinhamento PPA 2024–2027: OE 111; OE 202; OE 214.

Componente 3 – Urbanização Integrada e Resiliência Urbana
Problemas: infraestrutura urbana deficiente, riscos climáticos, ausência de espaços públicos e baixa integração com a cidade formal.
Soluções: ampliar a resiliência urbana e ambiental, promovendo a integração física, social e simbólica das

comunidades ao tecido urbano.

Ações:

- Obras de infraestrutura (drenagem, vias, acessos, saneamento);

- Construção e requalificação de espaços públicos;

- Soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde;

- Urbanismo tático, arte urbana e ativação cultural.

Alinhamento PPA 2024–2027: OE 111; OE 201; OE 202.

Componente 4 – Fortalecimento Institucional
Problemas: ausência de dados atualizados, fragmentação das políticas públicas e baixa capacidade de gestão integrada.
Soluções: fortalecimento da capacidade pública de planejar, implementar e monitorar políticas territoriais, com sistema resiliente, eficiente e participativo.

Ações:

- Desenvolvimento de sistemas e aplicativos para mapeamento e diagnósticos participativos;

- Levantamentos técnicos e socioeconômicos;

- Monitoramento contínuo de indicadores;

- Produção de guias e protocolos técnicos;

- Fortalecimento da gestão pública intersetorial;

- Ferramentas de gestão de riscos (monitoramento, geoprocessamento de áreas, ocupações irregulares e vulnerabilidades ambientais);

- Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).

Alinhamento PPA 2024–2027: OE 301; OE 302; OE 303.

Integração e efeito sistêmico
A força do PVNM está na **integração dos quatro componentes**, cada um respondendo a dimensões específicas da vulnerabilidade urbana e promovendo a transformação estrutural dos territórios de Niterói. Ao articular **moradia digna, infraestrutura resiliente, fortalecimento econômico e gestão pública qualificada**, o programa lança as bases para uma cidade mais justa, segura e sustentável, alinhada aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027 e às principais agendas globais de desenvolvimento urbano.

O PVNM busca, no médio e longo prazo, atuar em todas as comunidades e favelas de Niterói, garantindo que os investimentos cheguem aos territórios historicamente negligenciados. Nesta fase inicial, contempla intervenções em **12 comunidades prioritária**s, marco inaugural de uma política pública contínua e transformadora para os territórios populares da cidade.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do PVNM propõe uma **abordagem integrada para melhorar a qualidade de vida em Niterói**, considerando aspectos socioeconômicos, urbanos e habitacionais, com soluções sustentáveis e de impacto duradouro. Visa **transformações concretas, mensuráveis e observáveis** nas favelas e comunidades.

Além dos benefícios diretos das intervenções físicas, busca-se também **gerar externalidades positivas de longo prazo, como fortalecimento do tecido social e promoção da equidade**. O PVNM amplia as capacidades de grupos historicamente marginalizados — mulheres, jovens, populações negras e periféricas — por meio de sua inclusão ativa em processos decisórios, qualificação profissional e protagonismo comunitário. Além disso, valoriza a cultura local e aprimora a governança urbana com base em dados e participação.

Espera-se que os territórios se tornem mais autônomos, fortalecidos institucionalmente e capazes de sustentar os avanços mesmo após o término das ações diretas. A resiliência social e a governança local serão pilares para a

continuidade das transformações.

Resultados esperados por componente:

Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

- Elevação da renda domiciliar com estabilidade econômica, combate à pobreza e diversificação das fontes de renda;

- Formalização de micro empreendimentos e fortalecimento da economia popular;

- Participação ativa de mulheres em capacitação, empreendedorismo e liderança, com impacto na equidade de gênero;

- Qualificação profissional e inclusão digital para juventudes e mulheres, ampliando a empregabilidade;

- Fortalecimento de redes comunitárias e laços de solidariedade, com efeitos na convivência e prevenção da violência;

- Valorização da cultura local e do pertencimento, promovendo autoestima e identidade coletiva;

- Aumento da participação cívica por meio da mobilização social e da gestão compartilhada de espaços públicos.

Componente 2 – Melhorias Habitacionais

- Aumento do número de moradias com padrões mínimos de habitabilidade, segurança, ventilação, iluminação e conforto térmico

- Redução de indicadores de insalubridade e riscos domésticos relacionados à estrutura das residências;

- Realocação segura e planejada de famílias residentes em áreas de risco, com garantia de continuidade dos vínculos sociais e acesso a serviços;

- Redução de gastos públicos com saúde e assistência social decorrentes de situações precárias e inadequadas de moradia;

- Reconhecimento das moradias como espaços de dignidade, permanência e referência para a vida familiar e comunitária.

Componente 3 – Urbanização Integrada e Resiliência Urbana

- Universalização do acesso à infraestrutura básica em áreas selecionadas (água, esgoto, drenagem, energia, mobilidade);

- Aumento da frequência e permanência da população em espaços públicos revitalizados, com impactos positivos na convivência, lazer e segurança;

- Redução significativa da vulnerabilidade física e ambiental de áreas de encosta, especialmente com a adoção de soluções baseadas na natureza;

- Melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade interna nos territórios urbanizados;

- Aumento da atratividade dos territórios para novas iniciativas públicas, culturais, esportivas e comunitárias;

- Valorização simbólica dos territórios, com fortalecimento da identidade cultural e da memória coletiva local.

Componente 4 – Fortalecimento Institucional

- Disponibilização de ferramentas digitais integradas para planejamento, execução e monitoramento de políticas urbanas;

- Melhoria da qualidade e da disponibilidade de dados sobre habitação, infraestrutura, perfil socioeconômico e riscos ambientais;

- Aumento da eficiência na formulação de políticas públicas baseadas em diagnóstico técnico e escuta participativa;

- Estabelecimento de fluxos institucionais de cooperação entre secretarias, com foco em soluções intersetoriais no território;

- Produção de referenciais técnicos e metodológicos com potencial de replicação em outras iniciativas urbanas;

- Fortalecimento da imagem institucional da Prefeitura como agente promotor de inovação urbana, justiça territorial e desenvolvimento sustentável.

Externalidades positivas esperadas:

- Redução das desigualdades socioespaciais no município, com impacto nos indicadores de vulnerabilidade social;

- Estímulo à cultura de pertencimento e à valorização do território;

- Fortalecimento de vínculos comunitários e da confiança da população na administração pública;

- Aumento do capital social e da resiliência coletiva das comunidades frente a eventos críticos (climáticos, econômicos ou sanitários);

- Geração de aprendizados institucionais e disseminação de boas práticas, com potencial de replicação nacional.

Esses resultados representam não somente **resposta emergencial às condições precárias dos territórios atendidos**, mas a **construção de um novo paradigma de política urbana em Niterói**, fundado em participação, inovação social, sustentabilidade e justiça territorial.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo geral:

O Programa visa **melhorar a qualidade de vida, a resiliência urbana e o desenvolvimento sustentável das populações residentes em territórios vulneráveis do município de Niterói**.

Objetivos Específicos:

A. Fomentar **a inclusão social e econômica, a igualdade de gênero, o bem-estar, e o fortalecimento comunitário** por meio da valorização da história e da cultura local, da criação de oportunidades de geração de renda, do apoio técnico, das redes solidárias e da participação cidadã.

CORRELAÇÃO:

Componente:

Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico.

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza;

- OE 105 – Fortalecer a economia criativa;

- OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres;

- OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Indicadores:

- Indicador de Inclusão na Economia Criativa e Cultura Popular (IIECCP);

- Índice de Inclusão Econômica de Mulheres em Idade Produtiva (IIEMIP);

- Índice de Inserção Produtiva da Juventude (IIPJ).

B. Reduzir o déficit habitacional qualitativo e quantitativo, e garantir moradias seguras e sustentáveis, com foco em melhorias habitacionais progressivas, reassentamento de famílias em áreas de risco e assistência técnica gratuita, promovendo qualidade de vida, a dignidade e o conforto ambiental nas habitações.

CORRELAÇÃO:

Componente:

Componente 2 – Melhorias Habitacionais.

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis;

- OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres;

- OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Indicadores:

- Proporção da população urbana vivendo em domicílios precários e inadequados (Indicador Chave Nacional do PPA OE 111 – adaptado para incluir domicílios inadequados);

- Mudanças executadas em moradias atendidas pelo “Arquiteto de Família” (Indicador criado).

C. Implantar **infraestrutura urbana articuladamente nos territórios atendidos**, promovendo acesso a saneamento básico, drenagem urbana, iluminação pública e espaços de convivência qualificados, com foco na segurança climática, na resiliência urbana a adaptação às mudanças climáticas, na valorização dos espaços públicos e na promoção da inclusão socio territorial de forma alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à Nova Agenda Urbana (NAU).

CORRELAÇÃO:

Componente:

Componente 3 – Urbanização Integrada e Resiliência Urbana.

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis;

- OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

- OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas.

Indicadores:

- Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) (Indicador Chave Nacional do PPA OE 111 - adaptado)

D. Fortalecer a capacidade institucional do município para o planejamento, gestão e monitoramento de políticas urbanas em territórios vulneráveis, por meio do uso de dados georreferenciados, ferramentas digitais, fluxos intersetoriais e produção de guias técnicos.

CORRELAÇÃO:

Componente:

Componente 4 – Fortalecimento Institucional.

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 301 – Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social;

- OE 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais;

- OE 303 – Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo.

Indicadores:

- Índice de Transparência e Governança Municipal (ITGM) para Comunidades.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: INDICADOR 2: Índice de Inclusão Econômica de Mulheres em Idade Produtiva (IIEMIP) - (Indicador Chave Nacional do PPA OE107 – adaptado)

Descrição:
Específico (SMART**):**

Mede o percentual de mulheres em idade produtiva (14 a 59 anos) que não estão inseridas no mercado de trabalho formal ou autônomo, vivendo em domicílios chefiados por mulheres nas comunidades atendidas pelo Programa Vida Nova no Morro (PVNM).

Mensurável (SM**A**RT**):**
Dados para coleta:

- PMET-CM – Quantidade de mulheres em idade produtiva empregadas formalmente ou inseridas em atividades econômicas autônomas residentes em domicílios chefiados por mulheres.

- PIT-CM – Total de mulheres em idade produtiva residentes em domicílios chefiados por mulheres.

Fórmula de cálculo:
IIEMIP (%) = (PMET-CM ÷ PIT-CM) × 100

Interpretação:
O IIEMIP expressa o percentual de mulheres em idade produtiva (14 a 59 anos) sem ocupação formal ou autônoma, vivendo em domicílios chefiados por mulheres. Quanto maior o valor, maior a exclusão econômica. A redução do índice indicará avanços nas políticas de inclusão e autonomia econômica.

Linha de base inicial:

- Total de famílias chefiadas por mulheres no Município cadastradas no CADÚNICO: 42.257;

- Famílias com pelo menos uma mulher em idade produtiva fora do mercado: 24.082.

Esse número representa cerca de **57%** dessas famílias.

Atingível (SM**A**RT**):**
A meta considera os investimentos previstos no Componente 1 e sua execução escalonada ao longo de 5 anos.

Relevante (SMA**R**T**):**
Objetivo do PVNM:
Fomentar a inclusão social e econômica, a igualdade de gênero e o fortalecimento comunitário, por meio da valorização da cultura local, geração de renda, apoio técnico e participação cidadã.

Componente relacionado:
Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

Objetivos estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza;

- OE 107 – Reforçar políticas de atenção às mulheres;

- OE 214 – Reduzir desigualdades regionais com equidade de oportunidades.

O IIEMIP reflete a capacidade do programa em promover inclusão econômica e equidade de gênero, especialmente no contexto de famílias chefiadas por mulheres. Essas famílias concentram alta vulnerabilidade social. O indicador busca enfrentar obstáculos estruturais e ampliar oportunidades de autonomia econômica.

Principais fatores identificados:

Baixa inserção produtiva: Mulheres chefes de família enfrentam barreiras para entrar ou permanecer no mercado de trabalho.

Desigualdade salarial e de oportunidades: Mesmo inseridas, enfrentam remunerações mais baixas e menor acesso a cargos qualificados.

Falta de tempo e suporte: Sobrecarga com cuidado de filhos, idosos ou dependentes limita a capacitação e a renda.

Empreendedorismo e qualificação: O programa investirá em formação e renda autônoma para mulheres chefes de família.

Trabalho precoce: Pressões econômicas levam adolescentes ao trabalho precoce, comprometendo sua formação e futuro.

O PVNM atuará com ações estruturadas de formação, empreendedorismo e apoio à renda, reduzindo desigualdades e promovendo autonomia.

Temporal (SMAR**T**):

Ao longo dos cinco anos, serão realizados os seguintes marcos concretos:

- Ano 1 (2026): Atualização da linha de base nas comunidades atendidas e início das ações de mobilização e escuta ativa das mulheres, com pelo menos **10%** delas participando de atividades de formação ou orientação profissional.

- Ano 2 (2027): Ampliação das oportunidades de capacitação e estímulo à formalização ou geração de renda autônoma, com redução da taxa para **45%**.

- Ano 3 (2028): Integração com políticas públicas de apoio ao empreendedorismo feminino, acesso a editais, microcrédito e parcerias com empresas. Redução da taxa para **40%**.

- Ano 4 (2029): Consolidação de redes de apoio e acompanhamento de trajetórias de inserção produtiva, alcançando **35%** de mulheres ainda fora da economia formal/autônoma.

- Ano 5 (2030): Alcançar a meta final de **30%**, com fortalecimento das estratégias de inclusão econômica e autonomia das mulheres.

Fontes de verificação:

- Dados da PNAD Contínua (IBGE) e pesquisas locais, Observatório do Cadastro Único;

- Cadastros em programas de capacitação e empreendedorismo;

- Registros de MEIs, vínculos formais de trabalho e geração de renda autônoma;

- Relatórios do Programa Vida Nova no Morro.

Meta:
Reduzir para 30% a proporção de famílias chefiadas por mulheres com pelo menos uma mulher em idade produtiva (14 a 59 anos) fora do mercado de trabalho formal ou autônomo, nas comunidades atendidas pelo Programa Vida Nova no Morro, em até 5 anos, por meio de estratégias de inclusão produtiva, qualificação profissional e fortalecimento da autonomia econômica feminina.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: INDICADOR 5: Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) - (Indicador Chave Nacional do PPA OE - 111)

Descrição:
Específico (**S**MART):

O **IAASB mede o avanço na ampliação do acesso ao saneamento básico adequado nas comunidades atendidas pelo programa**, considerando a proporção de domicílios com esgotamento sanitário conectado à rede pública. O indicador está alinhado ao objetivo de incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, promovendo investimentos integrados em infraestrutura urbana.

Mensurável (S**M**ART):

Dados a Serem Coletados para Monitoramento:

Para acompanhar a implementação do programa, será necessário coletar:

- NDEC - Número total de domicílios existentes nas comunidades atendidas.

- NDE - Número de domicílios com acesso adequado a esgotamento sanitário (antes e depois das intervenções)

- NDAA - Número de domicílios com abastecimento de água canalizada (antes e depois das intervenções).

Fórmula de Cálculo:

Aumento do IAASB (%) = (NDEC ? NDE) ÷ NDAA

(Nº de domicílios atendidos com acesso adequado a saneamento pós-programa ? Nº de domicílios atendidos com acesso adequado a saneamento pré-programa) ÷ Nº total de domicílios nas comunidades atendidas

Interpretação: O IAASB expressa o percentual de avanço na adequação do saneamento nas comunidades beneficiadas. Quanto maior o índice, maior a efetividade do programa na universalização do acesso ao saneamento básico.

Atingível (SM**A**RT):

A meta está baseada no aporte de investimentos no **Componente 3 - Urbanização Integrada e Resiliência Urbana**, prevista no **Produto 3.2 Melhoria Urbana Finalizada**, e prevê um **crescimento percentual de 10% no atendimento de serviço de esgotamento sanitário adequado**, compatível com o investimento **no prazo do programa de 5 anos.**

Relevante (SMA**R**T):

Coerência do Indicador com os Objetivos:

Objetivo Específico do PVNM:

C - Implantar infraestrutura urbana integrada e soluções baseadas na natureza nos territórios atendidos, promovendo mobilidade, saneamento, acessibilidade e convivência, com foco na segurança climática, na valorização dos espaços públicos e na inclusão territorial.

Componente Relacionado do PVNM: Componente 3 – Urbanização Integrada e Resiliência Urbana

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

- OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

O **IAASB reflete diretamente a capacidade do programa em expandir a infraestrutura de saneamento básico nas comunidades** integradamente, contribuindo para:

Melhoria da qualidade de vida da população atendida, reduzindo a contaminação de solos e corpos d'água e prevenindo doenças de veiculação hídrica e sanitária.

Redução de riscos sanitários e ambientais, ao diminuir as possibilidades de contaminação de afluentes e de infiltração em encostas e barrancos, fortalecendo a segurança e a resiliência urbana nos territórios de atuação.

Inclusão socio territorial e promoção da equidade urbana, ao reduzir as desigualdades no acesso à infraestrutura de saneamento básico e garantir melhores condições de habitabilidade nas áreas vulneráveis.

Temporal (SMAR**T**):

A evolução será medida a partir do comparativo entre a linha de base e os dados atualizados durante os 5 (cinco) anos de execução do programa. Serão consideradas as melhorias em infraestrutura de saneamento realizadas nas comunidades atendidas, com foco no aumento do número de domicílios com acesso adequado ao serviço.

Meta:

Linha de Base:

Conforme o Censo Demográfico 2022 (IBGE), 77,9% dos domicílios localizados em áreas de comunidades do município de Niterói possuem banheiro exclusivo e esgotamento sanitário conectado à rede pública.

Meta:

Ampliar o Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico **(IAASB)** nas áreas de implantação do programa, alcançando um **aumento de 10% no prazo de 5 (cinco) anos.** O objetivo é garantir que mais domicílios tenham banheiro exclusivo e ligação à rede pública de esgoto, promovendo melhorias nas condições sanitárias e na qualidade de vida da população.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: INDICADOR 8: Indicador de Aumento da Cobertura Vegetal Urbana (IACVU)

Descrição:
Específico (**S**MART):

O indicador mede o **aumento percentual da cobertura vegetal e arborização nas áreas de intervenção do programa**, por meio da implantação de **ações de reflorestamento, implementação de *ecolimites* e soluções baseadas na natureza**. O indicador está alinhado ao objetivo de promover segurança climática, melhoria ambiental e valorização dos espaços públicos nas comunidades.

Mensurável (S**M**ART):

Dados a Serem Coletados para Monitoramento:

Para acompanhar a implementação do programa, será necessário coletar:

- AVA - Área Verde Atual (m²) nas comunidades atendidas antes da intervenção.

- AVP - Área Verde Pós-intervenção (m²) nas comunidades após a implantação das ações do programa.

- ATC - Área Territorial da Comunidade (m²).

Fórmula de Cálculo:

Aumento percentual da cobertura vegetal **= ((AVP - AVA) ÷ ATC) × 100**

Interpretação: O indicador expressa o aumento proporcional da área verde e arborizada nas comunidades, indicando o impacto positivo do programa na qualificação ambiental dos territórios.

Atingível (SM**A**RT):

A meta está baseada no aporte de investimentos no **Componente 3 - Urbanização Integrada e Resiliência Urbana**, prevista dentro dos **Produtos 3.3 e 3.5**, e prevê um aumento de 5%, compatível com as ações de reflorestamento, implantação de ecolimites e soluções baseadas na natureza **no prazo do programa de 5 anos do programa.**

Relevante (SMA**R**T):

A relevância do indicador está na **Correlação Objetivos Estratégicos**:

Objetivo Específico do PVNNM: Implantar infraestrutura urbana integrada e soluções baseadas na natureza nos territórios atendidos, promovendo mobilidade, saneamento, acessibilidade e convivência, com foco na segurança climática, na valorização dos espaços públicos e na inclusão territorial.

Componente Relacionado do PVNNM: Componente 3 – Urbanização Integrada

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

- OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Coerência do Indicador com os Objetivos:

O indicador reflete diretamente a efetividade do programa na ampliação das áreas verdes e arborizadas nas comunidades, contribuindo para:

- Aumento da segurança climática e redução da vulnerabilidade ambiental, uma vez que cobertura vegetal desempenha um papel fundamental na **melhoria da drenagem urbana, na contenção de encostas e na redução do risco de deslizamentos**, além de **minimizar os efeitos de inundações** e enxurradas.

- Melhoria da qualidade de vida da população, proporcionando mais **áreas sombreadas, redução da temperatura ambiente e aumento do conforto térmico** nos espaços urbanos. Tais benefícios contribuem diretamente para a **saúde física e mental da população**, reduzindo casos de doenças relacionadas ao calor extremo e promovendo ambientes mais saudáveis e agradáveis para a convivência comunitária.

Meta:
Linha de Base: A linha de base será estabelecida a partir dos mapeamentos iniciais do programa, por meio de levantamento territorial e ambiental utilizando ferramentas como SIG e sensoriamento remoto. A medição considerará a área atual de cobertura vegetal (referência 2026) e será comparada à área registrada ao final do programa, permitindo aferir o incremento real em termos de recuperação ambiental e implantação de infraestrutura verde.

Meta: Ampliar a cobertura vegetal nas comunidades atendidas, garantindo que as áreas de implantação do programa apresentem um **aumento de 5% na proporção de áreas verdes e arborizadas** até a conclusão do programa.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: INDICADOR 4: Eficácia do projeto "Arquiteto de Família" - EAF

Descrição:
Específico (SMART***):***

O indicador **EAF** irá medir a razão de mudanças realizadas e as assessorias técnicas prestadas. A eficácia está atrelada aos produtos de assessorias técnicas e dos cursos de capacitação fornecidos pelo projeto "Arquiteto de Família" que visam promover de melhorias habitacionais executadas pelos próprios beneficiários.

Mensurável (SM**ART):**

Dados para coleta:

- QMH – Quantidade de Melhorias Habitacionais realizadas orientadas por assessoria técnica no território atendido.

- QAT – **Quantidade de projetos entregues pelas Assessorias Técnicas** no território atendido.

Fórmula de Cálculo:

EAF= QMH ÷ QAT (Quantidade de melhorias habitacionais realizadas com orientação de assessoria técnica ÷ Nº de assessorias técnicas prestadas)

Interpretação:

O **EAF** expressa a razão que mede a eficácia do projeto “Arquiteto de Família”. Quanto mais próximo de 1, maior a efetividade do programa na promoção de moradias seguras, sustentáveis, confortáveis, e com qualidade de vida.

Atingível (SM**A**RT):

A meta está baseada no aporte de investimentos no componente 1 e 2, produtos 1.3.2, 1.3.4 e 2.3.

Relevante (SMART):

Coerência do Indicador com os Objetivos:

Objetivo Específico do PVNM:
B - Reduzir o déficit habitacional qualitativo e quantitativo, e garantir moradias seguras e sustentáveis, com foco em melhorias habitacionais progressivas, reassentamento de famílias em áreas de risco e assistência técnica gratuita, promovendo qualidade de vida, a dignidade e o conforto ambiental nas habitações.

Correlação Objetivos Estratégicos PPA Federal (2024–2027):

- OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

- OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres;

- OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

O EAF reflete diretamente a eficácia do projeto "Arquiteto de Família" sob a ação conjunta de assessoria técnica, oficinas de capacitação e do Galpão das Oportunidades. Compreendendo que para a execução de reforma, ampliação ou demais alterações é preciso contar com projeto técnico, mão de obra e material, itens esses que serão promovidos por cada produto citado acima.

Considerando que 82% das construções no Brasil são autoconstruídas, ou seja, que não contam com serviços de profissionais tecnicamente habilitados, de arquitetos e/ou engenheiro profissional para construção (Data Folha, 2022), o produto **2.3. Assessorias técnicas habitacionais prestadas** irá oportunizará a orientação e acompanhamento de profissionais capacitados na área da construção civil para a população residente nas comunidades atendidas que desejem fazer alterações nas moradias. Esse serviço é fundamental não só para a economicidade e promoção da habitabilidade e da segurança física do imóvel, mas também como uma forma de garantir que o ambiente de moradia esteja alinhado com a cultura e modo de vida dos moradores, sob perspectiva de visão de futuro.

Temporal (SMAR**T):**

A efetividade será medida a partir do registro e acompanhamento dos atendimentos realizados, considerando como resolutivas as assessorias que resultarem em encaminhamentos concretos ou soluções implementadas. O sistema de monitoramento incluirá formulários de avaliação, relatórios técnicos, entrevistas com beneficiários e registros de campo, garantindo a verificação periódica dos resultados ao longo dos cinco anos.

Meta:

Linha Base: Por ser um projeto novo, assim como a criação deste indicador, não foi possível estipular uma linha de base para acompanhamento.

Meta: Alcançar uma efetividade de **75% nas assessorias técnicas prestadas no território** ao longo dos **5 anos de atuação do programa**, com base na razão 4/3 entre demandas atendidas e acompanhadas com resolutividade.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: INDICADOR 6: Índice de Inserção Produtiva da Juventude (IIPJ) (Indicador Chave Nacional do PPA OE207 – adaptado)

Descrição:
Específico (**S**MART)**:**

O IIPJ mede a inserção produtiva de jovens entre 15 e 29 anos promovendo sua inclusão econômica e social seja por meio de retorno a estudos, capacitação profissional, ou por meio de acesso a oportunidades de emprego.

Mensurável (S**M**ART)**:**
Dados para coleta:

JPET – Quantidade de jovens entre 15 e 29 anos empregados formalmente ou inseridos em atividades econômicas autônomas.

JNT – Número total de jovens entre 15 e 29 anos em situação de vulnerabilidade ocupacional nas comunidades atendidas.

Fórmula de Cálculo:

IIPJ (%) = (JPET ÷ JNT) × 100

Interpretação:

O IIPJ expressa o percentual de jovens que estavam sem ocupação de emprego e/ ou que estavam fora do do espaço escolar e passaram a ter alguma forma de inserção produtiva e/ou educacional. Quanto maior o índice, maior a efetividade das políticas de capacitação e empregabilidade juvenil.

Base de dados:

Não há, até o momento, dados consolidados específicos sobre a inserção produtiva da juventude nos territórios atendidos. A ausência de desagregação etária nos relatórios padrão do Cadastro Único impossibilita o cálculo direto do número de jovens ocupados ou em atividade econômica formal/autônoma.

Dessa forma, o indicador IIPJ será iniciado com **linha de base zero**, com a necessidade de construção de metodologia própria de coleta e acompanhamento a partir da implementação do programa.

Atingível (SM**A**RT):

A meta está baseada em expansão das iniciativas já desenvolvidas em Niterói como o Niterói Ecosocial e o Territórios da Juventude, promovendo que sua implementação ocorra nos territórios do Vida Nova No Morro. Para ampliar o alcance e a efetividade dessas ações, o programa prevê um crescimento escalonado em um prazo de **5 (cinco) anos**, contemplando a incentivo a retomada de estudos, capacitação profissional, estímulo ao empreendedorismo e a inserção no mercado de trabalho.

Relevante (SMA**R**T):

Coerência do Indicador com os Objetivos:

Objetivo Específico do PVNM:

Fomentar a inclusão social e econômica, a igualdade de gênero e o fortalecimento comunitário, por meio da valorização da história e cultura local, da criação de oportunidades de geração de renda, apoio técnico, redes solidárias e participação cidadã.

Componente Relacionado do PVNM:
Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

Correlação Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- **OE 101** – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza

- **OE 214** – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

OE 207 Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

O IIPJ mede o impacto das ações voltadas à capacitação e empregabilidade juvenil, considerando desafios estruturais que dificultam a inserção produtiva dos jovens. Entre os principais desafios a serem enfrentados estão:

Dificuldade de acesso ao mercado de trabalho: muitos jovens encontram barreiras para ingressar em empregos formais devido à baixa escolaridade, falta de experiência profissional e escassez de oportunidades alinhadas às suas realidades socioeconômicas.

Desigualdades socioeconômicas: A falta de recursos e apoio estrutural dificulta a permanência dos jovens em programas de capacitação e reduz suas chances de inserção produtiva sustentável.

A ampliação das ações do Niterói Ecosocial e dos Territórios da Juventude busca mitigar esses desafios, promovendo capacitação técnica, estímulo ao empreendedorismo e acesso a oportunidades de trabalho digno. A implementação territorializada dessas iniciativas garantirá um impacto mais abrangente, fortalecendo a inclusão produtiva e a autonomia econômica da juventude.

Temporal (SMAR**T**):

O prazo para alcance da meta será de 5 (cinco) anos, entre 2026 e 2030. A avaliação contínua do indicador permitirá compreender o impacto das intervenções nas trajetórias dos jovens e orientar políticas públicas voltadas à sua inclusão produtiva.

Meta:
Alcançar, em 5 anos, uma taxa de **inserção produtiva de 45% entre jovens de 15 a 29 anos residentes nas comunidades** atendidas pelo Programa Vida Nova no Morro, a partir de uma linha de base inicial zerada, promovendo o acesso ao trabalho formal e ao empreendedorismo autônomo.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: INDICADOR 1: Indicador de Inclusão na Economia Criativa e Cultura Popular (IIECCP) - (Indicador Chave Nacional do PPA OE105 – adaptado)
Descrição:

Específico (SMART**):**

O IIECCP mede a participação de trabalhadores da economia criativa e da cultura popular nas comunidades atendidas e sua autonomia financeira, considerando artistas, artesãos, produtores culturais e demais agentes do setor.

Mensurável (S**M**ART**):**

Dados para coleta:

- PECC – Quantidade de pessoas empregadas formalmente ou inseridas em atividades econômicas autônomas no setor cultural e criativo.

- PIT – Número total de pessoas economicamente ativas nas comunidades atendidas.

Fórmula de Cálculo:
- IIECCP (%) = (PECC ÷ PIT) × 100

Interpretação:
O IIECCP expressa o percentual de trabalhadores da economia criativa e da cultura popular que possuem fonte de renda oriunda desse mercado. Quanto maior o índice, maior a inclusão econômica e a valorização da arte e cultura local.

Linha de Base:

- População total cadastrada no Cadastro Único em Niterói (2025): 55.601 pessoas

- Pessoas em situação de trabalho (ocupadas) segundo o Observatório do Cadastro Único: 25.661 pessoas

- Pessoas atualmente vinculadas a iniciativas de economia solidária no município: 2.860 pessoas segundo a Subsecretaria de Economia Solidária (SMASES)

- Percentual atual estimado de trabalhadores da economia criativa/cultura popular no mercado de trabalho formal e/ou autônomo: Considerando os 2.860 trabalhadores da economia solidária como base aproximada, isso representa cerca de 11,1% dos trabalhadores do CADÚNICO ocupados (2.860 / 25.661).

Atingível (SM**A**RT**):**

A meta prevê um crescimento escalonado dentro de 5 (cinco) anos, considerando programas de capacitação, fomento ao empreendedorismo criativo, editais de incentivo cultural e fortalecimento de redes solidárias no setor cultural.

Relevante (SMA**R**T**):**

Componente Relacionado do PVNM: Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

Coerência do Indicador com os Objetivos:

Objetivo Específico do PVNM:

Fomentar a inclusão social e econômica, a igualdade de gênero e o fortalecimento comunitário, por meio da valorização da história e cultura local, da criação de oportunidades de geração de renda, apoio técnico, redes solidárias e participação cidadã.

Correlação Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza

- OE 105 – Fortalecer a economia criativa

- OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

O IIECCP reflete diretamente a capacidade do programa em impulsionar a economia criativa e a diversidade cultural, enfrentando desafios estruturais como:

- Baixa formalização no setor: muitos trabalhadores da cultura atuam na informalidade, reduzindo seu acesso a direitos trabalhistas e financiamento.

- Desigualdade de acesso a recursos: pequenos produtores culturais e artistas independentes enfrentam dificuldades para acessar incentivos e políticas públicas.

- Falta de infraestrutura e espaços culturais: A ausência de equipamentos culturais limita a difusão da produção artística e o fortalecimento das redes culturais comunitárias.

- Precarização do trabalho cultural: muitos profissionais da cultura enfrentam instabilidade de renda e poucas oportunidades de qualificação e reconhecimento profissional.

O programa atuará fomentando a formalização, promovendo capacitações, ampliando editais e incentivando políticas que garantam sustentabilidade financeira para a cultura popular.

Temporal (SMAR**T):**

Ao longo dos 5 anos, serão observados os seguintes marcos concretos de avanço:

- **Ano 1** (2026): Estabelecimento da linha de base do indicador e mobilização da comunidade. Pelo menos 10% dos trabalhadores da cultura terão acesso a capacitação ou apoio financeiro.

- **Ano 2** (2027): Expansão das ações de formação e fomento. Espera-se um aumento de 15% no número de trabalhadores formalizados ou com geração de renda autônoma no setor criativo.

- **Ano 3** (2028): Implementação de políticas estruturantes que ampliem o acesso a editais e mercados culturais. A meta é atingir 20% de crescimento no IIECCP em relação à linha de base.

- **Ano 4** (2029): Consolidação de redes e espaços culturais comunitários. A expectativa é de 25% de crescimento no indicador.

- **Ano 5** (2030): Atingir o objetivo final de 30% de aumento na participação de trabalhadores da economia criativa no mercado de trabalho formal e/ou autônomo, com fortalecimento da sustentabilidade financeira do setor.

Esses resultados serão comprovados por meio de:

- Cadastros nos equipamentos de Economia Solidária de Niterói como: Casa da Economia Solidária Paul Singer, Conselho Municipal de Economia Solidária (CMES), Fórum de Economia Solidária de Niterói (FES-NIT):

- Registros de MEI e formalizações

- Dados de participação em capacitações e formações

- Monitoramento do IIECCP (Indicador de Inserção Econômica da Cultura e da Criatividade Popular)

- Relatórios de geração de renda e atividades autônomas desenvolvidas.

Meta:
Elevar o número de trabalhadores da economia criativa e da cultura popular vinculados ao mercado de trabalho formal e/ou autônomo em **pelo menos 30% em relação ao patamar atual** em articulação com iniciativas de economia solidária e valorização cultural local em até 5 anos.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: INDICADOR 7: Índice de Transparência e Governança Municipal (ITGM) para Comunidades

Descrição:
Específico (SMART**):**

O índice mede a transparência de dados e informações públicas, municipais e disponibilizadas de fácil acesso para a população pertencente a comunidades, além de medir a governança municipal pela gestão democrática e participativa social nas zonas de especial interesse social (ZEIS).

Mensurável (SM**ART):**

Dados a Serem Coletados para Monitoramento:

Para acompanhar a implementação do programa, será necessário ter os seguintes critérios:

GP - Gerenciamento da Prefeitura (Velocidade da transformação completa de dados produzidos in loco pelo programa para plataforma web, após revisão de dados quando necessário) peso: 40%
Escala de 1 a 0, sendo 1 – transformação em até 1 mês; 0,5 – entre 1 mês e 6 meses; 0,25 – após 6 meses e 0 – não havendo a transformação para a plataforma.

FAD - Facilidade de Acesso aos Dados (a existência ou não de plataforma da prefeitura adequada para formato aberto e de fácil navegabilidade para o usuário) peso: 30%

Existindo = 1

Não existindo = 0

MPP - Mecanismos de Participação Popular (existência ou não da população em mapeamentos especializados) peso: 30%

Alcance de 50% da população estimada pelo IBGE para participação no processo de Busca Ativa de perfil socioeconômico - habitacional= 1 Não existindo = 0

Existência da realização do Mapeamento de Área Urbana = 1 Não existindo = 0

Fórmula de Cálculo:

ITGM = 0.4(GP) + 0.3(FAD) + 0.3(MPP)

Interpretação:

O índice calcula uma nota de 0 a 10 através da média aritmética das taxas dos 3 critérios citados, classificado em 4 faixas (insuficiente, regular, bom e excelente), expressa a situação de transparência de dados e participação social do governo municipal e quanto maior sua nota, melhor sua classificação, maior a efetividade do programa na divulgação de dados relacionais, e maior fortalecimento democrático da população moradora em comunidades de Niterói.

Atingível (SM**A**RT**):**

A meta está baseada em dar uma nota média ao município e ser pelo menos de classificação de faixa “bom” em sua transparência de dados participação social do programa, através dos produtos de mapeamentos especializados (mapa sistematizado participativo e participação em guias técnicos/ ferramentas de gestão de risco) e do sistema de ação integrada socioeconômica, técnico-habitacional e urbanístico que será implantado e disponibilizado seus dados e informações em plataforma web, de posse da equipe de gestão municipal e retrocompatibilidade com sistema digital da prefeitura de Niterói.

Relevante (SMA**R**T**):**

Correlação Objetivos Estratégicos:

Objetivo Específico do PVNM:
Fortalecer a capacidade institucional do município para o planejamento, gestão e monitoramento de políticas urbanas em territórios vulneráveis, por meio do uso de dados georreferenciados, ferramentas digitais, fluxos intersetoriais e produção de guias técnicos.

Componente Relacionado do PVNM: Componente 4 – **Fortalecimento Institucional**

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027): 301, 302 e 303
O ITGM reflete diretamente a capacidade do programa em **promover o acesso de dados públicos do programa de fácil divulgação e a participação social da população em comunidades de Niterói**, contribuindo para:

Maior amplitude de dados socioeconômicos produzidos sobre os territórios das comunidades produzidos pelo poder público, aperfeiçoando assim a capacidade estatal de produção de dados qualitativos e quantitativos da população residentes em comunidades.

Redução de desigualdade democrática da população residentes em comunidades, reforçando a importância da atuação social de toda a população munícipe, em carência socioeconômica, na tomada de decisões benéficas a zonas especiais de interesse social.

Melhoria na inclusão digital de dados municipais, garantindo acesso a dados de forma compartilhada e moderna por parte da prefeitura sobre o programa.

Temporal (SMAR**T)**

Ao longo de 5 anos, alcançar um índice médio de pelo menos 7,0 (Bom), para avaliar o impacto das participações sociais e a lisura de dados públicos do programa pelas comunidades.

Avaliar o grau de transparência da administração municipal, considerando a facilidade de acesso a informações públicas do programa e a participação social, por via de mapas de colaboração ativa da população em comunidades e dados abertos em plataformas digitais do município.

Meta:

Linha de Base:

O ITGM utiliza metodologia adaptada do Indice de Transparência e Governança Pública (ITGP), do movimento global Transparência internacional Brasil, onde é feito uma análise da transparência, governança pública e participação cidadã em municípios brasileiros. O ITGP realizou análises em mais de 300 municípios em parceria com organizações da sociedade civil, e no Estado do Rio de Janeiro foram avaliados 13 municípios, fornecendo uma média do estado de 51 pontos e de classificação de faixa Regular (dados coletados em 2024). O município de Niterói não possui avaliação de índice, entretanto o movimento Transparência internacional disponibiliza um guia de passo a passo para implementar sua metodologia municipal. Devido a escala de atuação do programa VNNM se restringir somente a uma parcela da população municipal, o ITGM será utilizado e calculado somente para implantar e avaliar a transparência e governança para as comunidades urbanas de Niterói, iniciando assim sua linha de base em zero.

Meta:

Ao longo de 5 anos, alcançar um índice médio de pelo menos 7,0 (Bom), para avaliar o impacto das participações sociais e a lisura de dados públicos do programa pelas comunidades.
1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: INDICADOR 3: Proporção da população urbana vivendo em domicílios precários e inadequados - PPUHPI (Indicador Chave Nacional do PPA OE 111 – adaptado para incluir domicílios inadequados)

Descrição:
Específico (**S**MART)*:*

O indicador **PPUHPI** irá medir a redução do déficit habitacional quantitativo e qualitativo.

Mensurável (S**M**ART):

Dados para coleta:

- PUHPI – quantidade de Pessoas residentes em Unidades Habitacionais Precárias e Inadequadas no território atendido.

- PT - Número da População Total no território atendido.

Fórmula de Cálculo:

PPUHPI (%) **= PUHPI** ÷ PT

(Nº pessoas residentes em unidades habitacionais precárias e inadequadas no território atendido ÷ Nº total da população na comunidade atendida)

Interpretação:

O PPUHPI expressa o percentual da população em déficit habitacional qualitativo e quantitativo. Quanto menor o índice, maior a efetividade do programa na universalização do acesso à moradia.

Atingível (SM**A**RT):

A meta está baseada no aporte de investimentos no componente 2 e produto 2.1 e 2.2, e prevê um crescimento atingível em um prazo de 5 anos.

Relevante (SMA**R**T):

Coerência do Indicador com os Objetivos:

Objetivo Específico do PVNM:
B - Reduzir o déficit habitacional qualitativo e quantitativo, e garantir moradias seguras e sustentáveis, com foco em melhorias habitacionais progressivas, reassentamento de famílias em áreas de risco e assistência técnica gratuita, promovendo qualidade de vida e permanência digna no território.

Componente Relacionado do PVNM:

Componente 2 – Melhorias Habitacionais

Componente 3 - Urbanização Integrada e Resiliência Urbana

Correlação Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

- OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres;

- OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

O PPUHPI reflete diretamente a capacidade do programa em **reduzir o déficit habitacional quantitativo e qualitativo**, considerando que:

O **déficit habitacional quantitativo** está atrelado aos domicílios precários (imóveis sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, e improvisados em espaços como prédios em construção, tendas, barracas, grutas, etc.) e à inadequação fundiária (quando o imóvel está em área de risco). Estes casos serão atendidos pelo produto **(P) 2.2. - Desapropriação e medidas compensatórias para famílias reassentadas.**

O **déficit habitacional qualitativo** está atrelado aos imóveis inadequados quanto às carências habitacionais qualitativas (moradias com cobertura inadequada, piso inadequado, adensamento excessivo e ausência de banheiro de uso exclusivo) e às carências de infraestrutura urbana (imóvel que não possui conexão de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e coleta de lixo). Estes casos serão atendidos pelos produtos **(P) 2.1. - Melhorias em Habitações Inadequadas e(P) 3.2.1 - Melhoria Urbana Finalizada (Vias, Acessos, Drenagem, Água e Esgoto).**

Temporal (SMAR**T**):

Ao longo dos cinco anos, serão realizados os seguintes marcos concretos:

- Ano 1 (2026): Levantamento atualizado das condições habitacionais nas comunidades beneficiadas, priorização dos territórios com maior vulnerabilidade e início das obras de requalificação habitacional emergencial.
Fontes de verificação: diagnósticos técnicos de campo, cadastros habitacionais, relatórios de engenharia social.

- Ano 2 (2027): Requalificação de pelo menos **20%** das moradias precárias identificadas na linha de base, com foco em melhorias estruturais como piso, cobertura e banheiros. **Fontes de verificação:** registros fotográficos, laudos técnicos, prestação de contas de obras, relatórios do programa.

- Ano 3 (2028): Ampliação das intervenções para abastecimento de água, ventilação e espaços de dormitório adequados. Atingir **40% de redução** nas moradias precárias. **Fontes de verificação:** vistorias domiciliares, pareceres técnicos, cadastros atualizados e indicadores de qualidade habitacional.

- Ano 4 (2029): Integração das ações habitacionais com políticas urbanas de saneamento e mobilidade. Redução acumulada de **55%** nas condições de precariedade. **Fontes de verificação:** relatórios intersetoriais, dados de serviços públicos acessados, mapas de intervenção urbana.

- Ano 5 (2030): Alcançar a **redução de 70%** das moradias precárias nos territórios atendidos, com foco na sustentabilidade e manutenção das melhorias habitacionais. **Fontes de verificação:** comparativo da linha de base com diagnósticos finais, avaliações de impacto, PNAD atualizada (IBGE), relatórios finais do programa.

Meta:
Linha de Base (2022)

De acordo com a **PNAD Contínua - IBGE (2022)**, o **déficit habitacional** na região do Arco Metropolitano de Niterói/São Gonçalo (RJ) e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresenta os seguintes dados:

- 8.933 moradias identificadas como **precárias** na região do Arco Metropolitano de Niterói/São Gonçalo.

- 2.050.876 moradias inadequadas na Região Metropolitana do RJ, sendo:

- 231.278 sem armazenamento de água adequado

- 98.163 com ausência de quartos

- 46.769 com cobertura inadequada

- 3.520 sem banheiro

- 4.243 com piso inadequado

Esses dados refletem a carência estrutural enfrentada por comunidades urbanas periféricas, especialmente nos territórios que serão contemplados pelo programa.

Meta: Reduzir em **70%** a proporção da população urbana vivendo em **domicílios precários**, nas comunidades beneficiadas pelo programa, ao longo de **5 anos** de atuação, promovendo o acesso à moradia digna e segura

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: (C) 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO
Valor estimado em Dólar (USD): 6.935.000,00

Descrição:
Descrição do Componente

O Componente de Desenvolvimento Socioeconômico do Programa Vida Nova no Morro (PVNM) atua para **reduzir desigualdades, ampliar oportunidades e fortalecer as capacidades locais dos territórios de favelas e comunidades de Niterói**. Parte-se da premissa de que ao pensar em processos de urbanização integrada, a atuação do programa deve vir acompanhada de estratégias que promovam o fortalecimento do capital humano, a ampliação das capacidades locais e a valorização da cidadania ativa. O foco é gerar impactos duradouros na vida das pessoas, integrando ações sociais, econômicas e territoriais.

Entre as prioridades está o **investimento em ações voltadas à infância e juventude**, como caminho estratégico de prevenção à violência. Garantir oportunidades desde cedo — por meio de atividades culturais, educativas e profissionais — é fundamental para romper ciclos de exclusão e criar trajetórias mais seguras e promissoras para crianças e adolescentes nos territórios.

A atuação do componente se organiza em duas frentes complementares: Fortalecimento comunitário - sustentabilidade da ação e Inclusão Econômica e Social. Ambas garantem que os avanços do programa sejam sustentáveis e gerem transformações concretas nos modos de vida das comunidades.

Soluções propostas

A frente do fortalecimento comunitário promove a mobilização social e a valorização dos laços locais. Serão criados espaços como o *Espaço Vida Nova*, voltados ao diálogo, à convivência e à decisão coletiva. Lideranças comunitárias serão formadas, núcleos de zeladoria urbana com participação popular serão ativados, e atividades culturais reforçarão o sentimento de pertencimento. O objetivo é construir redes que sustentem a ação pública mesmo após o fim das intervenções diretas.

Já a frente de Inclusão Econômica e Social foca na promoção do trabalho digno, do empreendedorismo popular e da qualificação profissional, com atenção especial para mulheres e jovens. Um destaque é a capacitação de mulheres como **Agentes Vida Nova de Cuidados Comunitários (ACC)**, que terão papel de auxílio na zeladoria e no cuidado com o território, fortalecendo práticas de cuidado coletivo. A frente, propõe ainda o **Galpão das Oportunidades**, voltado à formação profissional em áreas estratégicas com práticas sustentáveis, reaproveitamento de materiais, soluções baseadas na natureza promovendo ações que auxiliem na resiliência socioambiental dos territórios atingidos. Para ampliar a empregabilidade, o programa prevê ainda fomento a oportunidades formais de emprego além da valorização dos talentos locais e aproximando as comunidades dos circuitos econômicos da cidade.

O componente será articulado com outras políticas públicas municipais, por meio de **ações intersetoriais**, garantindo acesso ampliado da população a serviços de saúde, educação, cultura, meio ambiente e assistência social. A **integração institucional** busca fortalecer os projetos de vida das famílias atendidas e maximizar os impactos das ações.

Além da dimensão econômica, o componente atua também no **fortalecimento do tecido social e no aumento da autoestima comunitária** como motores para a transformação. A valorização da cultura e da identidade local, por meio de oficinas, eventos e festivais, será central para reforçar o senso de pertencimento e ativar vocações produtivas ligadas à economia criativa e à cultura popular.

Resultados esperados

-A implantação do componente visa promover transformações mensuráveis nos territórios, por meio de:

-Implementação de espaços de referência e fortalecimento da participação cidadã e formação de lideranças;

-Estruturação do *Galpão das Oportunidades* como fomento à economia solidária e formalização de microempreendimentos locais;

-Ampliação do acesso à qualificação profissional, principalmente para mulheres e juventudes.;

-Ampliação de acesso a integração serviços públicos por meio de ações articuladas e campanhas informativas sobre direitos e políticas públicas;

-Promoção da cultura e da identidade local, com oficinas, eventos e apoio à economia criativa;

-Adoção de práticas sustentáveis e educação ambiental como parte da formação profissional e do cotidiano das comunidades.

Com essas entregas, o componente contribuirá diretamente para a redução das desigualdades socioeconômicas e territoriais, promovendo o protagonismo das comunidades na gestão dos seus próprios processos de transformação. A articulação entre capital social, geração de renda e acesso a direitos fortalece a resiliência coletiva e a capacidade de sustentação dos avanços mesmo após o fim das ações diretas do programa, alinhando-se aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual da União 2024–2027 e às principais agendas de justiça territorial e desenvolvimento sustentável.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S) 1.1 – Fortalecimento Comunitário e Zeladoria (60% dos beneficiários = 11.095 pessoas)

O fortalecimento comunitário é o ponto de partida para garantir que as transformações nos territórios sejam sustentáveis e conduzidas pelas próprias pessoas que vivem ali. O Programa Vida Nova no Morro aposta na escuta ativa, no cuidado e na participação cidadã para ativar o protagonismo das comunidades. A execução do trabalho social será responsável por aproximar moradores dos processos de requalificação urbana e social, com ações como oficinas, rodas de conversa, acompanhamento psicossocial, formações de lideranças e apoio nos reassentamentos.

(P) 1.1.1: Execução do Trabalho Social

Projeção de Impacto: Pelo menos 60% do subcomponente | aproximadamente 6.657 pessoas.

Objetivo: Visa integrar as famílias aos processos de transformação local com apoio psicossocial, formação cidadã e estímulo à participação ativa.

Metas:

-50 lideranças comunitárias capacitadas;

-15 ações culturais e de valorização da memória local.

(P) 1.1.2 Produto: Ações de Valorização Comunitária e Zeladoria

Projeção de Impacto: Pelo menos 20% dos beneficiários| aproximadamente 2.219 pessoas.

Objetivo: Garante o cuidado contínuo dos espaços públicos com protagonismo local e promoção da sustentabilidade das intervenções.

Meta:

-Implantação dos 12 Núcleos Comunitários.

(P) 1.1.3 Produto: Espaço Vida Nova em operação

Projeção de Impacto: Pelo menos 20% dos beneficiários| aproximadamente 2.219 pessoas

Objetivo: Polos de cidadania ativa, cultura, educação popular, inclusão digital, mobilização social.

Meta:

- Pelo menos 30 ações formativas realizadas (cursos, oficinas, encontros)

(**S) 1.2 – Inclusão Econômica e Social (40% dos beneficiários =** 7.396 pessoas**)**

Promover a inclusão econômica ampliando o acesso de jovens, mulheres e outros grupos em situação de vulnerabilidade a oportunidades de formação e geração de renda. A estratégia parte do reconhecimento dos saberes, trajetórias e potências já existentes nas comunidades, fomentando iniciativas que aliem valorização cultural, fortalecimento da economia popular e desenvolvimento sustentável dos territórios.

(P) 1.2.1 Abertura de novas turmas para infância e juventude

Projeção de Impacto: Pelo menos 20% dos subcomponentes| aproximadamente 1.479 pessoas.

Objetivo: Ampliar o acesso de jovens a formação em meio ambiente, audiovisual, cultura digital e cidadania.

Meta:

- Pelo menos 50 jovens beneficiados nas áreas do programa

(P) 1.2.2: Programas para Igualdade de Gênero e Autonomia Feminina

Projeção de Impacto: Pelo menos 40% | aproximadamente 2.958 pessoas.

Objetivo: Promove o empoderamento de mulheres em áreas estratégicas da economia local.

Metas:

-20 mulheres formadas em cursos de construção civil;

-10 mulheres qualificadas para atuação no turismo comunitário.

(P) 1.2.3: Projetos de Incubação e Galpão das Oportunidades

Projeção de Impacto: 30% | aproximadamente 2.219 pessoas.

Objetivo: Impulsionar a economia local, fomentar práticas sustentáveis e gerar oportunidades reais de trabalho e renda.

Metas:

-1 Galpão estruturado com áreas de produção, reciclagem e capacitação.

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 18491 pessoas

S.1.1– Fortalecimento Comunitário e Zeladoria: 11.095 pessoas (60%).

S.1.2 – Inclusão Econômica e Social: 7.396 pessoas (40%).

Esses números representam a estimativa de atendimento acumulado ao longo do ciclo de implementação do Programa Vida Nova no Morro, contemplando **18.491 pessoas** e **7.662 domicílios** como público total. A realização das ações será distribuída de forma progressiva ao longo de cinco anos, com base no planejamento físico-financeiro do Programa.

A média de implementação das ações está prevista da seguinte forma: **Ano 1 – 30%**, **Ano 2 – 25%**, **Ano 3 – 20%**, **Ano 4 – 15%** e **Ano 5 – 10%**, respeitando a complexidade das intervenções e o tempo necessário para o fortalecimento dos vínculos comunitários, a consolidação das estruturas e a ampliação gradual da cobertura das ações nos territórios.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: (C) 2 - MELHORIAS HABITACIONAIS
Valor estimado em Dólar (USD): 57.174.000,00

Descrição:
O componente de **Melhorias Habitacionais** visa **reduzir a vulnerabilidade habitacional de famílias residentes em comunidades e favelas de Niterói,** promovendo condições de **segurança e salubridade nas moradias**. Para isso, serão realizadas **reformas de melhorias qualitativas** em unidades habitacionais com deficiências construtivas, que afetam a qualidade de vida e a saúde dos moradores, através dos produtos **(P) 2.1 - Moradias melhoradas** e **(P) 2.3 - Assessorias técnicas habitacionais prestadas**. As moradias em áreas de alto risco geológico e sanitário, onde reforma e melhorias seriam incapazes de oferecer segurança e salubridade, serão oferecidas alternativas para o reassentamento das famílias, através do produto **(P) 2.2. - Desapropriação e medidas compensatórias para famílias reassentadas**

Relação com as soluções propostas:

O programa responde às condições precárias e inadequadas de moradia identificadas no município, onde milhares de famílias em comunidades de Niterói convivem com situações que as expõe a riscos estruturais, sanitários e ambientais.

Resultados esperados:

A implementação deste componente contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade habitacional, com os seguintes resultados:

- Redução do déficit habitacional qualitativo e **quantitativo**;

- Redução de indicadores de insalubridade e riscos domésticos relacionados a estrutura das residências no município, com a meta de requalificar;

- Ativação do serviço de assessoria técnica, beneficiando as famílias residentes nas comunidades em atendimento;

- Redução do número de domicílios em áreas de risco, garantindo **reassentamento adequado** para famílias, priorizando a continuidade dos vínculos sociais e acesso a serviços;

- Redução de gastos públicos com saúde e assistência social decorrentes de situações precárias e inadequadas de moradia;

- Reconhecimento das moradias como espaços de dignidade, permanência e referência para a vida familiar e comunitária;

- Promoção de moradias seguras, sustentáveis, confortáveis, com valorização cultural.

Ao final do programa, espera-se avançar na construção de uma cidade mais equitativa, garantindo **condições habitacionais dignas e seguras**, alinhadas aos Objetivos Estratégicos de transição para cidades sustentáveis, prevenção de desastres e redução das desigualdades regionais.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente de **Melhoria Habitacionais** visa a transformação das condições de moradia nas comunidades de Niterói, **abordando diretamente as deficiências qualitativas e quantitativas habitacionais.** As intervenções habitacionais darão prioridade à implementação de soluções passivas, Soluções Baseadas na Natureza (SbN) e de reaproveitamento, que promovem eficiência energética, conforto térmico e sustentabilidade ambiental. Essas estratégias podem incluir técnicas de iluminação e ventilação naturais, telhados verdes, placas solares, captação e reuso de água da chuva, além do uso de materiais ecológicos e reaproveitados/reciclados, garantindo maior resiliência habitacional e adaptação às mudanças climáticas.

(P) 2.1 - Melhorias em Habitações Inadequadas

- Projetos Técnicos (Kits): Elaboração de um caderno técnico de melhorias habitacionais, contendo diretrizes padronizadas e itens personalizáveis para intervenções em moradias inadequadas. O material servirá como base para todas as reformas realizadas no programa, garantindo qualidade, eficiência e sustentabilidade nas intervenções. **Meta**: 1 caderno técnico de soluções desenvolvido.

- Reforma das Casas: Execução de serviços de reformas habitacionais para corrigir inadequações, podendo fazer parte: reparos em instalações elétricas e hidrossanitárias, requalificação de pisos e revestimentos, adaptação de banheiros e cozinhas, melhoria da ventilação e iluminação, requalificação de coberturas, entre outros. **Meta**: 7662 moradias reformadas.

- Subsídio Aluguel: Concessão de auxílio aluguel (R$800,00/mês) para famílias realocadas temporariamente devido às obras. **Meta**: 1.539 famílias atendidas, por até 3 meses.

Obs.: Este produto está diretamente relacionado ao componente **(S) 4.1 - GERENCIAMENTO DE DADOS, MONITORAMENTO E LEVANTAMENTOS TÉCNICOS** e ao produto **(P) 4.1.1 - Sistema de ação integrada socioeconômica, técnico-habitacional e urbanístico** que auxiliará na identificação de elegibilidade e proverá um aplicativo que sistematizará o processo de levantamento técnico, projeto técnico e documentação para licitação das intervenções, possibilitando agilizar e escalonar o produto de Melhorias em Habitações Inadequadas.

(P) 2.2 - Desapropriação e Medidas Compensatórias para Famílias Reassentadas

- **Soluções Habitacionais de Reassentamento:** Oferta de alternativas habitacionais para famílias afetadas por obras ou em áreas de risco, incluindo: Compra Assistida, indenização financeira, construção de novas unidades habitacionais, além de subsídio aluguel até a entrega da nova moradia, entre outras. **Meta** : 353 famílias reassentadas.

- Subsídio Aluguel: Concessão de auxílio aluguel (R$800,00/mês) para famílias realocadas temporariamente devido ao reassentamento que precisarem de local provisório de moradia enquanto a execução do modelo escolhido seja efetivado e a família possa habitar a nova moradia. **Meta**: 353 famílias atendidas, por até 12 meses.

(P) 2.3 - Assessorias Técnicas Habitacionais Prestadas

- Assessorias Técnicas: Prestação de suporte técnico para famílias, incluindo orientação multidisciplinar em engenharia, arquitetura, design de interiores e eficiência energética, garantindo que as reformas sejam seguras, sustentáveis e participativas. Além da realização de um projeto técnico, fornece orientação para planejamento da obra e acompanhamento da execução. **Meta**: Serviço de atendimento do Arquiteto de Família durante 5 anos do projeto para atendimentos das 12 comunidades.

Obs.: Este produto está atrelado ao componente **(C) 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO** e aos produtos **(P) 1.3.1 - Galpão das Oportunidades em operação e (P) 1.3.3 - Centro de Formação Popular Vida Nova em funcionamento**, que fornecem materiais e capacitam os moradores para o planejamento dos projetos e execução das intervenções. Estas atividades são dependentes e essenciais para concretizar os projetos elaborados nas assessorias técnicas, compreendendo que para a execução de uma mudança, reforma ou ampliação nas moradias é preciso projeto (assessoria técnica), mão de obra (capacitação ofertada no centro de Formação Popular Vida Nova) e material (ofertado pelo Galpão das Oportunidades aos moradores que possuírem projeto técnico das intervenções).

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: (C) 3 - URBANIZAÇÃO INTEGRADA E RESILIÊNCIA URBANA
Valor estimado em Dólar (USD): 65.104.000,00

Descrição:
O Componente de Urbanização Integrada e Resiliência Urbana tem como objetivo **promover a resiliência urbana e a adaptação às mudanças climáticas, reduzindo vulnerabilidades socioambientais e ampliando a qualidade de vida** nas comunidades e favelas de Niterói. A partir de **intervenções estruturantes de urbanização integrada**, este componente busca garantir infraestrutura urbana completa, minimizar riscos geo-hidrológicos e ampliar a integração das áreas de favelas e comunidades ao tecido urbano da cidade.

As ações estarão estruturadas em quatro frentes principais:

Urbanismo tático, arte urbana e ativação cultural: incentivo à apropriação dos espaços públicos pela comunidade por meio de intervenções artísticas e culturais.

Obras de infraestrutura urbana: melhoria das condições de drenagem, pavimentação, saneamento, iluminação pública, drenagem e acessibilidade.

Criação e qualificação de espaços públicos: implantação de praças, quadras e centros comunitários para fomentar o convívio social e a integração comunitária.

Soluções de mitigação de risco e adaptação climática: implementação de medidas sustentáveis para ampliar a resiliência urbana e reduzir impactos ambientais, com foco em contenção de encostas e aplicação de soluções baseadas na natureza.

Relação com as Soluções Propostas

A implantação deste componente responde diretamente à necessidade de superação da infraestrutura urbana deficiente, mitigação de riscos climáticos e criação de espaços públicos de qualidade. As soluções propostas reforçam a resiliência das comunidades ao proporcionar melhor acesso a serviços urbanos, reduzir vulnerabilidades ambientais e promover a integração territorial.

Resultados Esperados

Com a execução deste componente, espera-se alcançar:

- Ampliação da infraestrutura urbana: regularização de vias, saneamento e drenagem para proporcionar maior segurança e acessibilidade;

- Redução de riscos ambientais: estabilização de encostas, recuperação de áreas degradadas e implementação de drenagem sustentável;

- Valorização dos espaços públicos: criação de ambientes de convivência seguros, acessíveis e propícios ao desenvolvimento comunitário;

- Fortalecimento da identidade local e participação cidadã: incentivo à apropriação dos espaços urbanos por meio de arte, cultura e gestão comunitária.

Com isso, o componente de Urbanização Integrada e Resiliência Urbana contribui para um **desenvolvimento urbano sustentável**, garantindo que as comunidades estejam mais bem preparadas para **enfrentar os desafios climáticos e ambientais** do futuro.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente busca transformar as comunidades e favelas de Niterói por meio de uma série de **intervenções estruturantes, com foco na mitigação de riscos, adaptação às mudanças climáticas e resiliência urbana.** Os esforços visam promover a integração social e territorial, reduzindo vulnerabilidades ambientais e climáticas, e oferecendo condições mais seguras e sustentáveis para a população. A seguir, são apresentados os produtos e ações integradas do componente:

(P) 3.1 - Projetos Urbanísticos Entregues.

- Elaboração e entrega de projetos urbanísticos integrados para as comunidades atendidas, com base em diagnóstico participativo e diretrizes de sustentabilidade, resiliência e inclusão socioterritorial.

- Mapeamento das condições urbanas existentes, incluindo infraestrutura, acessibilidade, áreas de risco, equipamentos públicos e espaços de convivência.

- Proposição de soluções de qualificação urbana que contemplem rede viária interna, drenagem, saneamento, áreas verdes, espaços públicos, iluminação pública e arborização.

- Inclusão de estratégias de adaptação climática e redução de riscos ambientais no desenho urbano.

- Construção do projeto com participação ativa da comunidade, incorporando demandas e saberes locais para fortalecer o pertencimento e a apropriação do território

Meta: 12 projetos urbanísticos integrados entregues.

(P) 3.2 - Ações de Urbanismo Tático e Arte Urbana Implementadas.

- Implementação de ações de urbanismo tático, como a pintura de brincadeiras no chão e a instalação de pequenos espaços verdes.

- Pintura de fachadas e empenas com murais que retratam a história local, utilizando técnicas de arte urbana.

- Recuperação de fachadas em pontos de interesse comunitário.

- Realização de oficinas participativas com os moradores para o planejamento e execução das intervenções de urbanismo tático.

- Instalação de mobiliário urbano simples, como bancos e lixeiras recicláveis, promovendo a convivência e a identidade local.

- Incentivo à apropriação dos espaços públicos pela comunidade por meio de intervenções culturais que fortaleçam a identidade local e a coesão social.

Metas: Realizar **ações de urbanismo tático e arte urbana** nas **12 comunidades atendidas**, com foco na valorização dos espaços públicos, participação cidadã e fortalecimento da identidade local, incluindo:

- 1 oficina participativa em cada comunidade, totalizando **12 oficinas**, com envolvimento direto dos moradores no planejamento das intervenções;

- Realização do conjunto de intervenções planejados nas oficinas (Pintura de mural em fachada ou empena, intervenção lúdica ou de convivência por comunidade, como pintura de chão, instalação de mobiliário urbano simples ou criação de microespaços verdes) em cada comunidade, com **12 murais de arte urbana.**

(P) 3.3 - Melhoria Urbana Finalizada (Vias, Acessos, Iluminação Pública, Drenagem, Água e Esgoto)

- Construção, ampliação e melhoria do sistema viário interno das comunidades, incluindo pavimentação de vias veiculares, escadarias e rampas de pedestres.

- Requalificação de calçadas e ciclovias, melhorando a conectividade e a acessibilidade entre as áreas e a cidade formal.

- Condicionamento de acessos e instalação de segurança viária, como guarda-corpos e sinalização.

- Implementação de arborização ao longo das vias, proporcionando conforto térmico e valorização estética.

- Construção ou melhoria da infraestrutura hídrica, assegurando o fornecimento adequado de água potável às comunidades.

- Melhoria da infraestrutura de saneamento básico, garantindo o acesso à rede de esgoto e a coleta e tratamento adequados de efluentes domésticos.

Metas: Execução do Projeto Urbanístico de cada uma das **12 comunidades**.

(P) 3.4 - Espaços e Equipamentos Públicos Reformados/Construídos

- Construção ou requalificação de áreas de lazer, como praças e parques recreativos, além de quadras poliesportivas.

- Implantação de hortas urbanas e espaços de convivência comunitária para fomento da interação e fortalecimento da coesão social.

- Desenvolvimento de novos usos para áreas subutilizadas, transformando-as em locais de encontro e atividades culturais ou recreativas.

- Construção ou requalificação de centros comunitários, associações de moradores e outros espaços de serviço público.

Metas: Construção de **14 equipamentos ou espaços públicos,** além da reforma/requalificação de **30 equipamentos ou espaços públicos existentes,** nas 12 comunidades atendidas.

(P) 3.5 - Obras de Contenção de Encostas e Redução de Risco (Infraestrutura Verde e SbN) implementadas.

- Implementação de soluções baseadas na natureza (SbN) e infraestrutura verde, como sistemas de microdrenagem, jardins de chuva e técnicas de bioengenharia.

- Recuperação e reflorestamento de áreas degradadas, ampliando a resiliência das comunidades aos desastres naturais e os impactos das mudanças climáticas.

- Estabilização de encostas para mitigar os riscos de deslizamentos e alagamentos, por meio de obras de contenção e revegetação de áreas vulneráveis.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: (C) 4 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Valor estimado em Dólar (USD): 3.854.000,00

Descrição:

O Componente de **Fortalecimento Institucional** tem como objetivo contribuir para **estruturar a resiliência institucional da administração pública municipal nas áreas de comunidades e favelas**, promovendo a in **tegração entre políticas setoriais e a qualificação da gestão territorial de forma participativa, digital e orientada por dados.** O componente busca **superar a fragmentação das políticas públicas nos territórios de comunidade e favelas**, **a ausência de diagnósticos sistematizados e atualizados** sobre essas comunidades e a **limitação de instrumentos que garantam a participação social** no planejamento e monitoramento das ações públicas.

Por meio do **fortalecimento da estrutura institucional** necessária para a execução do programa, este componente viabiliza a formulação, gestão e monitoramento de políticas públicas mais eficazes e adaptadas às realidades das ZEIS e comunidades atendidas. A partir da implantação de sistemas digitais e instrumentos de planejamento habitacional, o componente busca consolidar uma abordagem integrada e orientada por dados, ampliando a resiliência institucional do programa frente aos desafios territoriais, sociais e climáticos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Este componente concentra-se na criação de ferramentas técnicas, digitais e metodológicas que qualifiquem a atuação do programa nas comunidades atendidas. Visa à construção de uma base sólida de dados e protocolos técnicos que permitam uma gestão territorial mais eficiente, intersetorial e com ampla participação cidadã.

(P) 4.1 - Sistema de ação integrada socioeconômica, técnico-habitacional e urbanístico

- Desenvolvimento e implantação de uma plataforma digital integrada que permita a articulação entre diferentes bases de dados e instrumentos de gestão relacionados aos aspectos sociais, urbanísticos e habitacionais dos territórios populares.

- O sistema subsidiará o planejamento urbano, a tomada de decisões baseadas em evidências e o acompanhamento dos impactos das políticas públicas implementadas.

Meta: 1 sistema e plataforma de dados digital integrado implantado e em operação.

(P) 4.2 - Mapeamentos especializados

- Realização de mapeamentos territoriais, socioeconômicos e técnicos, com o objetivo de gerar diagnósticos atualizados sobre as comunidades atendidas.

- Os levantamentos envolvem o uso de geotecnologias, coleta de dados primários e processos participativos para garantir a representatividade das informações e fortalecer o controle social.

Meta: 12 mapeamentos especializados produzidos e sistematizados (1 para cada comunidade).

(P) 4.3 - Materiais de fortalecimento técnico do programa

- Capacitação da equipe técnica multidisciplinar do programa, visando fortalecer a qualificação técnica e a efetividade das ações no território

- Aquisição de licenças de softwares especializados para apoio à análise territorial, elaboração de projetos e monitoramento das ações do programa, incluindo ferramentas de geoprocessamento, desenho técnico, modelagem urbana e gestão integrada.

- Compra de equipamentos tecnológicos (computadores, notebooks, tablets e periféricos) com especificações adequadas às demandas da equipe técnica, garantindo estrutura operacional adequada para o desenvolvimento dos projetos e o acompanhamento das atividades em campo e escritório.

- Implantação da Metodologia BIM na Prefeitura através da aquisição de licenças do Sistema BIM para o planejamento e controle das obras municipais e implantação na Prefeitura, incluindo a capacitação especializada de funcionários envolvidos com o seu uso.

Meta: 48 licenças de softwares, aproximadamente 40 usuários com parque tecnológico atualizados e adequados aos seus devidos usos técnicos, e por fim, todos os funcionários dentro do programa capacitados para funcionamento do

programa.

(P) 4.1.4 - Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)

- Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), por meio da contratação de consultoria para os estudos de diagnóstico municipal, além das consultas públicas necessárias.

- O plano será construído de forma participativa, com base nos dados produzidos pelos diagnósticos e mapeamentos, e articulado aos demais instrumentos urbanísticos da cidade.

Meta: 1 PLHIS atualizado, validado e publicado.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: (C) 5 - GOVERNANÇA
Valor estimado em Dólar (USD): 13.344.000,00

Descrição:
O **Componente 5 – Governança** tem como finalidade assegurar a execução eficaz, transparente e integrada do Programa Vida Nova no Morro (PVNM), por meio do fortalecimento institucional da Prefeitura de Niterói em aspectos estratégicos de supervisão, gestão e controle. Este componente concentra as estruturas e ferramentas essenciais à boa governança do programa, viabilizando a articulação intersetorial, o monitoramento contínuo e a conformidade técnico-financeira das ações executadas.

Resultados esperados com a implantação do Componente 5 – Governança:

- Fortalecimento da capacidade institucional do município, por meio da profissionalização da gestão do programa e da capacitação técnica das equipes envolvidas;

- Garantia de conformidade ambiental e social, com a adoção de boas práticas internacionais e nacionais de supervisão e mitigação de riscos;

- Transparência na execução financeira, assegurada pela atuação da auditoria independente e pela produção de relatórios sistemáticos;

- Melhoria da articulação intersetorial, com definição de fluxos de trabalho claros, sistemas de acompanhamento e integração entre secretarias;

- Aprimoramento dos mecanismos de controle, planejamento e prestação de contas, fortalecendo a governança pública e a confiança institucional;

- Legado institucional: desenvolvimento de modelos e ferramentas replicáveis em outros programas estruturantes do município.

Com esse componente, o PVNM consolida uma abordagem de **gestão pública eficiente, moderna e transparente**, essencial à implementação de um programa multissetorial e de impacto transformador nos territórios populares de Niterói.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente de Governança tem como objetivo assegurar a gestão eficiente, transparente e coordenada do Programa Vida Nova no Morro (PVNM), garantindo a boa execução física, orçamentária e social do programa, em conformidade com os padrões nacionais e internacionais de financiamento, gestão pública e salvaguardas socioambientais.

As ações serão executadas por meio de três produtos estratégicos, que correspondem aos serviços técnicos especializados de supervisão, apoio à gestão e auditoria externa, promovendo a integridade, rastreabilidade e capacidade institucional da Prefeitura de Niterói.

(P) 4.2.1 – Supervisão Técnica, Ambiental e Social

Descrição:
Este produto contempla a contratação de consultorias técnicas especializadas e/ou equipes multidisciplinares para acompanhar, avaliar e orientar a execução das ações físicas, sociais, habitacionais e ambientais do programa. A

supervisão ocorrerá de forma contínua, com foco no cumprimento das metas, prazos e salvaguardas, além da identificação e mitigação de riscos.

Bens e serviços ofertados:

- Serviços especializados de supervisão de obras e intervenções urbanas;
- Monitoramento ambiental e social das áreas de intervenção;
- Relatórios técnicos mensais e semestrais;
- Apoio ao cumprimento de salvaguardas ambientais e sociais do BID;
- Recomendações corretivas e apoio à gestão de riscos.

Metas quantitativas: 100% das obras e intervenções acompanhadas por equipe técnica.

(P) 4.2.2 – Apoio à Gestão do Programa

Descrição:
Este produto garante o suporte técnico, administrativo e operacional necessário para o funcionamento da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). Inclui a contratação de equipe, estruturação de sistemas de gestão, produção de relatórios gerenciais e realização de capacitações.

(P) 4.2.3 – Auditoria Externa

Descrição:
Produto voltado à contratação de auditoria independente para acompanhamento e verificação da regularidade físico-financeira do programa, conforme exigido pelos órgãos de controle e pelo organismo financiador. A auditoria assegurará transparência, legalidade e conformidade na aplicação dos recursos.

Bens e serviços ofertados:

- Relatórios técnicos de auditoria com parecer sobre a execução financeira;
- Avaliação de conformidade legal, contábil e procedimental;
- Recomendações técnicas para correções e melhorias;
- Interlocução com órgãos de controle externo.

Metas quantitativas:

- 5 auditorias independentes realizadas (1 por ano);

1. 6. **Beneficiários**

O Programa Vida Nova no Morro tem como **público-alvo os moradores de favelas e comunidades de Niterói que vivem em contextos de vulnerabilidade social, urbana e ambiental**. Estima-se que o programa atuará em 7.662 domicílios, beneficiando aproximadamente 18.491 pessoas. Esse público representa cerca de 3,8% da população total de Niterói, estimada em 481.749 habitantes (IBGE/2022), concentrando-se nas áreas com maiores desafios de acesso a direitos, infraestrutura, renda e qualidade de vida. De acordo com dados do Observatório do Cadastro Único, essa população é majoritariamente considerada de baixa renda, evidenciando a urgência de políticas públicas específicas e integradas para a superação das desigualdades. Segundo o Índice de Vulnerabilidade do Cadastro Único (IVCAD), a média do município é de 0,292 – sendo que quanto mais próximo de 1, maior o grau de vulnerabilidade –, reforçando a necessidade de intervenções estruturantes que fortaleçam redes comunitárias, ampliem o acesso a direitos e promovam inclusão produtiva e social.

O Programa busca **ampliar o bem-estar social e promover o desenvolvimento sustentável, com impacto direto nessas comunidades** e reflexos positivos em toda a cidade. Apesar dos avanços de Niterói no Índice de Progresso Social (IPS Brasil 2024), persistem desigualdades nos territórios populares. As ações visam reduzir riscos, melhorar a habitabilidade e ampliar o acesso à moradia digna, saneamento, mobilidade, educação, cultura e espaços públicos.

Desenvolvimento Socioeconômico (OE: 101, 105, 107, 207, 214)

Beneficiários diretos: moradores das comunidades, com foco em mulheres chefes de família, jovens, pessoas negras, com deficiência e famílias em pobreza/extrema pobreza. Indiretos: coletivos culturais, organizações comunitárias, empreendedores locais e toda a população de Niterói, ao fortalecer redes de apoio e reduzir desigualdades territoriais. A participação requer compromisso com atividades formativas (como oficinas e cursos) e com ações comunitárias e sustentáveis promovidas pelo Programa.

Impacto estimado: até 10.000 pessoas diretamente; 481.749 indiretamente.

Melhorias Habitacionais (OE: 111, 202, 214)

Beneficiários diretos: moradores de domicílios inadequados ou em risco, com prioridade para mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência e famílias com crianças pequenas. Critérios: morar há pelo menos 3 anos no local, não ter sido beneficiado por outro programa, não ser locatário, comprovar precariedade. Haverá cláusula de permanência mínima de cinco anos no imóvel beneficiado, vedando venda, aluguel ou cessão. Nos casos de famílias com mais de uma unidade domiciliar, apenas uma residência será contemplada com melhorias habitacionais se elegível nos critérios. Condicionalidades: participação no acompanhamento técnico-social e autorização das obras.

Impacto estimado: até 7662 residências beneficiadas; com pelo menos 18.491 pessoas impactadas indiretamente.

Urbanização Integrada e Resiliência Urbana (OE: 111, 201, 202)

Beneficiários diretos: moradores das áreas com obras de drenagem, pavimentação, contenção, saneamento e requalificação de praças, escolas e unidades de saúde. Indiretos: toda a cidade, com melhorias em mobilidade, áreas verdes e espaços públicos. Participação exige residência nas áreas atendidas e, quando possível, envolvimento em consultas públicas, oficinas e núcleos de acompanhamento. Famílias beneficiadas devem zelar pelos espaços.

Impacto estimado: aproximadamente 18.491 pessoas diretamente; 481.749 indiretamente.

Fortalecimento Institucional (OE: 301, 302, 303)

Beneficiários diretos: gestores públicos, equipes técnicas e instituições parceiras. Objetivo: qualificar e modernizar a gestão pública com uso de dados, tecnologias e participação social. A produção técnica será pública, devendo alimentar sistemas integrados e plataformas de transparência.
Impacto estimado: cerca de 40 funcionários públicos capacitados diretamente; 481.749 beneficiários indiretos com políticas mais eficientes.

Governança

Beneficiários diretos: equipes responsáveis pela coordenação, monitoramento e avaliação do Programa. Foco na gestão eficiente, prestação de contas e continuidade das ações. Indiretos: toda a população, com melhor aplicação dos recursos e transparência garantida.
Condicionalidades: auditorias independentes, relatórios periódicos e diálogo com a sociedade civil.
Impacto estimado: 40 funcionários públicos diretamente; 481.749 indiretamente.

Impacto Total Estimado: Cerca de 18.491 pessoas impactadas diretamente com ações em melhorias habitacionais, urbanização integrada e resiliência urbana e desenvolvimento socioeconômico. Indiretamente, o PVNM poderá beneficiar os 481.749 habitantes de Niterói, ao fortalecer redes de apoio, ampliar políticas públicas e transformar os territórios populares de forma integrada e sustentável.

1. 7. **Anexos**

Anexo I.1 - INDICE DE TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

Anexo I.2 - Plano de Cidade Inteligente

Anexo I.3 - Niterói que queremos

Anexo I.4 - Lei Urbanísta

Anexo I.5 - Plano de Contingência Verão

Anexo I.6 - Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência de Niterói

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O PVNM **contribui diretamente para diversos Objetivos Estratégicos do Governo Federal, com foco na superação da pobreza urbana, inclusão produtiva, qualificação territorial e fortalecimento institucional**. Estruturado em quatro componentes, o programa propõe soluções integradas, sustentáveis e territorializadas que incidem sobre fatores estruturantes da vulnerabilidade social e urbana em Niterói.

Os principais OEs relacionados ao PVNM são:

1. OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza

O PVNM atua sobre causas estruturais da pobreza urbana, promovendo inclusão produtiva e geração de renda em comunidades vulneráveis, com:

- Galpão das Oportunidades para capacitação e autoconstrução assistida;

- Incubação de negócios populares com suporte técnico e canais de venda;

- Programas voltados a mulheres e jovens;

- Espaços comunitários com foco em formação e redes de apoio.

Indicadores: IIEMIP, IIPJ, Produtividade por Pessoal Ocupado (territorial)

Nível: A (5 pontos)
Justificativa: Objetivos diretamente relacionados à redução da pobreza. Indicadores SMART com metas escalonadas. Recursos expressivos no Componente 1 e soluções inovadoras e replicáveis.

2. OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural

O PVNM adota a economia criativa como estratégia de geração de renda e valorização territorial:

- Incubadoras culturais voltadas a gastronomia, moda e arte digital;

- Urbanismo tático com arte urbana;

- Ativação de praças e centros comunitários para uso cultural.

Indicador: IIECCP

Nível: B (3 pontos)
Justificativa: Objetivos específicos claros e indicador SMART definido. As ações são relevantes, mas os recursos dedicados são menores em relação a outras frentes.

3. OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres

A igualdade de gênero é estruturante no PVNM, com:

- Formação e empreendedorismo feminino;

- Apoio à criação de negócios locais por mulheres;

- Fortalecimento de redes comunitárias e lideranças femininas.

Indicador: IIEMIP

Nível: A (5 pontos)
Justificativa: Ações territorializadas e focadas em mulheres negras e periféricas. Indicador SMART robusto. Alocação significativa de recursos e abordagem inovadora.

4. OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

O PVNM promove urbanização integrada com:

- Melhorias em 1.500 moradias;

- Obras de saneamento e acessibilidade;

- SbN e requalificação de espaços públicos.

Indicadores: PPUHPI, IAASB, aumento da área verde

Nível: A (5 pontos)
Justificativa: Ações estruturantes e integradas. Indicadores SMART. Recursos concentrados nos Componentes 2 e 3. Soluções eficientes e replicáveis.

5. OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

O PVNM adota SbN e infraestrutura verde:

- Jardins de chuva e telhados verdes;

- Reflorestamento urbano e eco limites;

- Moradias com tecnologias sustentáveis.

Indicador: Indicador de Aumento da Cobertura Vegetal Urbana (IACVU)

Nível: B (3 pontos)
Justificativa: Ações ambientais relevantes, mas integradas a um escopo urbano mais amplo. Recursos destinados são importantes, porém não centrais.

6. OE 202 – Ampliar capacidades frente a riscos e mudanças climáticas

O PVNM qualifica territórios frente a desastres e clima:

- Contenção de encostas, drenagem e iluminação sustentável;

- Conectividade por escadarias e passarelas acessíveis;

- Reaproveitamento de materiais e hortas comunitárias.

Indicadores: PPUHPI, EAF

Nível: A (5 pontos)
Justificativa: Ações urbanas com foco em resiliência. Indicadores robustos. Forte articulação com saúde, segurança e mobilidade. Recursos significativos e soluções sustentáveis.

7. OE 207 – Ampliar geração de trabalho e inserção produtiva dos mais pobres

O PVNM atua na inclusão produtiva:

- Capacitação profissional e apoio ao empreendedorismo;

- Galpão das Oportunidades como polo de formação;

- Fortalecimento de redes e negócios comunitários.

Indicador: IIPJ

Nível: B (3 pontos)
Justificativa: Objetivo claro e indicador com metodologia SMART. Ações formativas com impacto relevante, embora gradual. Boa articulação institucional.

8. OE 214 – Reduzir desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

PVNM busca equidade territorial com:

- Melhorias habitacionais e reassentamento;

- Obras de infraestrutura e espaços públicos;

- Apoio à geração de renda e sistemas de gestão participativa.

Indicadores: IIEMIP, IIPJ, PPUHPI, EAF

Nível: A (5 pontos)
Justificativa: Objetivos alinhados à redução de desigualdades socioespaciais. Indicadores SMART e metas viáveis. Recursos relevantes e ações replicáveis.

9. OE 301 – Ampliar democracia participativa, transparência e controle social

Governança e transparência são foco do Componente 4:

- Sistema integrado de dados (P4.1.1);

- Mapeamentos participativos (P4.1.2);

- Materiais técnicos acessíveis (P4.1.3);

- PLHIS participativo (P4.1.4);

- Aplicação do ITGM.

Indicador: ITGM

Nível: B (3 pontos)
Justificativa: Ações institucionais relevantes e bem estruturadas. Indicador robusto. Recursos proporcionais. Potencial de impacto alto, mas em dimensão transversal.

2. 2. **Anexos**

Anexo II – Detalhamento dos Objetivos Estratégicos Relacionados ao PVNM

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O arranjo institucional do Programa Vida Nova no Morro (PVNM) foi estruturado para assegurar uma gestão coordenada, eficiente e orientada a resultados. O Município de Niterói será o mutuário da operação e designou a **Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF)** como **órgão executor do programa**, responsável direta pela implementação, monitoramento e avaliação das ações previstas.

A SMHRF abrigará a **Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)**, cuja criação será formalizada por Portaria específica. A UGP contará com uma equipe técnica especializada e multidisciplinar, estruturada em dois núcleos principais:

- Núcleo de Monitoramento e Controle Operacional

- Núcleo Técnico

Adicionalmente, será vinculada à UGP uma **Comissão Especial de Licitações Internacionais**, responsável pela condução dos processos licitatórios do programa, em articulação direta com a Procuradoria de Termos, Licitações e Contratos (PTCL), da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Além disto, o Programa também criará um **Grupo de Trabalho (GT) Intersetorial** dentro da Administração Pública Municipal, com objetivo de avaliar e aprovar os encaminhamentos propostos pela Coordenação do Programa, além de validar as diretrizes e prioridades estratégicas para a sua implantação.



Coordenação Geral do Programa

A Coordenação Geral da UGP será exercida por profissional com comprovada experiência em gestão de projetos públicos e programas financiados por organismos internacionais. Essa função será responsável pela articulação institucional com o Governo Federal, o agente financiador (BID) e as demais instâncias envolvidas, além da supervisão técnica, operacional e administrativa da execução do programa.

Núcleo de Monitoramento e Controle Operacional

Coordenações:

- Aquisições, Licitações, Apoio Jurídico e Contratos: elaboração e acompanhamento de processos licitatórios, em conformidade com as exigências do BID.

- Planejamento e Controle: coordenação do Plano Operativo Anual (POA), do Plano de Execução do Projeto (PEP) e do monitoramento físico-financeiro.

- Administrativa-Financeira: gestão contábil e financeira da operação, consolidação de prestações de contas e relatórios de desembolso.

Núcleo Técnico

Coordenações:

- Meio Ambiente

- Projetos Urbanos e Obras

- Melhorias Habitacionais (Arquiteto de Família)

- Trabalho Social e Reassentamentos

- Mapeamento Socioeconômico e Diagnóstico

Cada coordenação será composta por equipes técnicas com conhecimento específico, oriundas de secretarias temáticas e entidades parceiras, garantindo a execução qualificada e integrada dos componentes do Programa.

Instituições Municipais Envolvidas e seus Papéis Institucionais

- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG): apoio técnico na elaboração e monitoramento do POA e articulação com os instrumentos de planejamento estratégico do município.

- Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES): articulação e execução de ações de proteção social, reassentamentos e apoio às famílias vulneráveis.

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS): acompanhamento das condicionantes ambientais, apoio técnico em soluções baseadas na natureza e licenciamento ambiental.

- Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura (SMOBI): execução de obras de infraestrutura urbana previstas nos componentes 2 e 3 do programa.

- Secretaria Municipal de Educação (SME): apoio às ações de formação cidadã, qualificação profissional e mobilização juvenil nos territórios atendidos.

- Secretaria Municipal de Saúde (SMS): articulação de ações de promoção da saúde, vigilância sanitária e apoio aos reassentamentos.

- Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION): suporte na elaboração de projetos e execução de obras, especialmente no que se refere à urbanização integrada.

- Procuradoria Geral do Município (PGM): apoio jurídico à UGP, elaboração de pareceres e supervisão dos processos licitatórios, por meio da PTCL.

- Controladoria Geral do Município (CGM): acompanhamento da conformidade e transparência na aplicação dos recursos do programa, contribuindo com o controle social e institucional.

Este arranjo institucional assegura a atuação coordenada entre a SMHRF, demais secretarias municipais e órgãos técnicos, promovendo uma governança eficaz, com foco em resultados, eficiência administrativa e impacto transformador nas comunidades de Niterói. O organograma da UGP e sua composição detalhada encontram-se anexados à presente Carta Consulta.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF)
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O Município de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF), dispõe de capacidade institucional consolidada para a implementação do Programa Vida Nova no Morro (PVNM), apoiada por um histórico robusto de execução de políticas públicas integradas nas áreas de habitação, urbanismo, regularização fundiária e planejamento territorial.

A estrutura operacional será centralizada na **Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)**, vinculada à SMHRF, que contará com uma **equipe multidisciplinar composta por aproximadamente 31 profissionais**. Esses profissionais serão distribuídos entre os núcleos de **Monitoramento e Controle Operacional** e **Núcleo Técnico**, organizados em coordenações com atribuições específicas e competência técnica comprovada em ações similares, inclusive com experiência prévia em projetos financiados por organismos multilaterais.

A **equipe da UGP contará com perfis técnicos especializados**, como engenheiros(as), arquitetos(as), designers, assistentes sociais, analistas de planejamento, técnicos ambientais, economistas, advogados(as), administradores(as) e especialistas em aquisições e finanças públicas. Todos os profissionais terão atribuições claras, formalizadas em instrumento normativo próprio (Portaria de criação da UGP), conforme modelo recomendado em operações com financiamento internacional.

Além disso, o município prevê a **contratação de empresa de consultoria técnica especializada**, com função de apoiar a supervisão de obras, elaboração de projetos, gestão do programa, mapeamento socioeconômico e apoio ao reassentamento de famílias, agregando capacidade adicional à equipe permanente.

A estrutura operacional contará com:

- Espaço físico exclusivo para a UGP, integrado à sede da SMHRF;

- Recursos de TI e sistemas de monitoramento (incluindo o Sistema de Ação Integrada Socioeconômica, Técnico-Habitacional e Urbanístico);

- Orçamento reservado para capacitação técnica continuada, fortalecimento institucional e produção de materiais técnicos;

- Veículos e logística para visitas técnicas e mobilização em campo;

- Suporte administrativo-financeiro integrado com o sistema de gestão da Prefeitura de Niterói.

As coordenações técnicas da UGP serão integradas a um sistema digital de controle e acompanhamento do Plano Operativo Anual (POA) e do Plano de Execução do Projeto (PEP), com relatórios regulares de desempenho físico-financeiro. A estrutura foi desenhada para garantir o acompanhamento em tempo real dos avanços do programa e permitir ações corretivas em caso de desvios.

Não está previsto repasse financeiro entre os órgãos municipais envolvidos, sendo a execução financeira centralizada na SMHRF, por meio da UGP. As demais secretarias e instituições parceiras contribuirão com **apoio técnico e operacional**, com base em instrumentos formais de cooperação intersetorial, como Termos de Cooperação e Protocolos de Atuação Integrada.

Essa modelagem assegura a execução eficiente e integrada do programa, combinando **capacidade técnica interna, apoio externo qualificado e articulação interinstitucional**, garantindo o atingimento dos objetivos e metas do PVNM dentro do prazo e escopo pactuados.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

BID_MATRIZ RESPONSABILIDADE RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade das ações implementadas pelo PVNM será assegurada por um conjunto articulado de estratégias voltadas à manutenção física das infraestruturas, à operacionalização dos novos serviços públicos ofertados e à construção de capacidades comunitárias e institucionais de manutenção e zeladoria, garantindo a continuidade e efetividade dos investimentos realizados.

Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

-Programas de formação, incubação e capacitação: A manutenção das ações será garantida por meio da continuidade de parcerias com instituições de ensino e fomento, além da institucionalização de editais de apoio a

negócios de impacto e inclusão produtiva.

Componente 2 – Melhorias Habitacionais

-As ações de melhorias habitacionais contarão com a atuação contínua de **assessorias técnicas especializadas** nos territórios de atuação, que prestarão suporte às famílias beneficiadas em diversos aspectos.

-A equipe técnica local de "**Arquitetos da Família**", como estratégia de continuidade nos territórios, permanecendo nos locais para orientar os moradores, especialmente nos casos de novas demandas ou ajustes pós-obra.

Componente 3 - Urbanização Integrada e Resiliência Urbana

Estrutura de Manutenção Física

-A **manutenção física das obras e equipamentos públicos** será de **responsabilidade da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SECONSER)**. Esta secretaria possui estrutura técnica e orçamentária voltada à conservação urbana e absorverá as demandas decorrentes do programa dentro do seu planejamento regular.

-Além da SECONSER, a **ION - Empresa de Obras e Infraestrutura de Niterói -** atuará no **apoio técnico e operacional** durante a implementação e, quando necessário, nas fases posteriores de requalificação e ampliação de infraestrutura.

Operacionalização de Serviços Públicos

A **operacionalização dos serviços públicos associados aos produtos do programa** será assumida por diferentes secretarias setoriais e parceiros estratégicos:

-Sec. Municipal de Urbanismo e Mobilidade: continuidade dos projetos urbanísticos e gestão da malha urbana requalificada.

-Sec. do Clima, Defesa Civil e Resiliência de Niterói: apoio ao monitoramento contínuo das intervenções de contenção de encosta, resiliência urbana e áreas de risco.

-Sec. Municipal de Mobilidade: organização dos fluxos de acessibilidade, conexão com a malha urbana existente e articulação com o transporte público.

Empresas concessionárias:

- Águas de Niterói: incorporação dos custos de gestão e manutenção das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

- ENEL: incorporação da manutenção da infraestrutura elétrica e da iluminação pública nos territórios beneficiados.

Secretarias setoriais para equipamentos públicos:

- Secretaria de Saúde e Fundação Municipal de Saúde: operação dos equipamentos de saúde eventualmente implantados.

- Secretaria Municipal de Educação (**SME**): gestão de escolas e espaços educativos implantados ou reformados.

- Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (**SMASES**): apoio na operação de centros comunitários com atendimento social.

Todos esses órgãos terão previsão de recursos operacionais em seus respectivos orçamentos, os quais estarão alinhados ao **Plano Plurianual (PPA) Municipal 2026–2029**, garantindo a cobertura dos custos de manutenção dos equipamentos e espaços públicos implementados pelo programa.

Componente 4 – Fortalecimento Institucional

Este componente será fundamental para sustentar os arranjos institucionais e operacionais após a implementação do programa. A gestão das ações dos demais componentes será monitorada por um **sistema digital integrado**, com base em dados georreferenciados, relatórios periódicos e avaliações participativas, permitindo ajustes e correções ao longo do tempo. A **manutenção e operacionalização** desse sistema vai estar sob responsabilidade da **UGP** (vinculada à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, conforme explicado no item *III.Gestão*).

Governança Comunitária e Sustentabilidade Social

Como parte das ações de fortalecimento comunitário e zeladoria, será criada uma rede de Z**eladoria Comunitária**, com foco especial na **capacitação de mulheres moradoras das comunidades**. Essa equipe será treinada por meio de oficinas práticas para atuar na **manutenção cotidiana de espaços públicos** e na mobilização para o cuidado coletivo com os territórios requalificados.

A operacionalização e manutenção do Programa Vida Nova no Morro estão ancoradas em uma estratégia robusta e integrada, **combinando a atuação de secretarias municipais, empresas concessionárias e a participação ativa das comunidades**. O **planejamento orçamentário do município,** expressado no PPA, **absorverá os custos recorrentes das ações**, garantindo a sustentabilidade financeira e institucional do programa. O cuidado com os territórios não será somente técnico, mas comunitário, assegurando que os espaços transformados continuem vivos, funcionais e apropriados pela população ao longo do tempo.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O PVNM está alinhado com Plano Plurianual Municipal (2022-2025) e Plano Estratégico de longo prazo “Niterói Que Queremos 2013-2033", além dos demais planejamentos estratégicos do município, sendo eles: Plano Diretor Municipal (2019), Lei Urbanística (2024), Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência à Mudança do Clima (2023), Plano de Contingência Verão da Defesa Civil (2024-2025) e Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (2012).

Abaixo seguem os programas e objetivos do PPA Municipal 2022-25, dos quais observamos o alinhamento e a contribuição do PVNM.

PROGRAMA: 0010| CIDADE URBANIZADA

OBJETIVO: Ampliar e conservar a infraestrutura urbana, mantendo a cidade limpa e iluminada e garantindo espaços públicos aptos às atividades de recreação, cultura, turismo e esporte e acessíveis à população com deficiência ou mobilidade reduzida, para contribuir para um maior bem-estar da sociedade.

PROGRAMA: 0132| RESILIÊNCIA A DESASTRES

OBJETIVO: Tornar a cidade mais resiliente a alagamentos, deslizamentos, mudanças climáticas e outros tipos de choques, bem como coordenar ações de preparação, prevenção, mitigação, resposta e recuperação para a proteção e defesa civil.

PROGRAMA: 0134| CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

OBJETIVO: Desenvolver, promover, implementar e divulgar os conhecimentos científicos e tecnológicos, incorporando no dia a dia da população ações relativas a cidades inteligentes, transformação digital e fomento ao ambiente de inovação (startups, incubadoras e coworking), com vistas a resultados econômicos, culturais e sociais.

PROGRAMA: 0146| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: Fomentar o desenvolvimento econômico de Niterói, de forma sustentável e inovadora, nos diversos setores (comercial, industrial e de serviços), mediante políticas integradas, promovendo e valorizando o empreendedorismo, a sustentabilidade de negócios e a atração de investimentos na cidade, bem como o incentivo à qualificação profissional e a geração de emprego e a renda, principalmente aos mais vulneráveis.

PROGRAMA: 0136| CULTURA É UM DIREITO

OBJETIVO: Desenvolver, valorizar, difundir e democratizar as manifestações, expressões, conhecimentos, equipamentos artísticos e culturais e o patrimônio histórico, bem como fomentar a economia criativa. Garantir políticas públicas descentralizadas e a cultura como direito de todas(os) as(os) cidadãs(os) e indutora do desenvolvimento socioeconômico sustentável da cidade.

PROGRAMA: 0137| CIDADE DO ESPORTE

OBJETIVO: Viabilizar atividades esportivas em modalidades diferenciadas nos diversos polos distribuídos pela cidade, para abranger todos os segmentos da população niteroiense, incluindo a população mais vulnerável.

PROGRAMA: 0147 | CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Promover a gestão sustentável dos recursos naturais, preservar a biodiversidade dos seus ecossistemas por meio de ações de recuperação e conservação ambiental, inclusive para fomentar o desenvolvimento econômico-social e sustentável na cidade e ampliar políticas de saneamento básico para população.

PROGRAMA: 0124 | ECONOMIA SOLIDÁRIA

OBJETIVO: Promover a economia solidária a fim de estimular o desenvolvimento socioeconômico sustentável com foco no incentivo ao fortalecimento de redes de economia solidária, atividades formativas para agentes de economia solidária e crédito em moeda social para consumo em comunidades populares.

PROGRAMA: 0140 | JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE

OBJETIVO: Garantir os direitos individuais, difusos e coletivos, combatendo o preconceito, a violência e a intolerância contra os grupos vulneráveis. Promover o exercício da cidadania mediante o desenvolvimento de políticas públicas para a promoção da igualdade racial, a proteção e inserção social e econômica da mulher, da juventude e de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, bem como políticas públicas de combate à LGBTfobia.

PROGRAMA: 0141 | HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO: Garantir o acesso à moradia legalizada e com infraestrutura adequada para a população de baixa renda, promovendo a saúde, o bem-estar e a inclusão social do cidadão, de forma sustentável e com respeito ao meio ambiente.

PROGRAMA: 0149 | GESTÃO PÚBLICA INOVADORA

OBJETIVO: Promover políticas públicas por meio de uma gestão orientada para resultados, inovadora e integrada no uso das novas tecnologias de informação e comunicação, garantindo o compromisso com a responsabilidade fiscal e com a eficiência do gasto público e possibilitando a melhoria da prestação e atendimento dos serviços, com vistas ao alcance dos resultados esperados pela sociedade.

PROGRAMA: 0150 | GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

OBJETIVO: Promover políticas públicas por meio de uma gestão centrada no cidadão, fortalecendo a participação popular nos seus processos decisórios, construindo um ambiente de gestão pública colaborativa e democrática.

3. 4. **Anexos**

Anexo III.2 - Organograma

Anexo III - Trechos do PPA Municipal 2022-2025

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Riscos Econômicos e Financeiros
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A oscilação dos preços de insumos e materiais de construção, bem como a inflação e variações cambiais, podem impactar significativamente o orçamento do projeto. Além disso, eventuais dificuldades na liberação de recursos pelo BID ou pelo orçamento municipal podem comprometer a continuidade das obras, resultando em paralisações e aumento dos custos.

Prevenção e Mitigação:
Criação de um fundo emergencial para cobrir custos imprevistos, acompanhamento rigoroso da execução financeira do projeto e estabelecimento de contratos flexíveis que permitam ajustes de valores conforme a necessidade.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Riscos Regulatórios e Institucionais I
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
A necessidade de cumprir diversas regulamentações municipais, estaduais e federais pode resultar em atrasos na obtenção de licenças ambientais e urbanísticas. O processo burocrático exige a aprovação de órgãos como a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), além de eventuais audiências públicas e consultas comunitárias. A complexidade desses trâmites pode comprometer o cronograma do projeto, resultando em custos adicionais e possíveis paralisações.

Prevenção e Mitigação:
Levantamento antecipado das exigências legais, elaboração de um cronograma estratégico para obtenção de licenças e diálogo contínuo com os órgãos reguladores. Além disso, a contratação de assessoria jurídica especializada ajudará a garantir conformidade com a legislação vigente e minimizar riscos de embargo.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Riscos Ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O projeto será implementado em comunidades de Niterói, algumas situadas em encostas ou áreas de preservação ambiental. A movimentação de terra e a impermeabilização do solo podem causar erosão, aumento do risco de deslizamentos e assoreamento de rios e córregos próximos. Além disso, a retirada da vegetação nativa pode impactar a fauna local e comprometer a qualidade do ar e do solo, especialmente em locais de difícil acesso, onde a logística para mitigação ambiental é mais desafiadora.

Prevenção e Mitigação:
Realização de estudos geotécnicos e ambientais detalhados antes do início das obras, implementação de projetos de drenagem e contenção de encostas, recuperação da vegetação nas áreas afetadas e monitoramento contínuo da qualidade da água e do solo para evitar impactos ambientais irreversíveis.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Riscos Contratuais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A execução do projeto depende da contratação de empresas especializadas em infraestrutura e urbanização. Caso os contratos não sejam bem estruturados, há risco de descumprimento de prazos, superfaturamento, baixa qualidade dos serviços prestados e até mesmo paralisação das obras. Além disso, a falta de fiscalização eficiente pode levar a desvios de recursos e ineficiência na aplicação do orçamento.

Prevenção e Mitigação:

Elaboração de contratos rigorosos com cláusulas de penalização para atrasos e descumprimentos, estabelecimento de mecanismos de auditoria periódica para garantir a transparência na execução das obras e realização de processos licitatórios com critérios rigorosos para seleção de empresas qualificadas.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Riscos Regulatórios e Institucionais II
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Com o propósito de atender a população residente nas comunidades, no máximo de complexidade de serviços essenciais e atendidos pela gestão pública, o programa atua de forma multisecretarial e há a necessidade de atuar em sincronia com as secretárias do grupo de trabalho. Dito isso, há o risco de não cooperação entre o grupo de trabalho com o programa e assim atrapalhando o fluxo de atuação e implementação do desenvolvimento econômico.

Prevenção e Mitigação:
O programa, para além do decreto de criação do programa, haverá o decreto de grupo de trabalho, que formaliza e regula as secretarias atuantes em conjunto ao programa e propõe a participação de forma integrada com as demandas da população local existente.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Riscos Sociais I
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A resistência da comunidade pode ser um dos principais desafios para a implementação do projeto, especialmente se a população não for devidamente informada sobre os benefícios das intervenções. O receio de remoções forçadas, a falta de confiança nas autoridades e o histórico de projetos inacabados podem gerar manifestações, protestos e até mesmo ocupações irregulares nas áreas destinadas às obras.

Prevenção e Mitigação:
Promoção de campanhas de conscientização desde as fases iniciais do projeto, realização de audiências públicas e reuniões comunitárias para escutar as demandas locais e construção de canais de comunicação direta para garantir a transparência no processo e minimizar conflitos.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Riscos Sociais II
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Pode haver problemas de circulação e completude territorial do programa, devido à forte presença de poder paralelo atuante nas comunidades, e assim, impedindo o alcance de famílias e domicílios atendidos, além da possibilidade de descaracterização urbanística.

Prevenção e Mitigação:
Para a prevenção, serão realizadas ações de comunicação e mobilização do programa, envolvendo membros de lideranças comunitárias, equipes de CRAS e Módulo Médico de Família de referências para uma melhor entrada, atuação no território e assim estar alinhado para estratégias de comunicação comunitária e assim haver uma maior disseminação de informação corretas do programa.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Riscos de Infraestrutura e Engenharia
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A implementação do projeto exige intervenções em locais com infraestrutura precária, como ruas estreitas e terrenos instáveis. Há risco de falhas estruturais durante a execução das obras, como colapsos de fundação, problemas no sistema de drenagem e incompatibilidade com a infraestrutura existente. Essas falhas podem comprometer a segurança dos trabalhadores e dos moradores, além de gerar retrabalho e atrasos.

Prevenção e Mitigação:
Realização de estudos técnicos aprofundados antes do início das obras, acompanhamento constante por engenheiros especializados, implementação de normas de segurança rigorosas no canteiro de obras e realização de simulações de impacto para garantir a viabilidade técnica de cada intervenção.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Riscos de Indenizações e Desapropriações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Algumas intervenções previstas no projeto podem exigir a remoção de famílias que vivem em áreas de risco ou em espaços destinados a obras de infraestrutura. O processo de indenização pode gerar resistência por parte dos moradores, especialmente se houver desconfiança sobre os valores oferecidos ou incerteza sobre a realocação. Questões fundiárias complexas, como a falta de regularização de imóveis, podem dificultar a negociação e atrasar a implementação do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Realização de um levantamento socioeconômico detalhado para identificar e mapear as famílias afetadas, desenvolvimento de um plano de reassentamento social transparente e justo, com participação ativa da comunidade, e criação de um canal de comunicação eficiente para esclarecer dúvidas e evitar conflitos judiciais. Além disso, é fundamental garantir a ampla divulgação dos critérios de indenização, assegurando que os valores sejam calculados com base em avaliações técnicas independentes e de acordo com parâmetros de mercado, o que aumenta a credibilidade do processo. É previsto a contratação de equipe especializada em mediação de conflitos fundiários para conduzir as negociações de forma imparcial, respeitando os direitos humanos e promovendo soluções consensuais. A atuação conjunta com órgãos de assistência social, defensorias públicas e cartórios pode auxiliar na regularização documental dos imóveis e na redução de insegurança jurídica. O uso de estratégias de comunicação ativa, como reuniões presenciais, visitas domiciliares e materiais informativos, contribui para aumentar a transparência, reduzir resistências e engajar a população nas decisões, favorecendo a adesão ao processo de remoção e reassentamento.

4. 10. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	146.411.000,00	146.411.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	240	300

Juros aplicáveis:
SOFR + margem de fundo em relação a SOFR (0,41% para o 1º trimestre 2025) + acrescida de spread de crédito (0,80% para o ano de 2025)
Periodicidade dos Pagamentos:
PAGAMENTOS SEMESTRAIS
Comissão de Compromisso:
0,5% semestral do valor do saldo do desembolso
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

0

Outras Informações:

.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
(C) 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.664.000,00	416.000,00	1.387.000,00	347.000,00	1.110.000,00	277.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
832.000,00	208.000,00	555.000,00	139.000,00		

Nome do componente					
(C) 2 - MELHORIAS HABITACIONAIS					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.470.000,00	617.400,00	13.600.000,00	3.400.000,00	13.600.000,00	3.400.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
13.600.000,00	3.400.000,00	2.469.200,00	617.400,00		

Nome do componente					
(C) 3 - URBANIZAÇÃO INTEGRADA E RESILIÊNCIA URBANA					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.896.100,00	1.474.000,00	13.431.000,00	3.357.000,00	13.430.000,00	3.358.800,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
13.430.000,00	3.357.000,00	5.896.100,00	1.474.000,00		

Nome do componente					
(C) 4 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.540.000,00	384.000,00	1.131.000,00	284.800,00	138.200,00	34.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
137.000,00	34.000,00	137.000,00	34.000,00		

Nome do componente					
(C) 5 - GOVERNANÇA					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.135.200,00	533.000,00	2.135.000,00	534.000,00	2.135.000,00	534.800,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.135.000,00	534.000,00	2.135.000,00	533.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

Não se aplica.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O PVNM tem avançado com diversas ações preparatórias essenciais para a sua implementação. Seguem as etapas já realizadas:

Estudo das Áreas de Interesse

- Levantamento das delimitações e informações georreferenciadas das ZEIS do município

Mapeamento das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) de Niterói, onde estão inseridas as comunidades e favelas do município.

- Levantamento dos dados do IBGE referentes a comunidades e favelas de Niterói

Coleta de informações como número de domicílios, densidade populacional, acesso a serviços básicos, infraestrutura existente, entre outros, para estabelecer critérios de prioridade e inserção no programa.

- Levantamento das denominações internas das comunidades

Identificação de como as comunidades preferem ser chamadas, como são reconhecidas pelas Secretarias da Prefeitura e sua relação com as ZEIS.

Visita Técnica às Áreas de Atuação

- Foram realizadas visitas nos territórios para compreender as condições das comunidades, os desafios enfrentados pelos moradores e as potencialidades locais.

- As visitas envolveram equipes multidisciplinares, com profissionais das áreas de habitação, infraestrutura, assistência social, saúde e defesa civil, além de lideranças comunitárias. Durante as visitas, foram observadas questões como precariedade habitacional, acessibilidade, mobilidade, riscos ambientais e disponibilidade de serviços públicos.

- O contato direto com a população permitiu coletar percepções sobre as principais demandas e fortalecer o envolvimento comunitário no desenvolvimento das soluções propostas pelo PVNM.

- A equipe de visita incluiu profissionais de diferentes segmentos, como: **SMHRF, SMCDCR, CRAS, PMF, GPTC,** além de lideranças comunitárias e representantes locais.

Mobilização de Líderes Comunitários

- Foram promovidos encontros com representantes das comunidades para diálogo sobre os principais desafios e expectativas.

- Mobilização das lideranças para participação ativa no planejamento e implementação do programa.

Reuniões e Levantamentos de Informações nas Secretarias de Niterói

1. SMHRF (Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária)

Levantamento de projetos de regularização fundiária realizados ou em andamento.

2. ION (Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói)

Identificação de projetos de infraestrutura urbana já executados ou planejados nas áreas de interesse.

Mapeamento de obras como urbanização, requalificação, pavimentação, contenção de encostas e construção de espaços públicos nos últimos 15 anos.

3. SMCDCR (Secretaria do Clima, Defesa Civil e Resiliência de Niterói);

Levantamento de contatos de lideranças comunitárias.

Mapeamento de áreas de risco, histórico de deslizamentos e alagamentos.

Análise dos protocolos de avaliação de risco e interdição de áreas vulneráveis.

4. SMASES (Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária)

Levantamento do histórico de atuação do CRAS e da Assistência Social nas comunidades.

Coleta de dados sobre famílias cadastradas no CRAS e no Cadastro Único.

5. SMS (Secretaria Municipal de Saúde)

Levantamento de informações sobre a cobertura do Programa Médico de Família (PMF).

Análise dos desafios no atendimento de saúde nas comunidades.

Todas essas ações foram realizadas com o objetivo de estabelecer parcerias interinstitucionais para a implementação do programa.

As informações levantadas servem de insumo para a implantação do projeto, auxiliando na definição dos critérios de intervenção nos territórios, na priorização das áreas mais vulneráveis e no planejamento estratégico das ações a serem executadas.

Benchmarking

- Levantamento de informações e trocas de experiências com iniciativas similares para compreender boas práticas, desafios e lições aprendidas.

- Foram realizadas reuniões com gestores e técnicos dos seguintes programas:

- Favela Bairro – Rio de Janeiro

-Casa Carioca – Rio de Janeiro

-Chegou Sua Vez - Maricá

-Pode Entrar Melhorias - São Paulo

- Nos 3 Programas abaixo, considerando o forte alinhamento com a proposta do Programa Vida Nova no Morro, foram realizadas visitas técnicas para conhecer in loco as estratégias de implementação, os desafios enfrentados e os impactos gerados pelas intervenções.

- Mais Vida nos Morros - Recife

- Promorar – Recife

- Vida Nova nas Grotas – Alagoas

- Essas visitas possibilitaram a troca de experiências com gestores, técnicos e beneficiários, permitindo uma análise detalhada das boas práticas adotadas, das metodologias aplicadas e dos modelos de gestão empregados.

- Essas experiências contribuíram para o fortalecendo o embasamento técnico do programa, aprimorando suas diretrizes de atuação.

Decreto de Criação do PVNM e do Grupo de Trabalho

- Está em fase de análise e aprovação o decreto que estabelece o Programa, e define seus objetivos e diretrizes. Institui também um Grupo de Trabalho Intersetorial, que reúne representantes de diversas secretarias da Prefeitura, a fim de garantir a implementação coordenada e integrada do programa.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.
