PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável - Vida Nova no Morro Niterói/RJ

Proponente: Município de Niterói
Processo SEI: 03101.000989/2025-78
Código do pleito: 3852640862/2025
Versão: 6

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 117.128.800,00 **Valor da Contrapartida:** USD 29.282.200,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 05
1. 2. 3. Soluções 08
1. 2. 4. Resultados 10
1. 3. Objetivo 12
1. 4. Indicadores 14
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 14
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 16
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 18
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 20
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 21
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 22
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 24
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 26
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 27
1. 5. Componentes 28
1. 5. 1. Informações do 1° componente 28
1. 5. 2. Informações do 2° componente 32
1. 5. 3. Informações do 3° componente 34
1. 5. 4. Informações do 4° componente 37
1. 5. 5. Informações do 5° componente 38
1. 6. Beneficiários 40
1. 7. Anexos 41
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 42
2. 1. Áreas estratégicas 42
2. 2. Anexos 43
3. GESTÃO 44
3. 1. Arranjo institucional 44
3. 1. 1. Descrição 44
3. 1. 2. Orgãos Executores 46
3. 1. 3. Estrutura Operacional 46
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 48
3. 2. Operacionalização e Manutenção 48
3. 3. Planejamento Estratégico 51
3. 4. Anexos 52
4. RISCOS 54
4. 1. Informações do 1° risco 54
4. 2. Informações do 2° risco 54
4. 3. Informações do 3° risco 54
4. 4. Informações do 4° risco 54
4. 5. Informações do 5° risco 55
4. 6. Informações do 6° risco 55
4. 7. Informações do 7° risco 55
4. 8. Informações do 8° risco 55
4. 9. Informações do 9° risco 56
4. 10. Anexos 56

5. FINANCIAMENTO 57
5. 1. Condições Financeiras da Operação 57
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 57
5. 2. Cronograma de Desembolso 59
5. 3. Contragarantias 60
5. 4. Anuência do Banco 60
5. 5. Anexos 60
6. ETAPAS REALIZADAS 62
6. 1. Etapas realizadas 62
6. 2. Anexos 68
7. Baixar todos os anexos 70

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável - Vida Nova no Morro Niterói/RJ
Sigla: PVNM
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Niterói

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O **Programa Vida Nova no Morro (PVNM)** é uma ação integrada e territorializada em resposta aos principais desafios enfrentados pelas comunidades e favelas de Niterói que se propõe a atuar por meio da **requalificação urbana e habitacional, da inclusão socioeconômica e territorial, do fortalecimento comunitário e do aprimoramento da capacidade institucional e da promoção da segurança pública**, contribuindo para a construção de territórios mais seguros, justos e resilientes.

Contexto Social:

Niterói é uma cidade de médio porte, situada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com população de 481.749 habitantes (IBGE, 2022). Da década de 1970 para 2020, Niterói apresentou um salto populacional de 200 mil habitantes (IBGE 2010).

A cidade destaca-se pelo elevado Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM-(0,837) e o sétimo do Brasil (Ranking do IDHM base PnadC-IBGE, 2012-2021). Apesar disso, cerca de **18% da população reside em comunidades e favelas**, totalizando aproximadamente 86.983 pessoas. Essa população é na sua maioria de mulheres (52,6%), das quais 72,7% se identificam como pretas ou pardas, com expressiva presença de crianças e jovens: 44% têm até 29 anos (IBGE, 2022).

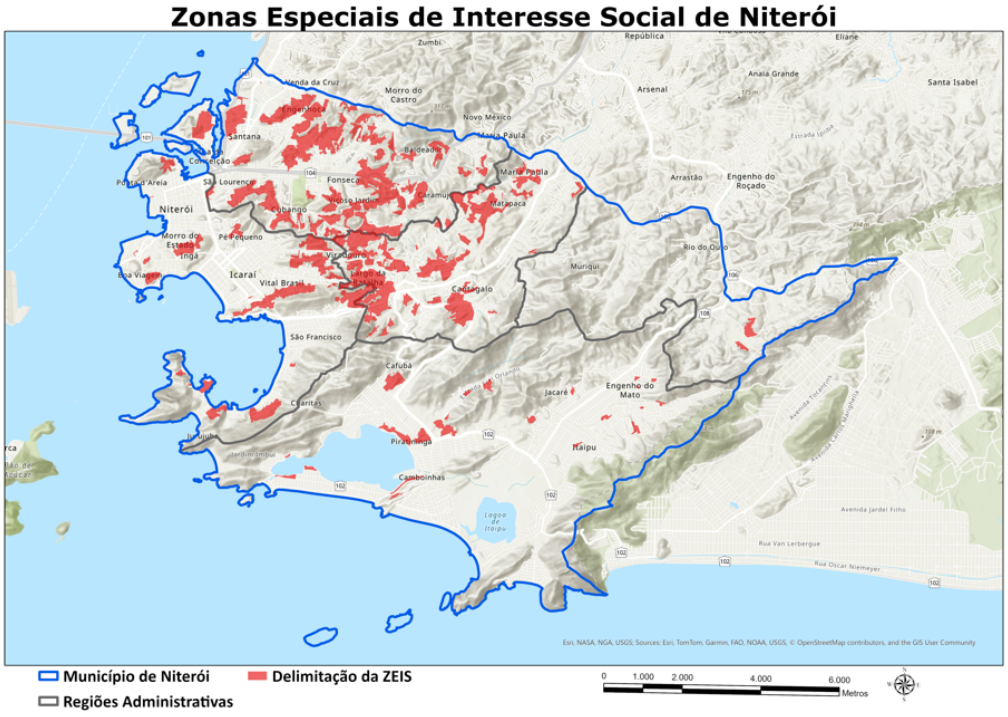


Figura 1: Mapa de ZEIS de Niterói, onde as comunidades e favelas estão inseridas. Fonte: Dados da Lei Urbanística de Niterói, 2024.

Somam-se a esse quadro desafios crescentes na segurança pública. Dados do Instituto de Segurança Pública ISP-RJ apontam aumento da violência letal e de conflitos armados em favelas, afetando a mobilidade, o acesso a serviços e a qualidade de vida. A insegurança compromete escolas, unidades de saúde e políticas públicas, exigindo ações urbanas integradas.

Contexto Econômico:

Niterói possui o terceiro maior PIB (R$ 46.553.203) e o sétimo maior PIB per capita no estado (R$ 90.643,80) (IBGE, 2019).

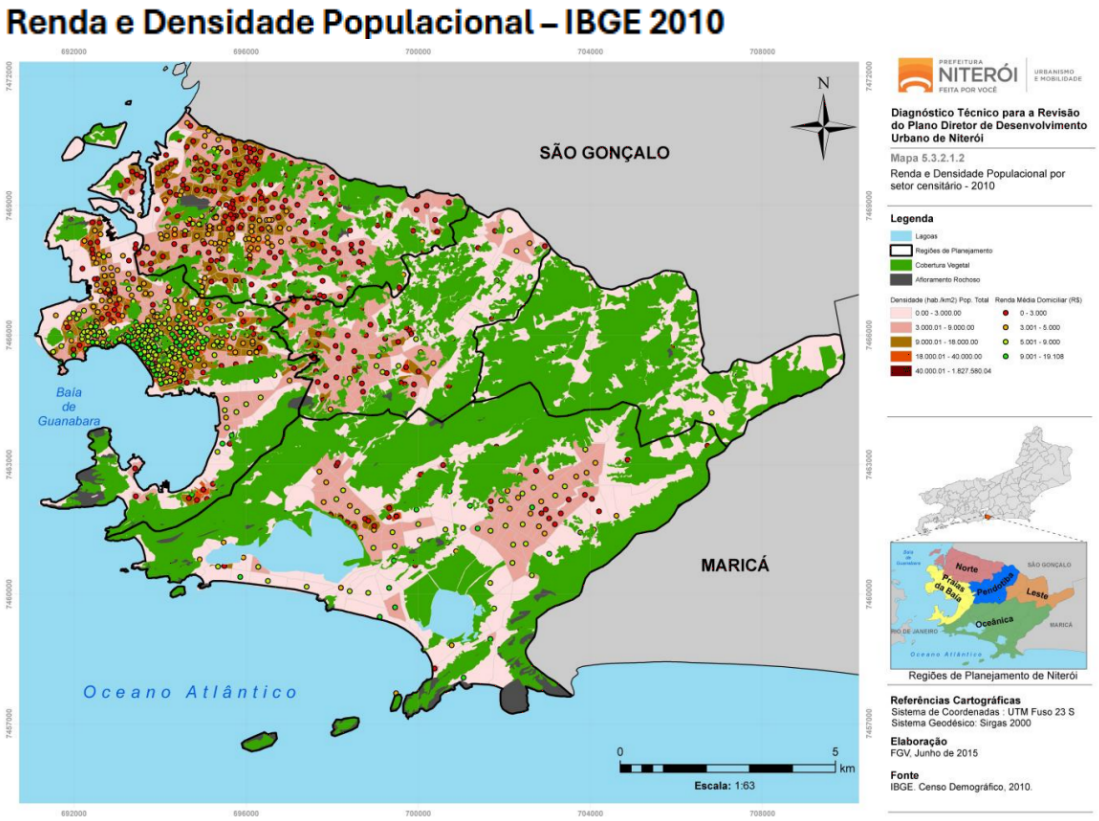


Figura 2: *Renda e Densidade Populacional- IBGE 2010. Fonte: Diagnóstico FGV, 2015.*

Entretanto, o Mapa de Rendimento Domiciliar per capita (FGV, 2015) e o Índice de Gini (0,598 – CEPERJ, 2019) evidenciam a desigualdade socioeconômica e territorial em Niterói. Segundo o Observatório do CadÚnico (2025), mais de 64 mil famílias vivem com até um salário mínimo. Em 2019, pesquisa sobre racismo e empregabilidade apontou que 32,7% dos jovens (15 a 29 anos) estavam desempregados, com destaque para a segregação racial: 48% dos jovens pretos buscavam inserção no mercado. Mulheres pretas eram o único grupo com taxa de desemprego (53%) superior à de emprego (47%) (Pesquisa "QUAL PERFIL?", 2019).

Contexto Político-Institucional:

A gestão pública de **Niterói tem avançado significativamente na construção de instrumentos de planejamento, governança, segurança e resiliência urbana**, com um conjunto integrado de marcos regulatórios que orientam as políticas municipais com foco em sustentabilidade, resiliência, inclusão e justiça territorial, conforme os anexos I.2 à I.7.

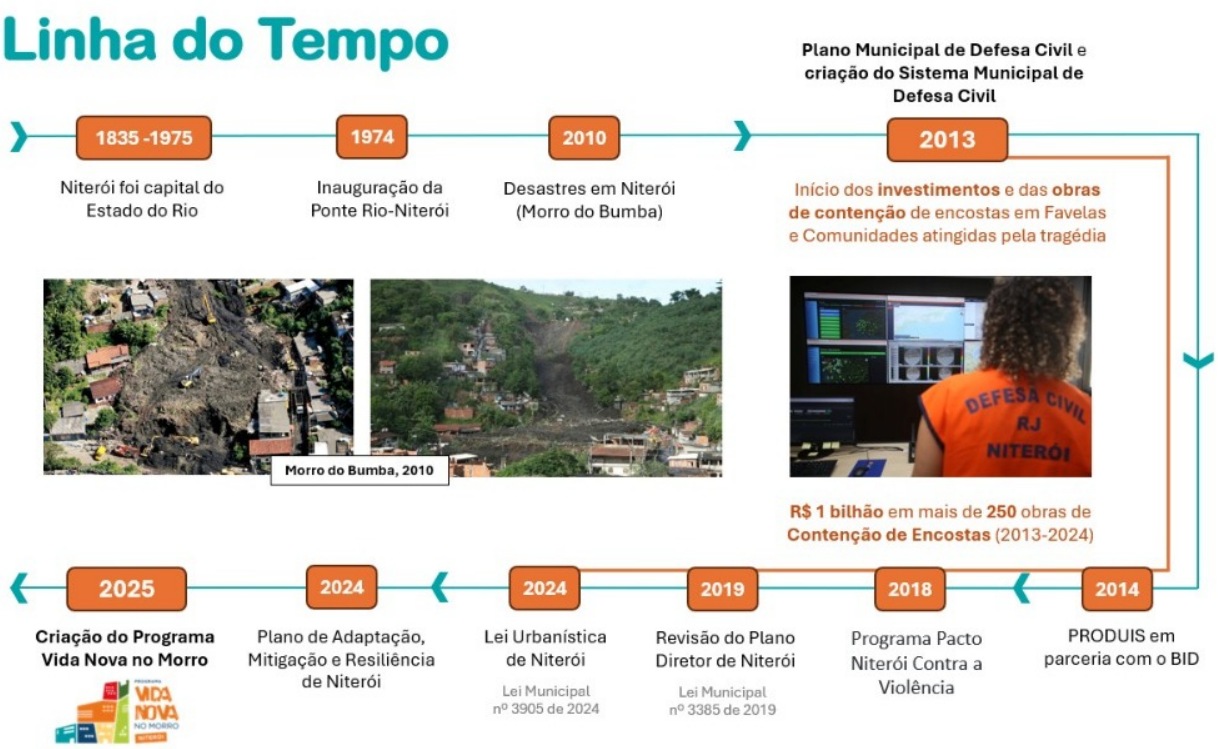


Figura 3: *Linha do Tempo. Fonte: Elaboração PVNNM, 2025*

Em 2013, como resposta ao desastre do Morro do Bumba (2010), Niterói elaborou o Plano Municipal de Defesa Civil e criou o Sistema Municipal de Defesa Civil. Essas ações representaram cerca de R$ 1 bilhão em mais de 250 obras de contenção de encostas em favelas e comunidades, além da criação do Centro de Comando da Defesa Civil, instalação de radares, pluviômetros, estações meteorológicas e NUDECs – Núcleos de Defesa Civil formados por voluntários (Anexos I.5 e I.7), consolidando um importante aparato de prevenção.

O município também estruturou o plano “Niterói Que Queremos – Visão 2033", com metas alinhadas aos ODS, à Nova Agenda Urbana da ONU e ao PPA Federal (2024–2027). Segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (2024), Niterói tem nível médio de desenvolvimento sustentável, com maiores desafios nos ODS 5, 9, 10 e 11.



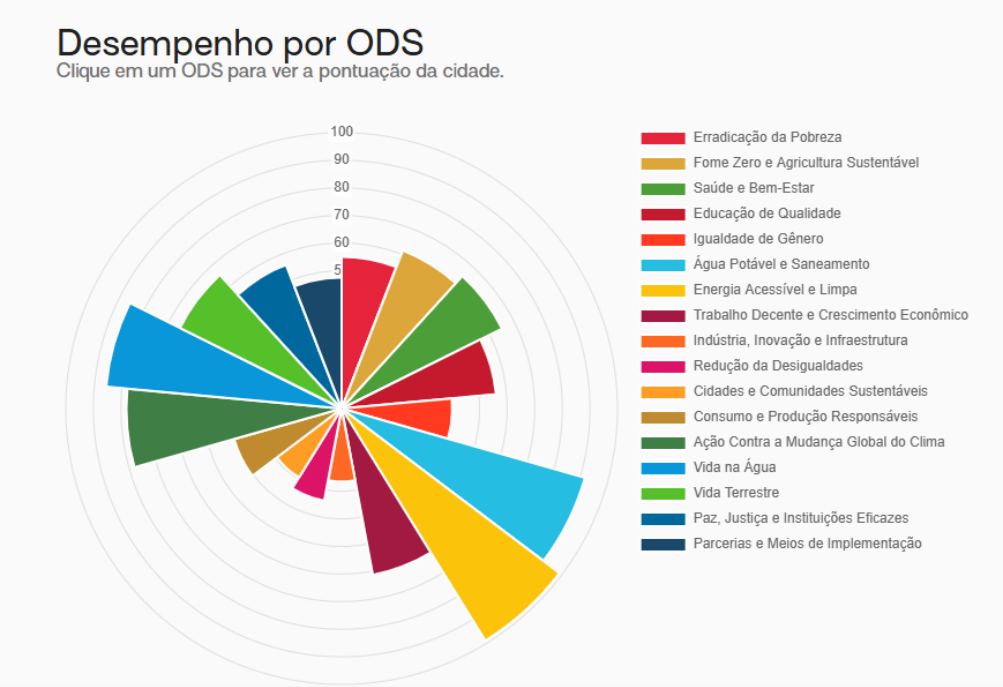


Figura 4: *Painel do IDSC (Geral) e Desempenho por ODS do Município de Niterói. Fonte: https://idsc.cidadesustentaveis.org.br/profiles/3303302/*

Análise Situacional:

As comunidades de Niterói enfrentam vulnerabilidades históricas: moradias precárias, falta de infraestrutura, escassez de espaços públicos e ausência de apoio técnico. Agravam esse quadro as fragilidades na segurança pública, marcadas pela presença desigual do Estado e pela estigmatização dos territórios populares. O PVNM propõe uma ação transversal e transformadora, com foco na requalificação urbana, dignidade habitacional, fortalecimento comunitário e institucional, inclusão econômica e construção de uma segurança cidadã. Ao reconhecer os territórios populares como espaços de potência, cultura e identidade, o PVNM se firma como política pública inovadora, com potencial de impacto estrutural e replicação no enfrentamento das desigualdades urbanas.

Somam-se a esse contexto as ameaças climáticas descritas no Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência (2024), conforme Anexo I.6, que identificou riscos de inundações em áreas como as planícies da Serra da Tiririca, agravados por impermeabilização do solo e ocupações precárias em zonas de risco. O mapa a seguir indica a vulnerabilidade da população a inundações fluviais, com destaque para o Norte da cidade, Pendotiba e Região Oceânica — onde se concentram muitas comunidades.

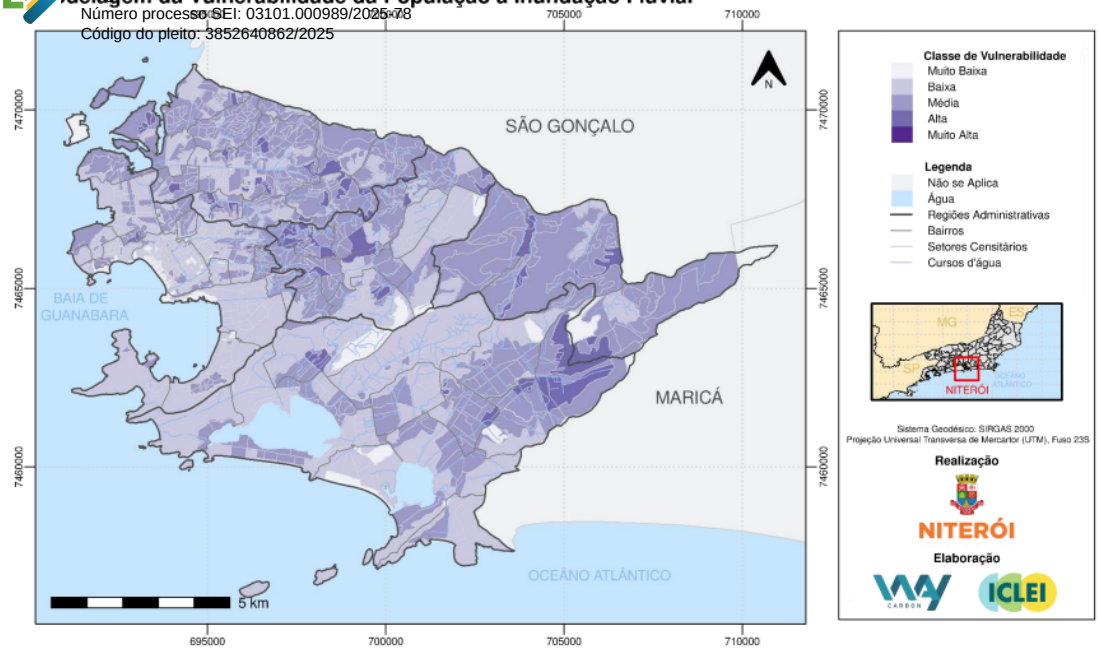


Figura 5: Mapa de Vulnerabilidade da população a inundação fluvial. Fonte: Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência de Niterói, 2024.

1. 2. 2. **Problema:**

O **Programa Vida Nova no Morro (PVNM)** foi concebido para enfrentar um conjunto de **problemas estruturais** que afetam diretamente a qualidade de vida e os direitos da população residente em comunidades e favelas de Niterói. Esses problemas são multidimensionais, têm causas históricas e institucionais, e geram **consequências graves em termos de vulnerabilidade social, ambiental e urbana**.

Problemas e necessidades:

1. Desigualdade sociais, econômicas, de gênero e de raça.

A cidade de Niterói possui **expressivos contrastes socioeconômicos**. Embora o município possua IDHM e PIBs per capita com índices elevados quando comparados a outras cidades, mais de 64 mil famílias ainda vivem com renda de até um salário-mínimo (Cadastro Único, 2025).

As **desigualdades econômicas** refletem no acesso da população de menor renda a direitos fundamentais como moradia, educação, trabalho, cultura, lazer e segurança, aprofundando ciclos de pobreza e exclusão social. Esses desafios se agravam diante da sobreposição de vulnerabilidades associadas a gênero, raça, idade, classe e deficiência. Assim, se faz necessário que as políticas públicas atuem transversalmente, abordando não só a infraestrutura urbana e habitacional, mas também a inclusão social e econômica integralmente.

2. Vulnerabilidade habitacional e déficit qualitativo de moradias

As desigualdades socioeconômicas são observadas também no acesso à moradia digna. No município de Niterói, em todo seu território, existem, segundo o Observatório do Cadastro Único (2023)

- 23.233 construções de alvenaria sem revestimento

- 1.407 domicílios improvisados

- 553 com piso de terra

Tais dados indicam que um **número significativo de moradores vive em situação de inadequação e precariedade habitacional**, expostos a doenças, riscos físicos, sanitários e ambientais, como infiltrações, insalubridade, isolamento térmico inadequado e maior suscetibilidade a desastres climáticos.

3. Infraestrutura urbana incompleta

Nas comunidades e favelas de Niterói, dados do Censo do IBGE de 2022 mostram que 77,9% dos domicílios nas comunidades possuem esgotamento sanitário conectado à rede, 95,3% têm acesso à água canalizada e 87,8% têm coleta de lixo regular. Com cobertura inferior ao restante da cidade, esses sistemas, nas comunidades, enfrentam **limitações técnicas e operacionais que dificultam a universalização dos serviços**. Efluentes acabam sendo lançados diretamente na rede de drenagem, comprometendo a qualidade do tratamento e amplificando os impactos ambientais.

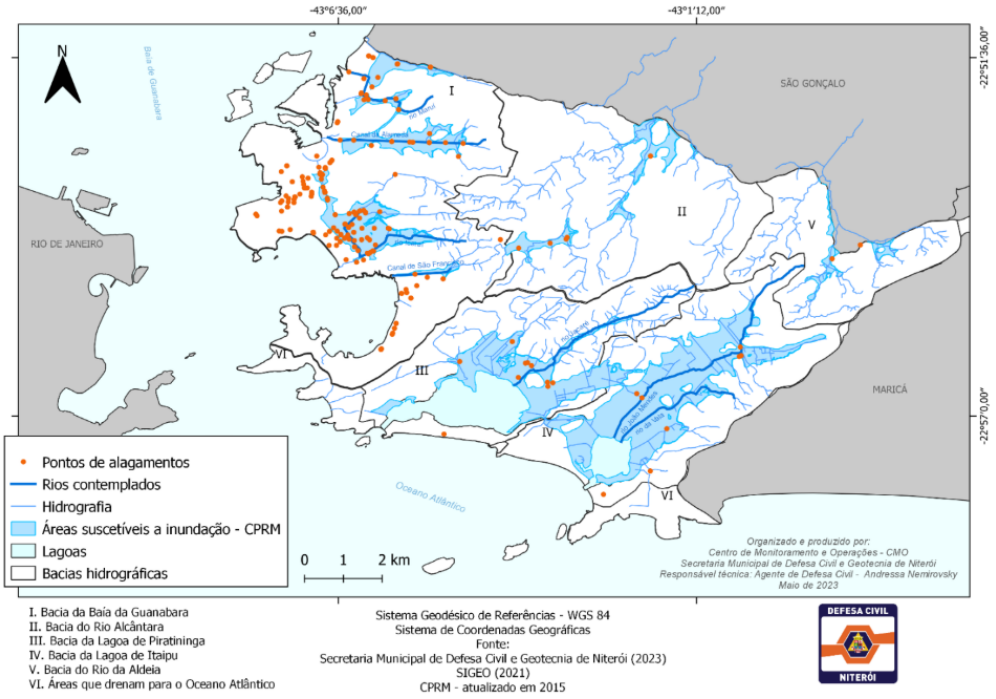


Figura 6: *Mapa de alagamentos de Niterói registrados entre 2019 e 2023. Fonte Defesa Civil*

Essas comunidades ainda contam com **trechos de ruas não pavimentadas, escadarias inseguras e falta de espaços públicos qualificados**. A ausência de soluções como micro drenagem, contenção de encostas e reflorestamento urbano comprometem a resiliência dos territórios, expondo as populações a riscos climáticos e ambientais.

4. Presença de população em áreas de risco geo-hidrológico

De acordo com levantamento realizado pela Casa Civil, 33.822 pessoas vivem em áreas de risco geohidrológico, mapeadas como suscetíveis a deslizamentos e enxurradas (2022). Em áreas de comunidade e favelas, a ocupação

desordenada, a supressão da vegetação e a ausência de obras de contenção agravam a **exposição a desastres climáticos**.

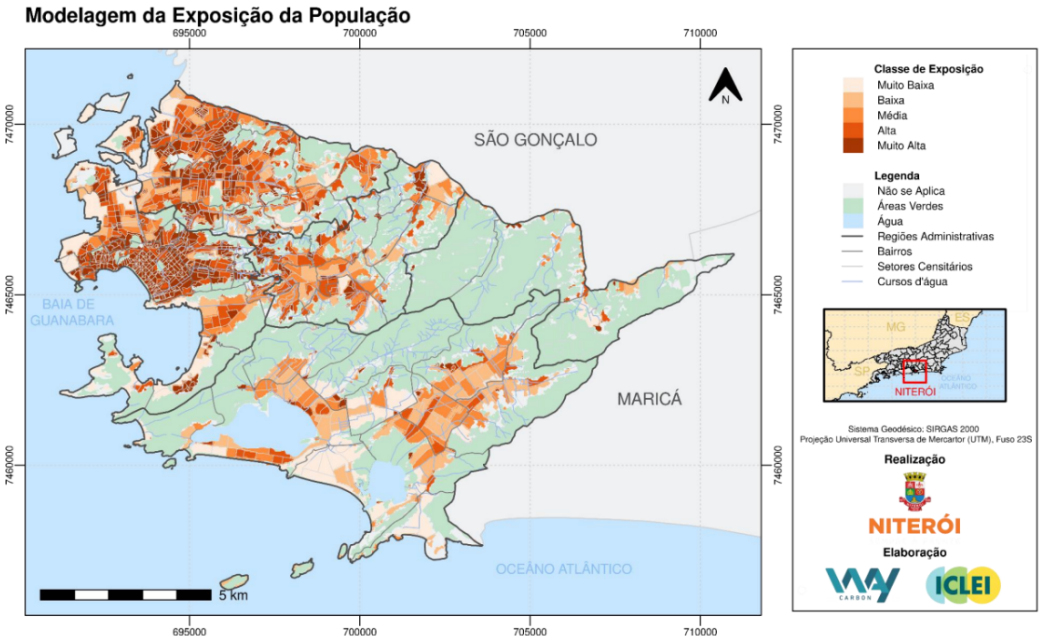


Figura 7: *Modelagem da exposição da população no município de Niterói. Fonte: Consórcio WayCarbon & ICLEI*

Esses riscos foram evidenciados em eventos como o **deslizamento no Morro do Bumba**, em 2010.

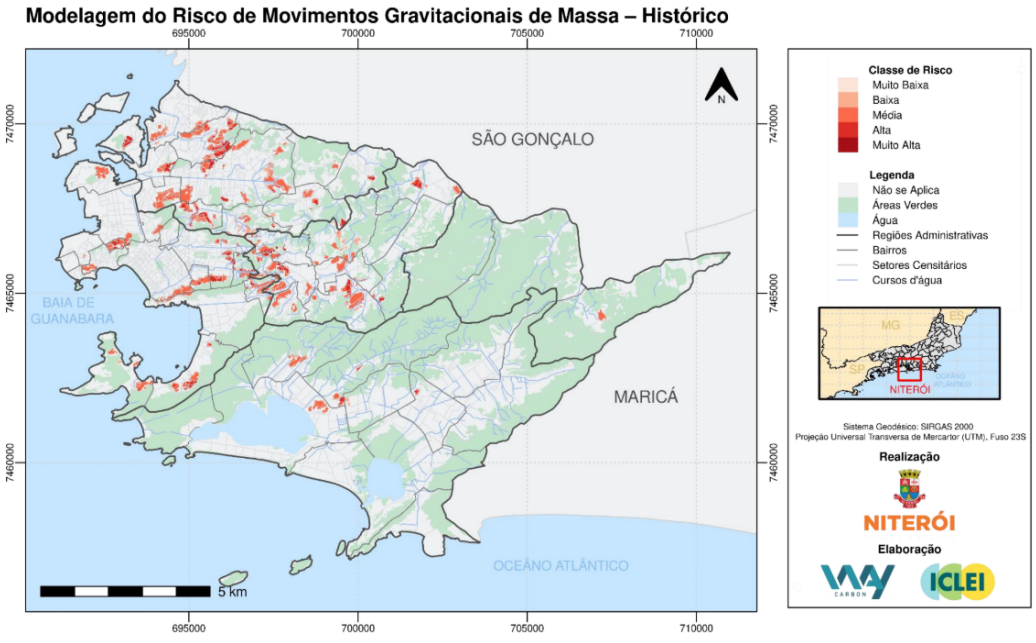


Figura 8: *Modelagem do risco de movimentos gravitacionais de massa para o período histórico (1995-2014) nas áreas de comunidades.*

5. Fragmentação das políticas públicas e ausência de instrumentos de planejamento territorial participativo

Faltam mecanismos efetivos de integração entre as políticas públicas setoriais no território. **Não há mapeamentos sistematizados com dados atualizados sobre as comunidades**, comprometendo o planejamento urbano e social.

Causas

A despeito dos investimentos recentes feitos pela Prefeitura de Niterói, os problemas descritos têm, historicamente, origem em múltiplos fatores interdependentes:

- Desigualdade estrutural de renda, raça e gênero, gerada por processos históricos de negligência e invisibilização institucional.

- Histórico de urbanização excludente, com ocupações informais;

- Descontinuidade e baixa articulação histórica entre políticas públicas nos territórios;

Consequências

- Desigualdade no acesso à cidade, com milhares de pessoas vivendo em condições insalubres e inseguras;

- Crescimento da vulnerabilidade frente às mudanças climáticas;

- Reprodução da pobreza e da exclusão econômica, especialmente entre mulheres, jovens e trabalhadores informais;

- Ineficiência na alocação de recursos públicos, pela falta de dados, planejamento participativo e gestão integrada.

Situação atual a ser transformada:

O PVNM parte de uma realidade em que as comunidades apresentam múltiplas carências de urbanização e de desenvolvimento. A cidade de Niterói reconhece essas fragilidades e propõe, através do programa, transformar as comunidades em espaços seguros, resilientes, mais produtivos e dotados de infraestrutura adequada. **Desenvolvimento socioeconômico, intervenções urbanas, habitacionais e fortalecimento institucional serão pilares centrais da estratégia de atuação**.

1. 2. 3. **Solução:**

Cada componente reúne soluções voltadas ao **enfrentamento dos problemas diagnosticados**, alinhadas aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual da União 2024–27, contribuindo para o desenvolvimento urbano inclusivo, justiça social, resiliência climática e fortalecimento institucional.

Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

Problemas: exclusão produtiva, insegurança pública, desigualdade de gênero, fragilidade das redes comunitárias e ausência de oportunidades econômicas.

Soluções: fortalecimento do capital humano e da segurança pública, empreendedorismo popular, participação cidadã e redes de apoio comunitário.

Ações:

- Criação de espaços públicos de apoio ao trabalho e renda (ex: Galpão das Oportunidades e Incubadora para negócios comunitários e solidários);

- Implantação do Centro de Formação Popular Vida Nova;

- Capacitação e empoderamento econômico com foco em juventudes e mulheres;

- Programas de igualdade de gênero e autonomia feminina, com formação de Agentes Vida Nova de Cuidados Comunitários (ACC);

- Núcleos de zeladoria urbana com participação comunitária;

- Promoção da cultura e identidade local com ações permanentes de mobilização, comunicação e participação.

- Programa de prevenção à violência da juventude contra o crime organizado

Alinhamento PPA 2024–27: OE 101, 105, 107, 112, 207, 214.

Componente 2 – Melhorias Habitacionais

Problemas: moradias precárias, insalubridade, ausência de assistência técnica, exposição a riscos e vulnerabilidade climática.

Ações:

- Reformas em moradias com carências qualitativas (banheiros, coberturas, paredes, pisos, ventilação, iluminação, acessibilidade, armazenamento de água, etc.), com foco em inovações sustentáveis;

- Implantação do programa “Arquiteto de Família”, com assessoria técnica especializada, personalizada e participativa;

- Reassentamento de famílias em risco (Compra Assistida, indenização, construção de unidades habitacionais com subsídio de aluguel, permuta de imóveis, entre outros).

Alinhamento PPA 2024–2027: OE 111, 202, 214.

Componente 3 – Urbanização Integrada e Resiliência Urbana

Problemas: infraestrutura urbana deficiente, insegurança pública, riscos climáticos, ausência de espaços públicos, baixa integração com a cidade formal.

Soluções: ampliar a segurança e resiliência urbana e ambiental, promovendo a integração física, social e simbólica das comunidades ao tecido urbano.

Ações:

- Obras de infraestrutura (drenagem, vias, acessos, saneamento);

- Construção e requalificação de espaços públicos;

- Soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde;

- Urbanismo tático, arte urbana e ativação cultural;.

- Construção do Centro de Formação e Qualificação de Guardas (CFQG), com foco em formação cidadã, capacitação contínua e valorização profissional da Guarda Civil Municipal;

- Ampliação do Centro Integrado de Segurança e Resiliência Urbana (CISP), com estrutura moderna, funcionamento 24h, tecnologia de ponta e integração entre agências para monitoramento de riscos, resposta a emergências e segurança urbana.

Alinhamento PPA 2024–2027: OE 107, 111, 112, 201, 202.

Componente 4 – Fortalecimento Institucional

Problemas: ausência de dados atualizados, fragmentação das políticas públicas e baixa capacidade de gestão integrada.

Soluções: fortalecimento da capacidade pública de planejar, implementar e monitorar políticas territoriais, com sistema resiliente, eficiente e participativo.

Ações:

- Desenvolvimento de sistemas e aplicativos para mapeamento e diagnósticos participativos;

- Levantamentos técnicos e socioeconômicos;

- Monitoramento contínuo de indicadores;

- Produção de guias e protocolos técnicos;

- Fortalecimento da gestão pública intersetorial;

- Ferramentas de gestão de riscos (monitoramento, geoprocessamento de áreas, ocupações irregulares e vulnerabilidades ambientais);

-Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).

Alinhamento PPA 2024–2027: OE 301, 302, 303

Integração e efeito sistêmico

A força do PVNM está na **integração dos quatro componentes**, cada um respondendo a dimensões específicas da vulnerabilidade urbana e promovendo a transformação estrutural dos territórios de Niterói. Ao articular **moradia digna, infraestrutura resiliente, segurança pública, fortalecimento econômico e gestão pública qualificada**, o programa lança as bases para uma cidade mais justa, segura e sustentável, alinhada aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–27 e às principais agendas globais de desenvolvimento urbano.

O PVNM busca, no médio e longo prazo, atuar em todas as comunidades e favelas de Niterói, garantindo que os investimentos cheguem aos territórios historicamente negligenciados. Nesta fase inicial, contempla intervenções em 12 comunidades, marco inaugural de uma política pública contínua e transformadora para os territórios populares da cidade.

1. 2. 4. **Resultado:**

O PVNM propõe uma abordagem integrada para melhorar a vida em Niterói, com soluções sustentáveis, inovadoras e de impacto duradouro. Visa transformações concretas, observáveis e mensuráveis nas comunidades, fortalecendo tecido social, equidade e governança, com foco na inclusão ativa de grupos marginalizados por meio de sua inclusão ativa em processos decisórios, qualificação profissional e protagonismo comunitário. Valoriza a cultura local, aprimora a gestão urbana com base em dados e participação, e aposta na autonomia territorial e na resiliência social como pilares da continuidade.

Resultados esperados por componente:

Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

- Elevação da renda domiciliar com estabilidade econômica, combate à pobreza e diversificação das fontes de renda;

- Formalização de micro empreendimentos e fortalecimento da economia popular;

- Participação ativa de mulheres em capacitação, empreendedorismo e liderança, com impacto na equidade de gênero;

- Qualificação profissional e inclusão digital para juventudes e mulheres, ampliando a empregabilidade;

- Fortalecimento de redes comunitárias e laços de solidariedade, com efeitos na convivência e prevenção da violência;

- Valorização da cultura local e do pertencimento, promovendo autoestima e identidade coletiva;

- Aumento da participação cívica por meio da mobilização social e da gestão compartilhada de espaços públicos.

- Redução dos números ligados à violência entre jovens em situação de risco, com foco na redução da reincidência e do recrutamento por organizações criminosas.

Componente 2 – Melhorias Habitacionais

- Aumento do número de moradias com padrões mínimos de habitabilidade, segurança, ventilação, iluminação e conforto térmico;

- Redução de indicadores de insalubridade e riscos domésticos relacionados à estrutura das residências;

- Realocação segura e planejada de famílias residentes em áreas de risco, com garantia de continuidade dos vínculos sociais e acesso a serviços;

- Redução de gastos públicos com saúde e assistência social decorrentes de situações precárias e inadequadas de moradia;

- Reconhecimento das moradias como espaços de dignidade, permanência e referência para a vida familiar e comunitária.

Componente 3 – Urbanização Integrada e Resiliência Urbana

- Universalização do acesso à infraestrutura básica em áreas selecionadas (água, esgoto, drenagem, energia, mobilidade);

- Aumento da frequência e permanência da população em espaços públicos revitalizados, com impactos positivos na convivência, lazer e segurança;

- Redução significativa da vulnerabilidade física e ambiental de áreas de encosta, especialmente com a adoção de soluções baseadas na natureza;

- Melhoria das condições de mobilidade e, acessibilidade interna e segurança nos territórios urbanizados;

- Aumento da atratividade dos territórios para novas iniciativas públicas, culturais, econômicas, esportivas e comunitárias;

- Valorização simbólica dos territórios, com fortalecimento da identidade cultural e da memória coletiva local

- Criação de equipamentos para capacitação técnico-operacional continuada da Guarda Civil Municipal, promovendo práticas alinhadas aos direitos humanos, à mediação de conflitos e à atuação cidadã;

- Ampliação do Centro Integrado de Segurança e Resiliência Urbana, com atuação 24h, para aprimoramento da resposta institucional a emergências e eventos críticos por meio da integração entre órgãos e tecnologias de ponta.

Componente 4 – Fortalecimento Institucional

- Disponibilização de ferramentas digitais integradas para planejamento, execução e monitoramento de políticas urbanas;

- Melhoria da qualidade e da disponibilidade de dados sobre habitação, infraestrutura, perfil socioeconômico e riscos ambientais;

- Aumento da eficiência na formulação de políticas públicas baseadas em diagnóstico técnico e escuta participativa;

- Estabelecimento de fluxos institucionais de cooperação entre secretarias, com foco em soluções intersetoriais no território;

- Produção de referenciais técnicos e metodológicos com potencial de replicação em outras iniciativas urbanas;

- Fortalecimento da imagem institucional da Prefeitura como agente promotor de inovação urbana, justiça territorial e desenvolvimento sustentável.

Externalidades positivas esperadas:

- Redução das desigualdades e da vulnerabilidade social;

- Valorização do território e fortalecimento do pertencimento;

- Reforço da confiança comunitária na gestão pública

- Aumento do capital social e da resiliência coletiva das comunidades frente a eventos críticos (climáticos, econômicos ou sanitários);

- Geração de boas práticas replicáveis.

- Melhoria dos índices de segurança em toda a cidade.

Esses resultados representam não somente **resposta emergencial às condições precárias dos territórios atendidos**, mas a **construção de um novo paradigma de política urbana em Niterói**, fundado em participação, inovação social, sustentabilidade e justiça territorial.

1. 3. **Objetivo**

O Programa visa **melhorar a qualidade de vida, a resiliência urbana, segurança pública e o desenvolvimento sustentável das populações residentes em territórios vulneráveis do município de Niterói**.

Objetivos Específicos:

A)Fomentar **a inclusão social e econômica, a igualdade de gênero, o bem-estar, e o fortalecimento comunitário** por meio da valorização da história e da cultura local, da criação de oportunidades de geração de renda, do apoio técnico, das redes solidárias e da participação cidadã.

CORRELAÇÃO:

Componente: Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico.

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza;

- OE 105 – Fortalecer a economia criativa;

- OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres;

- OE 112 - Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial;

- OE 207 – Ampliar geração de trabalho e inserção produtiva dos mais pobres

- OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Indicadores:

- Indicador de Inclusão na Economia Criativa e Cultura Popular (IIECCP);

- Índice de Inclusão Econômica de Mulheres em Idade Produtiva (IIEMIP);

- Índice de Inserção Produtiva da Juventude (IIPJ).

- Taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes (TMVI)

B) **Reduzir o déficit habitacional qualitativo e quantitativo, e garantir moradias seguras e sustentáveis**, com foco em melhorias habitacionais progressivas, reassentamento de famílias em áreas de risco e assistência técnica gratuita, promovendo qualidade de vida, a dignidade e o conforto ambiental nas habitações.

CORRELAÇÃO:

Componente: Componente 2 – Melhorias Habitacionais.

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis;

- OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres;

- OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Indicadores:

- Proporção da população urbana vivendo em domicílios precários e inadequados (Indicador Chave Nacional do PPA OE 111 – adaptado para incluir domicílios inadequados);

- Mudanças executadas em moradias atendidas pelo “Arquiteto de Família” (Indicador criado).

C) **Implantar infraestrutura urbana articuladamente nos territórios atendidos**, promovendo acesso a saneamento básico, drenagem urbana, iluminação pública e espaços de convivência qualificados, com foco na segurança climática, na resiliência urbana a adaptação às mudanças climáticas, na segurança dos territórios, na valorização dos espaços públicos e na promoção da inclusão socio territorial de forma alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à Nova Agenda Urbana (NAU).

CORRELAÇÃO:

Componente: Componente 3 – Urbanização Integrada e Resiliência Urbana.

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 107 Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres […] a redução da violência.

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis;

- OE 112 Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial;

- OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

- OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas.

Indicadores:

- Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) (Indicador Chave Nacional do PPA OE 111 - adaptado)

- Taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes (Indicador Chave Nacional do PPA 2024-2027 do OE 112)

D) Fortalecer a capacidade institucional para o planejamento, gestão e monitoramento de políticas urbanas, territoriais e de segurança em regiões vulneráveis do município.

CORRELAÇÃO:

Componente: Componente 4 – Fortalecimento Institucional.

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 301 – Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social;

- OE 302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais;

- OE 303 – Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo.

Indicadores:

- Índice de Transparência e Governança Municipal (ITGM) para Comunidades.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador de Inclusão na Economia Criativa e Cultura Popular (IIECCP) - (Indicador Chave Nacional do PPA OE105 – adaptado)

Descrição:

Específico (SMART**):**

O IIECCP mede a participação de trabalhadores da economia criativa e da cultura popular nas comunidades atendidas e sua autonomia financeira, considerando artistas, artesãos, produtores culturais e demais agentes do setor.

Mensurável (S**M**ART**):**

Dados para coleta:

- PECC: Quantidade de pessoas empregadas formalmente ou inseridas em atividades econômicas autônomas no setor cultural e criativo.

Fórmula de Cálculo:

- IIECCP= (PECC ÷ Populatção Total) × 100.000

Interpretação:

O IIECCP o número de trabalhadores da economia criativa e da cultura popular que possuem fonte de renda oriunda desse mercado. Quanto maior o índice, maior a inclusão econômica e a valorização da arte e cultura local.

Atingível (SM**A**RT**):**

A meta prevê um crescimento escalonado dentro de 5 (cinco) anos, considerando programas de capacitação, fomento ao empreendedorismo criativo, editais de incentivo cultural e fortalecimento de redes solidárias no setor cultural.

Relevante (SMA**R**T**):**

Componente Relacionado do PVNM: Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

Coerência do Indicador com os Objetivos:

Objetivo Específico do PVNM:

Fomentar a inclusão social e econômica, a igualdade de gênero e o fortalecimento comunitário, por meio da valorização da história e cultura local, da criação de oportunidades de geração de renda, apoio técnico, redes solidárias e participação cidadã.

Correlação Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza

- OE 105 – Fortalecer a economia criativa

- OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

O IIECCP reflete diretamente a capacidade do programa em impulsionar a economia criativa e a diversidade cultural, enfrentando desafios estruturais como:

- Baixa formalização no setor: muitos trabalhadores da cultura atuam na informalidade, reduzindo seu acesso a direitos trabalhistas e financiamento.

- Desigualdade de acesso a recursos: pequenos produtores culturais e artistas independentes enfrentam dificuldades para acessar incentivos e políticas públicas.

- Falta de infraestrutura e espaços culturais: A ausência de equipamentos culturais limita a difusão da produção artística e o fortalecimento das redes culturais comunitárias.

- Precarização do trabalho cultural: muitos profissionais da cultura enfrentam instabilidade de renda e poucas oportunidades de qualificação e reconhecimento profissional.

O programa atuará fomentando a formalização, promovendo capacitações, ampliando editais e incentivando políticas que garantam sustentabilidade financeira para a cultura popular.

Temporal (SMAR**T):**

Ao longo dos 5 anos, serão observados os seguintes marcos concretos de avanço:

- **Ano 1** (2026): Estabelecimento da linha de base do indicador e mobilização da comunidade. Pelo menos 10% dos trabalhadores da cultura terão acesso a capacitação ou apoio financeiro.

- **Ano 2** (2027): Expansão das ações de formação e fomento. Espera-se um aumento de 15% no número de trabalhadores formalizados ou com geração de renda autônoma no setor criativo.

- **Ano 3** (2028): Implementação de políticas estruturantes que ampliem o acesso a editais e mercados culturais. A meta é atingir 20% de crescimento no IIECCP em relação à linha de base.

- **Ano 4** (2029): Consolidação de redes e espaços culturais comunitários. A expectativa é de 25% de crescimento no indicador.

- **Ano 5** (2030): Atingir o objetivo final de 30% de aumento na participação de trabalhadores da economia criativa no mercado de trabalho formal e/ou autônomo, com fortalecimento da sustentabilidade financeira do setor.

Esses resultados serão comprovados por meio de:

- Cadastros nos equipamentos de Economia Solidária de Niterói como: Casa da Economia Solidária Paul Singer, Conselho Municipal de Economia Solidária (CMES), Fórum de Economia Solidária de Niterói (FES-NIT):

- Registros de MEI e formalizações

- Dados de participação em capacitações e formações

- Monitoramento do IIECCP (Indicador de Inserção Econômica da Cultura e da Criatividade Popular)

- Relatórios de geração de renda e atividades autônomas desenvolvidas.

Meta:

Linha de Base:

- População total do município: 481.749 habitanes (IBGE, 2022)

- Pessoas atualmente vinculadas a iniciativas de economia solidária no município: 2.860 pessoas segundo a Subsecretaria de Economia Solidária (SMASES)

- Considerando os 2.860 trabalhadores da economia solidária como base aproximada e a população total do município, o IIECCP é de 593 pessoas empregadas formalmente ou inseridas em atividades econômicas autônomas no setor cultural e criativo (PECC) a cada 100 mil habitantes.

Meta: Elevar o número de trabalhadores da economia criativa e da cultura popular vinculados ao mercado de trabalho formal e/ou autônomo em **pelo menos 30% em relação ao patamar atual,** em articulação com iniciativas de economia solidária e valorização cultural local, em até 5 anos.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Índice de Inclusão Econômica de Mulheres em Idade Produtiva (IIEMIP) - (Indicador Chave Nacional do PPA OE107 – adaptado)

Descrição:
Específico (SMART**):**

Mede o percentual de mulheres em idade produtiva (14 a 59 anos) que não estão inseridas no mercado de trabalho formal ou autônomo, vivendo em domicílios chefiados por mulheres nas comunidades atendidas pelo Programa Vida Nova no Morro (PVNM).

Mensurável (SMART**):**
Dados para coleta:

- PMET-CM – Quantidade de mulheres em idade produtiva empregadas formalmente ou inseridas em atividades econômicas autônomas residentes em domicílios chefiados por mulheres.

- PIT-CM – Total de mulheres em idade produtiva residentes em domicílios chefiados por mulheres.

Fórmula de cálculo:
IIEMIP (%) = (PMET-CM ÷ PIT-CM) × 100

Interpretação:
O IIEMIP expressa o percentual de mulheres em idade produtiva (14 a 59 anos) sem ocupação formal ou autônoma, vivendo em domicílios chefiados por mulheres. Quanto maior o valor, maior a exclusão econômica. A redução do índice indicará avanços nas políticas de inclusão e autonomia econômica.

Atingível (SM**A**RT**):**
A meta considera os investimentos previstos no Componente 1 e sua execução escalonada ao longo de 5 anos.

Relevante (SMA**R**T**):**
Objetivo do PVNM:
Fomentar a inclusão social e econômica, a igualdade de gênero e o fortalecimento comunitário, por meio da valorização da cultura local, geração de renda, apoio técnico e participação cidadã.

Componente relacionado:
Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

Objetivos estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza;

- OE 107 – Reforçar políticas de atenção às mulheres;

- OE 214 – Reduzir desigualdades regionais com equidade de oportunidades.

O IIEMIP reflete a capacidade do programa em promover inclusão econômica e equidade de gênero, especialmente no contexto de famílias chefiadas por mulheres. Essas famílias concentram alta vulnerabilidade social. O indicador busca enfrentar obstáculos estruturais e ampliar oportunidades de autonomia econômica.

Principais fatores identificados:

Baixa inserção produtiva: Mulheres chefes de família enfrentam barreiras para entrar ou permanecer no mercado de trabalho.

Desigualdade salarial e de oportunidades: Mesmo inseridas, enfrentam remunerações mais baixas e menor acesso a cargos qualificados.

Falta de tempo e suporte: Sobrecarga com cuidado de filhos, idosos ou dependentes limita a capacitação e a renda.

Empreendedorismo e qualificação: O programa investirá em formação e renda autônoma para mulheres chefes de família.

Trabalho precoce: Pressões econômicas levam adolescentes ao trabalho precoce, comprometendo sua formação e futuro.

O PVNM atuará com ações estruturadas de formação, empreendedorismo e apoio à renda, reduzindo desigualdades e promovendo autonomia.

Temporal (SMAR**T**):

Ao longo dos cinco anos, serão realizados os seguintes marcos concretos:

- Ano 1 (2026): Atualização da linha de base nas comunidades atendidas e início das ações de mobilização e escuta ativa das mulheres, com pelo menos **10%** delas participando de atividades de formação ou orientação profissional.

- Ano 2 (2027): Ampliação das oportunidades de capacitação e estímulo à formalização ou geração de renda autônoma, com redução da taxa para **45%**.

- Ano 3 (2028): Integração com políticas públicas de apoio ao empreendedorismo feminino, acesso a editais, microcrédito e parcerias com empresas. Redução da taxa para **40%**.

- Ano 4 (2029): Consolidação de redes de apoio e acompanhamento de trajetórias de inserção produtiva, alcançando **35%** de mulheres ainda fora da economia formal/autônoma.

- Ano 5 (2030): Alcançar a meta final de **30%**, com fortalecimento das estratégias de inclusão econômica e autonomia das mulheres.

Fontes de verificação:

- Dados da PNAD Contínua (IBGE) e pesquisas locais, Observatório do Cadastro Único;

- Cadastros em programas de capacitação e empreendedorismo;

- Registros de MEIs, vínculos formais de trabalho e geração de renda autônoma;

- Relatórios do Programa Vida Nova no Morro.

Meta:
Linha de base inicial:

- Total de famílias chefiadas por mulheres no Município cadastradas no CADÚNICO: 42.257;

- Famílias com pelo menos uma mulher em idade produtiva fora do mercado: 24.082.

Esse número representa cerca de **57%** dessas famílias.

Reduzir para 30% a proporção de famílias chefiadas por mulheres com pelo menos uma mulher em idade produtiva (14 a 59 anos) fora do mercado de trabalho formal ou autônomo, nas comunidades atendidas pelo Programa Vida Nova no Morro, em até 5 anos, por meio de estratégias de inclusão produtiva, qualificação profissional e fortalecimento da autonomia econômica feminina.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Proporção da população urbana vivendo em domicílios precários e inadequados - PPUHPI (Indicador Chave Nacional do PPA OE 111 – adaptado para incluir domicílios inadequados)

Descrição:
Específico (**S**MART)*:*

O indicador **PPUHPI** irá medir a redução do déficit habitacional quantitativo e qualitativo.

Mensurável (S**M**ART):

Dados para coleta:

- PUHPI – quantidade de Pessoas residentes em Unidades Habitacionais Precárias e Inadequadas no território atendido.

- PT - Número da População Total no território atendido.

Fórmula de Cálculo:

PPUHPI (%) **= PUHPI** ÷ PT

(Nº pessoas residentes em unidades habitacionais precárias e inadequadas no território atendido ÷ Nº total da população na comunidade atendida)

Interpretação:

O PPUHPI expressa o percentual da população em déficit habitacional qualitativo e quantitativo. Quanto menor o índice, maior a efetividade do programa na universalização do acesso à moradia.

Atingível (SM**A**RT):

A meta está baseada no aporte de investimentos no componente 2 e produto 2.1 e 2.2, e prevê um crescimento atingível em um prazo de 5 anos.

Relevante (SMA**R**T):

Coerência do Indicador com os Objetivos:

Objetivo Específico do PVNM:

B - Reduzir o déficit habitacional qualitativo e quantitativo, e garantir moradias seguras e sustentáveis, com foco em melhorias habitacionais progressivas, reassentamento de famílias em áreas de risco e assistência técnica gratuita, promovendo qualidade de vida e permanência digna no território.

Componente Relacionado do PVNM:

Componente 2 – Melhorias Habitacionais

Componente 3 - Urbanização Integrada e Resiliência Urbana

Correlação Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

-OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

-OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres;

-OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

O PPUHPI reflete diretamente a capacidade do programa em reduzir o déficit habitacional quantitativo e qualitativo, considerando que:

O déficit habitacional quantitativo está atrelado aos domicílios precários (imóveis sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, e improvisados em espaços como prédios em construção, tendas, barracas, grutas, etc.) e à inadequação fundiária (quando o imóvel está em área de risco). Estes casos serão atendidos pelo produto (P) 2.2. - Desapropriação e medidas compensatórias para famílias reassentadas.

O déficit habitacional qualitativo está atrelado aos imóveis inadequados quanto às carências habitacionais qualitativas (moradias com cobertura inadequada, piso inadequado, adensamento excessivo e ausência de banheiro de uso exclusivo), e às carências de infraestrutura urbana (imóvel que não possui conexão de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e coleta de lixo) e à inadequação fundiária (em área de risco). Estes casos serão atendidos pelos produtos (P) 2.1. - Melhorias em Habitações Inadequadas, e(P) 3.2.1 - Melhoria Urbana Finalizada (Vias, Acessos, Drenagem, Água e Esgoto) e (P) 3.5 - Obras de Contenção de Encostas e Redução de Risco (Infraestrutura Verde e SbN) Implementadas.

Temporal (SMART):

Ao longo dos cinco anos, serão realizados os seguintes marcos concretos:

- Ano 1 : Levantamento atualizado das condições habitacionais nas comunidades beneficiadas, priorização dos territórios com maior vulnerabilidade e início das obras de requalificação habitacional emergencial e de reassentamentos

Fontes de verificação: diagnósticos técnicos de campo, cadastros habitacionais, relatórios de engenharia social.

- Ano 2 a 5 : Requalificação das moradias inadequadas e reassentamentos. Fontes de verificação: registros fotográficos, laudos técnicos, prestação de contas de obras, relatórios do programa, vistorias domiciliares, cadastros atualizados e indicadores de qualidade habitacional.

Meta:

Linha de Base (2023)

Segundo o Observatório do Cadastro Único (2023) quantidade de domicílios precários e inadequados no município de Niterói se apresenta da seguinte forma:

-1.407 domicílios improvisados;

- 553 com piso de terra;

- 23.233 construções de alvenaria sem revestimento.

Esses dados refletem a carência estrutural enfrentada por comunidades urbanas periféricas, especialmente nos territórios que serão contemplados pelo programa.

Meta: Reduzir em **70%** a proporção da população urbana vivendo em **domicílios precários e inadequados**, nas comunidades beneficiadas pelo programa, ao longo de **5 anos** de atuação, promovendo o acesso à moradia digna e segura.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Eficácia do projeto "Arquiteto de Família" - EAF

Descrição:
Específico (SMART**)*:***

Específico (SMART**)*:***

O indicador **EAF** irá medir a razão de mudanças realizadas e as assessorias técnicas prestadas. A eficácia está atrelada aos produtos de assessorias técnicas e dos cursos de capacitação fornecidos pelo projeto "Arquiteto de Família" que visam promover de melhorias habitacionais executadas pelos próprios beneficiários.

Mensurável (SM**ART):**

Dados para coleta:

- QMH – Quantidade de Melhorias Habitacionais realizadas orientadas por assessoria técnica no território atendido.

- QAT – **Quantidade de projetos entregues pelas Assessorias Técnicas** no território atendido.

Fórmula de Cálculo:

EAF= QMH ÷ QAT (Quantidade de melhorias habitacionais realizadas com orientação de assessoria técnica ÷ Nº de assessorias técnicas prestadas)

Interpretação:

O **EAF** expressa a razão que mede a eficácia do projeto “Arquiteto de Família”. Quanto mais próximo de 1, maior a efetividade do programa na promoção de moradias seguras, sustentáveis, confortáveis, e com qualidade de vida.

Atingível (SM**A**RT):

A meta está baseada no aporte de investimentos no componente 1 e 2, produtos 1.3.2, 1.3.4 e 2.3.

Relevante (SMART):

Coerência do Indicador com os Objetivos:

Objetivo Específico do PVNM:

B - Reduzir o déficit habitacional qualitativo e quantitativo, e garantir moradias seguras e sustentáveis, com foco em melhorias habitacionais progressivas, reassentamento de famílias em áreas de risco e assistência técnica gratuita, promovendo qualidade de vida, a dignidade e o conforto ambiental nas habitações.

Correlação Objetivos Estratégicos PPA Federal (2024–2027):

-OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura; -

-OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres;

-OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

O EAF reflete diretamente a eficácia do projeto "Arquiteto de Família" sob a ação conjunta de assessoria técnica, oficinas de capacitação e do Galpão das Oportunidades. Compreendendo que para a execução de reforma,

ampliação ou demais alterações é preciso contar com projeto técnico, mão de obra e material, e acompanhamento técnico das execuções, itens esses que serão promovidos por cada produto citado acima.

Considerando que 82% das construções no Brasil são autoconstruídas, ou seja, que não contam com serviços de profissionais tecnicamente habilitados, de arquitetos e/ou engenheiro profissional para construção (Data Folha, 2022), o produto **2.3. Assessorias técnicas habitacionais prestadas** irá oportunizará a orientação e acompanhamento de profissionais capacitados na área da construção civil para a população residente nas comunidades atendidas que desejem fazer alterações e melhorias nas moradias. Esse serviço é fundamental, não só para a economicidade, e promoção da habitabilidade e da segurança física do imóvel, mas também como uma forma de garantir que o ambiente de moradia esteja alinhado com a cultura e modo de vida dos moradores, sob perspectiva de visão de futuro.

Temporal (SMAR**T):**

A efetividade será medida a partir do registro e acompanhamento dos atendimentos realizados, considerando como resolutivas as assessorias que resultarem em encaminhamentos concretos ou soluções implementadas. O sistema de monitoramento incluirá formulários de avaliação, relatórios técnicos, entrevistas com beneficiários e registros de campo, garantindo a verificação periódica dos resultados ao longo dos cinco anos.

Meta:
Linha Base: Por ser um projeto novo, assim como a criação deste indicador, não foi possível estipular uma linha de base para acompanhamento.

Meta: Alcançar uma efetividade de **50% nas assessorias técnicas prestadas no território** ao longo dos **5 anos de atuação do programa**, com base na razão 1/2 entre demandas atendidas e acompanhadas com resolutividade.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) - (Indicador Chave Nacional do PPA OE - 111)

Descrição:
Específico (**S**MART):

O **IAASB mede o avanço na ampliação do acesso ao saneamento básico adequado nas comunidades atendidas pelo programa**, considerando a proporção de domicílios com esgotamento sanitário conectado à rede pública. O indicador está alinhado ao objetivo de incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, promovendo investimentos integrados em infraestrutura urbana.

Mensurável (S**M**ART):

Dados a Serem Coletados para Monitoramento:

Para acompanhar a implementação do programa, será necessário coletar:

- NDEC - Número total de domicílios existentes nas comunidades atendidas.

- NDE - Número de domicílios com acesso adequado a esgotamento sanitário (antes e depois das intervenções)

- NDAA - Número de domicílios com abastecimento de água canalizada (antes e depois das intervenções).

Fórmula de Cálculo:

Aumento do IAASB (%) = (NDEC ? NDE) ÷ NDAA

(Nº de domicílios atendidos com acesso adequado a saneamento pós-programa ? Nº de domicílios atendidos com acesso adequado a saneamento pré-programa) ÷ Nº total de domicílios nas comunidades atendidas

Interpretação: O IAASB expressa o percentual de avanço na adequação do saneamento nas comunidades beneficiadas. Quanto maior o índice, maior a efetividade do programa na universalização do acesso ao saneamento básico.

Atingível (SM**A**RT):

A meta está baseada no aporte de investimentos no **Componente 3 - Urbanização Integrada e Resiliência Urbana**, prevista no **Produto 3.2 Melhoria Urbana Finalizada**, e prevê um **crescimento percentual de 10% no atendimento de serviço de esgotamento sanitário adequado**, compatível com o investimento **no prazo do programa de 5 anos.**

Relevante (SMA**R**T):

Coerência do Indicador com os Objetivos:

Objetivo Específico do PVNM:

C -Implantar infraestrutura urbana integrada e soluções baseadas na natureza nos territórios atendidos, promovendo saneamento básico, iluminação pública e espaços de convivência qualificados, com foco na segurança climática, na segurança dos territórios, na valorização dos espaços públicos e na inclusão socio territorial.

Componente Relacionado do PVNM: Componente 3 – Urbanização Integrada e Resiliência Urbana

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

- OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

O **IAASB reflete diretamente a capacidade do programa em expandir a infraestrutura de saneamento básico nas comunidades** integradamente, contribuindo para:

Melhoria da qualidade de vida da população atendida, reduzindo a contaminação de solos e corpos d'água e prevenindo doenças de veiculação hídrica e sanitária.

Redução de riscos sanitários e ambientais, ao diminuir as possibilidades de contaminação de afluentes e de infiltração em encostas e barrancos, fortalecendo a segurança e a resiliência urbana nos territórios de atuação.

Inclusão socio territorial e promoção da equidade urbana, ao reduzir as desigualdades no acesso à infraestrutura de saneamento básico e garantir melhores condições de habitabilidade nas áreas vulneráveis.

Temporal (SMAR**T**):

A evolução será medida a partir do comparativo entre a linha de base e os dados atualizados durante os 5 (cinco) anos de execução do programa. Serão consideradas as melhorias em infraestrutura de saneamento realizadas nas comunidades atendidas, com foco no aumento do número de domicílios com acesso adequado ao serviço.

Meta:

Linha de Base:

Conforme o Censo Demográfico 2022 (IBGE), 77,9% dos domicílios localizados em áreas de comunidades do município de Niterói possuem banheiro exclusivo e esgotamento sanitário conectado à rede pública.

Meta:

Ampliar o Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico **(IAASB)** nas áreas de implantação do programa, alcançando um **aumento de 10% no prazo de 5 (cinco) anos.** O objetivo é garantir que mais domicílios tenham banheiro exclusivo e ligação à rede pública de esgoto, promovendo melhorias nas condições sanitárias e na qualidade de vida da população.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Índice de Inserção Produtiva da Juventude (IIPJ) (Indicador Chave Nacional do PPA OE207 – adaptado)

Descrição:
Específico (**S**MART)**:**

O IIPJ mede a inserção produtiva de jovens entre 15 e 29 anos promovendo sua inclusão econômica e social seja por meio de retorno a estudos, capacitação profissional, ou por meio de acesso a oportunidades de emprego.

Mensurável (S**M**ART)**:**
Dados para coleta:

JPET – Quantidade de jovens entre 15 e 29 anos empregados formalmente ou inseridos em atividades econômicas autônomas.

JNT – Número total de jovens entre 15 e 29 anos em situação de vulnerabilidade ocupacional nas comunidades atendidas.

Fórmula de Cálculo:

IIPJ (%) = (JPET ÷ JNT) × 100

Interpretação:

O IIPJ expressa o percentual de jovens que estavam sem ocupação de emprego e/ ou que estavam fora do do espaço escolar e passaram a ter alguma forma de inserção produtiva e/ou educacional. Quanto maior o índice, maior a efetividade das políticas de capacitação e empregabilidade juvenil.

Atingível (SM**A**RT):

A meta está baseada em expansão das iniciativas já desenvolvidas em Niterói como o Niterói Ecosocial e o Territórios da Juventude, promovendo que sua implementação ocorra nos territórios do Vida Nova No Morro. Para ampliar o alcance e a efetividade dessas ações, o programa prevê um crescimento escalonado em um prazo de **5 (cinco) anos**, contemplando a incentivo a retomada de estudos, capacitação profissional, estímulo ao empreendedorismo e a inserção no mercado de trabalho.

Relevante (SMA**R**T):

Coerência do Indicador com os Objetivos:

Objetivo Específico do PVNM:

Fomentar a inclusão social e econômica, a igualdade de gênero e o fortalecimento comunitário, por meio da valorização da história e cultura local, da criação de oportunidades de geração de renda, apoio técnico, redes solidárias e participação cidadã.

Componente Relacionado do PVNM:
Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

Correlação Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza

- OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

OE 207 Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

O IIPJ mede o impacto das ações voltadas à capacitação e empregabilidade juvenil, considerando desafios estruturais que dificultam a inserção produtiva dos jovens. Entre os principais desafios a serem enfrentados estão:

Dificuldade de acesso ao mercado de trabalho: muitos jovens encontram barreiras para ingressar em empregos formais devido à baixa escolaridade, falta de experiência profissional e escassez de oportunidades alinhadas às suas realidades socioeconômicas.

Desigualdades socioeconômicas: A falta de recursos e apoio estrutural dificulta a permanência dos jovens em programas de capacitação e reduz suas chances de inserção produtiva sustentável.

A ampliação das ações do Niterói Ecosocial e dos Territórios da Juventude busca mitigar esses desafios, promovendo capacitação técnica, estímulo ao empreendedorismo e acesso a oportunidades de trabalho digno. A implementação territorializada dessas iniciativas garantirá um impacto mais abrangente, fortalecendo a inclusão produtiva e a autonomia econômica da juventude.

Temporal (SMAR**T**):

O prazo para alcance da meta será de 5 (cinco) anos, entre 2026 e 2030. A avaliação contínua do indicador permitirá compreender o impacto das intervenções nas trajetórias dos jovens e orientar políticas públicas voltadas à sua inclusão produtiva.

Meta:
Base de dados:

Não há, até o momento, dados consolidados específicos sobre a inserção produtiva da juventude nos territórios atendidos. A ausência de desagregação etária nos relatórios padrão do Cadastro Único impossibilita o cálculo direto do número de jovens ocupados ou em atividade econômica formal/autônoma.

Dessa forma, o indicador IIPJ será iniciado com **linha de base zero**, com a necessidade de construção de metodologia própria de coleta e acompanhamento a partir da implementação do programa.

Meta

Alcançar, em 5 anos, uma taxa de **inserção produtiva de 45% entre jovens de 15 a 29 anos residentes nas comunidades** atendidas pelo Programa Vida Nova no Morro, a partir de uma linha de base inicial zerada, promovendo o acesso ao trabalho formal e ao empreendedorismo autônomo.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Índice de Transparência e Governança Municipal (ITGM) para Comunidades

Descrição:
Específico (SMART**):**

O índice mede a transparência de dados e informações públicas, municipais e disponibilizadas de fácil acesso para a população pertencente a comunidades, além de medir a governança municipal pela gestão democrática e participativa social nas zonas de especial interesse social (ZEIS).

Mensurável (SMART**):**

Dados a Serem Coletados para Monitoramento:

Para acompanhar a implementação do programa, será necessário ter os seguintes critérios:

GP - Gerenciamento da Prefeitura (Velocidade da transformação completa de dados produzidos in loco pelo programa para plataforma web, após revisão de dados quando necessário) peso: 40%
Escala de 1 a 0, sendo 1 – transformação em até 1 mês; 0,5 – entre 1 mês e 6 meses; 0,25 – após 6 meses e 0 – não havendo a transformação para a plataforma.

FAD - Facilidade de Acesso aos Dados (a existência ou não de plataforma da prefeitura adequada para formato aberto e de fácil navegabilidade para o usuário) peso: 30%

Existindo = 1

Não existindo = 0

MPP - Mecanismos de Participação Popular (existência ou não da população em mapeamentos especializados) peso: 30%

Alcance de 50% da população estimada pelo IBGE para participação no processo de Busca Ativa de perfil socioeconômico - habitacional= 1 Não existindo = 0

Existência da realização do Mapeamento de Área Urbana = 1 Não existindo = 0

Fórmula de Cálculo:

ITGM = 0.4(GP) + 0.3(FAD) + 0.3(MPP)

Interpretação:

O índice calcula uma nota de 0 a 10 através da média aritmética das taxas dos 3 critérios citados, classificado em 4 faixas (insuficiente, regular, bom e excelente), expressa a situação de transparência de dados e participação social do governo municipal e quanto maior sua nota, melhor sua classificação, maior a efetividade do programa na divulgação de dados relacionais, e maior fortalecimento democrático da população moradora em comunidades de Niterói.

Atingível (SM**A**RT**):**

A meta está baseada em dar uma nota média ao município e ser pelo menos de classificação de faixa “bom” em sua transparência de dados participação social do programa, através dos produtos de mapeamentos especializados (mapa sistematizado participativo e participação em guias técnicos/ ferramentas de gestão de risco) e do sistema de ação integrada socioeconômica, técnico-habitacional e urbanístico que será implantado e disponibilizado seus dados e informações em plataforma web, de posse da equipe de gestão municipal e retrocompatibilidade com sistema digital da prefeitura de Niterói.

Relevante (SMA**R**T**):**

Correlação Objetivos Estratégicos:

Objetivo Específico do PVNM:
Fortalecer a capacidade institucional do município para o planejamento, gestão e monitoramento de políticas urbanas em territórios vulneráveis, por meio do uso de dados georreferenciados, ferramentas digitais, fluxos intersetoriais e produção de guias técnicos.

Componente Relacionado do PVNM: Componente 4 – **Fortalecimento Institucional**

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027): 301, 302 e 303
O ITGM reflete diretamente a capacidade do programa em **promover o acesso de dados públicos do programa de fácil divulgação e a participação social da população em comunidades de Niterói**, contribuindo para:

Maior amplitude de dados socioeconômicos produzidos sobre os territórios das comunidades produzidos pelo poder público, aperfeiçoando assim a capacidade estatal de produção de dados qualitativos e quantitativos da população residentes em comunidades.

Redução de desigualdade democrática da população residentes em comunidades, reforçando a importância da atuação social de toda a população munícipe, em carência socioeconômica, na tomada de decisões benéficas a zonas especiais de interesse social.

Melhoria na inclusão digital de dados municipais, garantindo acesso a dados de forma compartilhada e moderna por parte da prefeitura sobre o programa.

Temporal (SMAR**T)**

Ao longo de 5 anos, alcançar um índice médio de pelo menos 7,0 (Bom), para avaliar o impacto das participações sociais e a lisura de dados públicos do programa pelas comunidades.

Avaliar o grau de transparência da administração municipal, considerando a facilidade de acesso a informações públicas do programa e a participação social, por via de mapas de colaboração ativa da população em comunidades e dados abertos em plataformas digitais do município.

Meta:

Linha de Base:

O ITGM utiliza metodologia adaptada do Indice de Transparência e Governança Pública (ITGP), do movimento global Transparência internacional Brasil, onde é feito uma análise da transparência, governança pública e participação cidadã em municípios brasileiros. O ITGP realizou análises em mais de 300 municípios em parceria com organizações da sociedade civil, e no Estado do Rio de Janeiro foram avaliados 13 municípios, fornecendo uma média do estado de 51 pontos e de classificação de faixa Regular (dados coletados em 2024). O município de Niterói não possui avaliação de índice, entretanto o movimento Transparência internacional disponibiliza um guia de passo a passo para implementar sua metodologia municipal. Devido a escala de atuação do programa VNNM se restringir somente a uma parcela da população municipal, o ITGM será utilizado e calculado somente para implantar e avaliar a transparência e governança para as comunidades urbanas de Niterói, iniciando assim sua linha de base em zero.

Meta:

Ao longo de 5 anos, alcançar um índice médio de pelo menos 7,0 (Bom), para avaliar o impacto das participações sociais e a lisura de dados públicos do programa pelas comunidades.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**

Nome: Indicador de Aumento da Cobertura Vegetal Urbana (IACVU)

Descrição:

Específico (**S**MART):

O indicador mede o **aumento percentual da cobertura vegetal e arborização nas áreas de intervenção do programa**, por meio da implantação de **ações de reflorestamento, implementação de *ecolimites* e soluções baseadas na natureza**. O indicador está alinhado ao objetivo de promover segurança climática, melhoria ambiental e valorização dos espaços públicos nas comunidades.

Mensurável (S**M**ART):

Dados a Serem Coletados para Monitoramento:

Para acompanhar a implementação do programa, será necessário coletar:

- AVA - Área Verde Atual (m²) nas comunidades atendidas antes da intervenção.

- AVP - Área Verde Pós-intervenção (m²) nas comunidades após a implantação das ações do programa.

- ATC - Área Territorial da Comunidade (m²).

Fórmula de Cálculo:

Aumento percentual da cobertura vegetal **= ((AVP - AVA) ÷ ATC) × 100**

Interpretação: O indicador expressa o aumento proporcional da área verde e arborizada nas comunidades, indicando o impacto positivo do programa na qualificação ambiental dos territórios.

Atingível (SM**A**RT):

A meta está baseada no aporte de investimentos no **Componente 3 - Urbanização Integrada e Resiliência Urbana**, prevista dentro dos **Produtos 3.3 e 3.5**, e prevê um aumento de 5%, compatível com as ações de reflorestamento, implantação de ecolimites e soluções baseadas na natureza **no prazo do programa de 5 anos do programa.**

Relevante (SMA**R**T):

Correlação Objetivos Estratégicos:

Objetivo Específico do PVNNM: Implantar infraestrutura urbana integrada e soluções baseadas na natureza nos territórios atendidos, promovendo mobilidade, saneamento, acessibilidade e convivência, com foco na segurança climática, na valorização dos espaços públicos e na inclusão territorial.

Componente Relacionado do PVNNM: Componente 3 – Urbanização Integrada

Objetivos Estratégicos PPA (2024–2027):

- OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

- OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Coerência do Indicador com os Objetivos:

O indicador reflete diretamente a efetividade do programa na ampliação das áreas verdes e arborizadas nas comunidades, contribuindo para:

- Aumento da segurança climática e redução da vulnerabilidade ambiental, uma vez que cobertura vegetal desempenha um papel fundamental na **melhoria da drenagem urbana, na contenção de encostas e na redução do risco de deslizamentos**, além de **minimizar os efeitos de inundações** e enxurradas.

- Melhoria da qualidade de vida da população, proporcionando mais **áreas sombreadas, redução da temperatura ambiente e aumento do conforto térmico** nos espaços urbanos. Tais benefícios contribuem diretamente para a **saúde física e mental da população**, reduzindo casos de doenças relacionadas ao calor extremo e promovendo ambientes mais saudáveis e agradáveis para a convivência comunitária.

Meta:
Linha de Base: A linha de base será estabelecida a partir dos mapeamentos iniciais do programa, por meio de levantamento territorial e ambiental utilizando ferramentas como SIG e sensoriamento remoto. A medição considerará a área atual de cobertura vegetal (referência 2026) e será comparada à área registrada ao final do programa, permitindo aferir o incremento real em termos de recuperação ambiental e implantação de infraestrutura verde.

Meta: Ampliar a cobertura vegetal nas comunidades atendidas, garantindo que as áreas de implantação do programa apresentem um **aumento de 5% na proporção de áreas verdes e arborizadas** até a conclusão do programa.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes (Indicador Chave Nacional do PPA 2024-2027 do OE 112)

Descrição:
Específico (SMART):
Mede a incidência de mortes violentas intencionais — homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios — por 100 mil habitantes em Niterói. Expressa o nível de violência letal nos territórios urbanos e serve para monitorar a efetividade das ações preventivas de segurança cidadã.

Mensurável (SMART):
Dados para coleta:

- Número anual de mortes violentas intencionais (fontes: SIM/MS, SSP/RJ);
- População estimada do município (IBGE).

Fórmula:
TMVI = (Mortes violentas intencionais ÷ População total) × 100.000

Interpretação:
A taxa reflete o risco relativo de uma pessoa ser vítima de violência letal. Sua redução sinaliza melhoria nas condições de segurança e efetividade das ações preventivas e de articulação institucional.

Linha de base (2025): 13,55 mortes por 100 mil habitantes
Meta (2030): Redução para **10 mortes por 100 mil habitantes**

Atingível (SMART):
A meta é ambiciosa, mas viável frente aos investimentos do **Componente 3 -** Urbanização Integrada e Resiliência Urbana, com destaque para a **ampliação do CISP**, a **criação do CFQG** e a **implementação de metodologias preventivas com foco na juventude**.

Relevante (SMART):
Objetivo específico do PVNM:

c) Implantar infraestrutura urbana articuladamente nos territórios atendidos, promovendo acesso a saneamento básico, drenagem urbana, iluminação pública e espaços de convivência qualificados, com foco na segurança

climática, na resiliência urbana a adaptação às mudanças climáticas, na segurança dos territórios, na valorização dos espaços públicos e na promoção da inclusão socio territorial de forma alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à Nova Agenda Urbana (NAU).

Componente relacionado:
Componente 3 – Urbanização Integrada e Resiliência Urbana

Objetivos estratégicos PPA (2024–2027):

- **OE 112** – Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada;
- **OE 107** – Reforçar políticas de atenção às mulheres;
- **OE 202** – Ampliar capacidades frente a riscos e mudanças climáticas.

O indicador expressa o impacto das ações do PVNM na redução da violência letal, especialmente em territórios populares, articulando infraestrutura, formação institucional e prevenção à violência.

Fatores influentes:

- Alta exposição de jovens a redes de criminalidade;
- Déficits em formação continuada e infraestrutura operacional ;
- Falta de integração entre dados urbanos, sociais e de segurança.

Temporal (SMART):

- **Ano 1:** Levantamento da linha de base detalhada por território; início do Programa de Prevenção à Violência.
- **Ano 2:** Operacionalização parcial do CFQG e construção da nova unidade do CISP.
- **Ano 3:** Expansão das formações e integração de dados em tempo real; início da redução da taxa.
- **Ano 4:** Redução consistente da violência em comunidades atendidas.
- **Ano 5:** Alcançar a meta de 10 mortes por 100 mil habitantes, com sistemas consolidados.

Fontes de verificação:

- SIM/MS, SSP-RJ
- Relatórios do CISP e CFQG
- Indicadores municipais consolidados no PVNM

Meta:
Linha de base (2025): 13,55 mortes por 100 mil habitantes
Meta (2030): Redução para **10 mortes por 100 mil habitantes**

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: (C) 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO
Valor estimado em Dólar (USD): 8.220.000,00
Descrição:

Descrição do Componente

O Componente de Desenvolvimento Socioeconômico do Programa Vida Nova no Morro (PVNM) atua para **reduzir desigualdades, ampliar oportunidades, fortalecer as capacidades locais dos territórios de favelas e comunidades de Niterói e reforçar a segurança pública da cidade**. Parte-se da premissa de que ao pensar em processos de urbanização integrada, a atuação do programa deve vir acompanhada de estratégias que promovam o fortalecimento do capital humano, a ampliação das capacidades locais e a valorização da cidadania ativa. O foco é gerar impactos duradouros na vida das pessoas, integrando ações sociais, econômicas e territoriais.

Entre as prioridades está o **investimento em ações voltadas à infância e juventude**, como caminho estratégico de prevenção à violência. Garantir oportunidades desde cedo — por meio de atividades culturais, educativas e profissionais — é fundamental para romper ciclos de exclusão e criar trajetórias mais seguras e promissoras para crianças e adolescentes nos territórios.

A atuação do componente se organiza em duas frentes complementares: Fortalecimento comunitário - sustentabilidade da ação e Inclusão Econômica e Social. Ambas garantem que os avanços do programa sejam

sustentáveis e gerem transformações concretas nos modos de vida das comunidades.

Soluções propostas

A frente do fortalecimento comunitário promove a mobilização social e a valorização dos laços locais. Serão criados espaços como o Espaço Vida Nova, voltados ao diálogo, à convivência e à decisão coletiva. Lideranças comunitárias serão formadas, núcleos de zeladoria urbana com participação popular serão ativados, e atividades culturais reforçarão o sentimento de pertencimento. O objetivo é construir redes que sustentem a ação pública mesmo após o fim das intervenções diretas.

Já a frente de Inclusão Econômica e Social foca na promoção do trabalho digno, do empreendedorismo popular e da qualificação profissional, com atenção especial para mulheres e jovens. Um destaque é a capacitação de mulheres como **Agentes Vida Nova de Cuidados Comunitários (ACC)**, que terão papel de auxílio na zeladoria e no cuidado com o território, fortalecendo práticas de cuidado coletivo. A frente, propõe ainda o **Galpão das Oportunidades**, voltado à formação profissional em áreas estratégicas com práticas sustentáveis, reaproveitamento de materiais, soluções baseadas na natureza promovendo ações que auxiliem na resiliência socioambiental dos territórios atingidos. Para ampliar a empregabilidade, o programa prevê ainda fomento a oportunidades formais de emprego além da valorização dos talentos locais e aproximando as comunidades dos circuitos econômicos da cidade.

O componente será articulado com outras políticas públicas municipais, por meio de **ações intersetoriais**, garantindo acesso ampliado da população a serviços de saúde, educação, cultura, meio ambiente e assistência social. A **integração institucional** busca fortalecer os projetos de vida das famílias atendidas e maximizar os impactos das ações.

Além da dimensão econômica, o componente atua também no **fortalecimento do tecido social e no aumento da autoestima comunitária** como motores para a transformação. A valorização da cultura e da identidade local, por meio de oficinas, eventos e festivais, será central para reforçar o senso de pertencimento e ativar vocações produtivas ligadas à economia criativa e à cultura popular.

Resultados esperados

-A implantação do componente visa promover transformações mensuráveis nos territórios, por meio de:

-Implementação de espaços de referência e fortalecimento da participação cidadã e formação de lideranças;

-Estruturação do Galpão das Oportunidades como fomento à economia solidária e formalização de microempreendimentos locais;

-Ampliação do acesso à qualificação profissional, principalmente para mulheres e juventudes;

-Ampliação de acesso a integração serviços públicos por meio de ações articuladas e campanhas informativas sobre direitos e políticas públicas;

-Promoção da cultura e da identidade local, com oficinas, eventos e apoio à economia criativa;

-Adoção de práticas sustentáveis e educação ambiental como parte da formação profissional e do cotidiano das comunidades.

- Redução dos números ligados à violência entre jovens em situação de risco, com foco na redução da reincidência e do recrutamento por organizações criminosas.

Com essas entregas, o componente contribuirá diretamente para a redução das desigualdades socioeconômicas e territoriais, promovendo o protagonismo das comunidades na gestão dos seus próprios processos de transformação. A articulação entre capital social, geração de renda e acesso a direitos fortalece a resiliência coletiva e a capacidade de sustentação dos avanços mesmo após o fim das ações diretas do programa, alinhando-se aos Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual da União 2024–2027 e às principais agendas de justiça territorial e desenvolvimento sustentável.

Descrição de subcomponentes e produtos:

(S) 1.1 – Fortalecimento Comunitário e Zeladoria

O fortalecimento comunitário é o ponto de partida para garantir que as transformações nos territórios sejam sustentáveis e conduzidas pelas próprias pessoas que vivem ali. O Programa Vida Nova no Morro aposta na escuta ativa, no cuidado e na participação cidadã para ativar o protagonismo das comunidades. A execução do trabalho social será responsável por aproximar moradores dos processos de requalificação urbana e social, com ações como oficinas, rodas de conversa, acompanhamento psicossocial, formações de lideranças e apoio nos reassentamentos.

(P) 1.1.1: Execução do Trabalho Social

Projeção de Impacto: Pelo menos 60% do total de beneficiários/ 11.095 pessoas

Objetivo: Visa integrar as famílias aos processos de transformação local com apoio psicossocial, formação cidadã e estímulo à participação ativa.

Metas:

-50 lideranças comunitárias capacitadas;

-15 ações culturais e de valorização da memória local.

(P) 1.1.2 Produto: Ações de Valorização Comunitária e Zeladoria

Projeção de Impacto: Pelo menos 20% dos beneficiários | aproximadamente 3.698 pessoas.

Objetivo: Garante o cuidado contínuo dos espaços públicos com protagonismo local e promoção da sustentabilidade das intervenções.

Meta: Implantação dos 12 Núcleos Comunitários.

(P) 1.1.3 Produto: Espaço Vida Nova em operação

Projeção de Impacto: Pelo menos 20% dos beneficiários| aproximadamente 3.698 pessoas Objetivo: Polos de cidadania ativa, cultura, educação popular, inclusão digital, mobilização social. Meta:

- Pelo menos 30 ações formativas realizadas (cursos, oficinas, encontros)

(S) 1.2 – Inclusão Econômica e Social

Projeção de Impacto: 40% dos beneficiários/ 7.396 pessoas

Promover a inclusão econômica ampliando o acesso de jovens, mulheres e outros grupos em situação de vulnerabilidade a oportunidades de formação e geração de renda. A estratégia parte do reconhecimento dos saberes, trajetórias e potências já existentes nas comunidades, fomentando iniciativas que aliem valorização cultural, fortalecimento da economia popular e desenvolvimento sustentável dos territórios.

(P) 1.2.1 Abertura de novas turmas para infância e juventude

Projeção de Impacto: Pelo menos 20% dos beneficiários| aproximadamente 3.698 pessoas

Objetivo: Ampliar o acesso de jovens a formação em meio ambiente, audiovisual, cultura digital e cidadania.

Meta: 50 jovens beneficiados nas áreas do programa

(P) 1.2.2: Programas para Igualdade de Gênero e Autonomia Feminina

Projeção de Impacto: Pelo menos 40% beneficiários/ 7.396 pessoas

Objetivo: Promove o empoderamento de mulheres em áreas estratégicas da economia local.

Metas:

-20 mulheres formadas em cursos de construção civil;

-10 mulheres qualificadas para atuação no turismo comunitário.

(P) 1.2.3: Projetos de Incubação e Galpão das Oportunidades

Projeção de Impacto: 30% dos beneficiários| aproximadamente 5.547 pessoas.

Objetivo: Impulsionar a economia local, fomentar práticas sustentáveis e gerar oportunidades reais de trabalho e renda.

Metas: 1 Galpão estruturado com áreas de produção, reciclagem e capacitação.

(P) 1.2.4 - Programa de prevenção à violência da juventude contra o crime organizado

Desenvolvimento e implementação de metodologia baseada em evidências para prevenir o envolvimento de jovens com o crime organizado, por meio de equipes de rua, busca ativa e aplicação de Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). O programa atuará nas comunidades atendidas pelo PVNM, identificando jovens em situação de alto risco e oferecendo suporte psicossocial estruturado, com base em práticas comprovadas internacionalmente. A abordagem visa reduzir reincidência, fortalecer vínculos sociais e ampliar alternativas de vida segura e produtiva.

Projeção de Impacto: 4,9% da população das comunidades | aproximadamente 900 jovens

Esses números representam a estimativa de atendimento acumulado ao longo do ciclo de implementação do **Programa Vida Nova no Morro, contemplando 18.491 pessoas e 7.562 domicílios como público total**. A realização das ações será distribuída de forma progressiva ao longo de cinco anos, com base no planejamento físico-financeiro do Programa.

A média de implementação das ações está prevista da seguinte forma:

Ano 1 – 30%, Ano 2 – 25%, Ano 3 – 20%, Ano 4 – 15% e Ano 5 – 10%, respeitando a complexidade das intervenções e o tempo necessário para o fortalecimento dos vínculos comunitários, a consolidação das estruturas e a ampliação gradual da cobertura das ações nos territórios.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: (C) 2 - MELHORIAS HABITACIONAIS
Valor estimado em Dólar (USD): 53.538.000,00
Descrição:

O componente de Melhorias Habitacionais visa **reduzir a vulnerabilidade habitacional de famílias residentes em comunidades e favelas de Niterói**, promovendo condições de segurança e salubridade nas moradias. Para isso, serão realizadas reformas de melhorias qualitativas em unidades habitacionais com deficiências construtivas, que afetam a qualidade de vida e a saúde dos moradores, através dos produtos **(P) 2.1 - Moradias melhoradas** e **(P) 2.3 - Assessorias técnicas habitacionais prestadas**. As moradias em áreas de alto risco geológico e sanitário, onde reforma e melhorias seriam incapazes de oferecer segurança e salubridade, serão oferecidas alternativas para o reassentamento das famílias, através do produto **(P) 2.2. - Desapropriação e medidas compensatórias para famílias reassentadas.**

Relação com as soluções propostas:

O programa responde às condições precárias e inadequadas de moradia identificadas no município, onde milhares de famílias em comunidades de Niterói convivem com situações que as expõe a riscos estruturais, sanitários e ambientais.

Resultados esperados:

A implementação deste componente contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade habitacional, com os seguintes resultados:

- Redução do déficit habitacional qualitativo e quantitativo;

- Redução de indicadores de insalubridade e riscos domésticos relacionados à estrutura das residências no município, com a meta de requalifica-las;

- Ativação do serviço de assessoria técnica, beneficiando as famílias residentes nas comunidades em atendimento;

- Redução do número de domicílios em áreas de risco, garantindo reassentamento adequado para famílias, priorizando a continuidade dos vínculos sociais e acesso a serviços;

- Redução de gastos públicos com saúde e assistência social decorrentes de situações precárias e inadequadas de moradia;

- Reconhecimento das moradias como espaços de dignidade, permanência e referência para a vida familiar e comunitária;

- Promoção de moradias seguras, sustentáveis, confortáveis, com valorização cultural.

Ao final do programa, espera-se avançar na construção de uma cidade mais equitativa, garantindo **condições habitacionais dignas e seguras**, alinhadas aos Objetivos Estratégicos de transição para cidades sustentáveis, prevenção de desastres e redução das desigualdades regionais.

Descrição de subcomponentes e produtos:

O componente de Melhoria Habitacionais visa a **transformação das condições de moradia nas comunidades de Niterói**, abordando diretamente as deficiências **qualitativas e quantitativas** habitacionais. As intervenções habitacionais darão prioridade à implementação de soluções passivas, Soluções Baseadas na Natureza (SbN) e de reaproveitamento, que promovem eficiência energética, conforto térmico e sustentabilidade ambiental. Essas estratégias podem incluir técnicas de iluminação e ventilação naturais, telhados verdes, placas solares, captação e reuso de água da chuva, além do uso de materiais ecológicos e reaproveitados/reciclados, garantindo maior resiliência habitacional e adaptação às mudanças climáticas.

(P) 2.1 - Melhorias em Habitações Inadequadas

- Projetos Técnicos (Kits): Elaboração de um caderno técnico de melhorias habitacionais, contendo diretrizes padronizadas e itens personalizáveis para intervenções em moradias inadequadas. O material servirá como base para todas as reformas realizadas no programa, garantindo qualidade, eficiência e sustentabilidade nas intervenções. **Meta**: 1 caderno técnico de soluções desenvolvido.

- Reforma das Casas: Execução de serviços de reformas habitacionais para corrigir inadequações, podendo fazer parte: reparos em instalações elétricas e hidrossanitárias, requalificação de pisos e revestimentos, adaptação de banheiros e cozinhas, melhoria da ventilação e iluminação, requalificação de coberturas, entre outros. **Meta**: 7562 moradias reformadas.

- Subsídio Aluguel: Concessão de auxílio aluguel (R$800,00/mês) para famílias realocadas temporariamente devido às obras. **Meta**: 1.509 famílias atendidas, por até 3 meses.

Obs.: Este produto está diretamente relacionado ao **subcomponente (S) 4.1 - GERENCIAMENTO DE DADOS, MONITORAMENTO E LEVANTAMENTOS TÉCNICOS** e ao **produto (P) 4.1.1 - Sistema de ação integrada socioeconômica, técnico-habitacional e urbanístico** que auxiliará na identificação de elegibilidade e proverá um aplicativo que sistematizará o processo de levantamento técnico, projeto técnico e documentação para licitação das intervenções, possibilitando agilizar e escalonar o produto de Melhorias em Habitações Inadequadas.

(P) 2.2 - Desapropriação e Medidas Compensatórias para Famílias Reassentadas

- Soluções Habitacionais de Reassentamento: Oferta de alternativas habitacionais para famílias afetadas por obras ou em áreas de risco, incluindo: Compra Assistida, indenização financeira, construção de novas unidades habitacionais, além de subsídio aluguel até a entrega da nova moradia, entre outras. **Meta**: 331 famílias reassentadas.

- Subsídio Aluguel: Concessão de auxílio aluguel (R$800,00/mês) para famílias realocadas temporariamente devido ao reassentamento que precisarem de local provisório de moradia enquanto a execução do modelo escolhido seja efetivado e a família possa habitar a nova moradia. **Meta**: 331 famílias atendidas, por até 12 meses.

(P) 2.3 - Assessorias Técnicas Habitacionais Prestadas

- Assessorias Técnicas: Prestação de suporte técnico para famílias, incluindo orientação multidisciplinar em engenharia, arquitetura, design de interiores e eficiência energética, garantindo que as reformas sejam seguras, sustentáveis e participativas. Além da realização de projeto técnico, fornece orientação para planejamento da obra e acompanhamento da execução.

Meta: Serviço de atendimento do Arquiteto de Família durante 5 anos do projeto para atendimentos das 12 comunidades.

Obs.: Este produto está atrelado ao **componente (C) 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO** e aos produtos **(P) 1.3.1 - Galpão das Oportunidades em operação** e **(P) 1.3.3 - Espaço Vida Nova**, que fornecem materiais e capacitam os moradores para o planejamento dos projetos e execução das intervenções. Estas atividades são dependentes e essenciais para concretizar os projetos elaborados nas assessorias técnicas, compreendendo que para a execução de uma mudança, reforma ou ampliação nas moradias é preciso projeto (assessoria técnica), mão de obra (capacitação ofertada no centro de Espaço Vida Nova) e material (ofertado pelo Galpão das Oportunidades aos moradores que possuírem projeto técnico das intervenções).

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: (C) 3 - URBANIZAÇÃO INTEGRADA E RESILIÊNCIA URBANA
Valor estimado em Dólar (USD): 67.455.000,00
Descrição:

O Componente de Urbanização Integrada e Resiliência Urbana tem como objetivo **promover a resiliência urbana e a adaptação às mudanças climáticas, reduzindo vulnerabilidades socioambientais e ampliando a qualidade de vida** nas comunidades e favelas de Niterói. A partir de **intervenções estruturantes de urbanização integrada**, este componente busca garantir infraestrutura urbana completa, minimizar riscos geo-hidrológicos e ampliar a integração das áreas de favelas e comunidades ao tecido urbano da cidade. As ações estarão estruturadas em quatro frentes principais:

- **Urbanismo tático, arte urbana e ativação cultural:** incentivo à apropriação dos espaços públicos pela comunidade por meio de intervenções artísticas e culturais.

- **Obras de infraestrutura urbana:** melhoria das condições de drenagem, pavimentação, saneamento, iluminação pública, drenagem e acessibilidade.

- **Criação e qualificação de espaços públicos:** implantação de praças, quadras e centros comunitários para fomentar o convívio social e a integração comunitária.

- Soluções de mitigação de risco e adaptação climática: implementação de medidas sustentáveis para ampliar a resiliência urbana e reduzir impactos ambientais, com foco em contenção de encostas e aplicação de soluções baseadas na natureza.

- **Segurança pública:** fortalecimento das capacidades institucionais do poder público nos territórios, com foco na redução da violência e proteção social integrada.

Relação com as Soluções:

A implantação deste componente responde diretamente à necessidade de superação da infraestrutura urbana deficiente, mitigação de riscos climáticos e criação de espaços públicos de qualidade. As soluções propostas reforçam a resiliência das comunidades ao proporcionar melhor acesso a serviços urbanos, reduzir vulnerabilidades ambientais e promover a integração territorial.

As soluções previstas serão realizadas em **12 comunidades de Niterói,** distribuídas entre **diferentes macroterritórios** do município, priorizando um alcance a nível municipal do Programa. As comunidades foram

classificadas por **porte** (pequeno, médio e grande), o que orientou a modelagem e a quantificação preliminar das ações de urbanização.

Resultados Esperados:

Com a execução deste componente, espera-se alcançar:

- **Ampliação da infraestrutura urbana:** regularização de vias, saneamento e drenagem para proporcionar maior segurança e acessibilidade;

- **Redução de riscos ambientais:** estabilização de encostas, recuperação de áreas degradadas e implementação de drenagem sustentável;

- **Valorização dos espaços públicos:** criação de ambientes de convivência seguros, acessíveis e propícios ao desenvolvimento comunitário;

- **Fortalecimento da identidade local, da participação cidadã e da segurança:** incentivo à apropriação dos espaços urbanos por meio de arte, cultura, gestão comunitária e aumento da segurança pública.

Com isso, o componente de Urbanização Integrada e Resiliência Urbana contribui para um **desenvolvimento urbano sustentável**, garantindo que as comunidades estejam mais bem preparadas para enfrentar os desafios climáticos e ambientais do futuro.

Descrição de subcomponentes e produtos:

(P) 3.1 - Elaboração de Projetos Urbanísticos

Mapeamento das condições urbanas existentes, como infraestrutura, acessibilidade, áreas de risco, equipamentos públicos e espaços de convivência;

Definição de estratégias de adaptação climática e redução de riscos ambientais no desenho urbano;

Construção do projeto com participação ativa da comunidade, incorporando demandas e saberes locais;

Elaboração de projetos urbanísticos integrados para as comunidades atendidas, com base em diagnóstico participativo e diretrizes de sustentabilidade, resiliência e inclusão socioterritorial.

Meta: 12 projetos urbanísticos elaborados.

(P) 3.2 - Ações de Urbanismo Tático e Arte Urbana Implementadas

Implementação de ações de urbanismo tático;

Recuperação de fachadas em pontos chave da comunidade e pintura de empenas a fim de retratar a história local;

Realização de oficinas participativas com os moradores para o planejamento e execução das intervenções de urbanismo tático;

Instalação de mobiliário urbano simples, como bancos e lixeiras recicláveis, promovendo a convivência e a identidade local.

Metas: 1 oficina participativa em cada comunidadecom envolvimento direto dos moradores no planejamento das intervenções, além da realização do conjunto de intervenções planejados nas oficinas em cada comunidade.

(P)3.3 - Melhoria Urbana Finalizada

Construção, ampliação e melhoria do sistema viário interno das comunidades (vias, calçadas, escadarias e rampas). Priorização do uso de materiais drenantes, grelhas metálicas e canaletas, visando à redução da impermeabilização e melhoria do escoamento superficial da água;

Implantação ou requalificação de sistemas de drenagem pluvial, com incorporação de elementos de infraestrutura verde, como jardins de chuva e valas vegetadas, para aumentar a capacidade de retenção e escoamento sustentável da água;

Condicionamento de acessos e instalação de segurança viária, como guarda-corpos e sinalização;

Implementação de arborização ao longo das vias e áreas de convívio, com espécies nativas adaptadas ao microclima local, contribuindo para conforto térmico, sombreamento e controle da erosão superficial;

Construção ou melhoria da infraestrutura hídrica e sanitária;

Metas: Implantação do Projeto Urbanístico de cada uma das 12 comunidades.

(P)3.4 - Espaços e Equipamentos Públicos

Construção ou requalificação de áreas de lazer, como praças e parques recreativos, além de quadras poliesportivas;

Desenvolvimento de novos usos para áreas subutilizadas, transformando-as em locais de encontro e atividades culturais ou recreativas;

Construção ou requalificação de centros comunitários, associações de moradores e outros espaços de serviço público;

Metas: Construção de 14 equipamentos/espaços públicos, e reforma de 30 equipamentos/espaços públicos existentes, distribuidos nas 12 comunidades atendidas.

(P)3.5 - Obras de Contenção de Encostas e Redução de Risco implementadas.

Implementação de soluções baseadas na natureza (SbN) e infraestrutura verde, como sistemas de microdrenagem, jardins de chuva e técnicas de bioengenharia;

Recuperação de áreas degradadas com espécies nativas, priorizando encostas e zonas de risco, com o objetivo de ampliar a capacidade de retenção de água do solo, reduzir a erosão e a ocupação de áreas de risco;

Estabilização de encostas para mitigar os riscos de deslizamentos, com técnicas mistas de bioengenharia, contenção e revegetação assistida.

Meta: 60 obras de contenção de encostas, e realização de ações de reflorestamento com o plantio de mudas nativas, distribuídas entre as 12 comunidades atendidas pelo programa.

(P) 3.6 Ampliação do Centro Integrado de Segurança de Resiliência Urbana (CISP)

Ampliação do CISP com a construção de novo edifício anexoe aquisição de equipamentos e mobiliários, visando modernizar a gestão de emergências e fortalecer a resiliência urbana em Niterói. A estrutura contará com salas técnicas, áreas operacionais, tecnologias de monitoramento em tempo real, inteligência artificial e integração interinstitucional. Com funcionamento 24h, o centro atuará nas frentes de prevenção de desastres, mobilidade urbana, resposta a crises e grandes eventos, contribuindo para a segurança e sustentabilidade da cidade.

(P) 3.7 Construção de Centro de Formação e Qualificação de Guardas (CFQG)

Construção de Centro de Guardas e aquisição de equipamentos e mobiliários dedicada à formação inicial e continuada da Guarda Civil Municipal de Niterói, localizada no complexo da Cidade da Ordem Pública (Barreto). O CFQG contará com 5 salas de aula, auditório para 100 pessoas, biblioteca, ginásio, pista de atletismo e espaços administrativos. A estrutura será voltada à qualificação técnica, jurídica e cidadã dos agentes, com foco em direitos humanos, mediação de conflitos e segurança comunitária. Também oferecerá cursos de especialização e capacitação para gestores e guardas coirmãs, promovendo intercâmbio institucional e padronização de boas práticas em segurança pública municipal.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: (C) 4 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Valor estimado em Dólar (USD): 3.854.000,00

Descrição:
O Componente de **Fortalecimento Institucional** tem como objetivo contribuir para **estruturar a resiliência institucional da administração pública municipal nas áreas de comunidades e favelas**, promovendo a in **tegração entre políticas setoriais e a qualificação da gestão territorial de forma participativa, digital e orientada por dados.** O componente busca **superar a fragmentação das políticas públicas nos territórios de comunidade e favelas**, **a ausência de diagnósticos sistematizados e atualizados** sobre essas comunidades e a **limitação de instrumentos que garantam a participação social** no planejamento e monitoramento das ações públicas.

Por meio do **fortalecimento da estrutura institucional** necessária para a execução do programa, este componente viabiliza a formulação, gestão e monitoramento de políticas públicas mais eficazes e adaptadas às realidades das ZEIS e comunidades atendidas. A partir da implantação de sistemas digitais e instrumentos de planejamento habitacional, o componente busca consolidar uma abordagem integrada e orientada por dados, ampliando a resiliência institucional do programa frente aos desafios territoriais, sociais e climáticos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Este componente concentra-se na criação de ferramentas técnicas, digitais e metodológicas que qualifiquem a atuação do programa nas comunidades atendidas. Visa à construção de uma base sólida de dados e protocolos técnicos que permitam uma gestão territorial mais eficiente, intersetorial e com ampla participação cidadã.

(P) 4.1 - Sistema de ação integrada socioeconômica, técnico-habitacional e urbanístico

- Desenvolvimento e implantação de uma plataforma digital integrada que permita a articulação entre diferentes bases de dados e instrumentos de gestão relacionados aos aspectos sociais, urbanísticos e habitacionais dos territórios populares.

- O sistema subsidiará o planejamento urbano, a tomada de decisões baseadas em evidências e o acompanhamento dos impactos das políticas públicas implementadas.

Meta: 1 sistema e plataforma de dados digital integrado implantado e em operação.

(P) 4.2 - Mapeamentos especializados

- Realização de mapeamentos territoriais, socioeconômicos e técnicos, com o objetivo de gerar diagnósticos atualizados sobre as comunidades atendidas.

- Os levantamentos envolvem o uso de geotecnologias, coleta de dados primários e processos participativos para garantir a representatividade das informações e fortalecer o controle social.

Meta: 12 mapeamentos especializados produzidos e sistematizados (1 para cada comunidade).

(P) 4.3 - Materiais de fortalecimento técnico do programa

- Capacitação da equipe técnica multidisciplinar do programa, visando fortalecer a qualificação técnica e a efetividade das ações no território

- Aquisição de licenças de softwares especializados para apoio à análise territorial, elaboração de projetos e monitoramento das ações do programa, incluindo ferramentas de geoprocessamento, desenho técnico, modelagem urbana e gestão integrada.

- Compra de equipamentos tecnológicos (computadores, notebooks, tablets e periféricos) com especificações adequadas às demandas da equipe técnica, garantindo estrutura operacional adequada para o desenvolvimento dos projetos e o acompanhamento das atividades em campo e escritório.

- Implantação da Metodologia BIM na Prefeitura através da aquisição de licenças do Sistema BIM para o planejamento e controle das obras municipais e implantação na Prefeitura, incluindo a capacitação especializada de funcionários envolvidos com o seu uso.

Meta: 48 licenças de softwares, aproximadamente 40 usuários com parque tecnológico atualizados e adequados aos seus devidos usos técnicos, e por fim, todos os funcionários dentro do programa capacitados para funcionamento do programa.

(P) 4.1.4 - Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)

- Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), por meio da contratação de consultoria para os estudos de diagnóstico municipal, além das consultas públicas necessárias.

- O plano será construído de forma participativa, com base nos dados produzidos pelos diagnósticos e mapeamentos, e articulado aos demais instrumentos urbanísticos da cidade.

Meta: 1 PLHIS atualizado, validado e publicado.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: (C) 5 - GOVERNANÇA
Valor estimado em Dólar (USD): 13.344.000,00

Descrição:
O **Componente 5 – Governança** tem como finalidade assegurar a execução eficaz, transparente e integrada do Programa Vida Nova no Morro (PVNM), por meio do fortalecimento institucional da Prefeitura de Niterói em aspectos estratégicos de supervisão, gestão e controle. Este componente concentra as estruturas e ferramentas essenciais à boa governança do programa, viabilizando a articulação intersetorial, o monitoramento contínuo e a conformidade técnico-financeira das ações executadas.

Resultados esperados com a implantação do Componente 5 – Governança:

- Fortalecimento da capacidade institucional do município, por meio da profissionalização da gestão do programa e da capacitação técnica das equipes envolvidas;

- Garantia de conformidade ambiental e social, com a adoção de boas práticas internacionais e nacionais de supervisão e mitigação de riscos;

- Transparência na execução financeira, assegurada pela atuação da auditoria independente e pela produção de relatórios sistemáticos;

- Melhoria da articulação intersetorial, com definição de fluxos de trabalho claros, sistemas de acompanhamento e integração entre secretarias;

- Aprimoramento dos mecanismos de controle, planejamento e prestação de contas, fortalecendo a governança pública e a confiança institucional;

- Legado institucional: desenvolvimento de modelos e ferramentas replicáveis em outros programas estruturantes do município.

Com esse componente, o PVNM consolida uma abordagem de **gestão pública eficiente, moderna e transparente**, essencial à implementação de um programa multissetorial e de impacto transformador nos territórios populares de Niterói.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O componente de Governança tem como objetivo assegurar a gestão eficiente, transparente e coordenada do Programa Vida Nova no Morro (PVNM), garantindo a boa execução física, orçamentária e social do programa, em conformidade com os padrões nacionais e internacionais de financiamento, gestão pública e salvaguardas socioambientais.

As ações serão executadas por meio de três produtos estratégicos, que correspondem aos serviços técnicos especializados de supervisão, apoio à gestão e auditoria externa, promovendo a integridade, rastreabilidade e capacidade institucional da Prefeitura de Niterói.

(P) 4.2.1 – Supervisão Técnica, Ambiental e Social

Descrição:
Este produto contempla a contratação de consultorias técnicas especializadas e/ou equipes multidisciplinares para acompanhar, avaliar e orientar a execução das ações físicas, sociais, habitacionais e ambientais do programa. A supervisão ocorrerá de forma contínua, com foco no cumprimento das metas, prazos e salvaguardas, além da identificação e mitigação de riscos.

Bens e serviços ofertados:

- Serviços especializados de supervisão de obras e intervenções urbanas;

- Monitoramento ambiental e social das áreas de intervenção;

- Relatórios técnicos mensais e semestrais;

- Apoio ao cumprimento de salvaguardas ambientais e sociais do BID;

- Recomendações corretivas e apoio à gestão de riscos.

Metas quantitativas: 100% das obras e intervenções acompanhadas por equipe técnica.

(P) 4.2.2 – Apoio à Gestão do Programa

Descrição:
Este produto garante o suporte técnico, administrativo e operacional necessário para o funcionamento da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). Inclui a contratação de equipe, estruturação de sistemas de gestão, produção de relatórios gerenciais e realização de capacitações.

(P) 4.2.3 – Auditoria Externa

Descrição:
Produto voltado à contratação de auditoria independente para acompanhamento e verificação da regularidade físico-

financeira do programa, conforme exigido pelos órgãos de controle e pelo organismo financiador. A auditoria assegurará transparência, legalidade e conformidade na aplicação dos recursos.

Bens e serviços ofertados:

- Relatórios técnicos de auditoria com parecer sobre a execução financeira;

- Avaliação de conformidade legal, contábil e procedimental;

- Recomendações técnicas para correções e melhorias;

- Interlocução com órgãos de controle externo.

Metas quantitativas:

- 5 auditorias independentes realizadas (1 por ano);

1. 6. **Beneficiários**

O Programa Vida Nova no Morro (PVNM) **tem como foco os moradores de favelas e comunidades de Niterói em situação de vulnerabilidade social, urbana e ambiental.** Estima-se que o programa atuará em 7.562 domicílios, beneficiando cerca de 18.491 pessoas, o que representa aproximadamente 3,7% da população total de Niterói (481.749 habitantes, IBGE/2022). Essas áreas enfrentam desafios significativos de acesso a direitos, infraestrutura, renda e qualidade de vida. Dados do Observatório do Cadastro Único indicam que essa população é majoritariamente de baixa renda, ressaltando a urgência de políticas públicas específicas e integradas para superar as desigualdades. O Índice de Vulnerabilidade do Cadastro Único (IVCAD) aponta uma média municipal de 0,292 (quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade), reforçando a necessidade de intervenções estruturantes para fortalecer redes comunitárias, ampliar o acesso a direitos e promover inclusão produtiva e social.

O PVNM visa **ampliar o bem-estar social e promover o desenvolvimento sustentável, com impacto direto nessas comunidades** e reflexos positivos em toda a cidade. Apesar dos avanços de Niterói no Índice de Progresso Social (IPS Brasil 2024), persistem desigualdades nos territórios populares. As ações do programa buscam reduzir riscos, melhorar a habitabilidade e ampliar o acesso à moradia digna, saneamento, mobilidade, educação, cultura e espaços públicos.

Eixos de Atuação

1) Desenvolvimento Socioeconômico (OE: 101, 105, 107, 112, 207, 214)
Beneficiários diretos: moradores das comunidades, com foco em mulheres chefes de família, jovens, pessoas negras, com deficiência e famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Indiretos: coletivos culturais, organizações comunitárias, empreendedores locais e toda a população de Niterói, ao fortalecer redes de apoio e reduzir desigualdades territoriais. A participação requer compromisso com atividades formativas (oficinas e cursos) e ações comunitárias e sustentáveis promovidas pelo programa.
Impacto estimado: até 11.095 diretamente; 481.749 indiretamente.

2) Melhorias Habitacionais (OE: 111, 202, 214)
Beneficiários diretos: moradores de domicílios inadequados ou em risco, com prioridade para mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência e famílias com crianças pequenas. Critérios: residência mínima de três anos no local, não ter sido beneficiado por outro programa e comprovar precariedade. Haverá cláusula de permanência mínima de cinco anos no imóvel beneficiado, vedando venda, aluguel ou cessão. Em casos de famílias com mais de uma unidade domiciliar, apenas uma residência será contemplada, se elegível. Condicionalidades: participação no acompanhamento técnico-social e autorização das obras.
Impacto estimado: até 7.562 residências beneficiadas; pelo menos 18.491 pessoas impactadas diretamente.

3) Urbanização Integrada e Resiliência Urbana (OE: 107, 111, 112, 201, 202, 214)
Beneficiários diretos: moradores das áreas com obras de drenagem, pavimentação, contenção, saneamento e requalificação de praças, escolas e unidades de saúde. Indiretos: toda a cidade, com melhorias em mobilidade, áreas verdes e espaços públicos. A participação exige residência nas áreas atendidas e, quando possível, envolvimento em consultas públicas, oficinas e núcleos de acompanhamento. Famílias beneficiadas devem zelar pelos espaços.
Impacto estimado: aproximadamente 18.491 pessoas diretamente; 481.749 indiretamente.

Quanto as ações de segurança pública, toda a população do município será beneficiada com a ampliação do Centro Integrado de Segurança e com a construção do Centro de Formação.
População de Niterói (Censo, 2022): 481.749 pessoas.

5) Fortalecimento Institucional (OE: 301, 302, 303)
Beneficiários diretos: gestores públicos, equipes técnicas e instituições parceiras. Objetivo: qualificar e modernizar a gestão pública com uso de dados, tecnologias e participação social. A produção técnica será pública, devendo alimentar sistemas integrados e plataformas de transparência.
Impacto estimado: cerca de 40 funcionários públicos capacitados diretamente; 481.749 beneficiários indiretos com políticas mais eficientes.

6) Governança
Beneficiários diretos: equipes responsáveis pela coordenação, monitoramento e avaliação do programa. Foco na gestão eficiente, prestação de contas e continuidade das ações. Indiretos: toda a população, com melhor aplicação dos recursos e transparência garantida.
Condicionalidades: auditorias independentes, relatórios periódicos e diálogo com a sociedade civil.
Impacto estimado: 40 funcionários públicos diretamente; 481.749 indiretamente.

Impacto Total Estimado

Cerca de **18.491 pessoas impactadas diretamente** com ações em melhorias habitacionais, urbanização integrada, resiliência urbana e desenvolvimento socioeconômico. Indiretamente, o PVNM poderá beneficiar os **481.749 habitantes de Niterói**, ao fortalecer redes de apoio, ampliar políticas públicas e transformar os territórios populares de forma integrada e sustentável.

1. 7. **Anexos**

Anexo I.1 - INDICE DE TRANSPARENCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

Anexo I.2 - Plano de Cidade Inteligente

Anexo I.3 - Niterói que queremos

Anexo I.4 - Lei Urbanísta

Anexo I.5 - Plano de Contingência Verão

Anexo I.6 - Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência de Niterói

Anexo I.7- Pacto Niterói Contra Violência

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O PVNM contribui para diversos Objetivos Estratégicos do Governo Federal, focando na superação da pobreza urbana, inclusão produtiva, qualificação territorial e fortalecimento institucional. O programa propõe soluções integradas, sustentáveis e territorializadas para enfrentar a vulnerabilidade social e urbana em Niterói.

OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza
O PVNM atua nas causas estruturais da pobreza urbana, promovendo inclusão produtiva e geração de renda com:
-Galpão das Oportunidades para capacitação e autoconstrução
-Incubação de negócios com suporte técnico e canais de venda
-Programas voltados a mulheres e jovens
-Espaços comunitários para formação e redes de apoio.
Indicadores: IIEMIP, IIPJ, Produtividade (territorial)

> **Nível:** Alto
> **Justificativa:** Objetivos alinhados à redução da pobreza. Indicadores SMART com metas graduais. Recursos expressivos no Componente 1 e soluções inovadoras e replicáveis.

OE 105 – Fortalecer a economia criativa, memória e diversidade cultural
O PVNM valoriza a economia criativa como estratégia de renda e valorização territorial:
-Incubadoras culturais (gastronomia, moda e arte digital)
-Urbanismo tático com arte urbana
-Ativação de praças e centros comunitários
Indicador: IIECCP

> **Nível:** Médio
> **Justificativa:** Objetivos específicos e indicador SMART. Ações relevantes, mas com menor volume de recursos.

OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres
A igualdade de gênero é central no PVNM, com:
-Formação e empreendedorismo feminino
-Apoio a negócios locais por mulheres
-Fortalecimento de redes e lideranças femininas
-Aumento do policiamento e monitoramento em áreas públicas.
Indicador: IIEMIP

> **Nível:** Alto
> **Justificativa:** Ações focadas em mulheres negras e periféricas. Indicador SMART robusto. Recursos significativos e abordagem inovadora.

OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis
O PVNM promove urbanização integrada com:
-Melhorias habitacionais
-Obras de saneamento e acessibilidade
-Soluções baseadas na natureza (SbN) e requalificação de espaços públicos
Indicadores: PPUHPI, IAASB, área verde

> **Nível:** Alto
> **Justificativa:** Ações estruturantes e integradas. Indicadores SMART. Recursos concentrados nos Componentes 2 e 3. Soluções replicáveis.

OE 112 – Fortalecer segurança pública cidadã e integrada
O PVNM atua com foco na prevenção e fortalecimento institucional:
-Centro de Formação e Qualificação de Guardas (P3.7)
-Ampliação do Centro Integrado de Segurança e Resiliência Urbana (P3.6)
-Programa de Prevenção à Violência da Juventude (P1.2.4)
Indicador: Taxa de mortes violentas

> **Nível:** Alto
> **Justificativa:** Ações com foco territorial e prevenção. Metodologia inovadora e baseada em evidências. Recursos relevantes, impacto concentrado em formação e instituições.

OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente
O PVNM adota SbN e infraestrutura verde:
-Jardins de chuva e telhados verdes
-Reflorestamento urbano e eco limites
-Moradias com tecnologias sustentáveis
Indicador: IACVU

Nível: Médio
Justificativa: Ações ambientais relevantes, mas integradas a escopo urbano mais amplo. Recursos importantes, porém, não centrais.

OE 202 – Ampliar capacidades frente a riscos e mudanças climáticas
O PVNM qualifica territórios frente a desastres e clima com:
-Contenção de encostas, drenagem e iluminação sustentável
-Escadarias e passarelas acessíveis
-Reaproveitamento de materiais e SbN
Indicadores: PPUHPI, EAF

Nível: Alto
Justificativa: Ações urbanas focadas em resiliência. Indicadores robustos. Forte articulação com saúde, segurança e mobilidade. Recursos significativos e soluções sustentáveis.

OE 207 – Ampliar geração de trabalho e inserção produtiva dos mais pobres
O PVNM investe na inclusão produtiva:
-Capacitação profissional e apoio ao empreendedorismo
-Galpão das Oportunidades como polo de formação
-Fortalecimento de redes e negócios comunitários
Indicador: IIPJ

Nível: Médio
Justificativa: Objetivo claro e indicador com metodologia SMART. Ações formativas com impacto gradual. Boa articulação institucional.

OE 214 – Reduzir desigualdades regionais com equidade de oportunidades
O PVNM busca equidade territorial com:
-Melhorias habitacionais e reassentamento
-Infraestrutura e espaços públicos
-Apoio à geração de renda e gestão participativa
Indicadores: IIEMIP, IIPJ, PPUHPI, EAF

Nível: Alto
Justificativa: Alinhamento com redução de desigualdades socioespaciais. Indicadores SMART e metas viáveis. Recursos relevantes e ações replicáveis.

OE 301 – Ampliar democracia participativa, transparência e controle social
Governança e transparência são foco do Componente 4:
-Sistema integrado de dados (P4.1.1)
-Mapeamentos participativos (P4.1.2)
-Materiais técnicos acessíveis (P4.1.3)
-PLHIS participativo (P4.1.4)
-Aplicação do ITGM
Indicador: ITGM

Nível: Médio
Justificativa: Ações institucionais estruturadas. Indicador robusto. Recursos proporcionais. Potencial de alto impacto em dimensão transversal.

Detalhes no Anexo II – Detalhamento dos Objetivos Estratégicos Relacionados ao PVNM (R01).

2. 2. **Anexos**

Anexo II – Detalhamento dos Objetivos Estratégicos Relacionados ao PVNM

Anexo II – Detalhamento dos Objetivos Estratégicos Relacionados ao PVNM (R01)

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O PVNM foi estruturado para assegurar uma gestão coordenada, eficiente e orientada a resultados. O Município de Niterói será o mutuário da operação e designou a **Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF) e Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados (EPTC)** como órgão executor do programa, responsável direta pela implementação, monitoramento e avaliação das ações previstas.

A SMHRF abrigará a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), cuja criação será formalizada por Portaria específica. À UGP contará com uma equipe técnica especializada e multidisciplinar, estruturada em dois núcleos principais:

- Núcleo de Monitoramento e Controle Operacional

- Núcleo Técnico

Será vinculada à UGP a **Comissão Especial de Licitações Internacionais**, responsável pela condução dos processos licitatórios do programa, em articulação direta com a Procuradoria de Termos, Licitações e Contratos (PTCL), da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Além disto, o Programa também criará um **Grupo de Trabalho** (GT) Intersetorial dentro da Administração Pública Municipal, com papel consultivo e de apoio aos encaminhamentos propostos pela Coordenação do Programa.



Figura 9: *Arranjo institucional de gestão. Elaboração PVNNM, 2025*

Coordenação Geral do Programa

A Coordenação Geral da UGP será exercida por profissional com comprovada experiência em gestão de projetos públicos e programas financiados por organismos internacionais. Essa função será responsável pela articulação institucional com o Governo Federal, o agente financiador (BID) e as demais instâncias envolvidas, além da

supervisão técnica, operacional e administrativa da execução do programa.

Núcleo de Monitoramento e Controle Operacional

Coordenações:

- **Aquisições, Licitações, Apoio Jurídico e Contratos:** elaboração e acompanhamento de processos licitatórios, em conformidade com as exigências do BID.

- **Planejamento e Controle:** coordenação do Plano Operativo Anual (POA), do Plano de Execução do Projeto (PEP) e do monitoramento físico-financeiro.

- **Administrativa-Financeira:** gestão contábil e financeira da operação, consolidação de prestações de contas e relatórios de desembolso.

Núcleo Técnico

Coordenações:

- Meio Ambiente

- Projetos Urbanos e Obras

- Melhorias Habitacionais (Arquiteto de Família)

- Trabalho Social e Reassentamentos

- Mapeamento Socioeconômico e Diagnóstico

A coordenação será composta por equipes técnicas com conhecimento específico, oriundas de secretarias temáticas e entidades parceiras, garantindo a execução qualificada e integrada dos componentes do Programa.

Instituições Municipais Envolvidas e seus Papéis Institucionais

- **SM de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão**: apoio técnico na elaboração e monitoramento do POA e articulação com os instrumentos de planejamento estratégico do município.

- **SM de Assistência Social e Economia Solidária:** articulação e execução de ações de proteção social, reassentamentos e apoio às famílias vulneráveis.

- **SM de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade:** acompanhamento das condicionantes ambientais, apoio técnico em soluções baseadas na natureza e licenciamento ambiental.

- **SM de Mobilidade e Infraestrutura:** execução de obras de infraestrutura urbana previstas nos componentes 2 e 3 do programa.

- **SM de Educação:** apoio às ações de formação cidadã, qualificação profissional e mobilização juvenil nos territórios atendidos.

- **SM de Saúde** articulação de ações de promoção da saúde, vigilância sanitária.

- **Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói:** suporte na elaboração de projetos e execução de obras, especialmente no que se refere à urbanização integrada.

- **Procuradoria Geral do Município**: apoio jurídico à UGP, elaboração de pareceres e supervisão dos processos licitatórios, por meio da PTCL.

- Controladoria Geral do Município: acompanhamento da conformidade e transparência na aplicação dos recursos do programa, contribuindo com o controle social e institucional.

- **SM. das Culturas:** apoio às ações de mobilização e valorização da cultura nos territórios

- SM de Urbanismo: apoio na definição do diagnóstico, na definição estratégica das diretrizes.

- SM do Clima, Defesa Civil e Resiliência: apoio no monitoramento das áreas vulneráveis.

- **SM da Mulher:** apoio às ações à profissionalização da mulher

- **SM de Direitos Humanos:** apoio na proteção e promoção dos direitos humanos

- **SM de Conservação e Serviços Públicos:** manutenção e conservação da infraestrutura urbana

-**SM de Participação Social:** promover a participação da sociedade na elaboração, implementação, monitoramento e avaliação das políticas pública.

Este arranjo institucional assegura a atuação coordenada entre a SMHRF, demais secretarias municipais e órgãos técnicos, promovendo uma governança eficaz, com foco em resultados, eficiência administrativa e impacto transformador nas comunidades de Niterói. O organograma da UGP e sua composição detalhada encontram-se anexados à presente Carta Consulta.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF)
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O Município de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF), dispõe de capacidade institucional consolidada para a implementação do Programa Vida Nova no Morro (PVNM), apoiada por um histórico robusto de execução de políticas públicas integradas nas áreas de habitação, urbanismo, regularização fundiária e planejamento territorial.?

A estrutura operacional será centralizada na **Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP),** vinculada à SMHRF, que contará com uma equipe multidisciplinar composta por **31 profissionais** (Anexo III.10 - Arranjo Técnico de Coordenação) que serão distribuídos entre os núcleos de **Monitoramento e Controle Operacional e Núcleo Técnico**, organizados em coordenações com atribuições específicas e competência técnica comprovada em ações similares, inclusive com experiência prévia em projetos financiados por organismos multilaterais.

A **equipe da UGP contará com perfis técnicos especializados**, como engenheiros(as), arquitetos(as), designers, assistentes sociais, analistas de planejamento, técnicos ambientais, economistas, advogados(as), administradores(as), geógrafos e especialistas em aquisições e finanças públicas. Os profissionais terão atribuições claras, formalizadas em instrumento normativo próprio (Portaria de criação da UGP), conforme modelo recomendado em operações com financiamento internacional.

Além disso, o município prevê a **contratação de empresa de consultoria técnica especializada**, com função de apoiar a supervisão de obras, elaboração de projetos, gestão do programa, mapeamento socioeconômico e apoio ao reassentamento de famílias, agregando capacidade adicional à equipe permanente.

A estrutura operacional contará com:?

-Espaço físico exclusivo para a UGP, integrado à sede da SMHRF;?

-Recursos de TI e sistemas de monitoramento (incluindo o Sistema de Ação Integrada Socioeconômica, Técnico-Habitacional e Urbanístico);?

-Orçamento reservado para capacitação técnica continuada, fortalecimento institucional e produção de materiais técnicos;?

-Veículos e logística para visitas técnicas e mobilização em campo;?

-Suporte administrativo-financeiro integrado com o sistema de gestão da Prefeitura de Niterói.

As coordenações técnicas da UGP serão integradas a um sistema digital de controle e acompanhamento do Plano Operativo Anual (POA) e do Plano de Execução do Projeto (PEP), com relatórios regulares de desempenho físico-financeiro. A estrutura foi desenhada para garantir o acompanhamento em tempo real dos avanços do programa e permitir ações corretivas em caso de desvios.

Não está previsto repasse financeiro entre os órgãos municipais envolvidos, sendo a execução financeira centralizada na SMHRF, por meio da UGP. As demais secretarias e instituições parceiras contribuirão com apoio técnico e operacional, com base em instrumentos formais de cooperação intersetorial, como Termos de Cooperação e Protocolos de Atuação Integrada.

Essa modelagem assegura a **execução eficiente e integrada do programa**, combinando capacidade técnica interna, apoio externo qualificado e articulação interinstitucional, garantindo o atingimento dos objetivos e metas do PVNM dentro do prazo e escopo pactuados.

A Prefeitura conta com **experiência prévia em financiamento com o BID no desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói – PRODUIS** iniciado em 2014. O programa contempla intervenções que coadunam com o planejamento de melhorias na cidade de Niterói previsto no Plano Diretor, apoiando a provisão de infraestrutura e serviços públicos aos assentamentos informais do município.

A Prefeitura de Niterói celebrou o contrato registrado sob o número 2941-OC-BR, com prazo de execução entre 28 de fevereiro de 2014 a 28 de novembro de 2021, sendo posteriormente estendido para garantir a plena realização das metas estabelecidas. O valor total do investimento foi de US$ 44.130.000, dos quais US$ 26.470.000 foram financiados pelo BID e US$ 17.660.000 foram a contrapartida da Prefeitura de Niterói.

Para execução e monitoramento das intervenções, criou-se a Unidade de Gestão do Programa (UGP), originalmente ligada a vice-prefeitura. As intervenções foram divididas em quatro componentes:

1. Urbanização de Comunidades e Inclusão Social;

2. Mobilidade Urbana;


3. Requalificação de Áreas do Centro; e

4. Fortalecimento Institucional.

Mais detalhes sobre o PRODUIS encontram-se no Anexo III.8 - PRODUIS.




Figura 7 e 8: Urbanização na Comunidade Vila Ipiranga e Praça da Igrejinha, ambas na zona norte de Niterói.

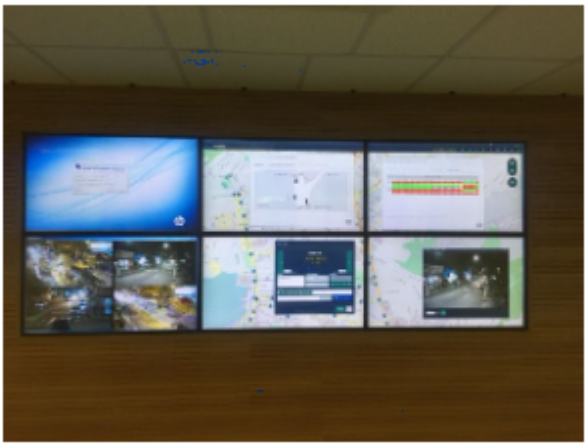


Figuras 9 e 10: Painel de monitoramento CCO e Parque das águas, Centro de Niterói.

Além do explicitado acima, damos destaque aos profissionais do corpo técnico da prefeitura, com ampla experiência em políticas públicas, planejamento e gestão, diretamente envolvidos com o PVNM e em pastas estratégicas da Prefeitura. As descrições das respectivas experiências e formações profissionais estão no Anexo III.11 - Corpo Técnico da Prefeitura.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

BID_MATRIZ RESPONSABILIDADE RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade das ações implementadas pelo PVNM será assegurada por um conjunto articulado de estratégias voltadas à manutenção das infraestruturas, à operacionalização dos serviços públicos ofertados e à construção de capacidades comunitárias e institucionais de manutenção e zeladoria.

Componente 1 – Desenvolvimento Socioeconômico

Valor anual: US$ 2.841.694,35

A manutenção das ações será garantida por meio das ações:

-Continuidade das atividades do Trabalho Social;

- Ações de valorização comunitária e zeladoria;

-Manutenção do Espaço Vida Nova;

-Novas turmas de projetos para infância e juventude;

-Continuidade de programas para igualdade de gênero e autonomia feminina;

-Continuidade dos projetos de incubação e aceleração de negócios populares;

-Manutenção do Galpão das Oportunidades;

- Continuidade do Programa de prevenção à violência.

Os valores são apresentados na planilha abaixo.

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO

ATIVIDADE	VALOR DÓLAR
Des. Socioeconomico	
(P) 1.1.1 -Trabalho Social	$98.006,64
(P) 1.1.2 - Ações de valorização comunitária e zeladoria	$29.900,33
(P) 1.1.3 - Espaço Vida Nova em operação	$93.023,26
(P) 1.2.1 Abertura de novas turmas e ampliação nos territórios de projetos para infância e juventude	$2.101.328,90
(P) 1.2.2 - Programas para igualdade de gênero e autonomia feminina implementados	$96.345,51
(P) 1.2.3 -Projetos de Incubação e Aceleração de Negócios Populares executados e Galpão das Oportunidades em operação	$90.863,79
(P) 1.2.4 - Programa de prevenção à violência da juventude contra o crime organizado	$332.225,91
Des. Socioeconomico - TOTAL	$2.841.694,35

Componente 2 – Melhorias Habitacionais

Valor anual: US$ 1.139.690,48

-As ações de melhorias habitacionais contarão com a atuação contínua de **assessorias técnicas especializadas** nos territórios de atuação, a equipe técnica local de "**Arquitetos da Família**", é uma estratégia de continuidade nos territórios, permanecendo nos territórios para orientar os moradores nos casos de novas demandas ou ajustes pós-obra e manutenção.

- Estão previstos valores para manutenção das melhorias habitacionais realizadas com **garantia de 5 anos** e para a **realização de melhorias em novas habitações**.

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO

ATIVIDADE	VALOR DÓLAR
Melhoria Habitacional	
Equipes "Arquitetos da Família"	$136.243,85
Garantia de 5 anos das obras + Novas Melhorias Habitacionais	$1.003.446,62
Melhoria Habitacional - TOTAL	**$1.139.690,48**

Componente 3 - Urbanização Integrada e Resiliência Urbana

Valor anual: US$ 2.422.065,37

Estão previstas a manutenção dos seguintes itens:

- Projetos Urbanísticos para revisão e novas intervenções no território;

- Manutenção e novas intervenções de **Urbanismo Tático e Arte Urbana**;

- Manutenção das melhorias urbanas realizadas (vias, iluminação, drenagem, água e esgoto, etc)

- **Manutenção dos equipamentos públicos** que foram construídos ou reformados;

- **Manutenção de ações de resiliência climática e redução de riscos** com a continuação dos núcleos de voluntários e novas capacitações, monitoramento das áreas de risco e gestão de grupo para acompanhamento do crescimento ordenado e preservação das áreas verdes;

- **Manutenção do Centro Integrado de Segurança de Resiliência Urbana (CISP) e Centro de Formação e Qualificação de Guardas (CFQG)**

As operações citadas acima serão operacionalizadas com apoio técnico de secretarias e órgãos específicos de cada área de ação, além de incorporarem em seu planejamento as manutenções necessárias após os 5 anos de implementação do PVNM com recurso do financiamento. Os órgãos parceiros são:

- Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos: absorverá ações de conservação urbana.

- Empresa de Obras e Infraestrutura de Niterói: ações de requalificação e ampliação de infraestrutura.

- Secretaria de Ordem Pública de Niterói: manutenção e operação dos equipamentos de segurança pública.

-Sec. Municipal de Urbanismo e Mobilidade: continuidade dos projetos urbanísticos e gestão da malha urbana.

-Sec. do Clima, Defesa Civil e Resiliência de Niterói: monitoramento contínuo das áreas de risco, de intervenções de contenção de encosta resiliência urbana e núcleos de voluntários.

- Águas de Niterói: gestão e manutenção das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

- ENEL: gestão e manutenção da infraestrutura elétrica e da iluminação pública nos territórios beneficiados.

- Secretaria de Saúde e Fundação Municipal de Saúde: operação dos equipamentos de saúde eventualmente implantados.

- Secretaria Municipal de Educação: gestão de escolas e espaços educativos implantados ou reformados.

- Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária: apoio na operação de centros comunitários.

Todos esses órgãos terão previsão de recursos operacionais em seus respectivos orçamentos alinhados ao **Plano Plurianual (PPA) Municipal 2026–2029**, garantindo a cobertura dos custos.

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO

ATIVIDADE	VALOR DÓLAR
Urbanização Integrada	
(P) 3.1 - Projeto Urbanístico - revisão e novas intervenções	$332.473,00
(P) 3.2 - Ações de Urbanismo Tático e Arte Urbana	$360.547,80
(P) 3.3 - Manutenção de Melhoria Urbana Executada (Vias, Acessos, Iluminação Pública, Drenagem, Água e Esgoto)	$1.455.080,30
(P) 3.4 - Manutenção de Espaços e Equipamentos Público Reformados/Construídos (Praça, Quadra, Centro Comunitário).	$39.237,36
(P) 3.5 - Manutenção das ações de Contenção de Encostas e Redução de Risco (Infraestrutura Verde e SbN) Implementada	$58.139,53
(P) 3.6 - Manutenção do Centro Integrado de Segurança de Resiliência Urbana (CISP)	$96.022,59
(P) 3.7 - Manutenção do Centro de Formação e Qualificação de Guardas (CFQG)	$80.564,78
Urbanização Integrada - TOTAL	$2.422.065,37

Componente 4 – Fortalecimento Institucional

Valor anual: US$ 437.493,99

Este componente será fundamental para sustentar os arranjos institucionais e operacionais após a implementação do programa. A gestão das ações dos demais componentes será monitorada por um **sistema digital integrado**, com base em dados georreferenciados, relatórios periódicos, avaliações participativas e capacitação do corpo técnico, permitindo ajustes e correções ao longo do tempo. A **manutenção e operacionalização** desse sistema vai estar sob

responsabilidade da **UGP.**

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO

ATIVIDADE	VALOR DÓLAR
Fortalecimento Institucional	
(P) 4.1.1 - Sistema de ação integrada socioeconômica, técnico-habitacional e urbanístico	$195.349,00
(P) 4.1.2 - Mapeamentos especializados	$227.693,16
(P) 4.1.3 - Materiais de fortalecimento técnicos do programa	$14.451,83
Fortalecimento Institucional - TOTAL	$437.493,99

A operacionalização e manutenção do PVNM estão ancoradas em uma estratégia robusta e integrada, **em parceria com secretarias municipais, empresas concessionárias e a participação ativa das comunidades**. O **planejamento orçamentário do município (PPA) absorverá os custos recorrentes das ações** garantindo a sustentabilidade financeira e institucional do PVNM. O cuidado com os territórios não será somente técnico, mas comunitário, assegurando que os espaços transformados continuem vivos, funcionais e apropriados pela população ao longo do tempo.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O PVNM está alinhado com o Plano Plurianual Municipal (2022-2025), o Plano Estratégico de longo prazo “Niterói Que Queremos 2013-2033" e o Pacto Niterói Contra Violência (2022), além dos demais planejamentos estratégicos do município, como: Plano Diretor Municipal (2019), Lei Urbanística (2024), Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência à Mudança do Clima (2023), Plano de Contingência Verão da Defesa Civil (2024-2025). Detalhes nos Anexos III.3 à III.7.

Abaixo seguem os programas e objetivos do PPA Municipal 2022-25, onde observa-se o alinhamento e a contribuição do PVNM.

PROGRAMA: 0010| CIDADE URBANIZADA (p.4)

> **OBJETIVO:** Ampliar e conservar a infraestrutura urbana, mantendo a cidade limpa e iluminada e garantindo espaços públicos aptos às atividades de recreação, cultura, turismo e esporte e acessíveis à população com deficiência ou mobilidade reduzida (...).

PROGRAMA: 0131 | NITERÓI MAIS SEGURA (p.33)

> **OBJETIVO**: Promover a proteção à vida humana e ao patrimônio público, por meio de ações de fiscalização e monitoramento dos espaços públicos, de forma a garantir políticas que promovam a cultura da paz e a mediação de conflitos, com vistas à redução dos índices de criminalidade, principalmente aos mais vulneráveis.

PROGRAMA: 0132| RESILIÊNCIA A DESASTRES (p.40)

> **OBJETIVO:** Tornar a cidade mais resiliente a alagamentos, deslizamentos, mudanças climáticas e outros tipos de choques, bem como coordenar ações de preparação, prevenção, mitigação, resposta e recuperação para a proteção e defesa civil.

PROGRAMA: 0134| CIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (p.56)

> **OBJETIVO:** Desenvolver, promover, implementar e divulgar os conhecimentos científicos e tecnológicos, incorporando no dia a dia da população ações relativas a cidades inteligentes, transformação digital e fomento ao ambiente de inovação (...), com vistas a resultados econômicos, culturais e sociais.

PROGRAMA: 0146| DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (p.100)

> **OBJETIVO:** Fomentar o desenvolvimento econômico de Niterói, de forma sustentável e inovadora, nos diversos setores (comercial, industrial e de serviços), mediante políticas integradas, promovendo e valorizando o empreendedorismo, a sustentabilidade de negócios e a atração de investimentos na cidade, bem como o incentivo à qualificação profissional e a geração de emprego e a renda, principalmente aos mais vulneráveis.

PROGRAMA: 0136| CULTURA É UM DIREITO (p.114)

> **OBJETIVO:** Desenvolver, valorizar, difundir e democratizar as manifestações, expressões, conhecimentos, equipamentos artísticos e culturais e o patrimônio histórico, bem como fomentar a economia criativa (...).

PROGRAMA: 0137| CIDADE DO ESPORTE (p.130)

OBJETIVO: Viabilizar atividades esportivas em modalidades diferenciadas nos diversos polos distribuídos pela cidade, para abranger todos os segmentos da população niteroiense, incluindo a população mais vulnerável.

PROGRAMA: 0147 | CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL (p.136)

OBJETIVO: Promover a gestão sustentável dos recursos naturais, preservar a biodiversidade dos seus ecossistemas por meio de ações de recuperação e conservação ambiental, inclusive para fomentar o desenvolvimento econômico-social e sustentável na cidade e ampliar políticas de saneamento básico para população.

PROGRAMA: 0124 | ECONOMIA SOLIDÁRIA (p.177)

OBJETIVO: Promover a economia solidária a fim de estimular o desenvolvimento socioeconômico sustentável com foco no incentivo ao fortalecimento de redes de economia solidária, atividades formativas para agentes de economia solidária (...).

PROGRAMA: 0140 | JUSTIÇA, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE (p.181)

OBJETIVO: Garantir os direitos individuais, difusos e coletivos, combatendo o preconceito, a violência e a intolerância contra os grupos vulneráveis. Promover o exercício da cidadania mediante o desenvolvimento de políticas públicas para a promoção da igualdade racial, a proteção e inserção social e econômica da mulher, da juventude e de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, bem como políticas públicas de combate à LGBTfobia.

PROGRAMA: 0141 | HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (p.198)

OBJETIVO: Garantir o acesso à moradia legalizada e com infraestrutura adequada para a população de baixa renda, promovendo a saúde, o bem-estar e a inclusão social do cidadão, de forma sustentável e com respeito ao meio ambiente.

PROGRAMA: 0149 | GESTÃO PÚBLICA INOVADORA (p.211)

OBJETIVO: Promover políticas públicas por meio de uma gestão orientada para resultados, inovadora e integrada no uso das novas tecnologias de informação e comunicação, garantindo o compromisso com a responsabilidade fiscal e com a eficiência do gasto público e possibilitando a melhoria da prestação e atendimento dos serviços (...).

PROGRAMA: 0150 | GESTÃO PÚBLICA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA (p.244)

OBJETIVO: Promover políticas públicas por meio de uma gestão centrada no cidadão, fortalecendo a participação popular nos seus processos decisórios, construindo um ambiente de gestão pública colaborativa e democrática.

Mais detalhes dos Programas no Anexo III.9 - PP.

3. 4. **Anexos**

Anexo III.2 - Organograma

Anexo III - Trechos do PPA Municipal 2022-2025

Anexo III.9 - PPA (R01)

Anexo III.3 - Pacto Niterói Contra Violência

Anexo III.4 - Niterói que Queremos

Anexo III.5 - Lei Urbanística

Anexo III.6 - Plano de Adaptação, Mitigação e Resiliência de Niterói

Anexo III.7 - Plano de Contingência Verão

Anexo III.10 - Arranjo Técnico de Coordenação

Anexo III.11 - Corpo Técnico da Prefeitura.

Anexo III.8 - PRODUIS

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Riscos Regulatórios e Institucionais I
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
A necessidade de cumprir diversas regulamentações municipais, estaduais e federais pode resultar em atrasos na obtenção de licenças ambientais e urbanísticas. O processo burocrático exige a aprovação de órgãos como a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), além de eventuais audiências públicas e consultas comunitárias. A complexidade desses trâmites pode comprometer o cronograma do projeto, resultando em custos adicionais e possíveis paralisações.

Prevenção e Mitigação:
Levantamento antecipado das exigências legais, elaboração de um cronograma estratégico para obtenção de licenças e diálogo contínuo com os órgãos reguladores. Além disso, a contratação de assessoria jurídica especializada ajudará a garantir conformidade com a legislação vigente e minimizar riscos de embargo.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Riscos Ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O projeto será implementado em comunidades de Niterói, algumas situadas em encostas ou áreas de preservação ambiental. A movimentação de terra e a impermeabilização do solo podem causar erosão, aumento do risco de deslizamentos e assoreamento de rios e córregos próximos. Além disso, a retirada da vegetação nativa pode impactar a fauna local e comprometer a qualidade do ar e do solo, especialmente em locais de difícil acesso, onde a logística para mitigação ambiental é mais desafiadora.

Prevenção e Mitigação:
Realização de estudos geotécnicos e ambientais detalhados antes do início das obras, implementação de projetos de drenagem e contenção de encostas, recuperação da vegetação nas áreas afetadas e monitoramento contínuo da qualidade da água e do solo para evitar impactos ambientais irreversíveis.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Riscos de Indenizações e Desapropriações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Algumas intervenções previstas no projeto podem exigir a remoção de famílias que vivem em áreas de risco ou em espaços destinados a obras de infraestrutura. O processo de indenização pode gerar resistência por parte dos moradores, especialmente se houver desconfiança sobre os valores oferecidos ou incerteza sobre a realocação. Questões fundiárias complexas, como a falta de regularização de imóveis, podem dificultar a negociação e atrasar a implementação do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Realização de um levantamento socioeconômico detalhado para identificar e mapear as famílias afetadas, desenvolvimento de um plano de reassentamento social transparente e justo, com participação ativa da comunidade, e criação de um canal de comunicação eficiente para esclarecer dúvidas e evitar conflitos judiciais. Além disso, é fundamental garantir a ampla divulgação dos critérios de indenização, assegurando que os valores sejam calculados com base em avaliações técnicas independentes e de acordo com parâmetros de mercado, o que aumenta a credibilidade do processo. É previsto a contratação de equipe especializada em mediação de conflitos fundiários para conduzir as negociações de forma imparcial, respeitando os direitos humanos e promovendo soluções consensuais. A atuação conjunta com órgãos de assistência social, defensorias públicas e cartórios pode auxiliar na regularização documental dos imóveis e na redução de insegurança jurídica. O uso de estratégias de comunicação ativa, como reuniões presenciais, visitas domiciliares e materiais informativos, contribui para aumentar a transparência, reduzir resistências e engajar a população nas decisões, favorecendo a adesão ao processo de remoção e reassentamento.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Riscos Regulatórios e Institucionais II
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Com o propósito de atender a população residente nas comunidades, no máximo de complexidade de serviços essenciais e atendidos pela gestão pública, o programa atua de forma multisecretarial e há a necessidade de atuar em sincronia com as secretárias do grupo de trabalho. Dito isso, há o risco de não cooperação entre o grupo de trabalho com o programa e assim atrapalhando o fluxo de atuação e implementação do desenvolvimento econômico.

Prevenção e Mitigação:
O programa, para além do decreto de criação do programa, haverá o decreto de grupo de trabalho, que formaliza e regula as secretarias atuantes em conjunto ao programa e propõe a participação de forma integrada com as demandas da população local existente.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Riscos Contratuais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A execução do projeto depende da contratação de empresas especializadas em infraestrutura e urbanização. Caso os contratos não sejam bem estruturados, há risco de descumprimento de prazos, superfaturamento, baixa qualidade dos serviços prestados e até mesmo paralisação das obras. Além disso, a falta de fiscalização eficiente pode levar a desvios de recursos e ineficiência na aplicação do orçamento.

Prevenção e Mitigação:
Elaboração de contratos rigorosos com cláusulas de penalização para atrasos e descumprimentos, estabelecimento de mecanismos de auditoria periódica para garantir a transparência na execução das obras e realização de processos licitatórios com critérios rigorosos para seleção de empresas qualificadas.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Riscos Sociais I
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A resistência da comunidade pode ser um dos principais desafios para a implementação do projeto, especialmente se a população não for devidamente informada sobre os benefícios das intervenções. O receio de remoções forçadas, a falta de confiança nas autoridades e o histórico de projetos inacabados podem gerar manifestações, protestos e até mesmo ocupações irregulares nas áreas destinadas às obras.

Prevenção e Mitigação:
Promoção de campanhas de conscientização desde as fases iniciais do projeto, realização de audiências públicas e reuniões comunitárias para escutar as demandas locais e construção de canais de comunicação direta para garantir a transparência no processo e minimizar conflitos.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Riscos Sociais II
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Pode haver problemas de circulação e completude territorial do programa, devido à forte presença de poder paralelo atuante nas comunidades, e assim, impedindo o alcance de famílias e domicílios atendidos, além da possibilidade de descaracterização urbanística.

Prevenção e Mitigação:
Para a prevenção, serão realizadas ações de comunicação e mobilização do programa, envolvendo membros de lideranças comunitárias, equipes de CRAS e Módulo Médico de Família de referências para uma melhor entrada, atuação no território e assim estar alinhado para estratégias de comunicação comunitária e assim haver uma maior disseminação de informação corretas do programa.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Riscos Econômicos e Financeiros
Impacto: Alto

Probabilidade: Média

Descrição:
A oscilação dos preços de insumos e materiais de construção, bem como a inflação e variações cambiais, podem impactar significativamente o orçamento do projeto. Além disso, eventuais dificuldades na liberação de recursos pelo BID ou pelo orçamento municipal podem comprometer a continuidade das obras, resultando em paralisações e aumento dos custos.

Prevenção e Mitigação:
Criação de um fundo emergencial para cobrir custos imprevistos, acompanhamento rigoroso da execução financeira do projeto e estabelecimento de contratos flexíveis que permitam ajustes de valores conforme a necessidade.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Riscos de Infraestrutura e Engenharia
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A implementação do projeto exige intervenções em locais com infraestrutura precária, como ruas estreitas e terrenos instáveis. Há risco de falhas estruturais durante a execução das obras, como colapsos de fundação, problemas no sistema de drenagem e incompatibilidade com a infraestrutura existente. Essas falhas podem comprometer a segurança dos trabalhadores e dos moradores, além de gerar retrabalho e atrasos.

Prevenção e Mitigação:
Realização de estudos técnicos aprofundados antes do início das obras, acompanhamento constante por engenheiros especializados, implementação de normas de segurança rigorosas no canteiro de obras e realização de simulações de impacto para garantir a viabilidade técnica de cada intervenção.

4. 10. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	117.128.800,00	146.411.000,00	146.411.000,00	29.282.200,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	240	300

Juros aplicáveis:
SOFR + margem de fundo em relação a SOFR (0,41% para o 1º trimestre 2025) + acrescida de spread de crédito (0,80% para o ano de 2025)
Periodicidade dos Pagamentos:
PAGAMENTOS SEMESTRAIS
Comissão de Compromisso:
0,5% semestral do valor do saldo do desembolso
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

0

Outras Informações:

Valor do financiamento (USD) - 117.128.800,00
Contrapartida financeira (USD) - 29.282.200,00

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
(C) 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.972.800,00	493.200,00	1.644.000,00	411.000,00	1.315.200,00	328.800,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
986.400,00	246.600,00	657.600,00	164.400,00		

Nome do componente					
(C) 2 - MELHORIAS HABITACIONAIS					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.713.216,00	428.304,00	10.279.296,00	2.569.824,00	10.279.296,00	2.569.824,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
10.279.296,00	2.569.824,00	10.279.296,00	2.569.824,00		

Nome do componente					
(C) 3 - URBANIZAÇÃO INTEGRADA E RESILIÊNCIA URBANA					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.396.400,00	1.349.100,00	11.872.080,00	2.968.020,00	12.411.720,00	3.102.930,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
12.411.720,00	3.102.930,00	11.872.080,00	2.968.020,00		

Nome do componente					
(C) 4 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.540.000,00	384.000,00	1.131.000,00	284.800,00	138.200,00	34.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
137.000,00	34.000,00	137.000,00	34.000,00		

Nome do componente					
(C) 5 - GOVERNANÇA					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.135.200,00	533.000,00	2.135.000,00	534.000,00	2.135.000,00	534.800,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.135.000,00	534.000,00	2.135.000,00	533.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O PVNM tem avançado com diversas ações preparatórias essenciais para a sua implementação. Seguem as etapas já realizadas:

Estudo preliminar das Comunidades:

Levantamento das ZEIS: mapeamento e informações georreferenciadas das ZEIS, onde estão as comunidades.?

Levantamento dos dados do IBGE: informações de domicílios, densidade populacional, serviços básicos, infraestrutura, entre outros, para estabelecer critérios de prioridade e inserção no programa.



as comunidades se as ZEIS.

Figura 11: Reunião de identificação de nomenclatura e localização de comunidades.

Visitas Técnicas às Comunidades

Visitas para compreensão das condições das comunidades, com equipes multidisciplinares acompanhadas de lideranças comunitárias e representantes locais, foram observadas questões como precariedade habitacional, acessibilidade, mobilidade, riscos ambientais e disponibilidade de serviços públicos.

O contato com a população permitiu conhecer as demandas e potencialidades locais e fortalecer o envolvimento com as comunidades no desenvolvimento das soluções propostas pelo PVNM.









Figuras 12 a 15: Registros de visitas técnicas nas comunidades de Niterói.

Reuniões e Levantamentos de Informações nas Secretarias de Niterói

Sec. M. de Habitação e Regularização Fundiária: levantamento de projetos de regularização fundiária realizados ou em andamento.

Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói: mapeamento de obras de urbanização, requalificação, pavimentação, contenção de encostas e construção de espaços públicos executadas ou planejadas nas áreas de interesse nos últimos 15 anos.

Sec. Mun. do Clima, Defesa Civil e Resiliência de Niterói: levantamento de contatos de lideranças comunitárias, áreas de risco, histórico de deslizamentos e alagamentos. Análise dos protocolos de avaliação de risco e de interdição de áreas vulneráveis.

Sec. Mun. de Assistência Social e Economia Solidária: levantamento do histórico de atuação e dados das famílias cadastradas no CRAS, no Cadastro Único e na Assistência Social.

Sec. de Ordem Pública de Niterói: O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) inaugurado em 2015, conta atualmente com 2.501,96m² e abriga serviços de segurança pública, incluindo o monitoramento da cidade com mais de 500 dispositivos. A avaliação das instalações e operação atual fundamentou as diretrizes técnicas para a ampliação do equipamento, que ganhará um anexo com novas tecnologias e capacidade operacional.

Sec. Mun.de Saúde: levantamento de informações sobre a cobertura do Programa Médico de Família e os desafios do atendimento nas comunidades. As informações levantadas contribuem para a implantação do das áreas mais vulneráveis e o



Figura 16: Reunião de alinhamento com a SMS

Benchmarking

Levantamento de informações e trocas de experiências com iniciativas similares para compreender boas práticas, desafios e lições aprendidas. Foram realizadas reuniões com gestores e técnicos dos programas:

Favela Bairro e Casa Carioca – Rio de Janeiro

Pode Entrar Melhorias - São Paulo

Em outros 3 programas, considerando o forte alinhamento com a proposta do Programa Vida Nova no Morro, foram realizadas visitas técnicas para conhecer in loco as estratégias de implementação, os desafios enfrentados e os

impactos gerados pelas intervenções.

Mais Vida nos Morros e Promorar - Recife

Vida Nova nas Grotas – Alagoas

As visitas possibilitaram a troca de experiências com gestores, técnicos e beneficiários, permitindo análise de boas práticas, de metodologias e de modelos de gestão empregados, contribuindo para o fortalecendo e o embasamento técnico do programa e aprimorando suas diretrizes de atuação.



Figuras 17 a 19: Registros das Visitas de Benchmarking ao Vida Nova Nas Grotas- Alagoas, Mais Vida nos Morros e ProMorar-Recife, em abril de 2025

Reunião com ONU-Habitat

Reunião sobre cooperação técnica para mapeamento e análise de dados sobre as favelas e comunidades de Niterói.



Figura 20: Registros Reunião com a ONU-Habitat, em abril de 2025

Reunião com CAU-RJ

Reunião sobre oportunidades de cooperação técnica para atendimento em assistência técnica para as famílias residentes nos territórios de favelas e comunidades de Niterói.



Figura 21: Registros Reunião com a ONU-Habitat, em abril de 2025

I Seminário de Preparação do Programa Vida Nova no Morro

O I Seminário teve o propósito de criar um espaço de diálogo e aprendizado mútuo, a fim de dar assistência à implantação do Programa. Foi um seminário interinstitucional, com foco na troca de experiências, boas práticas e estratégias de intervenção em áreas vulneráveis. Participaram profissionais que atuaram em projetos similares em diferentes cidades do Brasil. Mais detalhes no Anexo VI - Seminário PVNM.







Figura 22 a 24: Registros do I Seminário de Preparação Programa Vida Nova no Morro, maio 2025

6. 2. **Anexos**

Anexo VI - Seminário PVNM

7. **Baixar todos os anexos**

Download
