PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Resiliência Climática e Desenvolvimento Urbano Integrado na área do Córrego Machado, em Palmas/TO

Proponente: Município de Palmas
Processo SEI: 03101.000990/2025-01
Código do pleito: 442775891/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: BRL 447.344.000,00 **Valor da Contrapartida:** BRL 111.836.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 03
1. 2. 3. Soluções 07
1. 2. 4. Resultados 10
1. 3. Objetivo 11
1. 4. Indicadores 13
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 13
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 13
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 14
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 14
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 15
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 15
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 16
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 16
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 16
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 17
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 17
1. 5. Componentes 18
1. 5. 1. Informações do 1° componente 18
1. 5. 2. Informações do 2° componente 19
1. 5. 3. Informações do 3° componente 21
1. 6. Beneficiários 22
1. 7. Anexos 23
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 25
2. 1. Áreas estratégicas 25
2. 2. Anexos 27
3. GESTÃO 28
3. 1. Arranjo institucional 28
3. 1. 1. Descrição 28
3. 1. 2. Orgãos Executores 29
3. 1. 3. Estrutura Operacional 29
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 30
3. 2. Operacionalização e Manutenção 30
3. 3. Planejamento Estratégico 31
3. 4. Anexos 32
4. RISCOS 33
4. 1. Informações do 1° risco 33
4. 2. Informações do 2° risco 33
4. 3. Informações do 3° risco 34
4. 4. Informações do 4° risco 35
4. 5. Informações do 5° risco 37
4. 6. Informações do 6° risco 37
4. 7. Anexos 39
5. FINANCIAMENTO 40
5. 1. Condições Financeiras da Operação 40
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 40

5. 2. Cronograma de Desembolso 42
5. 3. Contragarantias 43
5. 4. Anuência do Banco 43
5. 5. Anexos 43
6. ETAPAS REALIZADAS 44
6. 1. Etapas realizadas 44
6. 2. Anexos 45
7. Baixar todos os anexos 47
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Resiliência Climática e Desenvolvimento Urbano Integrado na área do Córrego Machado, em Palmas/TO

Sigla: Palmas mais Resiliente

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Município de Palmas

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Contexto socioambiental e econômico

Palmas, capital do Tocantins, é uma cidade planejada fundada em 1989, destacando-se por sua infraestrutura e recursos naturais, como estoques verdes e disponibilidade hídrica (**Figura 1 e ANEXO IA**). Apresenta bons indicadores de desenvolvimento, como um IDH-M de 0,788 (2010), e sua população cresceu mais de 30% entre 2010 e 2022, alcançando 302 mil habitantes. No entanto, é uma das cidades mais quentes do Brasil, com umidade mínima de 13% e temperaturas médias subindo de 25,77°C (1995-1997) para 27,56°C (2021-2023), segundo dados do INMET.

Figura 1 - Mapa de localização e recursos ambientais de Palmas e do programa proposto

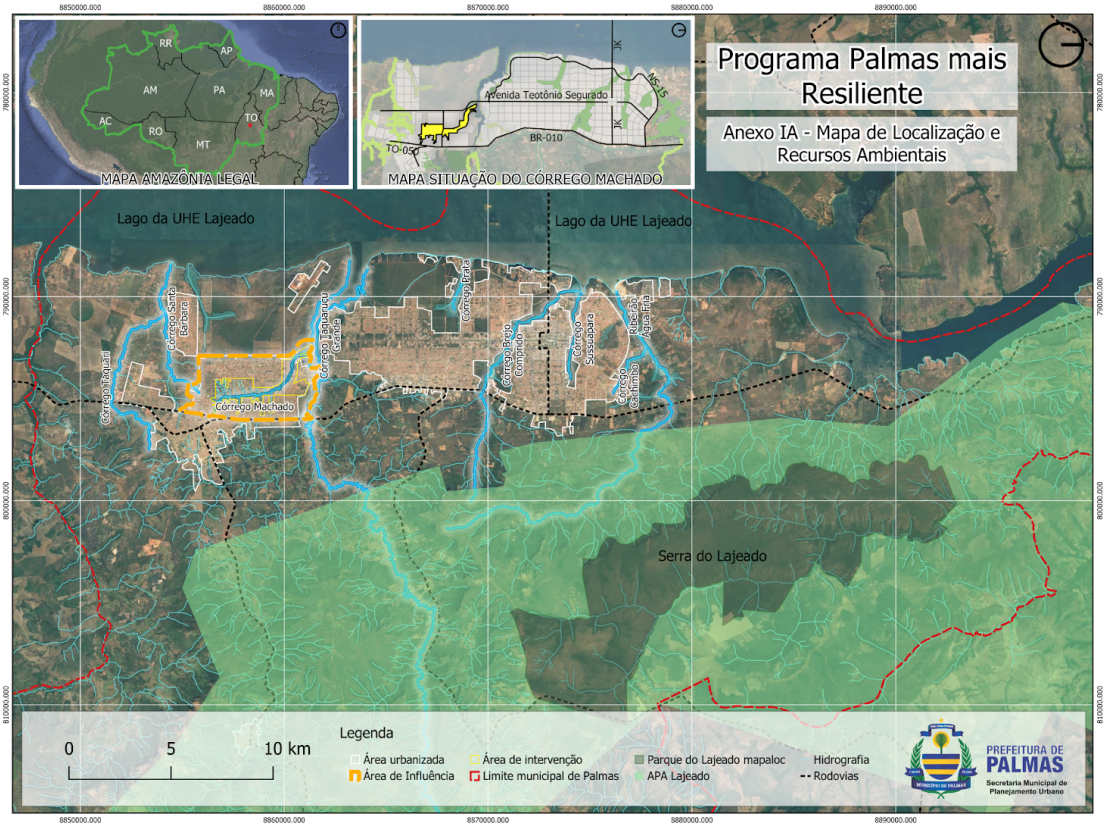

Ainda, em 2013, o Estudo de Mitigação e Adaptação da cidade indicou que ações de apoio à conservação das áreas de Bioma Cerrado sobrepostas à infraestrutura sustentável, como as propostas por este programa, podem reduzir a emissão de mais de 6 milhões de tCO2 até 2050. Em conjunto, estas informações apontam para os desafios e oportunidades relativos aos aspectos ambientais a serem endereçados pela municipalidade para garantir a ampliação e manutenção da qualidade de vida aos seus habitantes nos anos vindouros.

Entretanto, sua ocupação urbana ocorreu de forma dispersa, refletindo a segregação socioeconômica comum no Brasil. A população de menor renda se concentra em áreas distantes dos centros de emprego, com infraestrutura limitada, como na **Região Sul de Palmas**, que abriga **115.000 habitantes**, onde se insere o programa proposto.

Sua ocupação se deu, inicialmente, por parcelamentos promovidos pelo governo estadual no início da década de 90, destinados às camadas da população de menor renda que migravam para a cidade atraídas pelos empregos gerados na sua implantação. Também cedeu áreas adjacentes ao Córrego Machado, que é o elemento natural estruturante da intervenção física, para produção agrícola de abastecimento local. Ao longo do tempo, no entanto, estas áreas foram alvo de loteamentos irregulares, com modelos de ocupação que acarretaram significativa degradação e exposição da população ao risco.

O diagnóstico socioeconômico realizado em 2017 apontou que permanecem as características socioeconômicas da população a qual os parcelamentos foram inicialmente destinados, sendo **predominantemente negra e de baixa renda, com valores médios entre 1 a 3 salários mínimos**. Parte desta população habita localidades classificadas como áreas de risco pela Defesa Civil Municipal.

O cenário descrito implica em uma grande distinção paisagística e de acesso a cidade entre a Região Sul e a Região Centro. Esta última apresenta amplas áreas verdes ao longo dos cursos d'água reservadas para proteção e qualificação ambiental, permitindo o usufruto de seus serviços ecossistêmicos aliados a oferta de equipamentos públicos de esporte e lazer, como o Parque Cesamar e o Parque dos Povos Indígenas, que constituem-se como atrativos simbólicos da cidade. Na Região Sul não há nenhum parque urbano implantado e poucos são os espaços de esporte e lazer disponíveis.

Contexto político-institucional

Para endereçar os desafios socioambientais da cidade, incluindo os da Região Sul, o Plano Diretor de Palmas (2018) criou o Sistema Municipal de Infraestrutura Verde (SisMIV), que visa conectar as áreas protegidas e florestais das zonas rurais com os fragmentos de vegetação da área urbana, criando corredores verdes e propiciando uma cidade mais resiliente e com grandes estoques verdes distribuídos em todo seu território (**Figura 2 e ANEXO IB**).

Figura 2 - Mapa do SISMIV, com destaque para a área de intervenção do programa

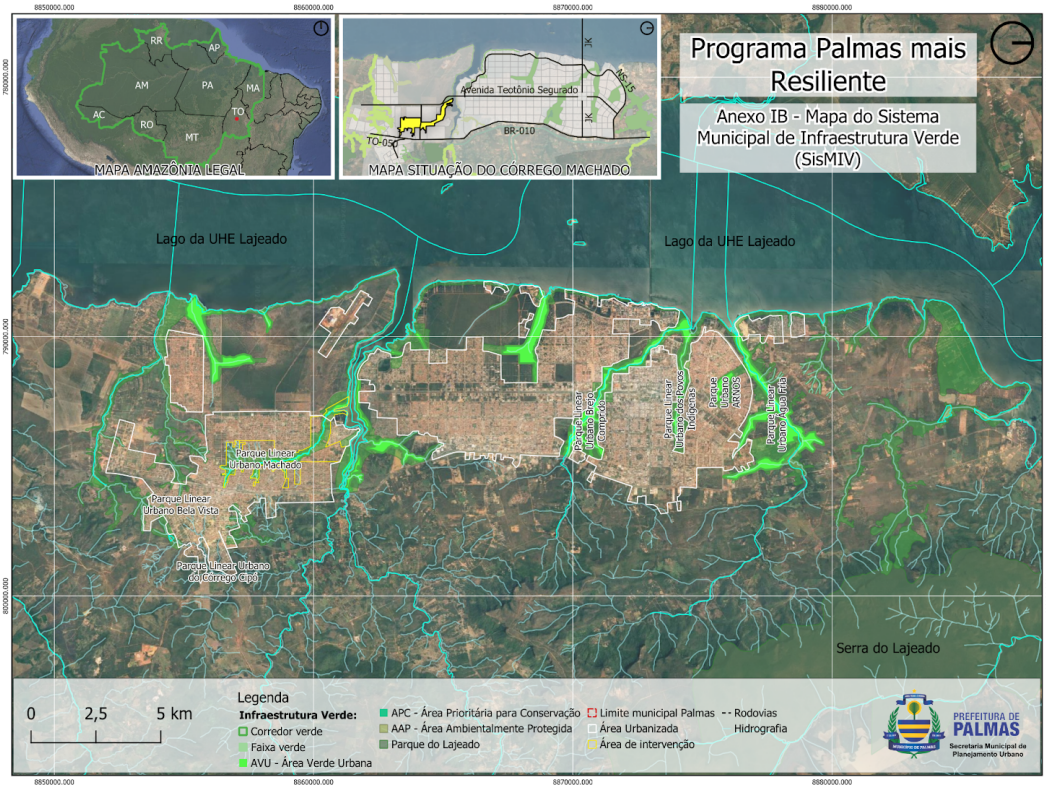

Uma das áreas do SisMIV é o Parque Linear Urbano (PLU) do Córrego Machado (**cerca de 250 ha**), que é parte integrante da área de intervenção do programa proposto (**519 ha e 14.845 habitantes**). A área constitui-se em uma bacia natural de drenagem com fragmentos relevantes do Bioma Cerrado e alto valor simbólico para a população.

Esta área já foi alvo de diversas tentativas de intervenção ao longo do tempo e está presente como prioritária no **Plano de Ação Palmas Sustentável (2015)**, muito embora tenha, historicamente, esbarrado na complexidade socioambiental que se sobrepõe à irregularidade fundiária. Neste sentido, o mesmo Plano Diretor citado aponta as

áreas adjacentes ao Córrego Machado como prioritárias para fins de regularização fundiária, processo que tem sido levado a cabo em anos recentes, com início da entrega de títulos em 2023. Ainda, percebe-se uma desarticulação comunitária, tendo em vista que nos diagnósticos já realizados não se identificou associações ou movimentos sociais com presença relevante na área de influência.

É válido destacar, no entanto, que dada a diferenciação de atendimento relativo à infraestrutura e serviços públicos entre a Região Centro e a Região Sul, a gestão municipal atual, retomando iniciativa realizada em gestões da década anterior, criou uma subprefeitura específica para a Região Aureny e Taquaralto, contemplando a área de influência do presente programa.

1. 2. 2. **Problema:**

A bacia hidrográfica do Córrego Machado (**CM, 1.425 ha**) abrange diversos bairros e é historicamente marcada por problemas ambientais e sociais que impactam negativamente seus recursos naturais, enfraquecendo as potencialidades dos serviços ecossistêmicos e a possibilidade de aumentar a resiliência local e promover estilos de vida sustentáveis, com saúde e bem-estar ao cidadão, além de intensificar as desigualdades socioterritoriais presentes na cidade. Os principais problemas identificados na área de influência do programa proposto (aproximadamente **1.860 ha e 60.777 habitantes - Figura 3 e ANEXO IC**), são:

Figura 3 - Mapa da área de influência do programa proposto

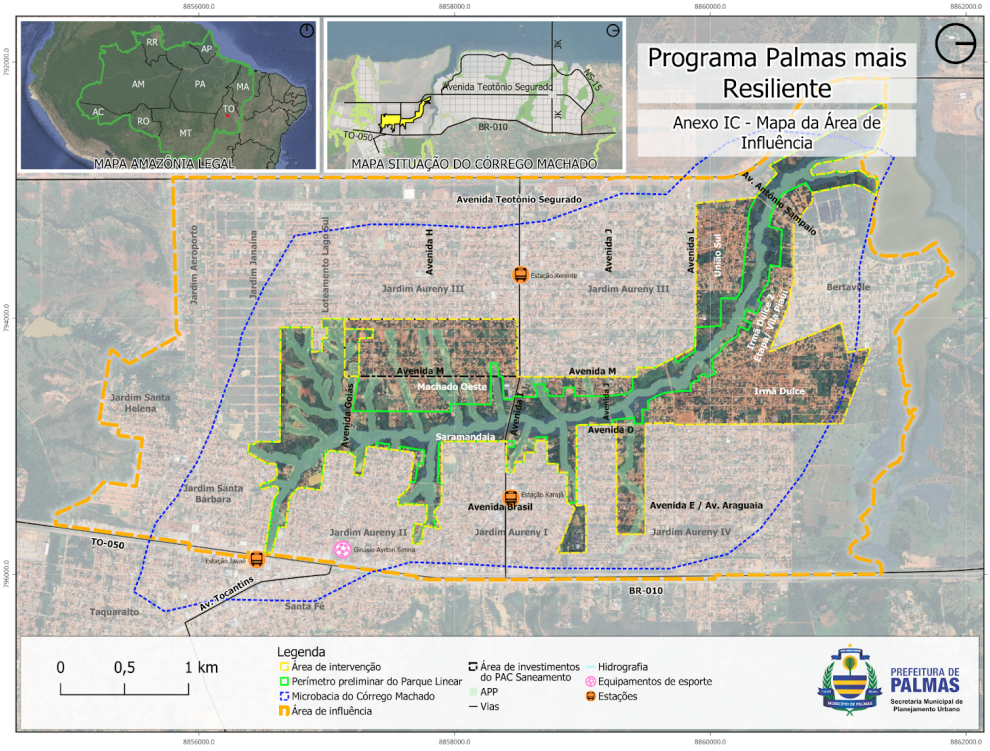

1 - Degradação e falta de educação ambiental - o padrão de ocupação urbana da área de intervenção (aproximadamente **519 ha**), aliada a ausência de programas intensivos de sensibilização sobre a importância de preservar os recursos naturais, resultou nos seguintes passivos ambientais, apontados em diagnóstico ambiental realizado em 2017 e reiterado em pesquisas acadêmicas recentes (**ANEXO II**) - supressão vegetal das APPs dos cursos hídricos e nascentes; desestabilização e desmoronamento de solo; processos erosivos acentuados e assoreamento; e lançamento de resíduos sólidos e dejetos diretamente no curso d'água e no solo (**Figura 4**). Estes fatores acarretam prejuízos na quantidade e qualidade da água, que apontam índices de coliformes termotolerantes totais acima do preconizado pela Resolução CONAMA N° 357/2005, bem como reduz benefícios ecossistêmicos importantes para a região, especialmente a regulação de temperatura e a minimização de inundações.

Figura 4 - Degradação ambiental na área de intervenção do programa

2 - Ocupações e assentamentos irregulares - ocorrem às margens do Córrego Machado (**CM**), incluindo suas APPs, intensificando a degradação ambiental e colocando os moradores em risco por ocuparem áreas vulneráveis a alagamentos, inundações, erosões e deslizamentos (**Figura 5 e ANEXO III**). A área de abrangência dos parcelamentos irregulares contempla tanto a área destinada a implantação do Parque Linear Urbano previsto no SISMIV, quanto os bairros adjacentes e que estão inseridos na bacia hidrográfica do córrego. Essas áreas carecem de infraestrutura, como universalização da rede de coleta e tratamento de esgoto, maior capilaridade da rede de transporte público coletivo, pavimentação de vias, calçadas, ciclovias, redes de drenagem pluvial aliadas à dispositivos SbN, iluminação pública e arborização urbana, dificultando, sobremaneira, o acesso destas populações aos demais serviços e equipamentos públicos ofertados na região. A irregularidade dos bairros adjacentes ao CM também redunda na ausência de áreas públicas municipais que poderiam ser destinadas para suprir a carência de equipamentos públicos na região.

Figura 5 - Distribuição das ocupações e assentamentos irregulares e em risco

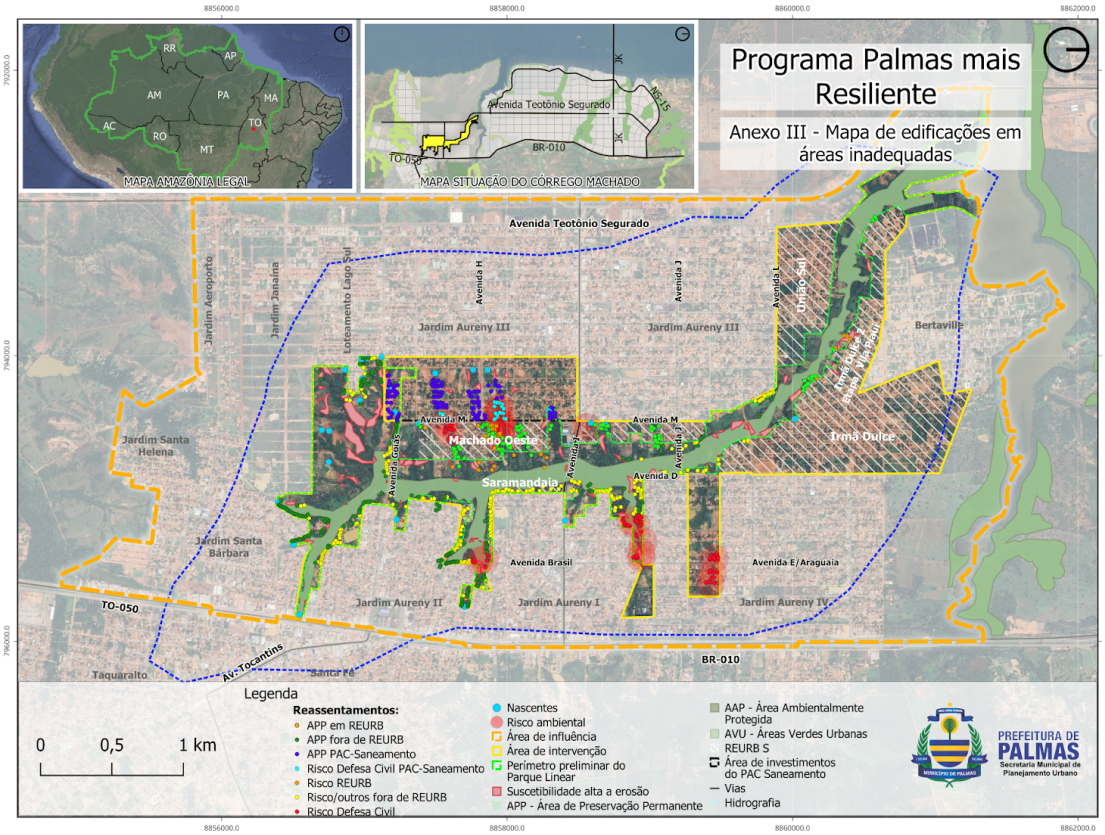

3 - Fragilidades socioeconômicas - o diagnóstico socioeconômico da porção sul da área de intervenção (**ANEXO IV**) destaca que cerca de 35% dos moradores são crianças e jovens (até 20 anos), há coabitação em cerca de 10% dos imóveis, além de uma ampla percepção de propriedade e de intenção de permanecer vivendo na região. Os dados censitários indicam uma população predominantemente negra e de baixa renda (1 a 3 salários mínimos - **Figura 6**). O Boletim Epidemiológico de 2023 mostra que a região é responsável por cerca de 27% das notificações de violência pessoal na cidade, atingindo principalmente mulheres (63% dos casos) e crianças e jovens até 19 anos (40% dos casos), com predominância da violência do tipo sexual (31,5%).

Figura 6 - Mapa de distribuição da população de Palmas com base na renda.

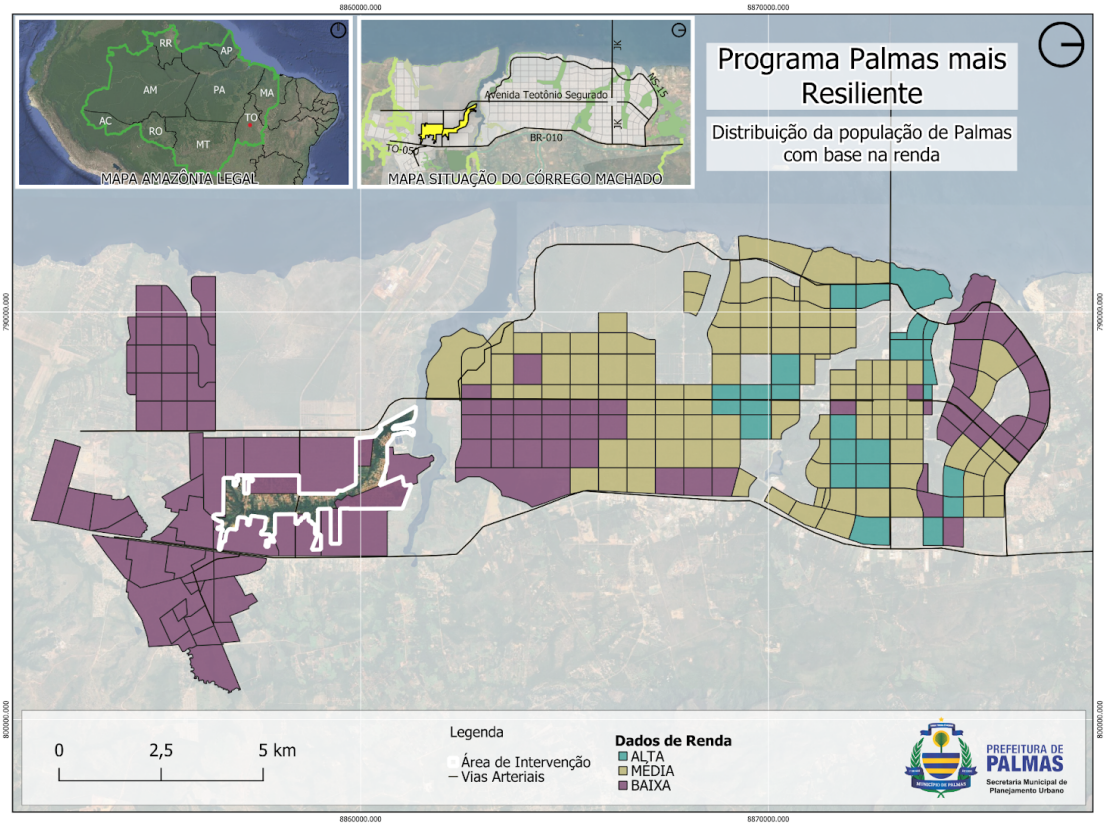

4 - Ausência de equipamentos públicos de lazer e espaços verdes qualificados (Figura 7), bem como de Saúde, Educação, Cultura e Sociais a distâncias acessíveis - O estudo Acesso Cidades (2023) identificou o baixo nível de acesso aos equipamentos públicos nas áreas próximas ao CM e, com maior destaque em toda a Região Sul, aos especificamente destinados ao lazer, praticamente inexistentes nesta região (a **Figura 8** e o **ANEXO V** trazem destaque ao efeito barreira causado pelo córrego, com suas restritas oportunidades de travessia e conexão entre os bairros). Isso resulta em desigualdades socioterritoriais alarmantes, com a parcela da população mais rica (predominantemente localizada na Região Centro) apresentando um nível de acesso aos equipamentos de lazer 70% superior à parcela mais pobre (predominantemente na Região Sul). Nesta última, há apenas uma localidade devidamente qualificada na área de influência - o Ginásio Ayrton Senna, em contraste com as diversas praças, praias e os dois parques urbanos implantados na Região Centro - Parque Cesamar e Parque dos Povos Indígenas.

Figura 7 - Mapa de disponibilidade de espaços livres em Palmas.

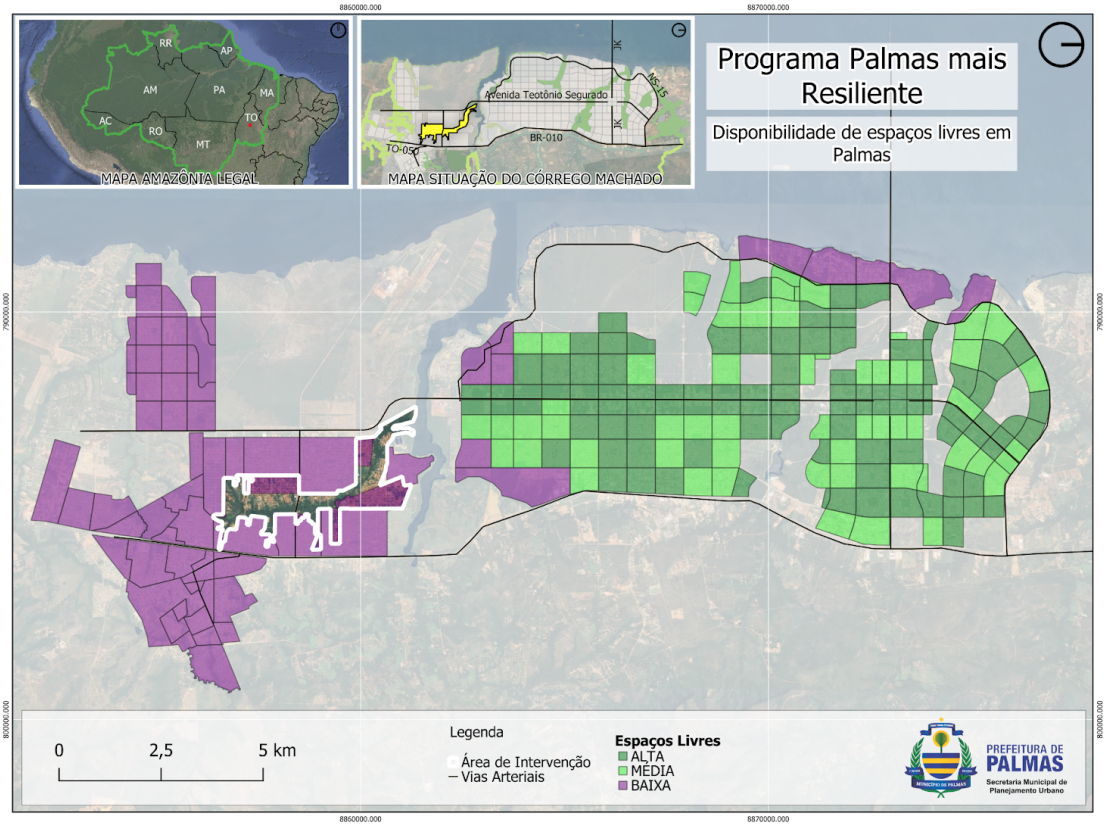

Figura 8 - Mapa de acesso a equipamentos públicos na área de influência do programa

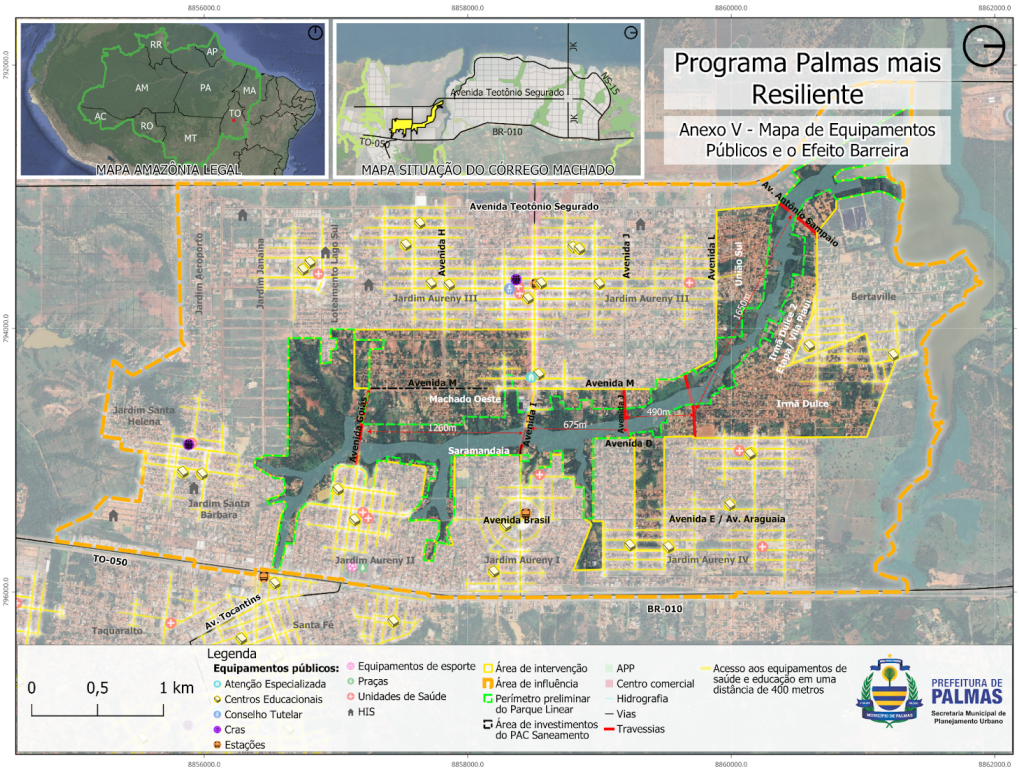

1. 2. 3. **Solução:**

Dada a diversidade e interação entre os problemas apontados, o programa se estrutura em uma abordagem de **Desenvolvimento Urbano Integrado** para a garantia da **Resiliência Climática** comunitária, destinando a totalidade de seus recursos ao cumprimento dos objetivos ambientais e climáticos. Assim, propõe-se as seguintes soluções:

1. Elaboração de diagnóstico socioambiental e Plano de Gestão Sustentável (PGS) para o PLU: visa garantir a conservação e recuperação ambiental, uso responsável dos recursos e manutenção das funções ecossistêmicas e sociais. O PGS visa não apenas manter o parque em funcionamento, mas potencializá-lo enquanto ativo ambiental e social de longo prazo, ajudando a enfrentar o desafio das mudanças climáticas e da urbanização crescente.

2. Revisão de planos e instrumentos jurídicos da política urbana e ambiental com a lente climática: consolidação de um arcabouço legal que subsidie a implantação da intervenção e possa escalonar o **desenvolvimento urbano integrado e promotor da resiliência climática** na cidade, expandindo as ações que alinhem Palmas aos ODS e a NDC brasileira, incluindo instrumentos legais voltados à adoção de Soluções Baseadas na Natureza (SbN).

3. Solução fundiária e habitacional: regularização fundiária e promoção dos reassentamentos, desapropriações e acompanhamento pós ocupação com base em um Plano de Trabalho Social (PTS) e um Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias (PRMC). Aliada a prestação de serviços de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), permitirá, entre outros, a superação das condições habitacionais de baixa qualidade, incluindo a inexistência da devida destinação e tratamento de efluentes; o afastamento das famílias das áreas de risco; e a disponibilidade de áreas públicas para a implantação dos equipamentos públicos necessários. Pretende-se que todas as novas unidades fornecidas no programa atendam a parâmetros de certificação EDGE, proporcionando melhores condições de habitabilidade.

4. Implantação do PLU do Córrego Machado, dos equipamentos públicos e da infraestrutura urbana sustentável dos bairros adjacentes necessários a resiliência local, a qualidade, a dignidade e o respeito à diversidade, contemplando (**Figuras 9, 10 e 11 ANEXO VI**):

4.a. PLU do Córrego Machado (250 ha): via paisagística, calçadas e ciclovias; proteção das áreas de fragilidade ambiental; espaços de lazer e equipamentos culturais e esportivos; pontes e passarelas para pedestres e ciclistas; e iluminação pública, garantindo, além da proteção e promoção dos ativos ambientais atrelados ao Córrego Machado, o acesso a espaços verdes qualificados para a população da Região Sul de Palmas.

4.b. Equipamento Públicos: 1 Casa da Mulher Empreendedora; 1 Espaço mais Cultura; 1 Escola de Tempo Integral; 4 Creches; 3 Unidades Básicas de Saúde; 2 Casas da Juventude; 1 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); 1 Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI); 1 Centro de Convivência da Pessoa Idosa; 1 Casa de Passagem; 1 Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 1 Posto da Guarda Metropolitana; 1 complexo esportivo; 5 núcleos de esporte, lazer e contemplação; e 1 Hospital Veterinário. Pretende-se fortalecer a rede de proteção social à população da área de influência, sobretudo das mulheres, crianças e jovens, bem como a redução das distâncias para acesso aos equipamentos públicos.

Figura 9 - Mapa das intervenções propostas

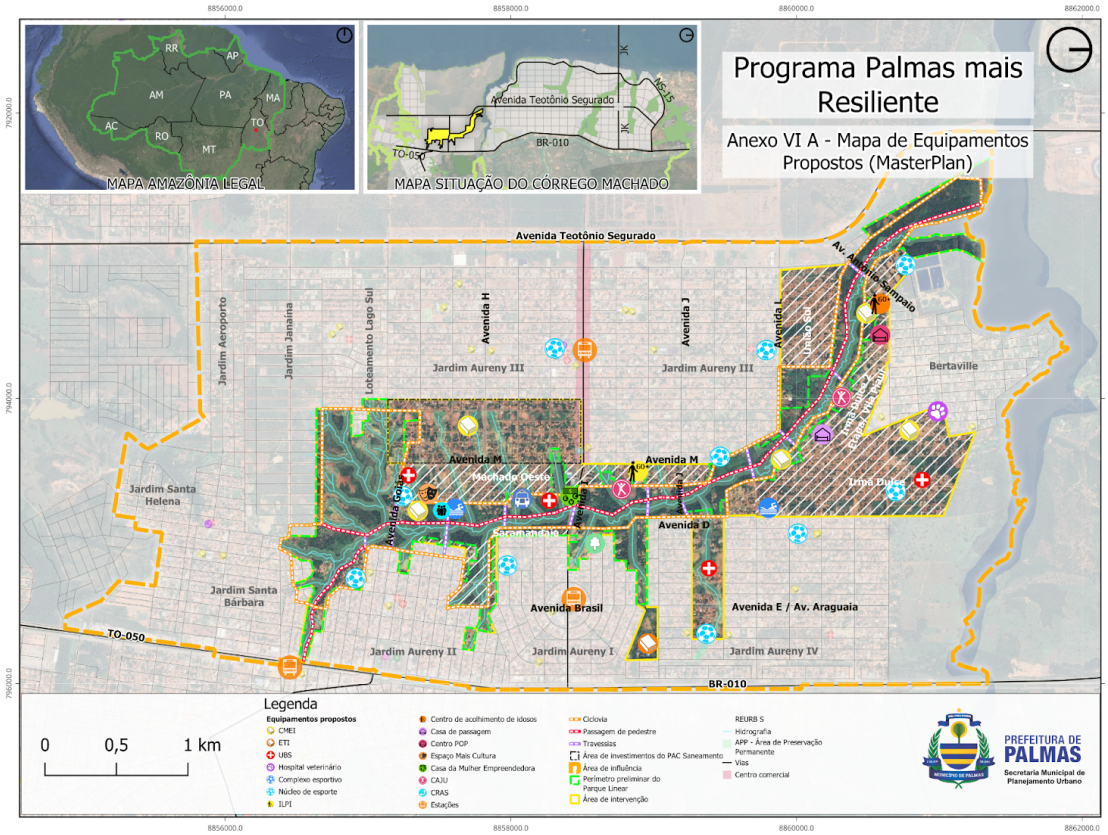

Figura 10 - Mapa dos acessos aos equipamentos públicos propostos

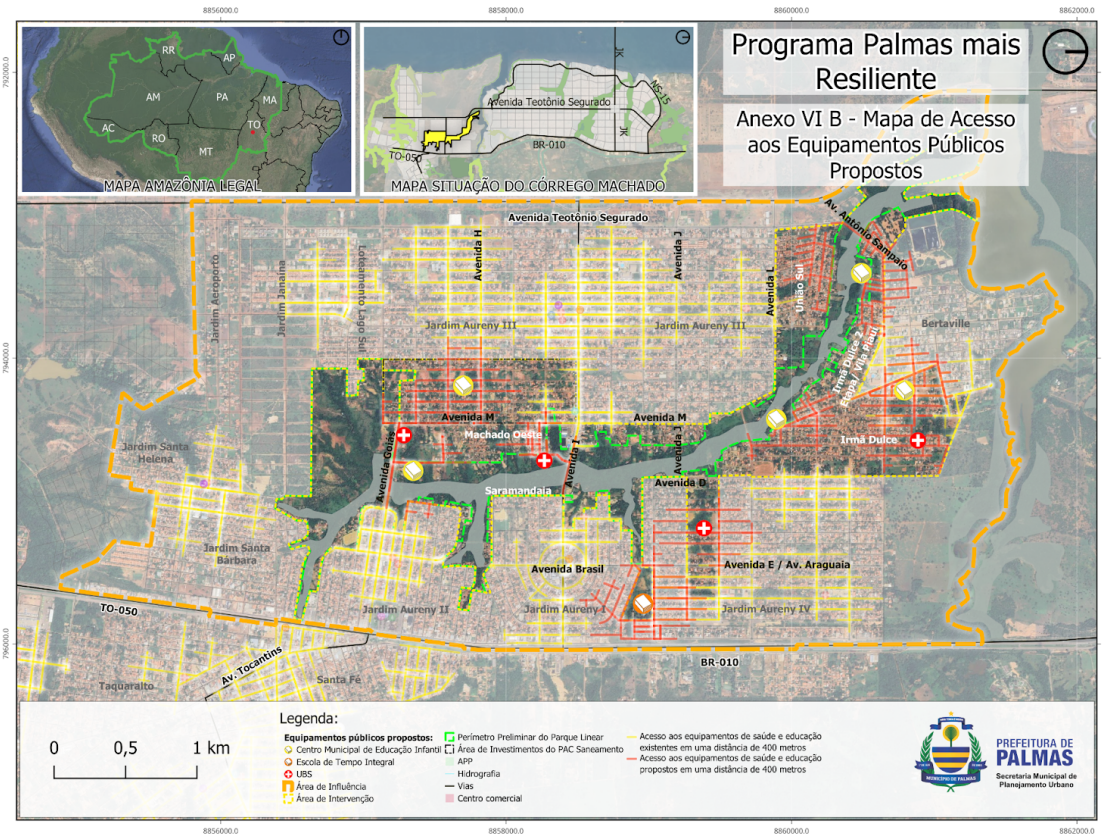

4.c. Infraestrutura urbana sustentável: seleção de **SBNs** para espaços livres e para drenagem sustentável associados a implantação da rede convencional; calçadas, ciclovias e pavimentação viária; paradas de transporte público coletivo; e iluminação pública. Possibilitará o aumento da segurança, facilitará o acesso aos equipamentos públicos e reduzirá os riscos advindos de eventos extremos.

Figura 11 - Mapa de Propostas de Infraestrutura Urbana Sustentável

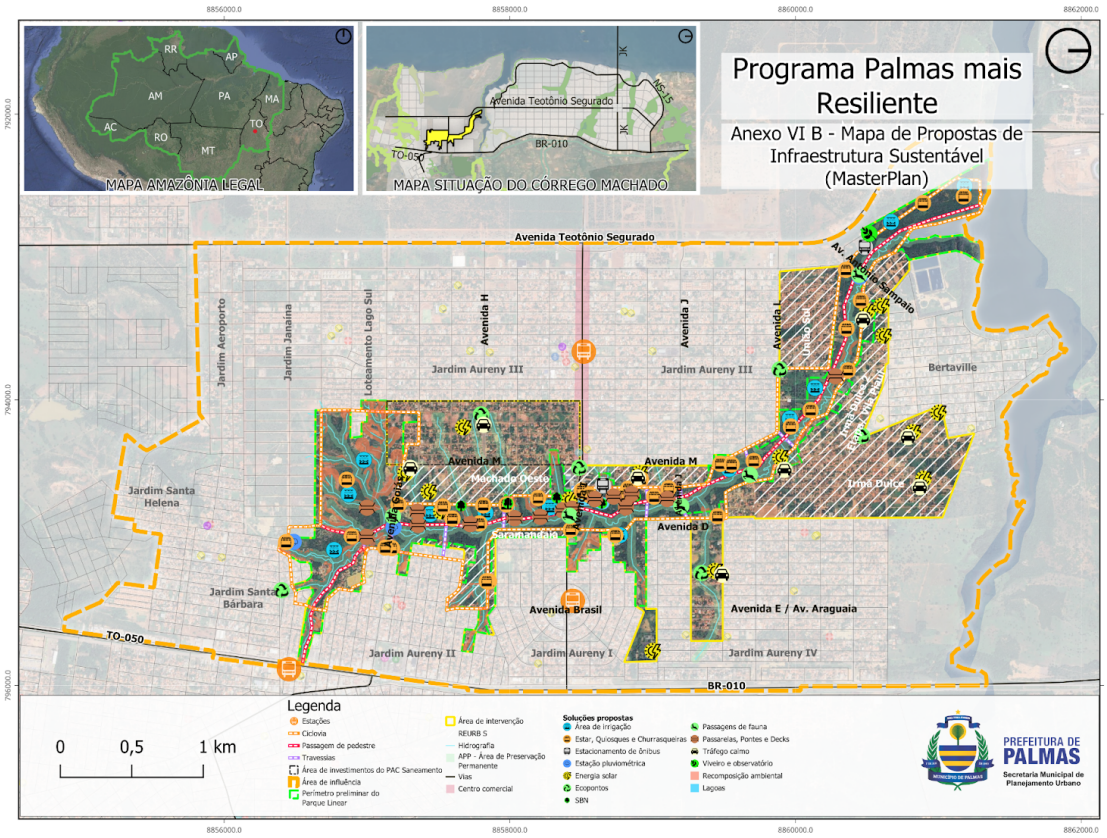

5. Desenvolvimento Comunitário: capacitação profissional, priorizando mulheres chefe de família e público LGBTQIA+; educação e empoderamento contra a violência de gênero, bem como contra crianças e jovens; e engajamento nas pautas voltadas à justiça climática, desenvolvimento sustentável, equidade social e respeito às diversidades. Pretende-se, sobretudo, reduzir a exposição ao risco de violência do público citado.

6. Sistema de Monitoramento Socioambiental: consolidação da base de dados e indicadores do programa com a criação de portal de acompanhamento público, além do arcabouço jurídico e instrumental para sua operação. Serão instaladas estações meteorológicas, medidores de vazão e uma rotina de análise da qualidade da água. Pretende-se garantir a continuidade do programa, avaliar seus resultados para replicação e manter a comunidade mobilizada para que as entregas se alinhem às suas reais necessidades.

1. 2. 4. **Resultado:**

O **PLU do Córrego Machado**, alicerçado em um **diagnóstico socioambiental** e em um **plano de gestão sustentável**, garantirá, em conjunto com o desassoreamento do córrego, a recuperação das APPs e áreas degradadas (**aproximadamente 33,25ha**), o aumento da qualidade da água do corpo hídrico com vistas a recuperar a balneabilidade que já apresentou e que era apropriada pela população no início da década de 90, alavancando os serviços ecossistêmicos prestados pelo curso d'água e pela vegetação, como a redução da temperatura, captura de CO2 e controle de cheias. Também aumentará o percentual da população da área de intervenção com acesso a espaços verdes e de lazer a uma distância caminhável (**de 2,01% para 50,08%**) promovendo seu bem estar e saúde. A revisão da política urbana e ambiental municipal com a lente climática permitirá que estes resultados se expandam para outras localidades do território municipal, potencializando o alcance dos recursos investidos no programa. Destaca-se, também, a redução do distanciamento simbólico entre a Região Centro e a Região Sul da cidade, já que a primeira conta com Parques Urbanos estruturados de amplo uso pela população municipal, enquanto a Região Sul carece de espaços com esta conformação.

No que tange às **soluções fundiárias e habitacionais**, o resultado esperado é a melhoria das condições de habitabilidade, com a garantia da regularidade fundiária das unidades na área de intervenção (**saltando de 731 para 5.487**), que permitirão maior segurança para o investimento das próprias famílias; a fixação dos moradores nos bairros, como é de interesse manifesto no diagnóstico já realizado, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade da população; a completa superação da condição de risco a que estão submetidas **374** famílias; a eliminação dos lançamentos irregulares de esgoto diretamente no Córrego Machado e a eliminação da existência de unidades habitacionais sem banheiro, que se configuram como fatores significativos para a poluição do córrego; e o aumento da qualidade construtiva das habitações por meio do uso de parâmetros EDGE nas novas unidades a serem providas dentro do programa, bem como pela oferta de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (cerca de **600 unidades**), promovendo, sobretudo, sua adaptação para um maior conforto climático.

A implantação da **infraestrutura urbana sustentável** dos bairros a serem regularizados, compreendendo uma área de aproximadamente **217 ha**, incluindo ampla utilização de Soluções baseadas na Natureza, conjugada com a rede de drenagem tradicional, para redução do escoamento superficial, velocidade e volume da água que chega diretamente a este rede e, consequentemente, ao Córrego Machado, proporcionará, em conjunto com as soluções fundiárias e habitacionais, a superação das condições de risco a alagamentos, inundações, erosões e deslizamentos (**374 famílias**); facilitará e promoverá o acesso aos equipamentos públicos por meio dos modos ativo de transporte, garantindo caminhos seguros e mais curtos, tanto pela pavimentação das vias e calçadas com acessibilidade universal, quanto pela iluminação pública a ser instalada e pela inserção de maior quantidade de travessias sobre o córrego; e expandirá o nível de acessibilidade global da área de intervenção pela possibilidade de inserção de linhas de transporte público coletivo. Este conjunto de melhorias de acesso aos equipamentos públicos é particularmente sensível ao programa tendo em vista o objetivo de fortalecer a rede de apoio a mulheres, crianças e jovens, sendo o público alvo que mais se beneficiará deste tipo de intervenção.

Neste sentido, não só a implantação da infraestrutura mas a própria **expansão da rede de equipamentos públicos (30 unidades)** ao longo da área de intervenção também facilitará este acesso, com destaque para equipamentos específicos ao público mais fragilizado e já citado - mulheres, crianças e jovens, que contarão com a **Casa da Mulher Empreendedora**, **casas da juventude, novas creches e escolas, posto da guarda metropolitana, complexo esportivo**, entre outros.

Por fim, as ações de **Desenvolvimento Socioambiental** proporcionarão a alavancagem na renda e maior capacidade de independência financeira para as mulheres, que se configura em um fator protetivo em casos de violência contra este público. Pretende-se realizar um amplo programa de capacitação e inclusão produtiva das mulheres inseridas no CadÚnico (saltando de **115** mulheres capacitadas para aproximadamente **500**), bem como expandir em 50% a área destinada a hortas comunitárias com preferência de destinação a este público, além expandir a rede de proteção de crianças e jovens inseridas no CadÚnico por meio de maior oferta de ações de inclusão social no esporte, lazer e formação cidadã, passando das atuais **825** matrículas em projetos deste teor para cerca de **1.500**.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:

O Programa tem como objetivo fortalecer a resiliência climática no entorno do Córrego Machado, por meio da conservação, proteção e recuperação ambiental do Bioma Cerrado, com foco na restauração de áreas degradadas e na implementação de soluções baseadas na natureza.

Objetivos Específicos:

a) Promover o aumento da resiliência a desastres e impactos das mudanças climáticas na cidade a partir da requalificação ambiental do entorno do CM e da urbanização sustentável com emprego de soluções baseadas na natureza (SBN).

Alinhamento:

- Indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8;
- Objetivo Estratégico PPA: 111, 201, 202, 214
- Componentes: 1 e 2

b) Implantar o Parque Linear do CM com a recuperação, restauração e revitalização das nascentes, cursos hídricos e suas APPs, contribuindo para melhoria da qualidade da água e demais serviços ecossistêmicos.

Alinhamento:

- Indicadores 1, 2, 3, 4, 5 e 8;
- Objetivo Estratégico PPA: 201, 202, 214
- Componente: 1

c) Aprimorar a qualidade do ambiente urbano, melhorando o microclima, mitigando emissões de gases de efeito estufa e promovendo saúde, bem-estar e melhorias na paisagem urbana por meio do aumento da cobertura florestal e da disponibilidade de espaços verdes e de lazer qualificados.

Alinhamento:

- Indicadores 1, 2, 3, 4, 5 e 8;
- Objetivo Estratégico PPA: 111, 201, 202
- Componente: 1

d) Reassentar famílias residentes em áreas de risco e de APP e promover a regularização fundiária dos imóveis elegíveis na área do entorno do CM.

Alinhamento:

- Indicadores 6 e 7;
- Objetivo Estratégico PPA: 111, 202, 214
- Componentes: 1 e 2

e) Promover a redução das desigualdades sociais por meio da implantação de infraestrutura urbana e diversos equipamentos públicos, garantindo maior acesso a espaços verdes, de esporte e lazer, bem como sociais, de saúde, educação e cultura.

Alinhamento:

- Indicador 8;
- Objetivo Estratégico PPA: 214
- Componente: 1

f) Fortalecer a rede de apoio a mulheres, crianças e jovens e reduzir as desigualdades de raça e gênero por meio da capacitação, inclusão produtiva, esportes, lazer e serviços públicos.

Alinhamento:

- Indicadores 9 e 10;

- Objetivo Estratégico PPA: 107, 207, 214
- Componente: 2

g) Ampliar a percepção de responsabilidade socioambiental na população da área de fomentando os sistemas de participação cidadã no planejamento e gestão territorial, ampliando a democracia participativa, a transparência e o controle social.

Alinhamento:

- Indicador 11;
- Objetivo Estratégico PPA: 214, 301
- Componente: 2

1. 25. **Indicadores**

1. 25. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador 1: Redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), contribuindo para o indicador-chave nacional relativo ao tema.

Descrição:
Acompanhando o indicador-chave nacional de Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Brasil, o programa prevê uma redução de 2.000 ton/CO2 advinda do reflorestamento de 33,24 ha de áreas de solo exposto (5,87 ha), uso urbano indevido (14,82 ha) e vegetação raleada (12,55 ha) nas adjacências do CM.

Este indicador auxiliará no monitoramento do alcance dos objetivos vinculados ao eixo ambiental do projeto, expostos nas alíneas A), B) e C) do item I.3.1, que se relacionam às áreas estratégicas 111, 201, 212 e 202 do PPA Federal 2024-2027. Tais objetivos e áreas estratégicas conectam-se à necessidade de realizar uma transição para cidades mais sustentáveis, com aumento da resiliência a desastres e impactos das mudanças climáticas, aumento da capacidade de prevenção e gestão de riscos e a necessária conservação, restauração e usos sustentável do meio ambiente.

Fórmula de cálculo: Áreas de cerrado reflorestadas (33 ha) X toneladas de CO2 capturado por hectare (60)

Dados a serem coletados: total de área reflorestada na área de influência do programa.

Linha de base*: Ano 2024 - 0,00 ton/CO2

***Trata-se de linha de base contrafactual, ou seja, sem o programa, não haverá a captura de CO2**

Meta:
Capturar 2.000 ton/CO2 2040.

1. 25. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Indicador 2: Aumento da resiliência, mitigação e adaptação às mudanças climáticas por meio da recuperação e revitalização da vegetação das APPs do CM.

Descrição:
O Diagnóstico Ambiental disponível no ANEXO II classifica o uso do solo de toda a faixa de APP do córrego e suas nascentes, que totalizam 124,12 ha. Deste total, 62,07ha foram classificados como mata de galeria, 12,56 ha como cerrado e 3,72 como área alagada, consideradas como APPs preservadas (78,36 ha). Para o ano previsto de conclusão do projeto (2030), então, considerou-se que as áreas classificadas como solo exposto (5,87 ha), urbano (14,82 ha) e vegetação raleada (12,55 ha) seriam recuperadas, totalizando 111,61 ha de APPs preservadas, recuperadas e revitalizadas (90% do total). O restante já é utilizado, atualmente, para produção de alimentos de consumo local, que deverá ser mantida seguindo critérios de sustentabilidade.

Este indicador auxiliará no monitoramento do alcance dos objetivos vinculados ao eixo ambiental do projeto, expostos nas alíneas A), B) e C) do item I.3.1, que se relacionam às áreas estratégicas 111, 201, 212 e 202 do PPA Federal 2024-2027. Tais objetivos e áreas estratégicas conectam-se à necessidade de realizar uma transição para cidades

mais sustentáveis, com aumento da resiliência a desastres e impactos das mudanças climáticas, aumento da capacidade de prevenção e gestão de riscos e a necessária conservação, restauração e usos sustentável do meio ambiente.

Fórmula de cálculo: Áreas preservadas, recuperadas e revitalizadas em APPs / total das áreas de APPs (124,12 ha)

Dados a serem coletados: uso do solo das APPs do CM (via imageamento de satélite ou drone), anualmente.

Linha de base: Ano 2017 - 78,36 ha

Meta:
Atingir 90% de APPs preservadas, recuperadas ou revitalizadas até 2030 (111,31 ha).

1. 25. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Indicador 3: Pontos de alagamento mapeados pela Defesa Civil na área de intervenção.

Descrição:
Trata-se dos 10 pontos de alagamento mapeados pela Defesa Civil desde 2019, dentro da área de influência do programa, os quais pretende-se que sejam eliminados após a implantação das SbNs associadas aos sistemas de drenagem convencional previstos no programa.

Este indicador auxiliará no monitoramento do alcance dos objetivos vinculados ao eixo ambiental e fundiário-habitacional do projeto, expostos nas alíneas A) e D) do item I.3.1, que se relacionam às áreas estratégicas 111, 201 e 202 do PPA Federal 2024-2027. Tais objetivos e áreas estratégicas conectam-se à necessidade de realizar uma transição para cidades mais sustentáveis, com aumento da resiliência a desastres e impactos das mudanças climáticas.

Fórmula de cálculo: Somatório de pontos de alagamento no entorno do CM identificados pela Defesa Civil.

Dados a serem coletados: pontos de alagamento observados na área de influência do programa, anualmente.

Linha de base: Ano 2022 - 10

Meta:
Atingir 0 pontos de alagamento mapeados pela Defesa Civil na área de intervenção até 2030.

1. 25. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador 4: Qualidade da água - coliformes termotolerantes totais no médio curso do CM.

Descrição:
Trata-se de indicador para acompanhar a qualidade da água do CM, que acaba por refletir diversas soluções nos eixos ambiental, fundiário-habitacional e de infraestrutura. O índice de referência foi identificado por coleta realizada no âmbito do diagnóstico ambiental da área (ANEXO II), para o período seco (outubro) e no ponto médio do curso d'água. A meta estipulada destina-se a cumprir o preconizado na resolução do CONAMA nº 357/2005.

Este indicador auxiliará no monitoramento do alcance dos objetivos vinculados ao eixo ambiental do projeto, expostos nas alíneas A), B) e C) do item I.3.1, que se relacionam às áreas estratégicas 111, 201, 202 e 212 do PPA Federal 2024-2027. Tais objetivos e áreas estratégicas conectam-se à necessidade de realizar uma transição para cidades mais sustentáveis e que possam avançar na oferta de infraestrutura e serviços públicos sem comprometer os recursos naturais, com destaque para os recursos hídricos.

Fórmula de cálculo: Determinação laboratorial expressa em Número Mais Provável em 100ml de amostra.

Dados a serem coletados: Número Mais Provável de coliformes termotolerantes totais em 100 ml de amostra (NMP/100 ml), anualmente.

Linha de base: Julho 2017 - 2.419,6 NMP/100ml

Meta:

Atingir o valor de 1.000 NMP/100ml, conforme preconizado na resolução do CONAMA nº 357/2005, até 2030.

1. 25. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador 5: Taxa de cobertura espacial das Soluções baseadas na Natureza (SbN) na área de intervenção.

Descrição:
Trata-se de indicador para acompanhar o avanço da implementação das Soluções baseadas na Natureza na área de intervenção. Considerou-se, como dado de partida, as áreas de APPs classificadas como mata de galeria (62,07 ha), cerrado (12,56 ha) e alagada (3,72 ha), conforme Diagnóstico Ambiental do ANEXO II e, como meta futura para o percentual designado, a implantação total do Parque Linear enquanto SbN estruturante do programa proposto, com 250 ha. A área de intervenção pode ser visualizada no ANEXO IC.

Pelo impacto ramificado das SbNs, sobretudo do Parque Linear do CM, este indicador auxiliará no monitoramento do alcance dos objetivos vinculados ao eixo ambiental, comunitário-organizacional e infraestrutura-equipamentos do projeto, expostos nas alíneas A), B), C) e E) do item I.3.1, que se relacionam à diversas áreas estratégicas do PPA Federal 2024-2027, quais sejam, a 111,113, 201, 202, 212 e 214. Tais objetivos e áreas estratégicas conectam-se à necessidade de realizar uma transição para cidades mais sustentáveis, com aumento da resiliência a desastres e impactos das mudanças climáticas, aumento da capacidade de prevenção e gestão de riscos e a necessária conservação, restauração e usos sustentável do meio ambiente, atrelada ao usos possíveis do parque que reduzirão as desigualdades socioterritoriais da cidade.

Fórmula de cálculo: Área coberta por SbNs / área total de intervenção.

Dados a serem coletados: Área das SbNs implantadas na área de intervenção.

Linha de base: 2024 - 15,10%

Meta:
Atingir o valor de 48,17% até 2030.

1. 25. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Indicador 6: Taxa de regularidade fundiária na área de intervenção.

Descrição:
Trata-se de indicador para acompanhar o avanço das ações de regularização fundiária a serem desenvolvidas no âmbito do programa. Como dado de partida, considerou-se o total de lotes/edificações regulares na área de intervenção, que se localizam nos bairros Aureny III, Aureny IV e Lago Sul (731 unidades). O total de lotes/edificações na área de intervenção contempla estes lotes regulares acrescidos de todos os demais lotes/edificações presentes nos projetos urbanísticos de regularização fundiária em curso e demais edificações fora das áreas de regularização e que precisarão ser reassentados (5.487), conforme levantamentos realizados pela órgão municipal de responsável pela regularização fundiária.

Este indicador tem um papel chave no programa e auxiliará no monitoramento do alcance dos objetivos vinculados, em especial, ao eixo fundiário-habitacional, mas que impacta todos os demais eixos, quais sejam, o ambiental, o comunitário-organizacional e o de infraestrutura-equipamentos, tendo em vista propiciar a adequada gestão do território no entorno do CM e garantir que o poder público possa implantar a infraestrutura e os equipamentos apontados como necessários no diagnóstico. Assim, contribuirá para o monitoramento dos objetivos expostos nas alíneas C), D) e E) do item I.3.1, que se relacionam às áreas estratégicas 102, 103, 111, 113, 201 e 202 do PPA Federal 2024-2027. Tais objetivos e áreas estratégicas conectam-se à necessidade de realizar uma transição para cidades mais sustentáveis e que possam avançar na oferta de infraestrutura e serviços públicos sem comprometer os recursos naturais, com destaque para os recursos hídricos e protegendo populações dos crescentes riscos ambientais.

Fórmula de cálculo: Lotes em situação regular na área de intervenção / total de lotes na área de intervenção.

Dados a serem coletados: Número de lotes regularizados na área de intervenção.

Linha de base: 2024 - 13,32%

Meta:
Atingir o valor de 90,00% até 2028.

1. 25. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Indicador 7: Edificações situadas em áreas de risco na área de intervenção.

Descrição:
Trata-se de indicador para monitorar os reassentamentos necessários vinculados aos fatores de risco ou a eliminação destes mesmos riscos, garantindo a segurança da população da área de intervenção. Para identificação das edificações situadas em áreas de risco, foram somadas as levantadas in loco pelo órgão responsável pela regularização fundiária, além das situadas em um raio de até 30m no entorno das áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil do Município.

Este é um dos indicadores chave do eixo fundiário-habitacional, com objetivo específico exposto na alínea D) do item I.3.1, que se relaciona, sobretudo, à área estratégica 202 do PPA Federal 2024-2027. O objetivo e a área estratégica citada referem-se a necessidade garantir a segurança das famílias eliminando os fatores de risco ou promovendo seu reassentamento, de maneira a ampliar a capacidade de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas.

Fórmula de cálculo: Somatório de edificações situadas em áreas de risco na área de intervenção.

Dados a serem coletados: Áreas de risco e número de edificações localizadas nestas áreas.

Linha de base: 2024 - 374

Meta:
Atingir o valor de 0 (zero) edificações situadas em áreas de risco, na área de intervenção, até 2028.

1. 25. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Indicador 8: Taxa de população próxima a espaços verdes e de lazer.

Descrição:
Trata-se de indicador para monitorar o percentual da população da área de influência do projeto que situa-se próxima a espaços verdes e de lazer. Para seu cálculo, foi realizada a operação de geoprocessamento de determinação da área de serviço, que cria a rede de caminhos possíveis, pelo sistema viário, com uma extensão pré-determinada (neste caso, 400m) a partir de um ponto de interesse. O ponto de interesse para este indicador é o único equipamento público qualificado de lazer/esporte disponível na área de influência, o Ginásio Ayrton Senna. Com a rede, foi levantado o número de domicílios adjacentes, valor posteriormente multiplicado pelo número de habitantes médio por domicílio, totalizando 1.242 pessoas. O número de habitantes médio por domicílio específico para a área de influência foi calculado utilizando os dados do CENSO 2022, que apresenta o total de domicílios e população por setor censitário. A média de habitantes por domicílio, na área de influência, é de 2,484. A meta estipulada considera a população futura que estará a até 400m do Parque Linear a ser implantado, totalizando 30.434 habitantes.

Este é um dos indicadores chave do eixo ambiental, mas que também repercute nos eixos comunitário-organizacional e de infraestrutura-equipamentos, com objetivos específicos expostos na alínea E) do item I.3.1, que se relacionam, sobretudo, às áreas estratégica 111, 113, 201 e 214 do PPA Federal 2024-2027. Tais objetivos e áreas estratégicas conectam-se à necessidade de realizar uma transição para cidades mais sustentáveis, com maior conservação e uso sustentável do meio ambiente e, dentre estes usos, apresenta-se aqueles de esporte e lazer em áreas verdes devidamente qualificadas.

Fórmula de cálculo: População que acessa espaços verdes e de lazer em até 400m de percurso pela rede viária / população total da área de influência (60.777 em 2022)

Dados a serem coletados: Espaços verdes e de lazer implantados na área de influência do programa.

Linha de base: 2024 - 2,01%

Meta:
Atingir o valor de 50,08% até 2030.

1. 25. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Indicador 9: Taxa de atendimento de mulheres cadastradas no CadÚnico por políticas municipais de capacitação e inclusão produtiva na área de influência.

Descrição:

Trata-se de indicador para monitorar as ações de capacitação e inclusão produtiva destinadas às mulheres que se pretendem efetivar no âmbito do programa. A linha de base utilizou a quantidade de vagas disponibilizadas pelo projeto Palmas por Elas (115), já em curso no Município. A meta foi estipulada no sentido de oferecer mais 3 edições deste projeto nos 3 primeiros anos de implantação do programa.

Este indicador alinha-se ao eixo comunitário-organizacional, com objetivos específicos expostos na alínea F) do item I.3.1, que se relacionam, sobretudo, às áreas estratégicas 105, 106, 107, 109, 112, 207 e 214 do PPA Federal 2024-2027. Tais objetivos e áreas estratégicas conectam-se à necessidade de reforçar políticas de segurança, proteção e redução das desigualdades de raça e gênero, com ações direcionadas à capacitação, inclusão produtiva e redução da violência contra as mulheres.

Fórmula de cálculo: Total de mulheres atendidas por programas de capacitação e inclusão produtiva / total de mulheres cadastradas no CadÚnico na área de influência (24.238 em 2024).

Dados a serem coletados: Quantidade de mulheres atendidas por ações de capacitação e inclusão produtiva na área de influência do programa e quantidade de mulheres cadastradas no CadÚnico para a mesma área.

Linha de base: 2024 - 0,5%

Meta:
Atender 2% de mulheres cadastradas no CadÚnico, na área de influência, por ações de capacitação e inclusão produtiva até 2028.

1. 25. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Indicador 10: Taxa de atendimento de crianças e jovens cadastrados no CadÚnico por políticas municipais de inclusão social por meio do esporte, do lazer e da formação cidadã na área de influência.

Descrição:
Trata-se de indicador para monitorar as ações de inclusão social destinadas a crianças e jovens no âmbito do programa. A linha de base foi calculada pelo somatório de crianças e jovens já matriculados nos projetos desenvolvidos pelas Secretarias de Juventude e Esporte e Lazer na área de intervenção, que situam-se nos bairros Aureny I, Aureny II e Aureny III (825). O total de crianças e jovens na área de influência foi obtido pelo percentual de habitantes com até 29 anos, conforme CENSO 2022, multiplicado pela população total da área de influência (30.300). Como meta, estipulou-se dobrar o número de vagas oferecidas nos projetos.

Este indicador alinha-se ao eixo comunitário-organizacional, com objetivos específicos expostos na alínea F) do item I.3.1, que se relacionam, sobretudo, às áreas estratégicas 102, 103, 105, 106, 109, 112, 207 e 214 do PPA Federal 2024-2027. Tais objetivos e áreas estratégicas conectam-se à necessidade de reforçar políticas de segurança, proteção às crianças e jovens, atreladas a redução das desigualdades de raça e gênero, com ações direcionadas à capacitação, inclusão produtiva, economia criativa e redução da violência contra crianças e jovens.

Fórmula de cálculo: Total de crianças e jovens atendidos por ações de esporte, lazer e formação cidadã / total de crianças e jovens na área de influência

Dados a serem coletados: Quantidade de crianças e jovens atendidos por ações de esporte, lazer e formação cidadã na área de influência do programa.

Linha de base: 2023 - 2,72%

Meta:
Atender 5% das crianças e jovens da área de influência por ações de esporte, lazer e formação cidadã até 2028.

1. 25. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Indicador 11: Amostra da população da área de influência participante em reuniões comunitárias na área de influência.

Descrição:
Trata-se de monitorar a real capilaridade das ações de participação comunitária a serem desenvolvidas no âmbito do programa. A linha de base considera os cidadãos presentes nas reuniões comunitárias desenvolvidas até o momento (41), desconsiderando participações repetidas, e uma amostra significativa da população da área de influência (99% de nível de confiança e 3% de erro - 1.759 pessoas), considerando que boa parte da amostra deverá ser envolvida nas ações do PRMC e PTS.

Por referir-se de maneira abrangente as ações de participação e formação comunitária a serem desenvolvidas, o indicador alinha-se aos eixos ambientais, fundiário-habitacional e comunitário-organizacional, que demandarão participação ativa da população inserida na área de influência do programa, contribuindo para os objetivos específicos expostos na alínea G) do item I.3.1. Estes objetivos relacionam-se, sobretudo, à área estratégica 301 do PPA Federal 2024-2027, cujo foco é a ampliação da democracia participativa, da transparência e do controle social.

Fórmula de cálculo: Total de cidadãos participantes em reuniões comunitárias do programa / 1.759

Dados a serem coletados: Quantidade de cidadãos participantes nas reuniões comunitárias do programa.

Linha de base: 2024 - 2,40%

Meta:
Atingir 100% da amostra populacional com 99% de confiança e 3% de erro, até 2030.

1. 26. **Componentes**

1. 26. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: INTERVENÇÕES AMBIENTAIS E DE INFRAESTRUTURA PARA RESILIÊNCIA CLIMÁTICA, INCLUINDO PARQUE LINEAR E DEMAIS SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA
Valor estimado em Real (BRL): 333.080.000,00

Descrição:
Este componente destina-se à contratação de consultorias para elaboração de estudos, planos e projetos, bem como de empresas para execução de serviços e obras necessárias à implantação das intervenções previstas no programa, como a requalificação ambiental, o parque linear, a infraestrutura urbana com ampla utilização de soluções baseadas na natureza e os equipamentos públicos. Estas intervenções farão com que a área de intervenção torne-se mais resiliente e menos suscetível aos riscos climáticos por meio da proteção de seus ecossistemas, prevenção de desmatamentos, aumento da capacidade do sistema de drenagem, conservação de seus recursos hídricos e controle da poluição destinada a eles utilizando-se da estratégia de desenvolvimento urbano integrado proposta no programa e que deverá ser escalonada para o restante do território municipal.

Para maior detalhamento dos componentes, subcomponentes e produtos, consultar o ANEXO VII.

Descrição de subcomponentes e produtos:
S-INTERVENÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO MACHADO (CM)

Trata-se das intervenções necessárias à recuperação das condições ambientais do CM e seu entorno, garantindo toda a sua potencialidade na prestação de serviços ecossistêmicos.

P-Estudos ambientais para licenciamento ambiental das intervenções do programa

META FÍSICA: 519 hectares

Contratação de consultoria para elaboração de estudos ambientais exigidos para licenciamento ambiental das intervenções, propondo medidas mitigadoras às atividades que impactam o meio ambiente.

P-Diagnóstico ambiental-urbanístico da bacia hidrográfica do CM, incluindo elaboração e implantação do Plano de Gestão Sustentável (PGS) do PLU

META FÍSICA: 1860 hectares

Contratação de consultoria para revisão e complementação do diagnóstico ambiental e urbanístico da bacia do CM, bem como elaboração e implantação do PGS do PLU, com análise e descrição dos meios físico, biótico e socioeconômico na bacia do CM e elaboração da modelagem hidráulico-hidrológica da mesma, utilizando dados climáticos, hidrológicos, topográficos, pedológicos, geológicos e de uso e ocupação do solo.

P-Projeto e execução de dispositivos de drenagem sustentável de águas pluviais com a adoção de técnicas de Soluções baseadas na Natureza (SbN)

META FÍSICA: 41 ha

Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos e execução dos dispositivos de drenagem sustentável de águas pluviais com adoção de técnicas de SbN para a bacia do CM, considerando a caracterização ambiental/urbana, técnicas de infiltração, retenção de água e restauração de áreas verdes.

P-Recuperação, restauração ou revitalização de APPs de nascentes e curso hídrico e de áreas verdes do entorno do Parque Linear

META FÍSICA: 33,25 hectares

Contratação de serviços de recuperação, restauração e revitalização das APP de nascentes, olhos d'água e das áreas verdes do entorno do PLU, visando a conservação dos recursos hídricos, a melhoria da qualidade da água e a recuperação da biodiversidade local.

P-Desassoreamento e implantação de barreiras de retenção de sedimentos no leito do CM

META FÍSICA: 7,93 km

Contratação de empresa especializada para implantação e manutenção de barreiras de retenção de sedimentos no leito do CM e realização de serviços de desassoreamento, remoção de sedimentos do leito do CM e garantia da manutenção dessas atividades por período de cinco anos, dando destinação adequada aos sedimentos, promovendo a melhoria da qualidade da água e a adequada gestão dos sedimentos, que serão destinados ao aterro sanitário.

S-INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Implantação do Parque Linear Urbano do CM, com foco nos espaços de lazer, esporte e contemplação da natureza, bem como toda a infraestrutura urbana nos bairros adjacentes, garantindo o saneamento e maior resiliência aos eventos climáticos, sobretudo pela integração às SbNs, além da implantação dos equipamentos públicos para suprir diversas políticas públicas.

P-Elaboração de projetos de engenharia do parque linear, equipamentos públicos e infraestrutura urbana integrados aos projetos das SbNs

META FÍSICA: 35 unidades

Contratação de consultoria para elaboração de projetos básicos e executivos, incluindo orçamentos, cronogramas físico-financeiros e memoriais descritivos, para todas as intervenções previstas no programa, desde as que serão propostas no PGS, a infraestrutura e os equipamentos do Parque Linear do CM, a infraestrutura urbana nos bairros adjacentes integradas às SbNs, os equipamentos públicos das diferentes políticas públicas, bem como das soluções habitacionais a serem definidas pelo PRMC.

P - Execução de infraestrutura e equipamentos do Parque Linear do Córrego Machado

META FÍSICA: 250 hectares.

Contração de empresa especializada em obras de engenharia para implantação do Parque Linear Urbano do CM, contemplando via paisagística, calçadas, ciclovias, travessias sobre o córrego, iluminação, alambrados, mobiliário urbano e núcleos de esporte, lazer e contemplação.

P - Execução de infraestrutura urbana nos bairros adjacentes ao córrego integrada às SbNs

META FÍSICA: 217 hectares

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para implantação de infraestrutura urbana com pavimentação, calçadas, ciclovias e drenagem integrada às SbNs.

P - Execução de equipamentos públicos na área de influência do programa

META FÍSICA: 30 unidades

Contratação de empresas de construção civil para a implantação dos equipamentos públicos cujas políticas públicas apresentem atendimento deficitário, inexistente ou pouco acessível conforme identificado no diagnóstico, com implantação urbanística integrada ao PLU, contemplando práticas de edificações sustentáveis alinhadas a redução do consumo de energia, geração de energia fotovoltaica, reaproveitamento de água, separação de resíduos, ampla arborização e permeabilidade do solo.

1. 26. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Valor estimado em Real (BRL): 207.400.000,00

Descrição:
Este componente contém os produtos relativos à garantia das soluções habitacionais compatíveis com a recuperação dos serviços ecossistêmicos do Córrego Machado e com a eliminação dos riscos à segurança das famílias; o rol de ações para educação, capacitação e inclusão produtiva para a população da área de influência; e a implantação dos sistemas e arcabouços operacionais necessários à continuidade dos benefícios a serem atingidos pelo programa, o que inclui seu monitoramento e a replicabilidade de projetos de desenvolvimento urbano integrado no território municipal. Contemplará todo o suporte técnico necessário à conclusão dos procedimentos de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, além da prestação de serviços em Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) para auxiliar as famílias da área de intervenção a promoverem melhorias em suas habitações. Além disso, a provisão de habitações seguirá os parâmetros de certificação EDGE, a fim de reforçar a estratégia de mitigação e adaptação do programa.

Descrição de subcomponentes e produtos:
S-SOLUÇÃO HABITACIONAL E FUNDIÁRIA

Elaboração do PRCM, com a provisão das soluções habitacionais adaptadas ao clima para o reassentamento das famílias localizadas onde não seja possível a eliminação dos fatores de risco e onde seja necessário a recuperação de APPs.

P-Provisão de soluções habitacionais com parâmetros de certificação ecoeficientes - EDGE

META FÍSICA: 743 unidades

Provisão habitacional das edificações para as 743 famílias a serem reassentadas, seguindo parâmetros de certificação EDGE.

P-Execução de desapropriações e medidas compensatórias para famílias reassentadas

META FÍSICA: 175 famílias reassentadas

Execução de todas as desapropriações e medidas compensatórias a serem detalhadas no PRMC. O diagnóstico aponta a necessidade de desapropriação de 175 imóveis, bem como 743 reassentamentos.

P-Regularização fundiária de interesse social (REURB-S) e assistência técnica em habitação de interesse social (ATHIS)

META FÍSICA: 3.720 unidades

Consultorias para apoio à conclusão dos processos de regularização fundiária, gerando aproximadamente 3.120 lotes regularizados, e oferta de ATHIS para mais 600 unidades, possibilitando, sobretudo, sua adaptação climática e sanitária.

S-DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Contratação de serviços para capacitação, educação e suporte produtivo visando a redução das desigualdades socioeconômicas; promoção da autonomia e empoderamento das mulheres; suporte e fortalecimento da rede comunitária de proteção à criança e ao adolescente; capilarização dos direitos e deveres referentes à política urbana e ambiental.

P-Programa de capacitação profissional com foco na superação das desigualdades e fragilidades de raça e gênero

META FÍSICA: 1200 pessoas capacitadas

Contratação de serviços de capacitação profissional e oferta de microcrédito especial e facilitado para os participantes. Prioridade para atendimento das mulheres, comunidade LGBTQIA+, negros e jovens.

P-Programa de hortas urbanas e assistência técnica para produção local de alimentos

META FÍSICA: 5 hortas implantadas

Implantação de novas hortas urbanas comunitárias e consultoria para assistência técnica, visando a geração de renda, revitalização dos espaços urbanos e recuperação de áreas degradadas, além de promover colaboração e coesão social, criando e fortalecendo laços entre a comunidade.

P-Programa de educação urbana, ambiental e de mudanças climáticas, incluindo suporte às ações do laboratório de articulação comunitária, com especial atenção a mulheres, crianças e jovens

META FÍSICA: 60 meses

Contratação de consultorias e aquisição de materiais para realizar ações, cursos e oficinas de educação urbanística e ambiental-climática como parte do fomento à formação cidadã local, pertinente ao laboratório de articulação urbana em implantação na área de intervenção.

P-Elaboração do Plano de Trabalho Social e execução das ações previstas

META FÍSICA: 1 plano de trabalho social elaborado

Contratação de consultoria para a elaboração e execução do Plano de Trabalho Social visando promover a participação social, melhoria das condições de vida, efetivação dos direitos sociais dos beneficiários da intervenção e sustentabilidade da mesma.

S-DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZAÇÃO

Produtos que permitirão monitoramento e continuidade dos benefícios a serem atingidos ao longo da execução do programa, dotando a municipalidade de arcabouço operacional e institucional que condense essa experiência para futura replicabilidade no território da cidade.

P-Elaboração de novo Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa, da Análise de Risco e Vulnerabilidade Climática e do Plano de Mitigação, Adaptação e Resiliência às Mudanças Climáticas

META FISICA: 3 unidades

Contratação de consultoria para elaboração dos três estudos mencioados.

P-Revisão, com a lente climática, de planos e do arcabouço jurídico e normativo afetos à política urbana e ambiental

META FÍSICA: 8 unidades

Contratação de consultoria para elaboração e revisão dos seguintes planos: Plano de Ação Palmas Sustentável; Política Municipal de Meio Ambiente; Plano de Arborização Urbana; Política Municipal de Mudanças Climáticas; Plano Local de Habitação de Interesse Social; Plano de Regularização Fundiária Sustentável; Plano Diretor Participativo; e Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos.

P-Implantação do Sistema de Monitoramento Socioambiental Municipal

META FÍSICA: 48 meses

Contratação de consultoria para concepção e implantação do Sistema de Monitoramento Socioambiental, incluindo equipamentos para monitoramento ambiental de aspectos relevantes para toda a área municipal.

P-Programa de capacitação técnica de servidores em mitigação e adaptação às mudanças climáticas

META FÍSICA: 750 servidores capacitados

Contratação de consultoria para a prestação de cursos de qualificação do corpo técnico do município, compreendendo os aspectos relativos às mudanças climáticas e meios de mitigação e adaptação a empregar, ofertado aos profissionais dos diversos órgãos da estrutura administrativa.

1. 26. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Real (BRL): 18.700.000,00

Descrição:
Este componente integra ações destinadas ao gerenciamento e administração do Programa, com ênfase na supervisão técnica, ambiental e social, apoio à UGP e auditorias externas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P-Supervisão técnica, ambiental e social

META FÍSICA: 60 meses

Devido à complexidade na execução de obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de empresa especializada no apoio à supervisão das obras a serem implantadas.

Os serviços de supervisão das obras apoiarão a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos na fiscalização das obras contratadas com empresas privadas. Também compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e sociais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa, bem como da execução das ações previstas no PRMC e PTS.

P- Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

META FÍSICA: 60 meses de apoio

Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao BID. A UGP está vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, com apoio de equipe técnica multidisciplinar das diversas Secretarias Municipais. Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa.

Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras e serviço, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de Palmas e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P- Auditoria Externa

META FÍSICA: 4 anos

O produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, sistemas de controle e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e órgãos de fiscalização.

Além desta auditoria, o Município fica sujeito às auditorias da Controladoria Municipal e do TCE/TO, para a total transparência das ações implantadas.

1. 27. **Beneficiários**

Pela abrangência do Programa, é possível afirmar que **toda a população de Palmas**, ou seja, os seus aproximadamente **302 mil habitantes** - Censo IBGE 2022 - serão beneficiados. Entre as principais iniciativas com esta abrangência, destacam-se a revisão e elaboração dos planos municipais sob a ótica climática, a implantação do sistema de monitoramento socioambiental municipal e a implementação de um sistema de informações unificado para atendimento às mulheres vítimas de violência.

A **Região Sul de Palmas**, onde está inserida a área de influência do Programa, abriga aproximadamente **116 mil habitantes** e apresenta um déficit significativo de infraestrutura e serviços públicos. A falta de espaços verdes qualificados para lazer e contemplação, escolas, unidades de saúde, centros culturais e centros de apoio social impacta diretamente a qualidade de vida da população e reforça as desigualdades socioeconômicas da cidade. Para enfrentar esses desafios, o Programa prevê a ampliação das áreas verdes e aplicação de soluções baseadas na natureza para controle de enchentes e mitigação do calor, a construção de novos equipamentos públicos, a melhoria da mobilidade urbana por meio de novas conexões entre os bairros, ciclovias, calçadas acessíveis e qualificação da infraestrutura de transporte público.

Por outro lado, os benefícios do programa poderão ser observados mais diretamente em sua **área de influência**, sendo formada pelos bairros inseridos da bacia hidrográfica do Córrego Machado e que são adjacentes a este corpo

hídrico, totalizando cerca de **61 mil habitantes**. Esta população enfrenta desafios estruturais significativos, como ocupações em áreas de risco, degradação ambiental e acesso limitado a equipamentos públicos.

Neste sentido, será realizado o reassentamento de cerca de 743 famílias que vivem em áreas sujeitas a alagamentos, erosão e deslizamentos, garantindo moradias dignas, seguras e adaptadas ao clima. Paralelamente, a regularização fundiária de mais de 5 mil imóveis promoverá segurança jurídica e melhores condições habitacionais para milhares de famílias. A recuperação e qualificação ambiental contribuirá para a melhoria das condições de saúde, no aumento da disponibilidade hídrica e redução do efeito de ilhas de calor na cidade, considerando que a degradação ambiental na área do Córrego Machado impacta não somente a qualidade de vida dos moradores da região, mas a cidade como um todo.

Destaca-se o recorte específico dos produtos voltados à superação das desigualdades socioeconômicas, como as soluções habitacionais, assistências técnicas, capacitações profissionais para inclusão produtiva e implantação de equipamentos, tendo em vista que a população residente no local é **predominantemente negra e com renda média baixa (até 3 salários mínimos)**. As ações de capacitação e inclusão produtiva, aliadas a capilaridade e aumento do número de vagas no sistema educacional propiciado pelas novas unidades a serem construídas, serão essenciais para a elevação dos níveis renda, escolaridade e preparação da população às novas demandas de mercado de trabalho, visto que na área de influência, apenas **3%** da população possuem **nível superior** e **13% são analfabetos**.

O Programa avança no suporte e proteção a grupos vulneráveis, com destaque para mulheres vítimas de violência, crianças e jovens. Existem **24 mil mulheres** cadastradas no CadÚnico, na área de influência, e estas terão aumento de acesso a políticas específicas de proteção, suporte psicológico e incentivo à autonomia econômica, com destaque para a futura Casa da Mulher Empreendedora e ao sistema de informações unificado para atendimento às mulheres vítimas de violência. Mais de **30 mil crianças e adolescentes** terão acesso facilitado aos equipamentos públicos de esporte, lazer, cultura, educação e saúde e parte deste público será beneficiado por ações de proteção e formação cidadã. A necessidade dessas iniciativas se justifica não só pelo tamanho do público mas, também, altos índices de violência na Região Sul da cidade, com destaque para a violência sexual contra mulheres, crianças e jovens, representando **31,5%** dos casos notificados.

Pelo exposto, o Programa descrito estrutura-se para garantir a superação das carências socioeconômicas e territoriais de sua área de influência por meio de uma abordagem de desenvolvimento urbano integrado, com foco na redução das desigualdades socioespaciais, na resiliência climática e na promoção da qualidade de vida da população mais vulnerável de Palmas ao integrar ações ambientais, sociais e urbanísticas, ao mesmo tempo em que promove melhorias estruturais para toda a cidade.

1. 28. **Anexos**

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte H

ANEXO VI Q - Masterplan Parque Linear do Córrego Machado

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte I

ANEXO VI F - Projeto Centro Municipal de Educação Infantil

ANEXO VI G - Unidade Básica de Saúde

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte L

ANEXO VI H - Casa da Juventude

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte M

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte E

ANEXO IV - Diagnóstico Socioeconômico

ANEXO VI J - Projeto da Instituição de Longa Permanência para Idosos

ANEXO V - Mapa de equipamentos públicos e efeito barreira

ANEXO VI K - Casa de Passagem

ANEXO VI A - Intervenções propostas

ANEXO VI L - Centro para Pessoas em Situação de Rua

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte A

ANEXO VI M - Posto Avançado da Guarda Metropolitana

ANEXO VI C - Mapa de Infraestrutura Sustentável

ANEXO VI N - Complexo Esportivo

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte B

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte C

ANEXO VI O - Núcleos de Esporte e Lazer

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte D

ANEXO VI D - Espaço Mais Cultura

ANEXO VI P - Hospital Veterinário

ANEXO VI R - Centro de Convivência da Pessoa Idosa

Anexo VI E - Projeto da Escola de Tempo Integral

ANEXO VI S - Casa da Mulher Empreendedora

ANEXO VII A - Componentes, subcomponentes e produtos

ANEXO VII B - Orçamento dos componentes, subcomponentes e produtos

ANEXO VI B - Mapa de Acesso a Equipamentos Propostos

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte J

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte K

ANEXO VI I - Centro de Referência em Assistência Social

ANEXO IA - Mapa de localização e recursos ambientais.

ANEXO IB - Mapa do SISMIV

ANEXO IC - Mapa da Área de Influência

ANEXO III - Assentamentos Irregulares

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte F

ANEXO II - Diagnóstico Ambiental - Parte G

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O programa é destinado integralmente ao atendimento das prioridades: I - combate à fome e redução das desigualdades; VI - combate ao desmatamento; e VII - enfrentamento à emergência climática, conforme art. 15, §3º da Resolução Normativa Nº 1/2024. O alinhamento aos Objetivos Estratégicos previstos no PPA 2024–2027 e seu nível de adequação e impacto (NAI) segundo critérios estabelecidos pela COFIEX é exposto a seguir e no ANEXO IX.

107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres

Proteção e a autonomia das mulheres por meio da Casa da Mulher Empreendedora, capacitação profissional e inclusão produtiva para mulheres do CadÚnico e sistema unificado de atendimento às vítimas de violência. A meta é atender 500 mulheres até 2028, quadruplicando o atual e reduzindo a vulnerabilidade social e econômica.

Nível de adequação e de impacto (NAI): Nível B

Justificativa:

- Alinhamento aos objetivos específicos **E, F e G.**
- Indicador 9 com linha de base e meta definida (2% das mulheres do CadÚnico até 2028).
- Recursos expressivos para inclusão produtiva e proteção social.
- Componentes integrados no desenvolvimento comunitário e institucional.
- Soluções replicáveis, com alto impacto em territórios vulneráveis.

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados

Abordagem integrada de urbanização sustentável na Região Sul de Palmas, incluindo infraestrutura com SbNs, regularização fundiária, reassentamento de famílias em áreas de risco e equipamentos públicos. A meta é transformar a área de intervenção, reduzindo desigualdades e promovendo qualidade de vida em uma das regiões mais carentes da cidade.

NAI: Nível A

Justificativa:

- Alinhamento ao objetivo geral e específicos **A, B, C e E**.
- Indicadores 2 a 5 e 8, com metas mensuráveis e prazos definidos.
- Investimentos significativos em infraestrutura, habitação e mobilidade sustentável.
- Componentes estruturantes voltados à resiliência urbana e inclusão social.
- Soluções replicáveis em outras áreas urbanas com vulnerabilidades semelhantes.

201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Restauração do Bioma Cerrado e uso sustentável do território com Parque Linear do Córrego Machado e SbNs, recuperação de APPs e revitalização de áreas degradadas. Tais ações promovem a conservação hídrica, sequestro de carbono e controle de enchentes, beneficiando toda a cidade.

NAI: Nível A

Justificativa:

- Alinhamento ao objetivo geral e específicos **A, B, C, D e E**.
- Indicadores 1 a 6 e 8, com metas viáveis e mensuráveis.
- Recursos expressivos em recuperação ambiental e mitigação climática.
- Componentes estruturantes que garantem impactos duradouros.
- Estratégia ambiental integrada com forte potencial de replicação.

202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Atuação direta na prevenção de riscos e adaptação climática ao reassentar famílias em áreas de risco, recuperar APPs e implantar SbNs integradas ao Parque Linear. Reduz a vulnerabilidade a alagamentos, erosões e deslizamentos, melhora a capacidade de resposta a desastres e fortalece a segurança ambiental urbana.

NAI: Nível A

Justificativa:

- Alinhamento ao objetivo geral e específicos **A, B, C e D**.
- Indicadores 1 a 7, com metas específicas e mensuráveis.
- Recursos expressivos à eliminação de riscos e adaptação climática.
- Componentes integrados de habitação, drenagem, meio ambiente e reassentamento.
- Estratégia robusta, eficiente e replicável em áreas urbanas com risco ambiental.

207 – Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

Inserção produtiva da população vulnerável com capacitações, apoio ao empreendedorismo e economia solidária. Implantação da Casa da Juventude e da Casa da Mulher Empreendedora, além da criação de hortas urbanas, promovendo segurança alimentar e inclusão socioeconômica.

NAI: Nível A

Justificativa:

- Alinhamento com objetivo **F**.

- Indicadores 9 e 10 com metas claras e aplicáveis até 2028.
- Recursos direcionados à capacitação profissional e suporte produtivo.
- Componentes que combinam formação, infraestrutura e fortalecimento comunitário.
- Soluções alinhadas à realidade local, com alta replicabilidade e impacto social.

214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Equilíbrio do desenvolvimento urbano em Palmas ao levar infraestrutura, serviços e oportunidades à Região Sul, historicamente preterida. A área de intervenção concentra populações de baixa renda e alta vulnerabilidade, que passarão a ter acesso a moradias seguras, equipamentos públicos e infraestrutura sustentável.

NAI: Nível B

Justificativa:

- Alinhamento com os objetivos **A, B, C, E e F**.
- Indicadores 2, 5, 8, 9 e 10, com metas claras para infraestrutura, reassentamento e capacitação.
- Recursos significativos destinados à urbanização de territórios vulneráveis.
- Componentes estruturantes que reduzem disparidades regionais.
- Estratégia com alto impacto social e forte potencial de replicabilidade.

2. 32. **Anexos**

ANEXO IX - Áreas estratégicas do PPA Federal

ANEXO IX A - Matriz de Compatibilidade das Áreas Estratégicas

ANEXO IX B - Áreas Estratégicas Complementares

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP)** da Prefeitura Municipal de Palmas/TO será o Órgão Executor do Programa, à qual estará vinculada a UGP. A SEIOP será responsável pelo planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa. Sob coordenação do Secretário da SEIOP, será demandada a participação das demais secretarias envolvidas, de acordo com suas competências. Para isso, será definida, em conjunto com os Secretários de cada área, a designação dos servidores que atuarão no Programa, compondo um grupo técnico específico.

A SEIOP, por intermédio da UGP, atuará como intermediário entre a Prefeitura Municipal de Palmas, o Banco financiador, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas envolvidas no Projeto.

Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

A UGP (Organograma do Arranjo Institucional - Figura 12 e ANEXO X) tem como objetivo garantir que as ações do Programa estejam alinhadas ao contrato de empréstimo, abrangendo o planejamento, programação e acompanhamento da execução física e financeira, além da avaliação dos resultados intermediários e finais. A UGP contará com apoio operacional externo, conforme previsto na matriz de componentes.

Figura 12 - Organograma da UPG proposta

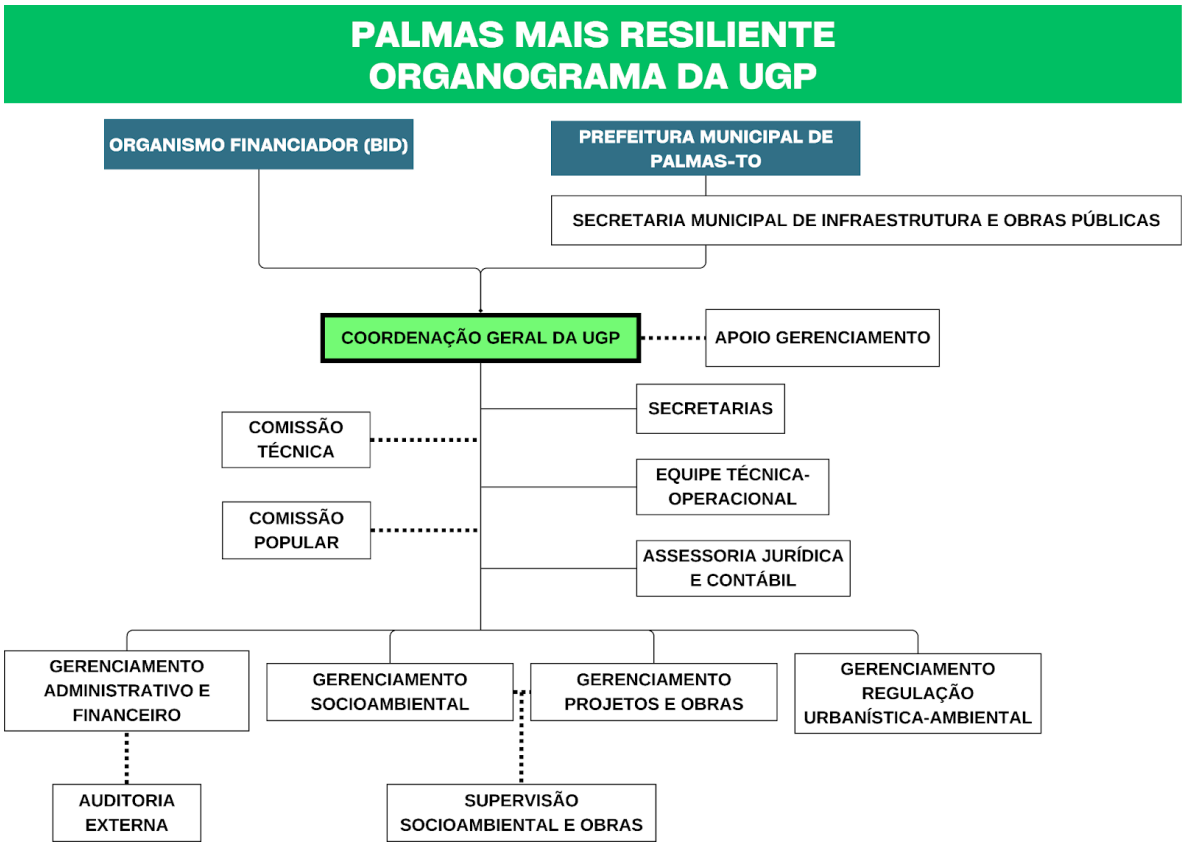

O Programa também receberá apoio das Secretarias Municipais, conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (ANEXO XI). São órgãos que possuem papéis específicos na execução do Programa, fornecendo suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações.

Além da SEIOP, as atribuições e competências dos principais órgãos municipais envolvidos serão:

a) Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SEMPU): desenvolvimento geral do programa, alinhando-o aos objetivos do planejamento urbano e compatibilizando as intervenções das diversas políticas públicas na área do programa, bem como com os demais projetos estruturantes da cidade;

b) Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA): licenciamento ambiental, execução da política de meio ambiente e apoio ao IMPUP na concepção do programa. Coordena o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA;

c) Secretaria Municipal da Habitação (SEHAB): coordenação e gestão dos projetos habitacionais do programa;

d) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária (SEDURF): licenciamento de edificações, coordenadora do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), política de regularização fundiária e acompanhamento social das famílias;

e) Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN): registros financeiros, pagamentos a fornecedores contratados e quitação dos encargos e parcelas do financiamento;

f) Procuradoria Geral do Município (PGM): respaldo jurídico a todos os atos praticados durante a execução do contrato de financiamento externo;

g) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Licitações (SEPLAN): operacionalização das licitações, gestão orçamentária municipal e alocação dos recursos humanos próprios necessários ao programa;

h) Secretaria Municipal da Mulher: suporte na concepção e gestão das ações destinadas ao fortalecimento da rede de proteção social das mulheres;

i) Secretaria Municipal da Juventude: suporte na concepção e gestão das ações destinadas ao fortalecimento da rede de proteção às crianças e jovens;

j) Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana: será a responsável pela manutenção das obras de infraestrutura, incluindo o Parque Linear do CM;

k) Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Defesa Civil: será responsável pela política de mobilidade urbana e do apoio na identificação de pontos de risco às famílias que habitam a área de intervenção, subsidiando as ações de reassentamento;

l) BRK Ambiental-Saneatins: empresa responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Palmas.

Além das instituições municipais citadas, as Secretarias de Saúde, Educação, Cultura e Esporte e Lazer também atuarão de maneira específica na implantação e gestão de seus equipamentos.

Ainda, pretende-se criar uma Comissão Técnica, com servidores indicados por tais órgãos, bem como ligados a universidades, concessionárias de serviços públicos, entre outros, para facilitar o compartilhamento de informações, suporte, tomada de decisão e coordenação de ações no território. Também será criada uma Comissão Popular com representantes das associações de moradores e da comunidade local, constituindo-se em canal de rápida distribuição de informação e coleta de demandas, acompanhamento perene da execução do programa pelos beneficiários, garantindo que suas necessidades sejam atendidas.

Quanto às políticas socioambientais do agente financiador, o Programa seguirá o Marco de Políticas Ambientais e Sociais (MPAS) do BID, que estabelece padrões internacionais para proteger as pessoas e o meio ambiente. O MPAS abrange áreas como gênero e diversidade, engajamento das partes interessadas e proteções robustas para trabalhadores e comunidades.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O Município já possui uma UGP estruturada e operacional para gerenciar o **Programa Palmas para o Futuro** (**Contrato de Empréstimo em execução com a CAF**). A experiência acumulada nos últimos anos com a gestão do referido programa será absorvida e é o ponto de partida para a organização interna da municipalidade no que se refere a preparação desta carta consulta, bem como para os futuros procedimentos pré e pós contratuais.

O Programa Palmas para o Futuro totaliza investimentos na ordem de **120 milhões de dólares**, com metade deste valor advindo do contrato de financiamento e a outra em contrapartidas realizadas pelo município. A operação foi autorizada por meio da **Lei Complementar nº 365/2017**, bem como foi criada uma comissão técnica (**Decreto nº 1.336/2017**) para conduzir os procedimentos necessários à assinatura do contrato, que seria realizada em **28 de**

dezembro de 2018.

O referido programa possui similaridades significativas com o proposto neste pleito, tendo em vista o direcionamento de recursos para **investimento em infraestrutura em bairros periféricos** (bairros Taquari, Santa Fé, Morada do Sol, todos na Região Sul de Palmas), sendo submetidos aos ritos gerais de **regularização fundiária**, **licenciamento ambiental** e **licitação para obras**.

Será instituída uma nova UGP, específica para este programa junto ao BID, que contará com uma equipe técnica capacitada e experiente, composta, inicialmente, por 2 arquitetos, 2 engenheiros ambientais, 2 engenheiros civis, 1 engenheiro de segurança do trabalho, 1 contador, 1 assessor jurídico, 1 assistente social, entre outros.

Este corpo técnico é constituído por profissionais de alta qualificação que, para além da sua graduação, apresentam especializações e mestrados nas áreas de ciências do ambiente, desenvolvimento regional, engenharia ambiental, engenharia de transportes, políticas públicas, geoprocessamento e cidades inteligentes. Conta-se com o suporte do pacote de softwares do tipo proprietário Autodesk (incluindo InfraWorks, Civil 3D, Revit, Autocad e demais), bem como domínio no uso de ferramentas de análise geoespacial - QGIS, e de modelagem hidrológica e hidráulica - SWMM.

Os equipamentos de informática disponibilizados atualmente para o corpo técnico da municipalidade são considerados de alta performance, possibilitando a utilização dos softwares mencionados acima de maneira adequada. Também há disponibilidade de infraestrutura e recursos para acompanhamento da execução dos produtos que compõem o programa, tanto no que se refere aos espaços físicos para estruturação da UGP, quanto automóveis, drones, GPSs e outros instrumentos necessários à realização de medições e acompanhamento das intervenções.

REPASSES DE RECURSOS

Não pretende-se realizar repasse de recursos entre os órgãos participantes, de maneira que a colaboração dos mesmos se dará em apoio à UGP ou na participação da Comissão Técnica a ser constituída, com os recursos sendo executados diretamente pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

ANEXO XI - Matriz RACI de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Para garantir a continuidade das ações propostas no programa pretende-se, desde o início, estruturar uma Comissão Técnica e uma Comissão Popular que, além do suporte e acompanhamento durante a fase de implantação, irão possibilitar a capilaridade das informações, dos objetivos e das metas de longo prazo pelas instituições municipais e sociedade civil. Estas comissões deverão ter continuidade mesmo após o término da execução do programa, reestruturando-se para sua nova função.

Além disso, prevê-se a implantação de um Sistema de Monitoramento Socioambiental, com a criação de um portal de acompanhamento público, fundamentado em indicadores transparentes e com resultados constantemente atualizados. O sistema contará com toda a instrumentalização necessária, como estações meteorológicas, medidores de vazão, rotinas de análise da qualidade da água, bem como sua normatização.

A nova estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Palmas também conta com órgão específico para manutenção dos espaços públicos, a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, que acompanhará, desde o início, a implantação do programa, de maneira a apropriar as novas frentes de manutenção necessárias.

No que se refere aos custos estimados para operacionalização e manutenção futura da infraestrutura e equipamentos instalados, bem como continuidade das ações comunitárias, as estimativas apontam para: Parque Linear Urbano do Córrego Machado (R$ 1.500.000,00/ano), sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana em parceria com a Fundação Municipal de Meio Ambiente, com recursos do orçamento municipal e do Fundo Municipal de Meio Ambiente; equipamentos públicos (R$ 3.600.000,00/ano), sob responsabilidade das secretarias específicas da política pública atendida e seus respectivos orçamentos; infraestrutura urbana dos bairros (R$ 1.200.000,00/ano), sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, com recursos do orçamento municipal; ações de desenvolvimento comunitário, incluindo hortas urbanas (R$ 1.200.000,00/ano), sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Serviços do Interior e Secretaria de Ação Social, subsidiada pelos demais órgãos que possuem atividades de formação cidadã, com recursos do orçamento municipal; e o próprio Sistema de Monitoramento Socioambiental (R$ 90.000,00/ano), sob responsabilidade da Fundação Municipal de Meio Ambiente, com recursos do fundo municipal de Meio Ambiente.

O escopo do programa também prevê, dentro dos estudos e revisões legislativas a serem desenvolvidas, a possibilidade de regulamentação do instrumento urbanístico da contribuição de melhoria e do IPTU Progressivo no

Tempo, que poderiam, de um lado, recuperar parte dos investimentos realizado e, do outro, garantir que novos empreendimentos se desenvolvam na área de influência do programa, desonerando o orçamento municipal de gastos com expansão e manutenção de infraestrutura em outras localidades, redirecionados a área em comento.

De outra maneira, também caberá a realização de estudos de viabilidade econômico-financeira para a concessão de áreas estratégicas na área de influência do programa para desenvolvimento de empreendimentos privados, cujos valores poderão compor o Fundo de Desenvolvimento Urbano, de Meio Ambiente ou fundo específico a ser criado para a futura manutenção do programa. Algumas áreas apresentam-se potencialmente atrativas para o desenvolvimento de empreendimentos turísticos ligados ao parque e sua conexão com a nova orla do bairro Bertavile, bem como um novo centro de convenções na cidade. De qualquer maneira, o município já tem a aplicação do instrumento urbanístico da Outorga Onerosa do Direito de Construir bastante consolidada, alimentando o Fundo de Desenvolvimento Urbano que possui o escopo das ações financiáveis totalmente alinhado ao objeto deste programa e com fluxo de recursos constantes, cabendo a previsão, no âmbito das revisões regulamentares previstas, possível fixação de cota-parte específica para tais fins.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O presente Projeto Palmas mais Resiliente se alinha de maneira estratégica ao Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 do município, contribuindo diretamente para diversas metas prioritárias voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável. Entre essas metas previstas no PPA, destacam-se: o aumento da cobertura vegetal; a elaboração do Plano de Ação de Mudanças Climáticas; a promoção da recuperação, restauração, conservação e proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs); o fortalecimento da rede de apoio às mulheres; o atendimento das famílias com programas habitacionais; a implementação das políticas de acessibilidade e mobilidade urbana; e a construção, revitalização e ampliação de equipamentos públicos.

Nesse contexto, o aumento da cobertura vegetal e o Plano de Ação de Mudanças Climáticas revelam-se como estratégia fundamental para fortalecer a resiliência climática, estando diretamente alinhadas às entregas e ao objetivo do presente programa, visando não apenas a conservação e a ampliação dos espaços naturais, mas também a melhoria da qualidade de vida da população de Palmas, principalmente da Região Sul.

Paralelamente, a regularização fundiária e o atendimento habitacional previstos tanto no PPA quanto neste Programa são pilares essenciais para o desenvolvimento urbano sustentável na área de influência. A partir da regularização fundiária será possível viabilizar as áreas necessárias aos reassentamentos para eliminação da situação de vulnerabilidade e risco habitacional e a implantação da infraestrutura e equipamentos públicos essenciais.

Outro eixo fundamental do PPA, diretamente vinculado a este programa, é o fortalecimento da rede de apoio às mulheres, garantindo proteção, autonomia e ampliação de serviços especializados, como a proposta de implantação da Casa da Mulher Empreendedora. A implementação de políticas de acessibilidade e mobilidade urbana também estão contempladas, tendo em vista a inclusão de calçadas acessíveis, ciclovias e paradas de transporte público coletivo qualificadas.

Ademais, a construção e revitalização de equipamentos públicos serão viabilizadas por meio desse programa, garantindo a instalação de espaços adequados para educação, saúde, cultura e lazer. A implantação de praças, centros comunitários e outros equipamentos fortalecerá os serviços públicos e impulsionará o desenvolvimento social e econômico da região.

Adicionalmente à vinculação ao PPA, este Projeto também alinha-se ao Plano Diretor Participativo Municipal de Palmas-TO (2018), conjuntamente à Política Municipal de Meio Ambiente (2001) e às diretrizes de mitigação e adaptação aos impactos das mudanças climáticas, assim como ao Plano de Ação Palmas Sustentável (2015).

Primeiramente, esta convergência se justifica porque o Plano Diretor de Palmas prioriza a função social e ambiental da cidade, a inclusão, a sustentabilidade e a gestão eficiente dos recursos hídricos. Para assegurar esse alinhamento, o programa prevê a instalação de equipamentos urbanos e comunitários, a ampliação de espaços verdes e a valorização de áreas de lazer próximas às moradias, especialmente em regiões carentes. Baseado em políticas ambientais, o projeto foca na recuperação ecológica do Córrego Machado e nos serviços ecossistêmicos. A criação do Parque, definida no Plano Diretor, reforça esse compromisso ao classificar a área como Área Verde Urbana (AVU) e garantir a proteção dos remanescentes vegetais por meio de sua designação como Áreas Ambientalmente Protegidas (AAPs). A classificação da região como ZEIS Tipo 3 também possibilita a regularização fundiária, aliando desenvolvimento urbano à conservação da biodiversidade.

A intervenção está claramente relacionada à Política Municipal de Meio Ambiente e às diretrizes climáticas, focando na preservação de áreas sensíveis, recuperação de APPs e nascentes do Córrego Machado. Somado a isso, o programa coaduna-se com as diretrizes estratégicas dispostas no Plano de Ação Palmas Sustentável (2015)l. Destacam-se a Diretriz 4 - Preservação e recuperação ambiental, a Ação 32 - Recuperação ambiental e implantação dos parques urbanos, a Ação 33 - Diagnóstico Fundiário do Córrego do Machado e a Ação 35 - Plano de Arborização Urbana.

Todas essas diretrizes e ações não apenas integram os objetivos fundamentais do presente Programa, mas também dialogam diretamente com as soluções inovadoras e sustentáveis propostas, abrangendo temas transversais como planejamento urbano sustentável, qualidade de vida, justiça social e resiliência climática.

Por fim, ainda foram considerados como orientações estratégicas no desenvolvimento deste programa:

- Diagnóstico da área de influência do PAC Saneamento (2017 a 2021);
- Programa de Regularização Fundiária Sustentável de Palmas (2017);
- Diagnóstico de acessibilidade e mobilidade com enfoque de classe, raça e gênero - Acesso Cidades (2023); e
- Plano de Mobilidade Urbana de Palmas (2024).

3. 8. **Anexos**

ANEXO VIII - Destaques vínculos PPA e Palmas Mais Resiliente

ANEXO X - Organograma da UGP

ANEXO XI - Matriz RACI

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: REGULATÓRIO
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Os principais riscos regulatórios a que o programa está exposto estão relacionados à Lei de Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa e à Lei Autorizativa para contratação de financiamento externo. Ambas devem ser aprovadas pela Câmara Municipal de Palmas. As possíveis causas para esta negativa estão ligadas a desentendimentos políticos, tendo em vista que o Programa está plenamente alinhado aos planos estratégicos municipais, inclusive seu Plano Diretor, e a municipalidade possui condições financeiras favoráveis para o financiamento. Caso as leis citadas não sejam aprovadas, o programa é impedido de captar o financiamento externo, devendo buscar novas fontes de financiamento.

Para além disso, em menor escala, corre-se o risco de que o próximo Plano Municipal de Água e Esgoto (PMAE) de Palmas não indique, dentre os prioritários, os bairros situados no Programa. Isto comprometeria a expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto na área de influência do programa, o que impediria o pleno atingimento de alguns de seus objetivos específicos.

Prevenção e Mitigação:
Para prevenir ou mitigar este risco, tem-se realizado constante sensibilização com a população da área de influência, por meio de diversas ações participativas para cocriação do programa (**ANEXO XII**), que proporcionam maior apoio popular às diversas ações de interface político-institucional. Estas ações também têm sido levadas aos vereadores, que tem participado dos espaços de discussão sobre o programa desde 2024, não havendo, até o momento, nenhuma manifestação contrária ao programa ou a opção de financiá-lo com recursos externos.

O programa também já foi apresentado e discutido no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que contam com diversas instituições da sociedade civil organizada. O fato de as ações do programa estarem assentadas em documentos legais já avaliados pela Câmara, caso do PPA 2022-2025 e do Plano Diretor Participativo, auxilia nas negociações para aprovação.

Deve-se considerar que as ações do presente programa serão realizadas em áreas públicas de propriedade do Município de Palmas ou em processos de regularização fundiária liderados pela municipalidade, sem qualquer necessidade de pactuação por meio de convênios, contratos, decretos ou acordos com o Governo do Estado ou Governo Federal.

Quanto ao próximo Plano Municipal de Água e Esgoto (PMAE) de Palmas, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SEMPU) já se manifestou junto à Agência de Regulação de Palmas, listando a prioridade destas áreas, sobretudo no que se refere a rede de coleta e tratamento de esgoto, contribuindo para as metas de qualidade da água no Córrego Machado. A SEMPU também participará das futuras comissões que irão realizar o processo de revisão do plano e reforçará as diretrizes de priorização destas áreas já contidas no Plano Diretor Participativo.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: CONTRATAÇÕES
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
A execução do Programa será realizada por uma Unidade de Gerenciamento (UGP), que fará parte da estrutura da SEIOP, composta por profissionais qualificados, incluindo aqueles voltados à área de planejamento e preparação de licitações e contratos, que utilizarão as modalidades de licitação exigidas pela Lei nº 14.133/2021.

Deve ser ressaltado que a Prefeitura de Palmas já tem, em seu quadro, pessoal com experiência em gerenciamento de programas semelhantes, como o Palmas para o Futuro, atualmente em execução. Este quadro será devidamente mobilizado à medida em que o processo de contratação do financiamento avançar.

PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES

No âmbito do programa, 85% do volume de recursos estão diretamente destinados à execução de obras, sendo as principais as seguintes: i. Execução de dispositivos de drenagem sustentável de águas pluviais com a adoção de técnicas SbN; ii. Execução de Infraestrutura do Parque Linear; iii. Execução de infraestrutura nos bairros adjacentes ao

córrego integrada às SbNs; iv. Execução de equipamentos públicos na área de influência do programa.

Seguindo as diretrizes para mitigação dos riscos de contratação (especificamente das obras, incluindo as intervenções ambientais), serão aplicados 8,15% do valor total do programa em consultoria técnica (estudos, projetos e gestão). Os principais itens de consultoria associados ao suporte às obras são: Elaboração de projetos de engenharia; e Supervisão técnica, ambiental e social. Esses dois itens consumirão 63,00% do total a ser destinado para consultorias e 5,13% do volume total de recursos a serem aplicados no programa.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Não há previsão de contratação de pessoal. A fiscalização dos contratos será realizada por meio de profissionais e técnicos que já fazem parte do quadro funcional da Prefeitura de Palmas, como demonstrado no item Palmas, como demonstrado no item III.1 ARRANJO INSTITUCIONAL.

Considera-se que os principais riscos relacionados às contratações são causados pela ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório, que pode ocasionar a escolha de empresa técnica e/ou financeiramente incapaz, podendo suscitar, entre outros aspectos, em:

- Má qualidade na execução de obras e projetos;

- Má qualidade no acompanhamento das obras e do Programa;

- Incapacidade de aplicação do investimento;

- Descumprimento do cronograma estipulado;

- Acidentes de trabalho e paralisação de obras.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar os riscos de contratações pretende-se impor rigor nos critérios de seleção técnica nos editais de licitação, valorizando tanto a experiência pretérita das empresas e das equipes alocadas quanto a capacidade financeira para projetos de magnitude compatível com aqueles propostos no âmbito do Programa. A própria contratação da Supervisão técnica, ambiental e social constitui-se em fator mitigador, potencializando a experiência e a capacidade operacional do Município de Palmas para a preparação das licitações, bem como para acompanhamento dos contratos em observância às normas técnicas, requisitos de qualidade, controle de cronograma, entre outros. Ainda, estão previstos recursos necessários à contratação da Gerenciadora do Programa, que prestará suporte ao controle físico-financeiro do programa, incluindo relatórios de execução e desembolsos, auxiliando na garantia de aplicação dos investimentos conforme os prazos estipulados.

Ressalta-se que o Município de Palmas conta com estrutura organizacional consolidada e experiente para execução e garantia de celeridade e segurança técnico-jurídica aos procedimentos de licitação e contratos. Este arcabouço é formado pela Superintendência de Licitações, pela Controladoria-Geral do Município e pela Procuradoria-Geral do Município. Este arcabouço institucional já possui experiência em licitações vinculadas ao financiamento externo e nas tipologias previstas no âmbito do programa.

A supervisão técnica contemplará a contratação de empresa com equipe multidisciplinar para suporte ao gerenciamento e fiscalização da elaboração dos projetos e execução das obras, que preste apoio não apenas nos aspectos de engenharia relativos à preparação, execução e recebimento dos projetos e obras, mas também nos processos de licitação e contratação das empreiteiras, incluindo os aspectos jurídicos. Além disso, a supervisão deverá contar com profissionais qualificados para fornecer apoio a avaliação de imóveis a serem desapropriados ou removidos e também monitorar os impactos sociais e ambientais das obras executadas, auxiliando a UGP na consecução das ações mitigadoras necessárias.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: DESAPROPRIAÇÕES
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
O Programa proposto destina grande parte de suas ações e investimentos à segurança dos moradores, abrangendo a regularização fundiária e a mitigação de riscos à vida. Cerca de 30% do orçamento está alocado para regularização, reassentamentos e desapropriações, priorizando a eliminação de fatores de risco e a recuperação de APPs e nascentes.

a) n° de imóveis, área estimada e número de famílias

Serão desapropriados 175 imóveis, afetando 148 famílias nos bairros Aureny III, Aureny IV e Lago Sul. A área total estimada é de 63.000m² em lotes urbanizados e 13.172m² em edificações.

b) situação fundiária

Os imóveis são oriundos de parcelamentos regulares, mas em três lotes do Lago Sul foram construídas 23 residências sem titularidade, enquadrando-se como reassentamentos. A identificação ocorreu por imagens aéreas, sem cadastro prévio das famílias. Os imóveis ocupados terão solução habitacional baseada nos parâmetros EDGE, enquanto os 27 lotes vazios serão indenizados pelo valor médio de mercado, totalizando cerca de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

c) os instrumentos legais previstos

As desapropriações seguirão os procedimentos legais, incluindo decreto de utilidade pública, planta expropriatória, laudo de avaliação, notificação dos proprietários e pagamento da indenização acordada ou compensação com imóveis equivalentes na área de influência do projeto.

d) formas de compensação a serem utilizadas

A administração oferecerá indenização financeira ou reposição do imóvel dentro da área de influência. Locatários serão identificados, e, se necessário, o município arcará com multas rescisórias e três meses de aluguel em imóvel similar.

e) órgãos responsáveis;

Uma comissão específica, composta por profissionais das áreas urbanística e ambiental, Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Procuradoria-Geral do Município, conduzirá os processos. Os recursos já estão previstos no programa.

Os principais riscos envolvem possíveis judicializações e atrasos, afetando o reassentamento e o uso das áreas recuperadas. Embora a magnitude seja reduzida, conflitos podem gerar estresse social e menor adesão da comunidade ao programa. Outro risco é o subdimensionamento das desapropriações, resultando em custos superiores aos estimados.

Prevenção e Mitigação:
Para minimizar riscos na desapropriação, já foram realizadas diversas consultas comunitárias para conscientizar a população sobre segurança e impactos ambientais, além de diversas outras que estão previstas no Plano de Ação e Articulação Comunitária (**ANEXO XI**I).

Além disso, o programa prevê:

- Projeto de Trabalho Social (PTS): Revisão do diagnóstico socioterritorial e monitoramento conforme a Portaria nº 464/2018.
- Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias (PRMC): Identificação de imóveis atingidos e possibilidade de reduzir desapropriações, garantindo compensações adequadas.
- Programa de educação urbana e ambiental: Conscientização sobre riscos e impactos ambientais.
- Posto territorial/laboratório urbano: Centralização das ações de educação cidadã, audiências e negociações individuais.
- Comissão específica para desapropriações: Integrada por urbanistas, Secretaria de Habitação e Procuradoria-Geral, com acompanhamento do Ministério Público para transparência.
- Rede de comunicação direta: Minimiza ruídos de informação e agiliza os esclarecimentos.
- Garantia de recursos financeiros contínuos: Evita interrupções e assegura compensações.

4. 11. **Informações do 4° risco:**
Nome: REASSENTAMENTOS
Impacto: Alto

Probabilidade: Alta

Descrição:
Para além das desapropriações na área de intervenção, que possuem menor representatividade no programa, é necessário um amplo reassentamento de famílias e remoção de edificações situadas em APPs e Áreas de Risco, conforme pode ser visualizado no **ANEXO III**. As informações específicas dos reassentamentos são inseridas a seguir:

a) Número de famílias a serem reassentadas

743, localizadas nos bairros Machado Oeste 01, Machado Oeste 02, Irmã Dulce 1ª Etapa, Irmã Dulce 2ª Etapa, Aureny III, Aureny IV, Lago Sul e Saramandaia.

b) Situação do cadastro

Todos os imóveis a serem removidos foram identificados por meio de levantamento aéreo, com posterior visita in loco nos bairros a serem regularizados para avaliação prévia de risco. As famílias inseridas nos bairros Irmã Dulce 1ª Etapa, Irmã Dulce 2ª Etapa, Machado Oeste 01, Machado Oeste 02 e Aureny III já foram cadastradas como parte das ações necessárias ao REURB-S e aos recursos do PAC Saneamento, estando ausente o cadastro das demais.

c) Local para reassentamento

Pretende-se reassentar todas as famílias impactadas pelo programa dentro de sua área de influência, especialmente nos bairros que estão passando pelos procedimentos de regularização fundiária, que receberão todo o aporte de infraestrutura e equipamentos públicos, e onde estão sendo destinados lotes para tais fins - Irmã Dulce 1ª e 2ª etapa; Machado Oeste 1ª e 2ª Etapa; e União Sul. Nestes bairros, serão gerados 967 lotes novos desocupados. No Anexo XIII é possível identificar os lotes sem edificações que irão resultar dos referidos procedimentos.

Prevenção e Mitigação:
Os principais riscos associados aos procedimentos de reassentamento são semelhantes aos anteriormente citados relativos às desapropriações, muito embora sua maior representatividade no âmbito do programa. Assim, se relacionam à judicialização ou morosidade para a conclusão dos processos que permitam o reassentamento das famílias e a plena utilização das áreas para as finalidades pretendidas, essencialmente a eliminação dos fatores de risco e a recuperação das APPs. Tais imbróglios podem vir a gerar estresse social, contribuindo para uma menor adesão da comunidade da área de influência ao projeto, reduzindo sua participação na construção e posterior apropriação dos espaços e equipamentos instalados, bem como a própria continuidade da exposição ao risco de parte dos impactos e a inviabilidade de garantir os serviços ecossistêmicos do córrego e seu entorno.

Há risco relevante de subdimensionamento do quantitativo de imóveis a serem removidos e de famílias a serem reassentadas, resultando na extrapolação dos custos estimados. No entanto, ressalta-se que todos os imóveis identificados como situados em APPs e áreas de risco pré-determinadas foram contabilizados para elaboração do programa, podendo, desta maneira, haver uma redução dos remanejamentos necessários por parte dos imóveis situados em APPs que poderão permanecer na área nos casos em que seja avaliado como possível a sua consolidação de maneira sustentável.

Já há um arcabouço de ações executadas e em andamento para mitigação de tais riscos, com destaque para a condução das consultas comunitárias (**ANEXO XII**). Para além das ações em andamento, do PTS e do PRMC, outras atividades previstas no programa possibilitarão a redução dos riscos, quais sejam:

- Programa de educação urbana, ambiental e de mudanças climáticas, consistindo em instrumento de conscientização quanto aos riscos e prejuízos ambientais da localização dos imóveis a serem desapropriados.

- Instalação de um posto territorial/laboratório de articulação urbana na área de intervenção do projeto, para assumir a centralidade nas ações de educação cidadã e esclarecimentos sobre todos os procedimentos relacionados aos procedimentos de reassentamentos, realização de todas as audiências e reuniões comunitárias com as famílias impactadas.

- Criação de comissão específica para condução dos procedimentos de desapropriação e reassentamento, composta por profissionais integrados à concepção urbanística-ambiental do programa, a Secretaria de Habitação e de Regularização Fundiária e da Procuradoria Geral do Município, assegurando a tomada de decisão ágil. Pretende-se convidar o Ministério Público do Tocantins para acompanhar estas ações, garantindo total transparência e maior capacidade de mediação nas negociações.

- Criação de uma rede de comunicação direta entre o poder público e a população, reduzindo ruídos de informação e permitindo a solução rápida de dúvidas e incompreensões;

- Garantia da continuidade de recursos orçamentários e financeiros para a quitação dos valores devidos como compensação, evitando interrupções e garantindo a eficácia.

Além disso, o PRMC deverá identificar e subsidiar a comissão responsável com o conjunto de soluções possíveis para cada família a ser reassentada, a saber: (1) reassentamento em imóveis com o mesmo uso e com características similares - prioridade do programa; (2) Compensação pecuniária; (3) indenização pelas benfeitorias e pela posse da área; e (4) pagamento de aluguel social.

4. 12. **Informações do 5° risco:**
Nome: AMBIENTAIS
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
A infraestrutura e os equipamentos públicos previstos no programa demandam licenciamento ambiental para sistemas de drenagem e pavimentação, bem como para a recuperação das áreas que se encontram degradadas e fazem parte das áreas naturais ambientalmente protegidas. Os respectivos licenciamentos ambientais exigidos serão todos apresentados e avaliados no âmbito do órgão municipal responsável pela política de meio ambiente - Fundação de Meio Ambiente - sendo exigido os seguintes estudos ambientais: Relatório de Controle Ambiental (RCA), Plano de Controle Ambiental (PCA) e um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que deverão ser elaborados por profissional habilitado com vinculação a um registro de anotação de responsabilidade técnica. Na matriz de componentes do programa está prevista a contratação de empresa específica para prestação de consultoria/serviços destinados à elaboração dos referidos estudos.

O programa proposto se estrutura em torno do Parque Linear Urbano do Córrego Machado (**ANEXO VI Q**) e, como todo parque urbano, visa contribuir de forma relevante com a qualidade de vida da população, promovendo saúde e bem estar físicos e psicológicos. Ademais, os parques apresentam benefícios que colaboram de forma significativa com a estabilidade ambiental das cidades, pois além da proteção de seus ecossistemas, promovem o uso correto do solo, conservando as áreas de proteção ambiental livres de ocupações e desmatamentos irregulares e da poluição, resultando em uma cidade menos vulnerável a eventos climáticos extremos.

A área de intervenção do programa sofre duras pressões antrópicas, que tem como consequência, inúmeros impactos ambientais. A existência de moradias irregulares impede a coleta de resíduos sólidos e a expansão da rede coletora de esgoto e seu posterior tratamento, levando ao lançamento desses resíduos em locais impróprios, como as margens e o leito do córrego. Por essa região apresentar um sistema hídrico bastante ramificado, havendo inclusive afloramento do lençol freático em alguns pontos, é importante frisar que estes despejos de resíduos causam contaminação do solo, da água superficial do Córrego Machado, podendo atingir também as águas subterrâneas.

A implantação de Parques Lineares Urbanos, equipamentos públicos e urbanização podem causar impactos ambientais que são comuns em obras de infraestrutura, como drenagem e pavimentação, por exemplo. Os impactos ambientais decorrentes deste tipo de empreendimento estão relacionados à geração de resíduos, efluentes, poeira e ruídos nos canteiros de obras, aumento do tráfego de máquinas e caminhões. Eles podem ocorrer tanto no meio físico, biótico e antrópico.

Para além dos impactos previstos, não se vislumbram riscos relevantes para a execução do programa, considerando os seguintes aspectos: a intervenção se dará totalmente sob a jurisdição ambiental municipal, reduzindo o número, os trâmites processuais para seu licenciamento e as instâncias decisórias envolvidas; o diagnóstico ambiental realizado não indicou áreas relevantemente sensíveis para além das que possuem declividade acentuada e as próprias APPs; não há identificação de patrimônio histórico, arqueológico ou simular, tampouco o programa se insere em áreas que demandam abordagem específica, como territórios indígenas ou quilombolas; e a expansão da rede de saneamento, essencial para garantia da qualidade da água do Córrego Machado, será inserida na revisão do Plano Municipal de Água e Esgoto, a ser realizada ainda em 2025.

Prevenção e Mitigação:
No que se refere às medidas mitigadoras dos impactos ambientais, sua adoção fará com que os impactos negativos previstos se tornem de baixa magnitude e importância não significativa. Será realizado um Plano de Controle Ambiental (PCA), que visa subsidiar as atividades potencialmente impactantes a serem realizadas, por meio de ações, normas e restrições, para que elas apresentem o menor ônus ambiental possível. Esse plano define as ações a serem executadas e os critérios ambientais a serem considerados pelos executores das obras. No decurso de implantação do programa será realizado o acompanhamento e monitoramento das obras civis a serem executadas, objetivando a efetivação das medidas mitigadoras propostas. Para suporte a este acompanhamento e monitoramento, o programa prevê a contratação da supervisão técnica, ambiental e social, bem como o apoio ao gerenciamento do programa.

4. 13. **Informações do 6° risco:**
Nome: SOCIAIS

Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Por tratar-se de um projeto de desenvolvimento urbano integrado algumas interferências decorrentes de possíveis desapropriações e reassentamento de populações residentes poderão afetar diretamente os vínculos familiares preestabelecidos. Assim, as principais interferências estão relacionadas à perda de laços sociais e redes de apoio já construídas ao longo de muitos anos pelas comunidades locais que necessitarão passar por um processo de adaptação à nova realidade.

Além disso, devido aos prováveis deslocamentos decorrentes da implementação do projeto e gerados pela privação involuntária de terra, poderá ocorrer uma mudança significativa na capacidade econômica da comunidade original, ou seja, uma perda das fontes de renda ou dos meios de subsistência, uma vez que muitas famílias vulneráveis já possuem uma base produtiva consolidada, onde provém o seu próprio sustento, quer seja por meio da produção de alimentos e cultivo da terra, ou por meio de estabelecimentos comerciais e de serviços locais, localizados na área de intervenção.

Outra interferência identificada refere-se a chegada de novos equipamentos e da implantação do próprio parque linear, os quais poderão atrair um perfil socioeconômico diferente para a área, alterando a composição social e econômica da comunidade original, possivelmente desencadeando um processo de gentrificação. Cumpre informar que na área de abrangência do Projeto não existem populações indígenas, quilombolas, tampouco outros grupos altamente vulneráveis que serão afetados.

Ainda, durante a fase de implantação dos empreendimentos, alguns impactos negativos, temporários e reversíveis poderão ocorrer, entre os quais, o bloqueio de vias, ocasionando limitação de acesso às residências, alagamentos temporários por causa de escavações em épocas de chuva, além de ruídos e poeiras gerados em atividades de construção.

No entanto, as ações decorrentes da implantação do Programa pretendem se destacar pelos impactos sociais positivos para a região. Por meio da implantação dos projetos de urbanização, de novos equipamentos e da melhoria da infraestrutura, destaca-se a valorização significativa na economia local, com a geração de novos empregos na área do Parque, bem como nos bairros circunvizinhos. Isto será potencializado pelo amplo programa de formação e inclusão produtiva direcionado aos públicos mais fragilizados da área de influência, quais sejam, crianças, jovens, mulheres e população LGBTQIA+.

Observa-se que com a implantação do Parque Linear, assim como através da qualificação dos bairros do entorno, poderá haver melhorias na segurança de toda a área de intervenção, afetando diretamente a comunidade local. Essas melhorias serão garantidas pelo próprio monitoramento do Parque, a instalação de um posto avançado da Guarda Metropolitana, o espaço de acolhimento inserido dentro da Casa da Mulher Empreendedora, como também pela implementação de ciclovias, calçadas acessíveis, iluminação pública, dentre outros.

Ainda, a ampliação do sistema de esgotamento sanitário proporcionará melhorias nas condições sanitárias da região, as quais implicam diretamente em melhorias na qualidade de vida da população, comumente refletidas nos indicadores de saúde pública.

Consoante as interferências apontadas, os principais riscos sociais são a perda de apoio e, no limite, a oposição da população da área de intervenção e/ou influência à sua execução; empobrecimento da população impactada pela perda de fontes de renda, desencadeando pressões socioeconômicas a rede de proteção social, exacerbando desigualdades e seus efeitos em cascata; e desencadeamento de um processo de gentrificação, com a população de menor renda migrando internamente no território da cidade, gerando resistência à replicação das estratégias propostas em outras áreas e à própria continuidade do programa.

Prevenção e Mitigação:
Para minimizar os riscos apontados, o programa contempla as seguintes ações mitigadoras (destaque para o **ANEXO XII**):

1 - Amplo processo participativo na concepção das intervenções, já iniciado e a ser fortalecido pelas ações do programa;

2 - Previsão de recursos suficientes para que os reassentamentos necessários sejam realizados dentro da área de intervenção do próprio programa, além de maior oferta habitacional na região;

3 - Elaboração e execução do arcabouço institucional e procedimental que garanta a consideração e atendimento das demandas locais, representados pelo PRMC e PTS previstos, bem como na Comissão Popular;

4 - Amplo programa de capacitação e inserção produtiva para propiciar aumento da renda da população impactada;

5 - Implantação do Sistema de Monitoramento Socioambiental Municipal; e

6 - Amplo conjunto de ações de comunicação direta com a sociedade, vinculados ao Laboratório de Articulação, ao PRMC, ao PTS e ao Sistema de Monitoramento Socioambiental Municipal.

Destaca-se que as diretrizes e salvaguardas sociais do BID serão aplicadas ao programa para que o trabalho de avaliação social e as necessidades de mitigação de riscos seja realizado sob a supervisão e com o apoio técnico desta instituição

4. 14. **Anexos**

ANEXO XIII - Projetos de regularização fundiária

ANEXO XII - Plano de ação e articulação comunitária

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Real	0.1740	447.344.000,00	97.297.320,00	559.180.000,00	111.836.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	222	294

Juros aplicáveis:
14,15% (CDI) ? 0,13% (spread VMP 15 anos) + 0,8% (capital ordinário) = 14,82% ao ano
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,50% a.a (vigente em 2025), com teto de 0,75% a.a., ajustado periodicamente pela Diretoria do Banco
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Não se aplica.

Outras Informações:

Para a opção de financiamento proposta foi realizada pesquisa com diversas instituições financeiras multilaterais (BIRD, BID, AFD, KFW, CAF, NDB) e nacionais (BNDES, CAIXA). Ao final, identificou-se como essencial a proteção quanto a variação do dólar e, pelas características do programa, a necessidade de financiá-lo como um todo, em uma única instituição, para que não perca sua visão de desenvolvimento urbano integrado. Isto excluiu as instituições nacionais, por não contemplarem todo o escopo proposto, e redundou na escolha do BID, instituição financeira internacional que realiza operações em reais e que possui ampla experiência com programas semelhantes ao Palmas Mais Resiliente, podendo oferecer o suporte técnico que será necessário para atingir seus objetivos.

Para facilitar a compreensão da taxa de juros aplicada pelo BID, colecionamos abaixo a tabela de epread bancário conforme a Vida Média Ponderada (VMP):

VMP	Base CDI*
3	-1,21
4	-1,10
5	-1,01

6	-0,91
7	-0,82
8	-0,74
9	-0,67
10	-0,61
11	-0,51
12	-0,42
13	-0,32
14	-0,22
15	-0,13

Os juros aplicáveis constituem-se do CDI, subtraído do spread da VMP de 15 anos no momento de cada desembolso, adicionado da margem de capital ordinário de 0,8% ao ano em 2025. Assim, os juros aplicáveis nesta operação são:

14,15% (CDI) ? 0,13% (spread VMP 15 anos) + 0,8% (capital ordinário) = 14,82% ao ano.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
INTERVENÇÕES AMBIENTAIS E DE INFRAESTRUTURA PARA RESILIÊNCIA CLIMÁTICA, INCLUINDO PARQUE LINEAR E DEMAIS SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
44.018.000,00	0,00	75.376.000,00	0,00	92.654.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
84.130.000,00	0,00	36.902.000,00	0,00		

Nome do componente					
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
12.080.000,00	1.900.000,00	24.354.200,00	34.360.800,00	29.640.600,00	43.614.400,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
17.592.800,00	21.307.200,00	11.896.400,00	10.653.600,00		

Nome do componente					
GESTÃO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.629.000,00	0,00	4.675.000,00	0,00	5.942.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.132.000,00	0,00	2.322.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Municípios, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

a) receitas próprias a que se refere o art. 156 da Constituição;

b) recursos a que se refere o art. 158 da Constituição; e

c) recursos a que se referem o inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição;

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Iniciativa Cidade Presente

Este programa foi inicialmente estruturado na Iniciativa Cidade Presente - Projetos municipais em Desenvolvimento Urbano Integrado (DUI), iniciada em 2023, na qual Palmas esteve entre as 12 selecionadas entre as 170 inscritas. A iniciativa está sob responsabilidade do Ministério das Cidades, em parceria com a GIZ Brasil.

Na primeira fase, contou com apoio da consultoria ATO Urbano que conduziu o processo de elaboração ampla do programa, contemplando seus objetivos, síntese do diagnóstico existente, a solução para os principais problemas identificados, mapeamento de riscos, partes interessadas, estimativas de custo e cronograma de execução, bem como possíveis fontes de financiamento.

Após uma nova seleção dentro da Iniciativa Cidade Presente, Palmas esteve entre as 6 cidades escolhidas e, por isso, tem recebido duas novas consultorias. A primeira, com foco na elaboração do Masterplan da intervenção, articulação comunitária e plano de ação (**ANEXO XII: acesso em bit.ly/palmasresiliente**), realizada pela MYR ESG Solutions, e a segunda, destinada à estruturação do financiamento, que culminou na elaboração desta Carta Consulta, liderada pela GOPA Infra.

Para além disso, visando a co-criação da intervenção, a equipe gestora do programa tem realizado diversas reuniões comunitárias que, em conjunto com ações de educação urbanística e ambiental, compõem o laboratório permanente de articulação urbana a ser instalado no centro do parque linear proposto.

Plano de Ação Palmas Sustentável

O Plano de Ação Palmas Sustentável (2015) é fruto da aplicação da metodologia da Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis, desenvolvida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A metodologia foi capaz de avaliar e identificar os programas e ações prioritários para Palmas, por meio de uma abordagem integrada por três dimensões: ambiental e mudança climática; urbana; e fiscal e governança.

O diagnóstico contemplou a avaliação de 120 indicadores agrupados em 23 temas, complementados por entrevistas diretas a uma amostra significativa dos habitantes de Palmas, bem como estudos específicos de mitigação das mudanças do clima; vulnerabilidade e riscos naturais; e estudo de crescimento urbano. Ao fim, foram elencadas 71 ações prioritárias, das quais destacam-se: 1 - Recuperação ambiental e implantação dos parques urbanos; 2 - Diagnóstico fundiário do Córrego Machado; 3 - Plano de Arborização urbana; e 4 - Urbanização e regularização fundiária dos assentamentos precários.

Diagnóstico prévio vinculado ao Programa Saneamento para Todos

De maneira prévia a Iniciativa Cidade Presente, a área de intervenção foi alvo de um amplo diagnóstico no que se refere aos aspectos fundiários, socioeconômicos, ambientais e de infraestrutura dentro do Programa Saneamento para Todos, com vistas a execução de infraestrutura - especialmente redes de drenagem - em parte da bacia hidrográfica do Córrego Machado. Os produtos relevantes advindos deste diagnóstico encontram-se nos já citados **ANEXOS II e IV** e foram a principal fonte de informação para o diagnóstico apresentado nesta carta consulta, bem como para a construção de parte dos indicadores de monitoramento.

Regularização fundiária

Dentro da área de intervenção constam 05 (cinco) núcleos Urbanos Informais (NUI) em processo de regularização fundiária, sendo eles: Irmã Dulce 1ª Etapa, Irmã Dulce 2ª Etapa, Machado Oeste 1, Machado Oeste 2 e União Sul. Dentre esses, 04 (quatro) já foram enquadrados para Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S), por meio dos seguintes dispositivos legais (**ANEXO XIII**):

Irmã Dulce 1ª Etapa (Decreto nº 1.477/2017);

Irmã Dulce 2ª Etapa (Decreto nº 2.523/2024); e

Machado Oeste 01 e Machado Oeste 02 (Decreto nº 1.789/2019).

O NUI Irmã Dulce 1ª Etapa já teve o seu processo de regularização fundiária finalizado, com a entrega dos títulos ocorrida em 02 de julho de 2024. O NUI União Sul encontra-se com processo paralisado, aguardando procedimento de acordo/negociação com o proprietário da área. Os demais NUI estão em andamento, restando a finalização e correção do projeto urbanístico, análise dos processos individualizados dos beneficiários, parecer final da procuradoria-geral do município quanto a regularidade do procedimento e a montagem do Dossiê, com posterior encaminhamento para serventia de imóveis que finaliza o procedimento com a abertura de matrícula para cada um.

Revisão do Plano Municipal de Água e Esgoto

A Prefeitura Municipal de Palmas está com processo em andamento para formalização de convênio com a Universidade Federal do Tocantins para a revisão do Plano Municipal de Água e Esgoto. No plano, é possível definir prioridades para os investimentos a serem realizados pela concessionária dos serviços de água e esgoto em Palmas (BRK). Neste sentido, esta municipalidade irá inserir, como prioritária, a expansão da rede de abastecimento de água e, sobretudo, de coleta e tratamento de esgoto na bacia hidrográfica do Córrego Machado.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download
