PFE - Pleito de Financiamento Externo
PROGRAMA JOINVILLE RESILIENTE E SUSTENTÁVEL: Integração Territorial e Melhoria da Qualidade de Vida da População

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Processo SEI: 03101.001014/2025-67
Código do pleito: 5384019907/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 08
1. 4. Indicadores 09
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 09
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 12
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 14
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 14
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 16
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 17
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 18
1. 5. Componentes 19
1. 5. 1. Informações do 1° componente 19
1. 5. 2. Informações do 2° componente 21
1. 5. 3. Informações do 3° componente 23
1. 5. 4. Informações do 4° componente 25
1. 5. 5. Informações do 5° componente 26
1. 6. Beneficiários 28
1. 7. Anexos 29
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 30
2. 1. Áreas estratégicas 30
2. 2. Anexos 32
3. GESTÃO 33
3. 1. Arranjo institucional 33
3. 1. 1. Descrição 33
3. 1. 2. Orgãos Executores 33
3. 1. 3. Estrutura Operacional 33
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 34
3. 2. Operacionalização e Manutenção 34
3. 3. Planejamento Estratégico 34
3. 4. Anexos 35
4. RISCOS 36
4. 1. Informações do 1° risco 36
4. 2. Informações do 2° risco 36
4. 3. Informações do 3° risco 37
4. 4. Informações do 4° risco 37
4. 5. Informações do 5° risco 38
4. 6. Informações do 6° risco 38
4. 7. Informações do 7° risco 39
4. 8. Informações do 8° risco 40
4. 9. Informações do 9° risco 40
4. 10. Anexos 41
5. FINANCIAMENTO 42
5. 1. Condições Financeiras da Operação 42

5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 42
5. 1. 2. Informações da 2ª fonte de financiamento 42
5. 2. Cronograma de Desembolso 47
5. 3. Contragarantias 48
5. 4. Anexos 48
6. ETAPAS REALIZADAS 49
6. 1. Etapas realizadas 49
6. 2. Anexos 49
7. CONTATOS 50
7. 1. Contatos 50
7. 2. Anexos 50
8. Baixar todos os anexos 51

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: PROGRAMA JOINVILLE RESILIENTE E SUSTENTÁVEL: Integração Territorial e Melhoria da Qualidade de Vida da População

Sigla: JOINVILLE RESILIENTE E SUSTENTÁVEL

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Joinville é o maior município de Santa Catarina, com uma população de 616.323 habitantes (IBGE, 2022), e representa um dos principais pólos industriais do Sul do Brasil. O município sedia grandes empresas e mantém um elevado índice de formalização do trabalho, o que contribui para seu dinamismo econômico. Além disso, sua localização geográfica estratégica – próxima a importantes eixos logísticos, aos Portos de São Francisco do Sul e Itapoá, e a aeroportos regionais – consolida sua posição como centro logístico e produtivo.

Apesar do elevado Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 0,809 (PNUD, 2021), que o classifica como “muito alto”, Joinville convive com disparidades regionais relevantes e, apesar da economia robusta, Joinville enfrenta desafios a serem superados, com destaque aqui aos relacionados à degradação ambiental associada à ocupação irregular das áreas ambientalmente frágeis, mobilidade urbana e deficiência no atendimento à saúde primária, entre outras condições inerentes às cidades de maior porte e com expansão urbana desordenada.

A distribuição espacial da infraestrutura urbana, dos serviços públicos e das oportunidades econômicas não acompanha de maneira equitativa o crescimento urbano. Essa desigualdade se manifesta na presença de áreas com carência de infraestrutura, notadamente nas regiões periféricas, onde o acesso a serviços essenciais como saúde, saneamento, transporte público e espaços de convivência é limitado ou insuficiente.

O processo de expansão urbana de Joinville foi fortemente influenciado por fatores históricos e ambientais. Colonizada por imigrantes europeus a partir do século XIX, a cidade se desenvolveu com base em um padrão de ocupação linear ao longo de vias estruturantes, sem a correspondente consolidação de infraestrutura urbana nos bairros que surgiam. Esse modelo urbano fragmentado levou à formação de "vazios estruturais", dificultando a integração dos territórios e comprometendo a coesão do tecido urbano. A malha urbana espraiada, consolidada de forma desarticulada, dificultou a conectividade entre regiões da cidade e acarretou desequilíbrios territoriais.

A geografia local também impôs condicionantes importantes ao desenvolvimento urbano. Joinville está situada em uma área de planície costeira, com relevo predominantemente plano e cercada pela Serra do Mar. A presença de uma densa rede hídrica e áreas de manguezal, especialmente na porção leste da cidade, coloca desafios à ocupação do solo e à preservação ambiental. As áreas de preservação permanente e os ecossistemas sensíveis, como a Baía da Babitonga e as matas ciliares, sofreram com a pressão antrópica devido à expansão urbana, à falta de saneamento e à ocupação irregular.

Socialmente, a cidade possui áreas de vulnerabilidade, onde prevalece a dificuldade de acesso físico aos equipamentos urbanos, renda média reduzida, afetando a utilização e a prestação de serviços públicos. Nessas áreas, observa-se o maior déficit de equipamentos públicos, especialmente unidades básicas de saúde. A mobilidade urbana é limitada, tanto pela fragmentação viária quanto pela deficiência de infraestrutura adequada ao usuário do sistema de transporte coletivo, por bicicleta e a pé, de forma acessível e eficiente, o que compromete a equidade no usufruto dos serviços urbanos e à própria cidade.

No campo político-institucional, Joinville possui um arcabouço normativo e técnico compatível com as exigências contemporâneas de planejamento e gestão pública. O Plano Diretor (2022), incorpora diretrizes de sustentabilidade, mobilidade ativa, uso racional do solo e proteção ambiental. A administração pública municipal possui estrutura técnica capacitada, com experiência em captação e execução de projetos com financiamento externo. Há também um ambiente institucional favorável à implementação de programas integrados e estruturantes, com governança ativa, participação social e articulação entre diferentes secretarias e órgãos públicos.

Entretanto, o enfrentamento dos desafios urbanos e socioambientais identificados demanda de efetividade operacional do planejamento com investimentos continuados em infraestrutura resiliente, maior articulação entre políticas públicas setoriais e uma atuação firme na promoção da equidade e acessibilidade aos serviços e espaços públicos. O cenário atual aponta para a urgência de iniciativas que revertam o quadro de desigualdade e vulnerabilidade social e ambiental, buscando integrar áreas hoje marginalizadas à dinâmica urbana e econômica do município, de forma sustentável e inclusiva.

Considerando estes fatores, esta Carta Consulta busca desenvolver ações relacionadas às questões de conectividade territorial, com um olhar à população mais vulnerável e carente de atendimento primário à saúde, procurando soluções que limitam a ocupação de áreas de preservação ambiental mantendo o equilíbrio entre o homem e a natureza, tornando a cidade mais resiliente e com capacidade de adaptação e transformação.

1. 2. 2. **Problema:**

Joinville, principalmente nas regiões nordeste e sudeste onde vive quase metade da população, possui problemas estruturais urbanos, sociais e ambientais, caracterizados por infraestrutura e serviços insuficientes, ocupação de áreas sensíveis e exposição crescente aos riscos decorrentes das mudanças climáticas.



A sobreposição entre carência de infraestrutura urbana, degradação ambiental, exposição a riscos climáticos e fragilidade dos serviços públicos revela um padrão de exclusão territorial estrutural que ameaça não apenas a coesão social da cidade, mas também sua sustentabilidade a longo prazo. O cenário atual de Joinville evidencia a urgência de intervenções que combinem infraestrutura física com infraestrutura ecológica, integrando o planejamento urbano à lógica da resiliência climática, da adaptação territorial e da proteção ambiental urbana.

A seguir, os principais problemas são descritos, com ênfase na degradação ambiental, desequilíbrio na implantação da infraestrutura e na vulnerabilidade socioecológica.

1-Falta de implementação das ações previstas nos planos diretores desde a década de 70 e suas atualizações.

Causas: Descontinuidade de ações que implementavam o desenvolvimento físico e territorial da cidade, desconsiderando o planejamento integrado, criando lacunas entre as políticas urbanas, sociais e ambientais.

Consequências:

- Ocupações urbanas com baixa sensibilidade Ecológica

- Aumento de risco de impactos ambientais negativos

- Implantação de infraestrutura de forma insuficiente

- Implantação de ações desconexas comprometendo o planejamento integrado

2-Precariedade da infraestrutura urbana e ausência de soluções ambientalmente sustentáveis

Causas: Urbanização realizada em desacordo com o planejamento urbano, com baixa capacidade de absorção das demandas de infraestrutura e sem incorporação de princípios de sustentabilidade ou soluções baseadas na natureza.

Consequências:

- Aumento da impermeabilização do solo urbano e redução da infiltração de águas pluviais

- Amplificação do escoamento superficial e da sobrecarga em redes de drenagem precárias ou inexistentes

- Degradação da paisagem urbana e aumento da poluição difusa em áreas urbanas vulneráveis

- Redução da capacidade de regulação térmica e hídrica dos territórios urbanos

3-Desconexão territorial e barreiras à integração de sistemas urbanos e naturais

Causas: Crescimento urbano fragmentado, desarticulação da malha viária e ausência de eixos de integração entre zonas urbanas e áreas verdes.

Consequências:

- Dificuldade de acesso físico à comunidades e setores da cidade com infraestrutura deficiente

- Baixo acesso a áreas de lazer, equipamentos públicos e espaços naturais de convivência

- Perda de conectividade ecológica entre áreas verdes e corredores ambientais

- Comprometimento da função ecológica e social dos espaços urbanos

4-Ocupação desordenada de áreas ambientalmente frágeis e legalmente protegidas

Causas: Pressão urbana sobre Áreas de Preservação Permanente (APPs) e faltade ações preventivas de controle do uso do solo.

Consequências:

- Supressão de vegetação nativa em margens de rios, manguezais e encostas

- Comprometimento da biodiversidade local e dos ecossistêmicos urbanos

- Aumento do risco de desastres naturais - enchentes, alagamentos e deslizamentos

- Contaminação de cursos d'água e de zonas de proteção ambiental por resíduos sólidos e esgoto

5-Vulnerabilidade crescente aos efeitos das mudanças climáticas

Causas: Falta de drenagem sustentável, escassez de áreas permeáveis, urbanização descontrolada e inexistência de estratégias adaptativas no planejamento municipal.

Consequências:

- Recorrência de inundações e impactos econômicos diretos sobre populações de baixa renda

- Redução da resiliência ecológica e urbana frente aos impactos das mudanças climáticas

- Insegurança socioambiental em territórios sem infraestrutura de contenção ou alerta

6-Deficiência estrutural da atenção primária à saúde em territórios vulneráveis e ambientalmente expostos

Causas: Quantidade insuficiente de UBSF, infraestrutura inadequada e pouca integração entre saúde pública e demais serviços públicos complementares ao desenvolvimento físico, territorial e ambiental.

Consequências:

- Baixa capacidade de prevenção e resposta a doenças sensíveis ao clima

- Dificuldade de acesso da população a cuidados primários

- Sobrecarga dos serviços de urgência, sem suporte físico territorial adequado

- Ausência de estruturas resilientes que integrem saúde e promoção da qualidade de vida

7-Escassez de espaços públicos sustentáveis e integrados ao ambiente urbano

Causas: Baixo investimento em áreas verdes de lazer, ausência de estruturação de parques e descontinuidade de sistemas ecológicos urbanos.

Consequências:

- Falta de acesso a áreas de lazer e bem-estar, com prejuízos à saúde física e mental da população

- Perda da função socioambiental dos espaços públicos em comunidades de maior vulnerabilidade

- Enfraquecimento da relação da população com o território e com os bens ambientais comuns

1. 2. 3. **Solução:**

As soluções para Joinville estão organizadas em três eixos estratégicos com componentes e produtos focados em reduzir desigualdades territoriais, requalificar áreas degradadas, proteger ecossistemas, ampliar acesso à saúde básica e fortalecer a adaptação climática. Essas ações visam responder aos problemas em áreas vulneráveis e estão alinhadas com os objetivos do PPA 2024-2027.

Eixo 1 – Planejamento, Estudos e Sustentabilidade Ambiental

Tem como finalidade assegurar a base técnica, legal e ambiental para a viabilização das intervenções do programa, além de munir o Município com projetos executivos desenvolvidos em conjunto com estudos ambientais para execução de futuras obras que garantirão ao Município soluções que conectam pessoas em harmonia com a

natureza.

A elaboração de estudos e projetos executivos detalhados permitirá o correto dimensionamento das obras de infraestrutura, garantindo eficiência, segurança e compatibilidade ambiental. O processo de licenciamento ambiental será essencial para mitigar os riscos de intervenção em áreas sensíveis, como manguezais, margens de rios e áreas de preservação permanente, além de assegurar o cumprimento da legislação ambiental.

Essas ações respondem à carência de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, e de segurança jurídica nas intervenções urbanas, além de possibilitar a adoção de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) como estratégia central de enfrentamento aos riscos climáticos.

Contribuição para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

Eixo 2 – Infraestrutura Urbana Sustentável e Conectividade Territorial

Abrange intervenções físicas de urbanização, mobilidade ativa e integração territorial em regiões periféricas e desconectadas da malha urbana. Inclui a revitalização de vias com pavimentação, drenagem, calçadas com acessibilidade, ciclovias e/ou ciclofaixas, iluminação pública e arborização, promovendo a requalificação urbana de áreas que hoje carecem de infraestrutura básica. Também contempla obras de arte especiais, como a complementação da Ponte Joinville e a Ponte Espinheiros, que garantem a mobilidade ativa e integração física/funcional entre setores urbanos hoje isolados.

As ações atenderão diretamente aos problemas de infraestrutura precária, fragmentação territorial, vulnerabilidade a alagamentos e exclusão socioespacial, promovendo soluções resilientes e ambientalmente integradas à paisagem urbana.

Contribuição para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:


OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

OE 210: Promover maior eficiência logística com valorização dos modais

OE 212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água

OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

OE 202: Ampliar a resiliência climática e a gestão de riscos urbanos

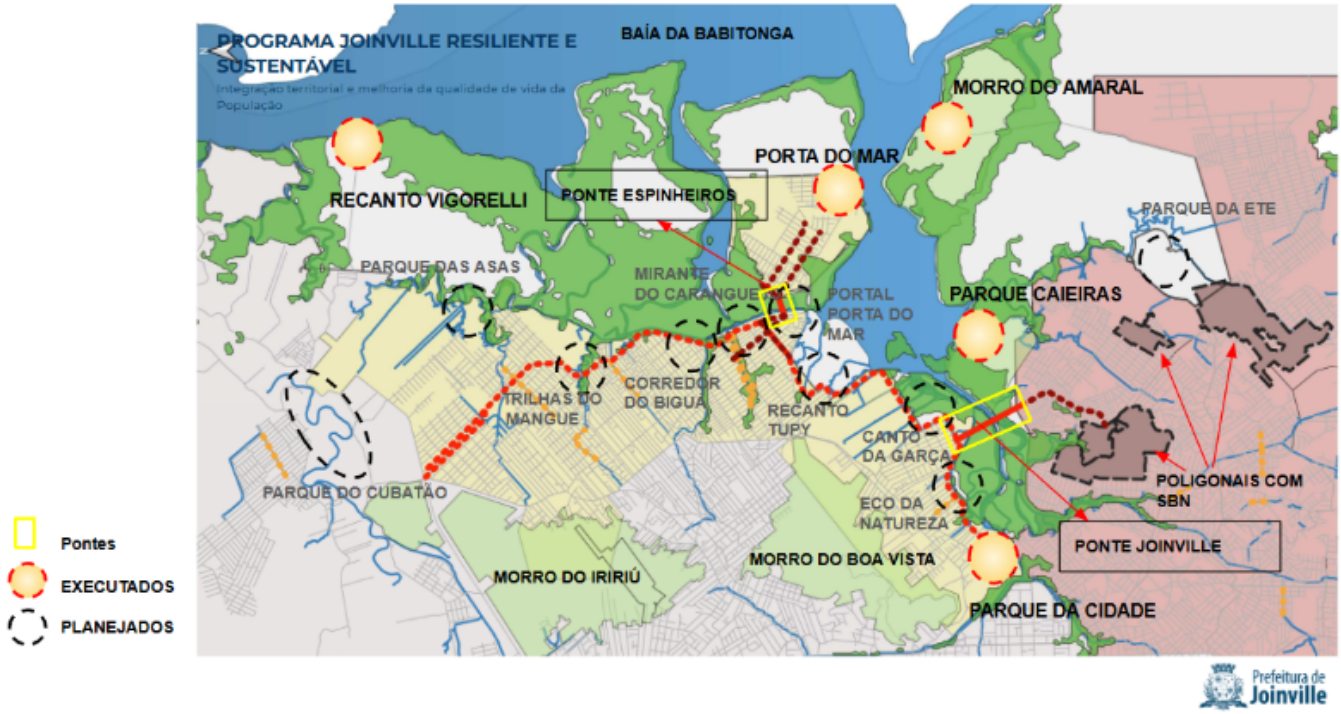

Eixo 3 – Ampliação da Atenção Primária à Saúde e Qualidade de Vida

As ações deste eixo visam melhorar o acesso da população à saúde básica, especialmente nas regiões com maior carência de cobertura e estrutura física. Estão previstas a construção de novas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) e a reforma e ampliação de unidades existentes. As UBSFs serão implantadas em terrenos próprios, com projeto arquitetônico padronizado, acessível e adaptado às necessidades de atenção humanizada, pensando na sustentabilidade da construção e manutenção predial com uso de tecnologias para economia de energia, água, entre outros, incorporando o conceito das “Vilas da Saúde” – espaços que integram saúde, lazer, esporte e convivência comunitária.

Essas soluções respondem à fragilidade da rede de atenção primária e à ausência de equipamentos adequados em áreas de risco ambiental e exclusão social. Ao integrar o cuidado com o território e com o bem-estar da população, o eixo promove qualidade de vida, saúde preventiva e fortalecimento dos vínculos sociais.

Contribuição para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade

OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas com foco na qualidade de vida

OE 106: Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social

OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

De forma transversal, todos os eixos do programa incorporam diretrizes de resiliência climática, infraestrutura verde e inclusão social, promovendo sinergias entre os componentes urbanos, ambientais e institucionais do território. A estratégia adotada contribui para o fortalecimento da capacidade de resposta do município aos desafios contemporâneos da urbanização desigual, das mudanças climáticas e da sustentabilidade urbana, promovendo uma Joinville mais equitativa, integrada e preparada para o futuro.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação deste programa gerará benefícios diretos substanciais e externalidades positivas com efeitos duradouros sobre o território, a população e o meio ambiente urbano. Ao enfrentar simultaneamente déficits históricos de infraestrutura, desigualdades territoriais, fragilidade dos serviços de saúde e riscos socioambientais agravados pelas mudanças climáticas, o programa visa reestruturar de forma sistêmica as regiões mais vulneráveis da cidade. A proposta assegura que os efeitos do programa sejam observáveis, mensuráveis e sustentáveis no tempo.

O programa em Joinville, alinhado ao Plano Diretor (Lei 620/22), visa promover a cidadania e o bem-estar através da melhoria do acesso a serviços públicos, desenvolvimento sustentável e direito à cidade. Espera-se a integração dessas ações com projetos municipais existentes, como a expansão do saneamento e a criação de um parque ambiental com centro de educação.

Além de obras físicas, o programa busca a integração social e a conscientização para o desenvolvimento sustentável, utilizando o espaço público como "plataformas de desenvolvimento" através de intervenções urbanas que qualifiquem a cidade como um lugar de cidadania.

Os resultados esperados incluem:

- Fomento ao transporte ativo com a ampliação da rede cicloviária

- Ampliação e facilitação do acesso da população a serviços urbanos e parques

- Conexão das regiões Nordeste e Sudeste com a execução da Ponte e reestruturação viária

- Obtenção do licenciamento ambiental da Via Parque

- Melhoria no atendimento da saúde com aumento de consultas na Atenção Primária e redução da demanda nas UPAs

A implementação do programa busca gerar benefícios duradouros, enfrentando déficits de infraestrutura, desigualdades, fragilidade na saúde e riscos socioambientais, visando reestruturar as áreas vulneráveis de forma sistêmica e sustentável.

Benefícios Diretos

1. Qualificação da infraestrutura urbana em regiões vulneráveis: Urbanização de vias incluindo a infraestrutura completa, reduzindo alagamentos e melhorando mobilidade e segurança. Trará a valorização urbana e recuperação da função social e ambiental das áreas urbanizadas.

2. Melhoria da conectividade urbana e territorial: Construção de pontes estratégicas e requalificação de acessos, diminuindo tempo e custo de deslocamento e ampliando acesso a serviços, oportunidades econômicas e equipamentos públicos.

3. Reforço à atenção básica em saúde: Construção/requalificação de UBSF em áreas prioritárias, ampliando cobertura, melhorando o acesso a cuidados preventivos e promoção da saúde em comunidades vulneráveis, diminuindo a sobrecarga dos serviços de urgência.

4. Melhoria da gestão ambiental e da capacidade adaptativa frente às mudanças climáticas: Projetos e obras de infraestrutura verde e proteção de áreas sensíveis, reduzindo riscos climáticos. Ampliação da capacidade institucional para integrar planejamento urbano e ambiental.

5. Planejamento técnico qualificado e seguro: Elaboração de projetos executivos para obras sustentáveis e juridicamente seguras, aumentando a eficiência e controle dos investimentos públicos.

Externalidades Positivas

1. Redução das desigualdades socioespaciais: Investimentos em áreas negligenciadas, promovendo inclusão.

2. Fortalecimento da coesão social e da cidadania: Criação de espaços públicos de qualidade e estímulo ao pertencimento comunitário.

3. Valorização do capital ambiental urbano: Preservação e recuperação de ecossistemas urbanos, como margens de rios e áreas de mangue, promovendo integração entre ambiente construído e natureza.

4. Estímulo à economia local e geração de empregos: Dinamização econômica através de obras e serviços.

5. Fortalecimento da governança pública e da capacidade institucional: Planejamento integrado e instrumentos de gestão eficazes.

Resultados Observáveis e Mensuráveis

A verificação dos resultados será feita através de indicadores como km de vias urbanizadas com infraestrutura completa, número de pontes construídas e acessos estruturados, redução no tempo de deslocamento, número de

UBSF construídas, cobertura da atenção primária à saúde, área de APP preservada, número de habitantes beneficiados e número de projetos elaborados.

O programa busca tornar Joinville uma cidade mais justa, resiliente, verde e integrada, alinhado aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027, especialmente nas áreas de equidade regional (OE 214), resiliência climática (OE 202), saúde de qualidade (OE 102), infraestrutura sustentável (OE 111) e valorização ambiental (OE 201).

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

O Programa tem o objetivo de promover o desenvolvimento urbano sustentável, inclusivo e resiliente em regiões vulneráveis de Joinville, por meio da qualificação da infraestrutura urbana, da ampliação do acesso à saúde básica e da integração urbana e ambiental, visando à redução das desigualdades socioespaciais e à adaptação da cidade aos impactos das mudanças climáticas.

Objetivos Específicos

a) Requalificar a infraestrutura urbana em áreas prioritárias, com foco em drenagem, acessibilidade, iluminação e infraestrutura verde, promovendo mobilidade segura, valorização territorial e resiliência urbana.

Correlação:

Componente: 2 – Infraestrutura Urbana Sustentável e Conectividade Territorial

Indicadores:

INDICADOR 1: Tempo de deslocamento por transporte coletivo entre as porções NE/SE.

INDICADOR 2: Oferta de serviços e comércios por bairros.

INDICADOR 3: Contagem de fluxos: Pedestres, ciclistas e motorizados.

INDICADOR 6: Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) na região Sudeste do Município (Indicador Chave Nacional do PPA 2024-2027)

Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

OE 212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água

OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas

b) Executar obras de conectividade territorial, incluindo pontes e acessos viários estruturantes, para integrar regiões fragmentadas, reduzir o tempo de deslocamento e ampliar o acesso a serviços e oportunidades urbanas.

Correlação:

Componente: 2 – Infraestrutura Urbana Sustentável e Conectividade Territorial

Indicadores

INDICADOR 1: Tempo de deslocamento por transporte coletivo entre as porções NE/SE.

INDICADOR 2: Oferta de serviços e comércios por bairros.

INDICADOR 3: Contagem de fluxos: Pedestres, ciclistas e motorizados.

Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027

OE 210: Promover maior eficiência logística com valorização dos modais

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

c) Ampliar e qualificar a rede de atenção primária em saúde por meio da construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), garantindo infraestrutura adequada, acessível e integrada às comunidades atendidas.

Correlação:

Componente: 3 – Ampliação da Atenção Primária à Saúde e Qualidade de Vida

Indicadores

INDICADOR 4: Número de atendimento nas UBSF

INDICADOR 5: Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré natal realizadas

Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027

OE 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade

OE 106: Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social

OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas com foco na qualidade de vida

OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

d) Contribuir para a adaptação da cidade às mudanças climáticas, por meio da incorporação de soluções baseadas na natureza, da proteção de áreas ambientalmente sensíveis e da redução da vulnerabilidade socioambiental nas regiões de intervenção.

Correlação:

Componente: Transversal aos Componentes 1 e 2

Indicadores

INDICADOR 6: Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) na região Sudeste do Município (Indicador Chave Nacional do PPA 2024-2027)

INDICADOR 7: Proporção de corpos hídricos com boa qualidade ambiental (%) na região Sudeste do Município (Indicador Chave Nacional do PPA 2024-2027)

Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027

OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas.

OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: INDICADOR 3: Contagem de fluxos: Pedestres, ciclistas e motorizados.

Descrição:
Monitoramento por contagem dos deslocamentos ativos e motorizados nas vias de acesso às novas pontes. Especificação em projeto para implantação dos pontos de vídeo-detecção das imagens a serem analisadas por equipe técnica do órgão público responsável, através de softwares de análise de imagem que detectam a passagem de pedestres, ciclistas e motorizados.

Este indicador está diretamente vinculado ao Objetivo Estratégico OE 210 do PPA 2024–2027: Promover maior eficiência logística com valorização dos modais. Também, está vinculado ao OE 111, que visa promover cidades mais sustentáveis, equitativas e funcionais. A melhoria da infraestrutura urbana e a conectividade de redes contribuem para a transição ecológica, a justiça socioambiental e a saúde pública.

Objetivos específicos relacionados no programa:

a) Requalificar a infraestrutura urbana em áreas prioritárias.

b) Executar obras de conectividade territorial, incluindo pontes e acessos viários estruturantes, para integrar regiões fragmentadas, reduzir o tempo de deslocamento e ampliar o acesso a serviços e oportunidades urbanas.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

S (Específico): Mede a quantidade e perfil de deslocamentos de pedestres, ciclistas e motorizados em áreas beneficiadas pelo programa que passam a ter infraestrutura adequada e conectada para os deslocamentos urbanos.

M (Mensurável): Números absolutos dos deslocamentos nos modos (a pé, por bicicleta, e demais modos de deslocamentos motorizados).

A (Atingível): O programa contempla obras que integram urbanização de vias com eixos estruturantes da cidade (Plano Viário, 2024) e com redes prioritárias de caminhabilidade e cicloviária (PDTA, 2016), sendo possível melhorar o índice de deslocamentos ativos (prioritários segundo P.D.Joinville, 2022) em curto e médio prazos nas áreas de intervenção.


R (Relevante): Está diretamente alinhado ao OE 111 do PPA, e também contribui para saúde pública, qualidade de vida e equidade territorial.


T (Temporal): Pode ser aferido anualmente a partir da conclusão das etapas de obra e/ou comparações parciais com a linha de base O.D. 2010 e 2019.

Demonstrativo de coerência entre o indicador e os objetivos:

A contagem de modos ativos e motorizados de deslocamento populacional, descrito neste indicador, é coerente com o escopo do programa na medida em que monitora 24 horas/dia, desde a implantação dos equipamentos, como a população vai se apropriar das novas vias e conexões urbanas no tempo. O monitoramento do perfil de deslocamentos urbanos captura, complementarmente, os efeitos das intervenções nas condições de vida da população urbana mais vulnerável, contribuindo para reduzir desigualdades socioespaciais e ambientais. Ao elevar o índice de deslocamentos ativos, o programa avança sobre metas essenciais do desenvolvimento urbano sustentável e da justiça ambiental (não emissão de CO2).

Meta:
Linha base: Pesquisa Origem Destino (OD) 2019, conforme gráfico abaixo:

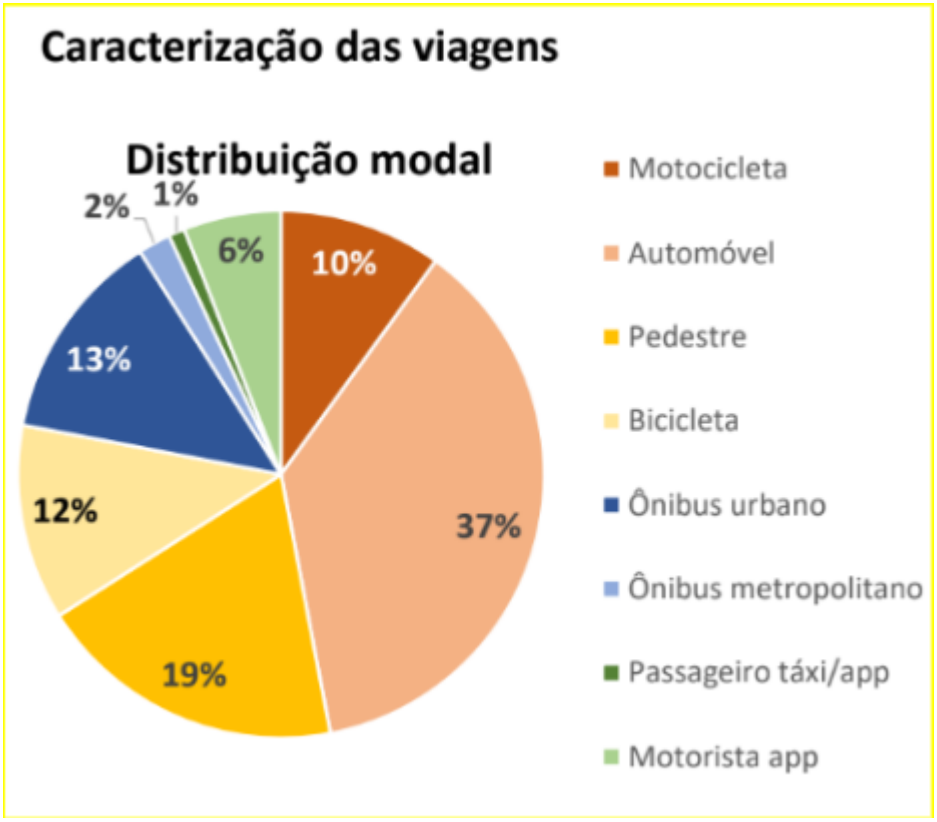
Caracterização das viagens
Distribuição modal
10%
37%
19%
12%
13%
2%
1%
6%
Motocicleta
Automóvel
Pedestre
Bicicleta
Ônibus urbano
Ônibus metropolitano
Passageiro táxi/app
Motorista app

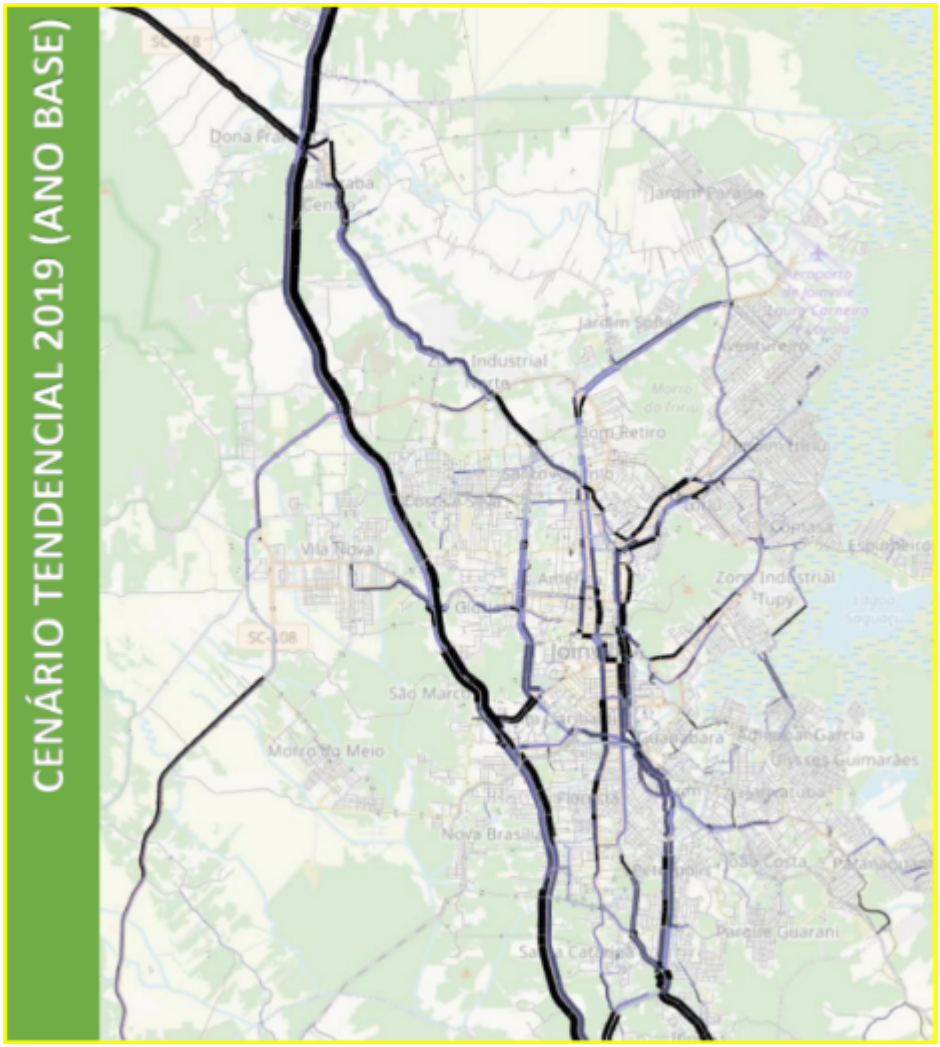

Meta: Ao final do Programa:

Deslocamentos a pé: manter acima de 20%;

Deslocamentos por bicicleta: Elevar o índice acima de 20% nos acessos das pontes.

Aferir o volume/perfil anual de deslocamentos de pedestres, ciclistas e motorizados nas vias e permitir uma comparação precisa das tendências volumétricas a cada ano nestas vias. Fornecer parâmetros técnicos para tomada de decisão.

Coletar dados robustos sobre o fluxo de pedestres, ciclistas e veículos motorizados nas vias, incluindo os padrões de deslocamento em diferentes dias da semana, horários e condições climáticas. Um conjunto de contagens automáticas bem distribuído no território pode ser uma forma efetiva de ter uma visão geral sobre o impacto das políticas de mobilidade.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: INDICADOR 6: Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) na região Sudeste do Município (Indicador Chave Nacional do PPA 2024-2027)

Descrição:
O Índice de Atendimento Adequado em Saneamento Básico (IAASB) é um indicador nacional estruturado pelo Governo Federal que mensura a proporção da população urbana que reside em domicílios com acesso simultâneo e adequado aos quatro componentes do saneamento básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.

Esse indicador é diretamente afetado pelas ações do programa proposto para Joinville, especialmente aquelas previstas no Objetivo Específico b) Requalificar a infraestrutura urbana em áreas prioritárias, pois estas incluem a urbanização de vias com drenagem eficiente, arborização, acessibilidade e integração com redes de esgoto e água, ampliando a cobertura e a qualidade dos serviços de saneamento básico.

O IAASB está diretamente vinculado ao **Objetivo Estratégico OE 111 e 202 do PPA 2024–2027**, que visa promover cidades mais sustentáveis, equitativas e funcionais. A melhoria da infraestrutura urbana e o acesso adequado ao saneamento básico contribuem para a transição ecológica, a justiça socioambiental e a saúde pública.

Objetivos específicos relacionados no programa:

a) Requalificar a infraestrutura urbana em áreas prioritárias, com foco em drenagem, acessibilidade, iluminação e infraestrutura verde, promovendo mobilidade segura, valorização territorial e resiliência urbana.

d) Contribuir para a adaptação da cidade às mudanças climáticas, por meio da incorporação de soluções baseadas na natureza, da proteção de áreas ambientalmente sensíveis e da redução da vulnerabilidade socioambiental nas regiões de intervenção.

Fórmula de cálculo:

O IAASB é calculado pela razão entre a população urbana na região sudeste do Município com acesso simultâneo e adequado aos quatro serviços de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, e drenagem urbana) e a população urbana na região sudeste do Município total, multiplicada por 100.

Critérios para "atendimento adequado":

Abastecimento de água por rede geral, com regularidade e potabilidade garantidas;

Coleta e tratamento de esgoto sanitário por rede pública;

Coleta regular e destinação adequada de resíduos sólidos domiciliares;

Existência de sistema de drenagem pluvial urbano funcional.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

S (Específico): Mede a proporção da população urbana em áreas beneficiadas que passa a ter atendimento adequado em saneamento básico completo.

M (Mensurável): Percentual calculado com base em dados populacionais e registros técnicos dos serviços de saneamento.

A (Atingível): O programa contempla obras que integram urbanização com redes de drenagem e esgoto, sendo possível melhorar este índice em curto e médio prazo nas áreas de intervenção.

R (Relevante): Está diretamente alinhado ao OE 111 do PPA, e também contribui para saúde pública, qualidade de vida e equidade territorial.

T (Temporal): Pode ser aferido na linha de base (T0) em 2024 e monitorado anualmente a partir da conclusão das etapas de obra e expansão dos serviços, previsto para ser concluído em 2030.

Coleta e fontes de dados para monitoramento:

Dados da Prefeitura de Joinville sobre extensão e cobertura das redes de esgoto, água e drenagem nas áreas urbanizadas.

Registros da Companhia Águas de Joinville (prestadora local de saneamento).

Relatórios técnicos de execução de obras e vistoria de campo.

Demonstrativo de coerência entre o indicador e os objetivos:
O IAASB é coerente com o escopo do programa na medida em que reflete diretamente os **benefícios mensuráveis da requalificação da infraestrutura urbana integrada ao saneamento ambiental**. O indicador captura os efeitos concretos das intervenções nas condições de vida da população urbana mais vulnerável, contribuindo para reduzir

desigualdades socioespaciais e ambientais. Ao elevar esse índice, o programa avança sobre metas essenciais do desenvolvimento urbano sustentável e da justiça ambiental.

Meta:
Linha de base: 23% da população da região Sudeste com atendimento adequado (2024).
Meta: 27% da população com atendimento adequado atendida ao final do Programa.

O aumento de 4% representa atendimento a aproximadamente 2.600 famílias da região sudeste.

Fonte: SIMGeo Prefeitura de Joinville, IBGE 2022.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: INDICADOR 4: Número de atendimento nas UBSF

Descrição:
Aumento do atendimento na Atenção Primária à Saúde (APS) a partir da ampliação das equipes de atendimento, bem como a ampliação do horário (até 22h) em algumas UBSF, com consequente disponibilização de novas vagas para consultas por mês.

Objetivos específicos relacionados no programa:

c) Ampliar e qualificar a rede de atenção primária em saúde por meio da construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), garantindo infraestrutura adequada, acessível e integrada às comunidades atendidas.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

- 1. 4. 4.

  S (Específico): Mede o aumento da quantidade de consultas médicas na APS.

- 1. 4. 5.

  M (Mensurável): Números absolutos das consultas médicas realizadas.

- 1. 4. 6.

  A (Atingível): O programa contempla construção de 9 novas UBSF e ampliação de mais 2, o que vai incidir diretamente no aumento do número de consultas médicas no Município.

- 1. 4. 7.

  R (Relevante): Está diretamente alinhado ao OE 102 do PPA, e também contribui para saúde pública e qualidade de vida da **população.**

- 1. 4. 8.

  (Temporal): Pode ser aferido mensalmente a partir da conclusão das obras e/ou comparações parciais com a linha de base 2024.

Meta:
Linha de base: 2024 - 56.700 consultas/mês

Meta: 64.620 consulta/mês (2030)

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

1. 4. 9. **Informações do 4° indicador:**
Nome: INDICADOR 7: Proporção de corpos hídricos com boa qualidade ambiental (%) na região Sudeste do Município (Indicador Chave Nacional do PPA 2024-2027)

Descrição:

O Índice de Qualidade da Água (IQA) dos rios Cachoeira, Itaum-açú e Itaum-mirim variam de acordo com o trecho do rio e com os parâmetros analisados. O IQA é uma escala que vai de 0 a 100, onde 0 indica péssima qualidade e 100 indica ótima qualidade. A partir das intervenções do Programa, acompanhar o monitoramento da qualidade da água e sua melhoria no rios, por meio da análise de características físicas, químicas e biológicas monitoradas pela concessionária de água e esgoto local.

Esse é um indicador chave nacional do Objetivo Estratégico OE 201 e 202 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

Objetivos específicos relacionados no programa:

a) Requalificar a infraestrutura urbana em áreas prioritárias, com foco em drenagem, acessibilidade, iluminação e infraestrutura verde, promovendo mobilidade segura, valorização territorial e resiliência urbana.
d) Contribuir para a adaptação da cidade às mudanças climáticas, por meio da incorporação de soluções baseadas na natureza, da proteção de áreas ambientalmente sensíveis e da redução da vulnerabilidade socioambiental nas regiões de intervenção.

Fórmula de cálculo:
Comparativo entre os resultados Pós-Programa e os resultados atuais.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: Mede o Índice de Qualidade da Água (IQA) dos rios Cachoeira, Itaum-açú e Itaum-mirim, na área de intervenção do Programa (região Sudeste)

Mensurável: O dado é obtido por meio de análises físicas, químicas e biológicas. Os resultados são avaliados em uma escala de 0 a 100, onde 0 indica péssima qualidade e 100 indica ótima qualidade. O IQA já é medido pela Companhia Águas de Joinville nos citados rios Cachoeira - pontos RBC12, RBC13, RBC 15, RBC 16 E RBC 19

Atingível: As obras do programa contribuem para a melhoria das qualidade da água, como as soluções baseadas na natureza (SbN)

Relevante: Relaciona-se diretamente à melhoria da qualidade de vida, à justiça urbana e à inclusão social

Temporal: Pode ser aferido mensalmente durante as etapas do Programa, bem como pode ser monitorado continuamente após o término do Programa nos pontos de coleta RBC12, RBC13, RBC 15, RBC 16 E RBC 19


Fontes e dados necessários para acompanhamento:


Fonte: Companhia Águas de Joinville (Média do Índice de Qualidade das Águas - IQA) nos pontos RBC12, RBC13, RBC 15, RBC 16 E RBC 19 - coleta mensal de dados.

Meta:
Linha de base: 42,7 (valor médio das coletas nos pontos RBC12, RBC13, RBC 15, RBC 16 E RBC 19 - 2024)

Meta: 51 (IQA Boa qualidade) ao final do Programa.

Fonte: Companhia Águas de Joinville (Média do Índice de Qualidade das Águas - IQA) nos pontos RBC12, RBC13, RBC 15, RBC 16 E RBC 19 - coleta mensal de dados.

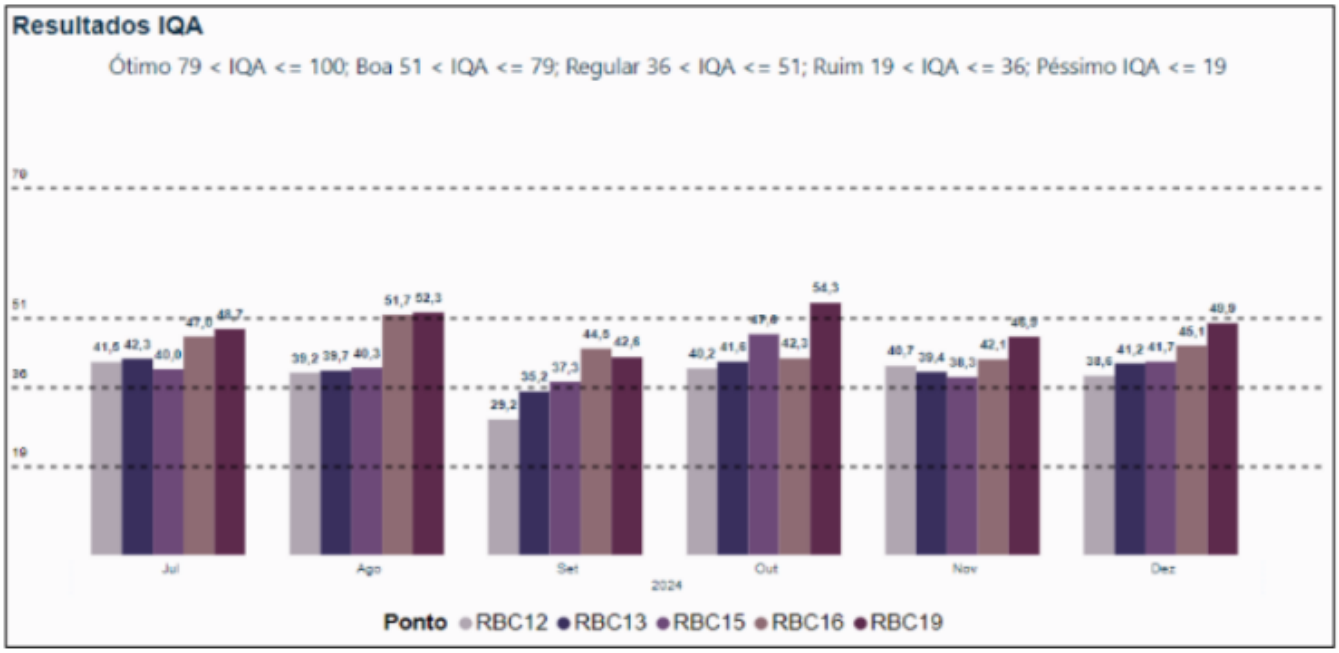

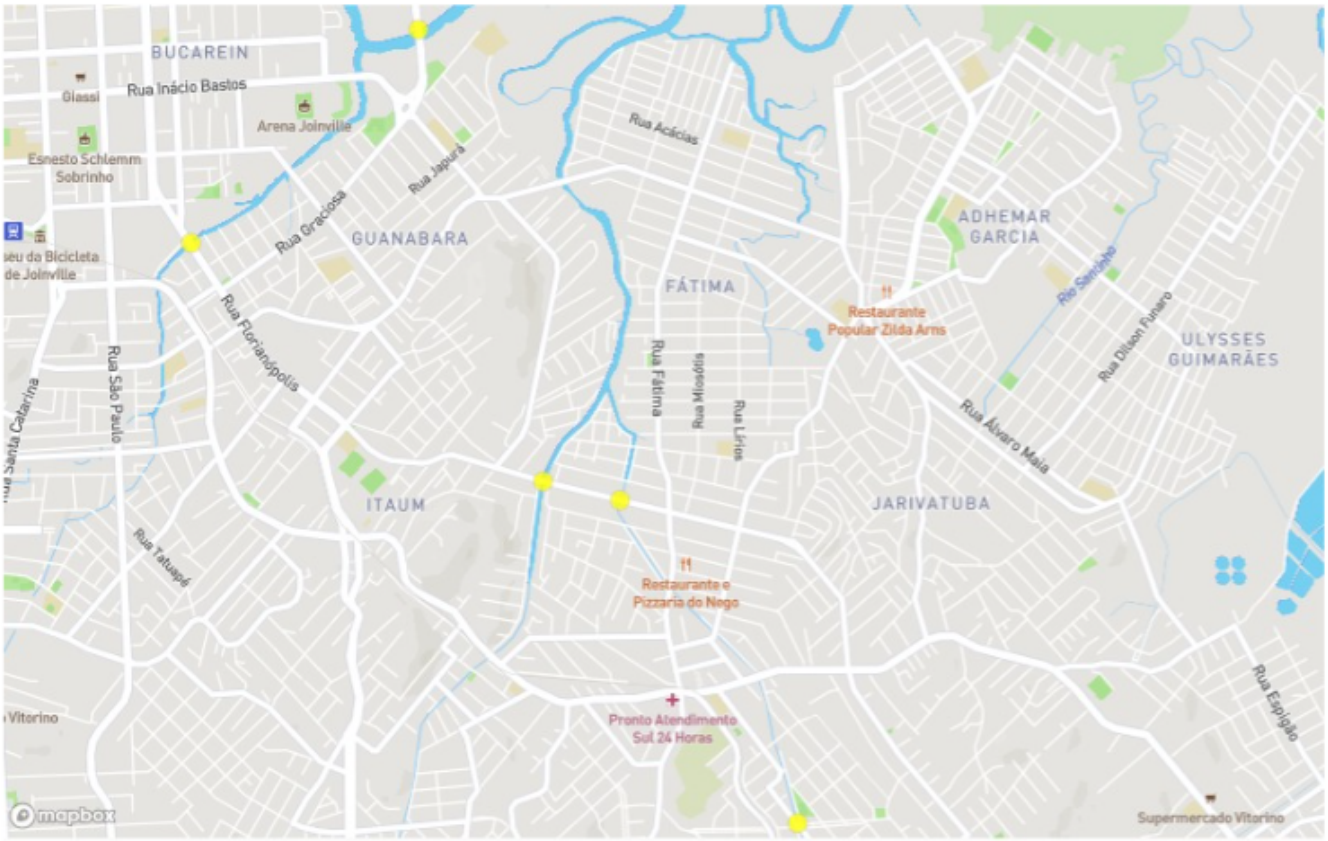

1. 4. 10. **Informações do 5° indicador:**
Nome: INDICADOR 1: Tempo de deslocamento por transporte coletivo entre as porções NE/SE

Descrição:
Diminuição do tempo necessário para o deslocamento entre o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (NE) até a Escola Municipal Centro de Atenção Integral à Criança Professor Mariano Costa - CAIC Adhemar Garcia (SE). Atualmente, para a população do Bairro Adhemar Garcia realizar um deslocamento por ônibus até o Hospital Regional NE, são necessárias duas paradas em estações (Guanabara e Centro), e o uso de (1301, 0140, 0406) 3 linhas para vencer o percurso. Com a execução das obras previstas neste programa, novas linhas serão criadas ou adaptadas com a possibilidade do trajeto via Ponte Joinville, implicando na redução do tempo de viagem no T.C.

entre as porções sudeste e nordeste da cidade.

Objetivos específicos relacionados no programa:

a) Requalificar a infraestrutura urbana em áreas prioritárias

b) Executar obras de conectividade territorial, incluindo pontes e acessos viários estruturantes, para integrar regiões fragmentadas, reduzir o tempo de deslocamento e ampliar o acesso a serviços e oportunidades urbanas.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

S (Específico): Mede o tempo de deslocamento das linhas do transporte coletivo entre as porções NE e SE da cidade.

M (Mensurável): Tempo de viagem em minutos entre estações do T.C.

A (Atingível): O programa contempla obras que integram urbanização de novas vias e execução de novas pontes, incluindo tratamentos priorizados ao transporte coletivo, sendo possível melhorar o tempo de deslocamentos de novas linhas do sistema.

R (Relevante): Está diretamente alinhado ao OE 214 e 111 do PPA, e também contribui para saúde pública, qualidade de vida e equidade territorial.

T (Temporal): Indicador quantitativo. Pode ser aferido qualitativamente com a análise por trechos de vias.

Demonstrativo de coerência entre o indicador e os objetivos:

A análise dos tempos de deslocamento no sistema de transporte coletivo da cidade é importante fonte de dados para novas leituras urbanas e fundamenta tomadas de decisão. O indicador é coerente com o escopo do programa na medida em que reduções significativas nos tempos de deslocamentos das pessoas, pelo modal, promovem o uso ou sua integração com modos outros modos de deslocamento, fortalecendo o sistema de transporte urbano e beneficiando a comunidade local com melhoria do acesso a serviços, economicidade nos deslocamentos e preservação ambiental pela não emissão de CO_2 no ar. Os efeitos dessas intervenções contribuem ainda para reduzir desigualdades socioespaciais e ambientais. Ao promover a redução dos tempos de viagens, o programa avança sobre metas essenciais do desenvolvimento urbano sustentável e da justiça ambiental.

Meta:
Linha de Base: 50 minutos (2024)

Meta: Redução de 20 minutos por viagem - tempo de percurso de 30 min ao final do Programa

1. 4. 11. **Informações do 6° indicador:**
Nome: INDICADOR 2: Oferta de serviços e comércios por bairros.

Descrição:
Número de novas unidades comerciais/serviços públicos ou privados abertos nos bairros atingidos por estas ações (alvarás formais). Monitoramento anual.

Objetivos específicos relacionados no programa:

a) Requalificar a infraestrutura urbana em áreas prioritárias

b) Executar obras de conectividade territorial, incluindo pontes e acessos viários estruturantes, para integrar regiões fragmentadas, reduzir o tempo de deslocamento e ampliar o acesso a serviços e oportunidades urbanas.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

S (Específico): Identifica o número de novos alvarás formais de comércios e serviços nas vias beneficiadas.

M (Mensurável): Número total de novos alvarás nas vias beneficiadas e porcentagem de usos por bairros.

A (Atingível): O programa contempla obras que integram urbanização de novas vias e execução de novas pontes, incluindo tratamentos priorizados aos transportes ativos e coletivos, bem como SBNs, promovendo fortemente mudanças no uso e ocupação do solo no seu entorno imediato e área de influência indireta.

R (Relevante): Está diretamente alinhado ao OE 214 e 111 do PPA, e também contribui para saúde pública, qualidade de vida e equidade territorial.

T (Temporal): Indicador quantitativo podendo aferir resultados em curto e médio prazos.

Demonstrativo de coerência entre o indicador e os objetivos:

O indicador é coerente com o escopo do programa na medida em que o incremento do número de alvarás formais para comércios e serviços nas áreas e bairros e vias beneficiadas indicam os efeitos positivos indiretos apontados pelos objetivos iniciais. A oferta de infraestrutura viária induz a ocupação e o uso do solo das áreas diretamente atingidas pelas obras previstas para as porções NE e SE de Joinville, promovendo novas dinâmicas urbanas e oportunidades socioeconômicas. O aumento dos índices de completude de bairros também inclui em sua base referencial de cálculo a oferta destes usos, indicador importante dentro da área do planejamento urbano de cidades sustentáveis.

Meta:
Linha de Base: unidades econômicas com uso comercial e unidades econômicas com uso de serviços por vias atingidas (Alvarás SAMA, 2025).

Região Nordeste (Espinheiros, Comasa e Boa Vista):

Uso	Total U.E.	%
Comercial	13	1,06
Serviços	13	1,06

Região Sudeste (Paranaguamirim, Ulysses Guimarães, Adhemar Garcia, Fátima, Jarivatuba):

Uso	Total U.E.	%
Comercial	69	3,99
Serviços	40	2,08

Meta: Incremento anual de 3%.

Atualização elaborada com base no número de novos alvarás formalizados na Secretaria de Meio Ambiente - SAMA.

1. 4. 12. **Informações do 7° indicador:**
Nome: INDICADOR 5: Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas

Descrição:
Aumentar a proporção de gestantes, com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas durante a gestação, sendo a primeira consulta realizada até a 12ª semana de gestação.

Objetivos específicos relacionados no programa:

c) Ampliar e qualificar a rede de atenção primária em saúde por meio da construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), garantindo infraestrutura adequada, acessível e integrada às comunidades atendidas.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

S (Específico): Mede a quantidade de gestantes que passaram a ter pelo menos 6 consultas durante a gestação.

M (Mensurável): Números absolutos das gestantes atendidas.

A (Atingível): O programa contempla construção de 9 novas UBSF e ampliação de mais 2, o que vai incidir diretamente no aumento do número de atendimentos no Município.

R (Relevante): Está diretamente alinhado ao OE 102 do PPA, e também contribui para saúde pública, qualidade de vida e diminuição da mortalidade infantil neonatal e materna.

T (Temporal): Pode ser aferido anualmente a partir da conclusão das obras e/ou comparações parciais com a linha de base 2021.

Meta:
Linha base: 2021 - 43%

Meta: ao final do Programa - 65%

Fonte: Plano Municipal de Saúde de Joinville, 2021

Numerador: Número de gestantes com pelo menos 06 consultas de pré natal, sendo a primeira consulta até a 12ª semana de gestação
Denominador: Número de gestantes com pré-natal na APS.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: 1 - Revitalização Urbana
Valor estimado em Dólar (USD): 1.900.000,00

Descrição:
O **Componente 1 – Revitalização Urbana** tem como foco central o desenvolvimento das bases técnicas e legais que viabilizarão a execução das intervenções estruturantes do programa. Compreende a elaboração de projetos executivos de engenharia, urbanismo e infraestrutura urbana, bem como os estudos necessários para a obtenção do licenciamento ambiental de obras com alta relevância territorial, funcional e ambiental.

Esse componente tem caráter preparatório, transversal e estratégico, pois garante a maturidade técnica e jurídica dos investimentos a serem realizados nos demais componentes do programa. A sua implantação viabiliza a execução de ações em áreas com significativa vulnerabilidade socioespacial e ambiental, onde serão promovidas transformações urbanas pautadas em soluções sustentáveis, integração territorial e qualificação de espaços públicos.

Entre os principais produtos, destacam-se os projetos executivos da Via Parque - eixo estruturante que interligará as regiões nordeste e sudeste da cidade, os projetos para cerca de 20 km de vias urbanas na porção sudeste do município, e os projetos viários de acesso às pontes Joinville e Espinheiros. Além disso, compreende a elaboração dos estudos necessários ao licenciamento ambiental das intervenções, especialmente da Via Parque, cuja implantação atravessa áreas ambientalmente sensíveis.

Esse componente responde diretamente a problemas como a falta de planejamento técnico integrado, a fragilidade na regularização ambiental prévia das obras públicas e a baixa capacidade institucional de resposta aos desafios da urbanização desordenada e das mudanças climáticas.

Resultados esperados com a implantação do componente:

1- Maior maturidade técnica e ambiental dos projetos incluídos no programa

2- Redução de riscos operacionais, jurídicos e ambientais na execução das obras

3 -Melhoria da eficiência dos investimentos públicos com base em projetos bem dimensionados

4 -Fortalecimento da capacidade institucional do município para planejamento urbano sustentável

Alinhamento com os objetivos específicos do programa:

(a) Elaborar estudos e projetos técnicos e obter licenciamentos ambientais

(b) Requalificar a infraestrutura urbana em áreas prioritárias

(e) Contribuir para a adaptação da cidade às mudanças climáticas e à redução da vulnerabilidade urbana

Contribuição para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas

OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Descrição de subcomponentes e produtos:
O **Componente 1** tem como foco central o desenvolvimento das bases técnicas e legais que viabilizarão a execução das intervenções estruturantes do programa. Compreende a elaboração de projetos executivos de engenharia e urbanismo, bem como os estudos necessários para o licenciamento ambiental de obras de grande relevância para a integração territorial, a mobilidade urbana e a qualificação de espaços públicos em regiões com vulnerabilidade socioespacial.

Este componente tem caráter preparatório, transversal e estratégico, pois garante a maturidade técnica e jurídica dos investimentos a serem realizados nos demais componentes. Suas ações também asseguram que as intervenções propostas estejam em conformidade com a legislação ambiental e orientadas pelos princípios de sustentabilidade urbana, resiliência climática, acessibilidade e equidade territorial. A seguir, apresentam-se os produtos vinculados ao componente:

Produto 1.1.1 – Estudos e Projetos

Este produto compreende a contratação e elaboração de projetos executivos de engenharia, urbanismo e infraestrutura urbana para áreas estratégicas do município de Joinville, com foco em promover a integração territorial, a qualificação dos espaços públicos e a preparação técnica para as intervenções físicas previstas nos demais componentes do programa.

As ações incluem:

Elaboração de estudos e projetos executivos para a Via Parque, localizada entre as regiões nordeste e sudeste da cidade, visando a integração urbana de uma área densamente habitada, atendendo diretamente a 55 mil pessoas e 82 mil habitantes indiretamente, por meio de soluções sustentáveis de mobilidade e infraestrutura urbana. Os projetos abrangerão o conceito Ruas Completas (WRI), considerando pavimentação, drenagem sustentável, estruturas de mobilidade ativa como calçadas acessíveis, ciclovias, sinalização, arborização urbana, áreas de lazer, canteiros drenantes e equipamentos comunitários, iluminação e mobiliário urbano;

Contratação de projetos executivos de aproximadamente 20 km de vias localizadas na porção sudeste do município, voltadas à requalificação urbana em áreas com alto grau de vulnerabilidade socioambiental. Essas vias receberão planejamento integrado de infraestrutura urbana, priorizando sistemas de microdrenagem sustentável, acessibilidade universal, arborização e equipamentos urbanos de apoio comunitário;

Elaboração de projetos de estruturação viária para os acessos às pontes Joinville e Espinheiros, com foco em adequação geométrica, qualificação urbana e segurança viária. As intervenções pretendidas têm por objetivo garantir que as conexões de entrada e saída das pontes estejam dimensionadas e integradas ao novo padrão de mobilidade previsto pelo programa, evitando gargalos e promovendo fluidez ao sistema viário local.

Esses estudos são estratégicos para viabilizar as intervenções futuras com base técnica, segurança jurídica e integração urbana, social e ambiental.

Produto 1.1.2 – Licenciamento Ambiental

Este produto contempla a elaboração de todos os estudos necessários à obtenção do Licenciamento Ambiental da Via Parque, abrangendo sua totalidade no trecho compreendido entre a Avenida Santos Dumont e a Rua Max Boehm, com extensão aproximada de 12 km.

A ação inclui:

- Diagnóstico ambiental detalhado da área de intervenção

- Levantamento de restrições legais e áreas de preservação permanente (APPs)

- Análise de alternativas locacionais e traçados

- Definição de medidas mitigadoras e compensatórias

- Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado (RAS), Estudo de Impacto Ambiental (EIA), ou o instrumento requerido pela autoridade licenciadora

- Suporte técnico ao município para tramitação do licenciamento junto aos órgãos competentes

Esse produto visa garantir a conformidade legal e ambiental das intervenções estruturantes, especialmente da Via Parque, cuja implantação atravessa áreas com sensibilidade ecológica e importância estratégica para a drenagem urbana e a integração territorial. O licenciamento ambiental é uma condição necessária para o início das obras e reforça o compromisso do programa com a sustentabilidade e a prevenção de riscos socioambientais.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: 2 - Infraestrutura Urbana Sustentável e Conectividade Territorial
Valor estimado em Dólar (USD): 81.400.000,00

Descrição:
O **Componente 2 – Infraestrutura Urbana Sustentável** e Conectividade Territorial compreende a execução de intervenções físicas voltadas à requalificação urbana e à integração territorial de áreas vulneráveis da cidade de Joinville, com foco na sustentabilidade, na mobilidade ativa, na acessibilidade e na segurança viária. As ações deste componente visam transformar o ambiente urbano por meio de obras estruturantes em regiões com baixo nível de urbanização e alta vulnerabilidade socioambiental, especialmente na porção sudeste do município.

Este componente abrange duas frentes principais de atuação:

Requalificação Urbana Sustentável: execução de obras em aproximadamente 20 km de vias que receberão infraestrutura completa, incluindo pavimentação, microdrenagem com soluções sustentáveis, calçadas acessíveis, ciclovias, arborização urbana, sinalização viária, canteiros drenantes e equipamentos comunitários. As intervenções ocorrerão em áreas com adensamento populacional significativo e baixo padrão urbanístico, promovendo acessibilidade, qualidade ambiental, valorização territorial e segurança para todos os modos de transporte.

Obras de Arte Especiais: implantação das pontes Joinville e Espinheiros, com seus respectivos acessos, ambas com papel estratégico na conexão entre setores urbanos hoje desconectados fisicamente. Em função da sua complexidade técnica, essas obras exigirão projetos específicos elaborados por equipes especializadas e execução cuidadosa, com gestão de riscos operacionais, ambientais e viários. As pontes serão adaptadas à mobilidade ativa e conectadas ao sistema viário revitalizado, promovendo fluidez, acessibilidade universal e integração funcional do território.

Este componente responde diretamente aos seguintes problemas identificados no diagnóstico: deficiência de infraestrutura urbana em regiões periféricas, baixa conectividade territorial, exclusão socioespacial, e ausência de soluções resilientes de drenagem e mobilidade urbana integrada.

Resultados esperados com a implantação do componente:

1- Melhoria significativa das condições urbanas e ambientais em áreas vulneráveis

2- Aumento da segurança, acessibilidade e conforto nos deslocamentos urbanos

3- Redução da exposição a alagamentos e melhoria da drenagem urbana

4 -Integração entre bairros isolados por barreiras naturais, por meio de novas conexões estruturantes

5 -Fortalecimento da coesão urbana e revalorização dos espaços públicos

Alinhamento com os objetivos específicos do programa:

(b) Requalificar a infraestrutura urbana em áreas prioritárias;

(c) Executar obras de conectividade territorial, incluindo pontes e acessos viários estruturantes;

(e) Contribuir para a adaptação da cidade às mudanças climáticas e à redução da vulnerabilidade urbana.

Contribuição para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas

OE 210: Promover maior eficiência logística com valorização dos modais

OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

Descrição de subcomponentes e produtos:
S2.1 Requalificação Urbana

Organização e preparação do ambiente físico para atendimento das exigências técnicas ambientais em consonância às premissas legais e às boas práticas projetuais, visando a consolidação da centralidade e conectividade urbana com a Implantação de sistemas transição entre o ambiente construído para o natural, prevendo vias, passeios e áreas de convívio social que atendam as características projetuais de soluções baseadas na natureza, ao deslocamento e de modais apropriados às intervenções, a partir dos equipamentos públicos existentes.

P2.1.1 - Execução de Intervenções Urbanas Sustentáveis

Implementação de obras e ações que promoverão a revitalização e requalificação urbana, através da implementação do conceito de “Ruas Completas”(WRI), considerando a infraestrutura de pavimentação, drenagem sustentável, implantação de estruturas cicloviárias, sinalização, iluminação, rede de serviços, arborização, canteiros drenantes, calçadas acessíveis e mobiliário urbano. Também serão feitas intervenções para melhorias em praças e áreas de lazer, promovendo bem-estar e coesão social dentro das comunidades urbanas. Isso porque ao oferecer ambientes propícios para atividades recreativas, esses lugares contribuem diretamente para a saúde física e mental dos cidadãos.

P2.1.2 - Implantação de mobilidade ativa e revitalização dos acessos à Ponte Joinville

Esta ação compreende a estruturação física das vias que compõem os acessos à Ponte Joinville. Visa atender a demanda de deslocamento entre as regiões NE/SE da cidade, garantindo às vias que possibilitam esse acesso, infraestrutura compatível com o uso que será propiciado. Na cabeceira “N”, prevê-se a implementação de um “quadrinário” envolvendo as vias que possibilitam acesso direto à ponte. As vias que compõem o eixo de acesso e saída da ponte, receberão o tráfego individual e de carga, enquanto que as vias paralelas imediatas ,serão tratadas e otimizadas para o trânsito de transporte coletivo público, bicicletas e pedestres. Na cabeceira “S”, a Ponte Joinville conecta-se à Av. Alvino Hansen, (2,0 km) via essa já implantada com 30m de largura, considerando o recebimento do trânsito previsto, no entanto, necessita de adequação e revitalização, consilhando a nova movimentação às condicionantes de segurança de trânsito e Mobilidade, incluindo a infraestrutura de pavimentação, drenagem sustentável, implantação de estruturas cicloviárias, rede de serviços, sinalização, iluminação, arborização urbana, canteiros drenantes, calçadas acessíveis e equipamentos comunitários.

S2.2 - Obras de Arte Especial (OEA)

A Obra de Arte Especial pela característica de sua definição técnica, consiste na elaboração e execução de obras estruturais específicas para atendimento de demandas direcionadas para a transposição de obstáculos físicos ou geográficos através de pontes , viadutos, passarelas, galerias e etc. Considera-se para efeito deste Programa a

implementação de (OAE) a continuidade da Ponte Joinville e a construção da Ponte Espinheiros.

P2.2.1 - Execução da Ponte Joinville (complementação)

A ação consiste na complementação para continuidade da execução da Ponte Joinville sobre o rio Cachoeira, cuja obra está em andamento e hoje, com 15% executada. A ponte tem extensão total de 980 metros e 26,48 metros de largura, formada por duas faixas para circulação de veículos, transporte público e área especial para bicicletas e pedestres de acordo com o projeto. A ponte fará a ligação entre os bairros Adhemar Garcia (zona Sudeste) e Boa Vista (zona Leste), transpondo a barreira física imposta pelo rio Cachoeira, propiciando a conectividade entre regiões NE e SE que possuem mais de 200 mil habitantes. A ponte está em execução e necessita de recursos financeiros complementares para conclusão.

P2.2.2 - Execução da Ponte Espinheiros, mobilidade ativa e acessos

A ponte Espinheiros fará a conexão entre os Bairros Espinheiros e Comasa. Vital para a continuidade da malha viária e atendimento à demanda de mobilidade na região, também terá a função de atendimento da população no caso de algum impedimento à única ponte existente para o acesso à “Ilha de Espinheiros”. Com aproximadamente 300m de extensão, realizará a conectividade intra urbana atendendo diretamente a população de aproximadamente 10 mil habitantes.

Esta ação compreende também a estruturação de 8 km de vias que promovem o acesso à Ponte Espinheiros, vias estas que serão beneficiadas com a infraestrutura de pavimentação, drenagem sustentável, implantação de estruturas cicloviárias, sinalização, iluminação, arborização urbana, canteiros drenantes, calçadas acessíveis e equipamentos comunitários.

A conexão da ponte interliga-se ao trecho previsto para a Via Parque, abrangendo os equipamentos de saúde, ensino e de preservação (Sambaqui). A requalificação destas vias direcionarão os fluxos em adequação à circulação proposta, formatando um sistema de deslocamento que privilegiam os acessos aos equipamentos públicos.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: 3 - Ampliação de Atenção Primária à Saúde e Qualidade de Vida
Valor estimado em Dólar (USD): 13.000.000,00

Descrição:
O **Componente 3 – Ampliação da Atenção Primária à Saúde e Qualidade de Vida** compreende a execução de intervenções físicas voltadas à ampliação da cobertura e à qualificação da infraestrutura da rede de Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Joinville. As ações deste componente visam melhorar o acesso da população aos serviços públicos de saúde por meio da construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), com foco na promoção da saúde, na prevenção de agravos e na melhoria da qualidade de vida.

As intervenções estão concentradas em regiões com alta vulnerabilidade social, baixa cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) e infraestrutura física inadequada, promovendo a universalização do atendimento e a integralidade do cuidado.

Este componente abrange duas frentes principais de atuação:

Construção de novas UBSF (Vilas da Saúde): Implantação de estruturas modernas, acessíveis e adaptadas à realidade local, com áreas internas para atendimento clínico, odontológico, enfermagem e saúde coletiva, além de espaços externos destinados à convivência comunitária, lazer e atividades físicas. As novas unidades seguirão o conceito de “Vilas da Saúde”, oferecendo pistas de caminhada, academias ao ar livre, playgrounds e áreas cobertas para uso em dias chuvosos.

Reforma e ampliação de UBSF existentes: Requalificação de unidades já em operação, com adequações às normas sanitárias e de acessibilidade, reorganização de fluxos e ampliação da capacidade instalada, garantindo maior conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

Este componente responde diretamente aos seguintes problemas identificados no diagnóstico: insuficiência de cobertura da APS em áreas prioritárias, inadequação da infraestrutura existente, dificuldade de acesso aos serviços de saúde e falta de espaços públicos voltados à promoção de hábitos saudáveis e ao fortalecimento do vínculo com a comunidade.

Resultados esperados com a implantação do componente:

1- Ampliação da cobertura da Atenção Primária à Saúde no território

2 -Melhoria da infraestrutura física e da ambiência dos serviços de saúde

3 -Redução do tempo de espera e aumento da resolutividade do atendimento básico

4 -Promoção de hábitos saudáveis por meio da integração entre saúde, lazer e convivência

5 -Fortalecimento dos vínculos comunitários e da atuação multiprofissional no SUS

Alinhamento com os objetivos específicos do programa:

(a) Elaborar estudos e projetos técnicos e obter licenciamentos ambientais

(d) Ampliar a cobertura e a qualidade da Atenção Primária à Saúde em regiões prioritárias

(e) Contribuir para a adaptação da cidade às mudanças climáticas e à redução da vulnerabilidade urbana

Contribuição para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis.

OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na qualidade de vida.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P3.1.1 - Construção de UBSF e Vilas da Saúde

Construção de 9 (nove) novas Unidades Básicas de Saúde da Família nas regiões nordeste e sudeste da Cidade. Estas unidades serão construídas com infraestrutura necessária para propiciar os serviços oferecidos pelas UBSF como consultas com clínico geral, ginecologista, pediatra, psiquiatra, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, atendimento odontológico, exames preventivos de câncer de colo de útero e de mamas, administração e fornecimento de medicamentos, vacinação e demais serviços de atenção básica em saúde.

As unidades foram projetadas de forma sustentável com intuito de melhorar a eficiência energética nos edifícios e reduzir o consumo de energia de forma prática e sustentável, utilizando de recursos como isolamento térmico, iluminação eficiente, uso de energias renováveis, e também fazer captação, armazenamento e aproveitamento da água da chuva.

Além da construção da UBSF, as unidades serão contempladas com a construção das Vilas da Saúde anexas, conformadas com espaços de lazer externos e espaço coberto voltados à prática de atividades físicas e lazer, com o objetivo de promover a saúde física e mental, compostos por academia da melhor idade, academia fixa, playground, quadras de esporte, pergolados, espaços para jogos, pistas de corrida e caminhada

P3.1.2 - Ampliação e Reforma de UBSF

Ampliação e reforma de 2 (duas) UBSF. As edificações que receberão intervenções apresentam características funcionais e tipicidade de uma edificação destinada a Unidade de Saúde com atendimento de público. Além de melhorias na edificação, as UBSF contemplarão de espaço coberto externo para a prática de atividades físicas, assim como academia da melhor idade e playground. O projeto buscou proporcionar segurança e qualidade de trabalho aos servidores municipais, refletindo em conforto, rapidez e acessibilidade ao munícipe, além de garantir qualidade do meio ambiente laboral, espaços internos claros, arejados e confortáveis. Acessibilidade fácil e autônoma para pessoas com deficiência, atendendo às normas vigentes e às prescrições da Vigilância Sanitária Municipal.

Além dos aspectos apresentados, o projeto trouxe soluções para o uso racional e eficiente de energia e água e sistema de coleta seletiva de lixo hospitalar.





1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**

Nome: 4 - Gestão de Desapropriações e Contrapartidas Imobiliárias
Valor estimado em Dólar (USD): 8.250.000,00

Descrição:
O **Componente 4 – Gestão de Desapropriações e Contrapartidas Imobiliárias** compreende as ações voltadas à regularização fundiária e à disponibilização de áreas estratégicas para viabilizar a implantação das obras previstas no programa. As ações incluem a execução de processos de desapropriação e a mobilização de imóveis públicos municipais, com o objetivo de garantir segurança jurídica, disponibilidade territorial e eficiência na implementação dos componentes de infraestrutura, saúde e mobilidade urbana.

As desapropriações incidem sobre áreas prioritárias localizadas nas regiões de influência das obras de acesso às **Pontes Joinville e Espinheiros**, bem como em trechos do sistema viário a ser requalificado. A seleção dos imóveis considera critérios de viabilidade técnica, regularidade jurídica, localização estratégica e relação custo-benefício, conforme traçados e projetos preliminares das intervenções.

Paralelamente, o município utilizará **imóveis públicos de sua titularidade** como contrapartida institucional para a implantação das **Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs)** e outras intervenções previstas, otimizando o uso do patrimônio existente e reduzindo a necessidade de aquisição de novas áreas.

Este componente responde diretamente à necessidade de garantir **disponibilidade fundiária adequada e tempestiva**, mitigando riscos operacionais, jurídicos e financeiros associados à posse ou à regularização dos terrenos.

Resultados esperados com a implantação do componente:

1- Disponibilização legal e técnica das áreas necessárias para implantação das obras

2- Mitigação de riscos de atraso por entraves fundiários ou disputas de posse

3- Redução de custos operacionais por meio da utilização de imóveis já pertencentes ao município

4- Atendimento integral às condicionantes legais de domínio e uso do solo exigidas para operações de crédito externo

Descrição de subcomponentes e produtos:
P4.1.1 Desapropriações

As áreas a serem desapropriadas visam a integração e a gestão de atendimento da população. Estão situadas em pontos que abrangem com maior eficácia a área de influência e entorno destes equipamentos e foram estimadas com base em estudos preliminares dos traçados da Ponte Espinheiros e das vias de acesso às pontes em execução no Programa e baseiam-se na relação entre custo/benefício e assertividade quanto ao uso futuro e condições técnicas e legais para o desenvolvimento de obras e projetos.

Estima-se que serão desapropriadas 25 propriedades, que somadas totalizam uma área aproximada de 10 mil metros quadrados. Esses números ainda serão refinados, com a elaboração dos projetos executivos. A desapropriação será efetuada indenizando os proprietários, utilizando recursos próprios do município.

4.1.2 Disponibilização de imóveis públicos municipais

Os terrenos são de propriedade do Município (**Anexo 2**) e serão utilizados para as obras de reforma, ampliação e construção das UBSF, contempladas neste Programa. Os valores dos terrenos foram calculados com base no Laudo de Avaliação realizado por avaliador independente e estão disponibilizados no **Anexos 2.1 e 2.2**.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: 5 - Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 1.700.000,00

Descrição:
O **Componente 5 – Gestão do Programa** contempla ações essenciais para assegurar a execução eficiente, transparente, integrada e em conformidade técnica, ambiental e financeira de todas as etapas do programa. Este componente reúne os instrumentos de apoio à coordenação, supervisão e controle da implementação das ações, constituindo a base operacional que sustenta a boa governança do programa ao longo de seu ciclo de vida.

As atividades previstas estão voltadas à gestão programática, institucional e fiduciária do programa, e compreendem desde o apoio direto à unidade executora, até a supervisão técnica e ambiental das obras e a realização de auditorias externas independentes.

O componente está estruturado em três produtos complementares:

Apoio ao Gerenciamento do Programa: conjunto de serviços especializados voltados à estruturação e funcionamento da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), incluindo assessorias técnicas e operacionais nas áreas de engenharia, ambiental, social, jurídica, administrativa e financeira, bem como suporte ao monitoramento, comunicação e articulação institucional.

Supervisão Técnica, Ambiental e Social: contratação de empresa ou consórcio especializado para acompanhar e fiscalizar a execução física das obras, garantindo o cumprimento dos projetos, prazos, custos e padrões de qualidade. Inclui a supervisão dos aspectos socioambientais, com foco no cumprimento das condicionantes legais, mitigação de impactos, relacionamento com comunidades e salvaguardas ambientais e sociais.

Auditoria Externa: realização de auditorias independentes com foco na verificação da conformidade contábil, financeira e operacional da execução do programa, em consonância com os marcos normativos do financiador e da legislação brasileira. As auditorias reforçam a transparência e a rastreabilidade dos recursos, prestando contas à sociedade e aos órgãos de controle.

A implantação desse componente é indispensável para assegurar a integridade dos processos, o alcance dos resultados planejados e a boa utilização dos recursos públicos e do financiamento externo. Além disso, contribui para o fortalecimento da capacidade institucional do Município de Joinville na gestão de projetos complexos e multissetoriais.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P5.1.1 Apoio ao Gerenciamento do Programa

Este produto compreende a contratação de serviços especializados de apoio técnico, administrativo e institucional à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). As atividades incluem:

- Assessorias técnicas nas áreas de engenharia, planejamento, meio ambiente, social, jurídica, administrativa e financeira

- Monitoramento físico e financeiro do programa, com consolidação de informações e apoio à tomada de decisão

- Organização dos processos internos da UCP, controle de prazos e contratos

- Suporte à comunicação institucional e à articulação com os órgãos envolvidos

- Apoio à conformidade com as normas do financiador e aos marcos legais e regulatórios nacionais

O objetivo é estruturar e manter em pleno funcionamento a UGP, fortalecendo a capacidade de coordenação do Município de Joinville na condução de um programa multissetorial de alta complexidade.

P5.1.2 Supervisão Técnica, Ambiental e Social

Os serviços de supervisão das obras compreenderão o apoio à Prefeitura de Joinville na fiscalização das obras programadas em contratos firmados com terceiros. Também compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos.

Para o desempenho do apoio ao serviço de fiscalização e acompanhamento de obras estão previstas as seguintes atividades básicas de campo, realizadas no local de implantação das mesmas:

- Controle da qualidade técnica dos serviços contratados

- Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos

- Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços

- Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto

- Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente

- Controle dos faturamentos da obra, verificando as quantitativos efetivamente medidos

- Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos

- Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de soluç?o para as problemas decorrentes da execução contratual

- Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra

P5.1.3 Auditoria Externa

Este produto prevê a realização de auditorias externas independentes ao longo da execução do programa, com o objetivo de verificar a conformidade contábil, financeira e operacional dos recursos utilizados, tanto do financiamento externo quanto da contrapartida nacional.

- As auditorias contemplarão:

- Análise das demonstrações financeiras e registros contábeis

- Verificação da legalidade e regularidade das despesas executadas

- Avaliação da conformidade dos processos de aquisição, contratação e medição de obras

- Rastreabilidade dos recursos aplicados

- Emissão de pareceres técnicos com recomendações para aprimoramento dos processos de gestão

As auditorias contribuirão para a transparência, o controle social e a credibilidade institucional do programa, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das exigências do agente financiador.

1. 6. **Beneficiários**

O programa é direcionado a setores da população de Joinville que apresentam elevadas vulnerabilidades socioespaciais, resultantes de deficiências em infraestrutura urbana, mobilidade, acesso a serviços públicos e condições habitacionais inadequadas. Com base em análises e estudos técnicos, define-se que os principais beneficiários se organizam em duas áreas de influência: a Porção Nordeste e a Porção Sudeste da cidade, cujos perfis socioeconômicos e quantitativos foram detalhados a seguir.

Porção Nordeste:
Composta pelos bairros Aventureiro, Jardim Iririú, Comasa, Boa Vista, Zona Industrial e Espinheiros, a Porção Nordeste soma aproximadamente 118.096 habitantes.

Além disso, estima-se que a população diretamente impactada pela implantação do Eixo Ecológico, dentro de um raio de 500 metros, alcance cerca de 55.623 habitantes. A implantação da nova ponte para conectar o bairro Espinheiros ao Comasa impacta diretamente aproximadamente 9.895 habitantes, conforme dados estimados pela SEPUR e IBGE para 2022. Vale ressaltar que o bairro Espinheiros, considerado como uma "ilha" devido ao seu acesso limitado (atualmente, o único acesso terrestre ocorre via ponte da Rua Baltazar Buschle), possui um potencial de expansão urbana considerável, com estudos indicando um incremento populacional que pode chegar a até 40.000 habitantes. Adicionalmente, o Espinheiros apresenta características de potencial turístico, com atividades costeiras, restaurantes especializados e equipamentos como o Joinville Iate Clube e o píer do Barco Príncipe, em cuja orla estão previstas intervenções de revitalização e implantação de novos píeres flutuantes.

Porção Sudeste:
Composta por 14 bairros, a Porção Sudeste concentra aproximadamente 170.697 habitantes, distribuídos entre os bairros Guanabara, Adhemar Garcia, Fátima, Jarivatuba, Ulisses Guimarães, João Costa, Itaum, Profipo, Petrópolis, Boehmerwald, Santa Catarina, Itinga, Parque Guarani e Paranaguamirim.
Nesta região, as intervenções de revitalização e requalificação urbana visam transformar vias não pavimentadas, proporcionando uma melhoria significativa nos fluxos viários e na drenagem urbana, com o consequente benefício para a população que utiliza essas vias, bem como contribuir para proteção dos cursos d'água em períodos de chuvas intensas.

Atenção Primária e Benefícios Sociais:
Adicionalmente, o programa amplia os serviços de saúde por meio da modernização e ampliação das UBSF, beneficiando diretamente 120.276 habitantes da área de abrangência das 11 novas ou requalificadas unidades. Dentre esses, aproximadamente 7.758 famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, evidenciando o impacto significativo sobre as populações de menor renda.

Condições Socioeconômicas e Carências:
Os beneficiários do programa são majoritariamente moradores de áreas com alta densidade populacional, baixa infraestrutura urbana consolidada e acesso limitado a serviços públicos de saúde, educação e mobilidade. Historicamente, essas localidades apresentam carências como ruas sem pavimentação, sistema de drenagem ineficiente e dificuldade de acesso aos equipamentos sociais, o que acarreta maior risco de exclusão territorial e vulnerabilidade socioambiental. A implementação do programa visa, portanto, melhorar a qualidade de vida desses cidadãos, promovendo a equidade no acesso a infraestrutura básica, o fortalecimento da rede de saúde e a revitalização dos espaços públicos, contribuindo para a melhoria dos determinantes sociais e a promoção do desenvolvimento sustentável.

1. 7. **Anexos**

Anexo 1- Eixo 2

Anexo 2 - Terrenos contrapartida - Tabela Valores

Anexo 2.1 - Laudos Imobiliários P1

Anexo 2.2 - Laudos Imobiliários P2

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Alinhamento e contribuição específica do Programa a cada um dos Objetivos Estratégicos (OE) previstos no PPA 2024–2027, bem como o nível de adequação e impacto segundo os critérios estabelecidos pela COFIEX:

1. OE 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade

O Programa contribui diretamente com o inciso IV do §3°, art.15, da Resolução 01/2024: IV-saúde: atenção primária e especializada.

Fortalecimento da Atenção Primária: O programa contempla a construção, ampliação e reforma de 11 UBSFs, com estrutura moderna e acessível. As novas unidades seguirão o conceito de Vilas da Saúde, com áreas externas para lazer, convivência e atividades físicas

Ampliação do acesso: Novas UBSFs ampliam significativamente a cobertura da Estratégia Saúde da Família, em regiões com baixa oferta de serviços públicos, atendendo populações vulneráveis

Promoção da saúde integral: As unidades proporcionarão atendimento qualificado, com horários estendidos e integração de ações preventivas e promocionais, reduzindo internações por causas evitáveis

Nível de adequação e impacto: Nível A

Justificativa:

Objetivos G e E: Alinhamento direto com o fortalecimento do SUS, em especial da atenção primária

Indicadores e metas SMART: 4, 5

Alocação de recursos: Investimento relevante destinado à estruturação da APS

Componentes vinculados: C 3 – Atenção Primária e Qualidade de Vida

Soluções eficientes: O modelo de Vilas da Saúde é inovador e replicável

2. OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

Urbanização sustentável: O programa promove a requalificação de cerca de 20 km de vias com soluções verdes, calçadas acessíveis, ciclovias, arborização e drenagem sustentável em áreas vulneráveis

Conectividade territorial: A construção das pontes Joinville e Espinheiros conecta regiões urbanas separadas, ampliando o acesso seguro a serviços e espaços públicos

Acesso equitativo à infraestrutura: O projeto garante transporte público acessível, mobilidade ativa e reorganização funcional do território

Nível de adequação e impacto: A

Justificativa:

Objetivos G e E: Estruturados para promover cidades mais conectadas e inclusivas

Indicadores e metas SMART: 1, 2, 3, 6

Recursos alocados: Parte significativa do orçamento destinada à infraestrutura urbana sustentável

Componentes vinculados: C 1 e 2

Soluções replicáveis: Integração de drenagem verde, mobilidade e serviços sociais

3. OE 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas

Contribuição do Projeto:

Espaços para atividade física: As UBSFs contarão com áreas externas para práticas esportivas e convivência, como pistas de caminhada, academias ao ar livre e quadras

Mobilidade ativa: A requalificação urbana prevê calçadas, ciclovias e acessos seguros, incentivando deslocamentos a pé e de bicicleta como formas cotidianas de exercício

Integração saúde-esporte: Os espaços promovem qualidade de vida, bem-estar e saúde mental, sobretudo em territórios de vulnerabilidade

Nível de adequação e impacto: A

Justificativa:

Objetivos G e E:: Alinhados à ampliação de espaços públicos para práticas saudáveis

Recursos alocados: Investimentos em Vilas da Saúde e infraestrutura urbana

Componentes vinculados: C 2 e 3

Soluções integradas: Saúde, lazer e urbanismo em uma abordagem replicável

4. OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Preservação urbana: A Via Parque atua como divisor ecológico, limitando a ocupação em áreas de manguezal e criando uma faixa de transição entre o natural e o construído

Soluções baseadas na natureza: As intervenções incluem drenagem sustentável, arborização e elementos verdes integrados ao desenho urbano

Gestão ambiental preventiva: O projeto prevê estudos ambientais e licenciamento completo, garantindo conformidade legal e sustentabilidade

Nível de adequação e impacto: A

Justificativa:

Objetivos G e E:: Foco na conservação e uso sustentável do solo urbano

Indicadores e metas SMART: 7

Recursos alocados: Investimentos relevantes nas fases de projeto e obras sustentáveis

Componentes vinculados: C 1 e 2

Soluções eficientes: A Via Parque é um modelo replicável de infraestrutura ecológica urbana

6. OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Infraestrutura resiliente: Adoção de drenagem verde, arborização e técnicas urbanas adaptadas para reduzir alagamentos e mitigar riscos climáticos

Redução da vulnerabilidade: As intervenções em áreas críticas, reduzindo a exposição de populações vulneráveis a eventos extremos

Ordenamento do território: A Via Parque promove o uso racional do solo urbano e evita a ocupação de áreas de risco

Nível de adequação e impacto: A

Justificativa:

Objetivos G e E:: Foco direto em adaptação climática e infraestrutura urbana segura

Indicadores e metas SMART: 6 e 7

Recursos alocados: Parte substancial do orçamento alocada em intervenções com impacto climático

Componentes vinculados: C 1 e 2

Soluções replicáveis: Estratégias urbanas baseadas na resiliência e sustentabilidade

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O arranjo institucional do Programa contará com três níveis de decisão: a) estratégico, b) de coordenação, gestão e execução e c) de apoio e acompanhamento à execução técnica e administrativa.

O nível estratégico será de responsabilidade da Secretaria de Administração e Planejamentos (SAP), que é a esfera responsável pelas decisões macro do Programa e pelo seu monitoramento e acompanhamento, bem como interlocução com o órgão financiador.

O nível de coordenação, gestão e execução é de responsabilidade dos principais órgãos da administração direta do município sobre o Programa que são a SAP, SEPUR, SEINFRA e SES. A SAP será a responsável pela gestão da Operação de Crédito Externo proposta. O planejamento e a organização do Programa serão conduzidos pela Unidade de Coordenação de Projetos (UCP) vinculada à SAP, conforme Decreto 30.953/2018, juntamente com as equipes de apoio designadas pela SEPUR e SEINFRA que serão criadas para o Programa e ainda pela SES, secretaria responsável pela Contrapartida.

As secretarias SEPUR e SEINFRA, por sua vez, serão responsáveis pela supervisão, fiscalização e execução das ações propostas, visando garantir sua efetivação.

No nível de apoio e acompanhamento à execução técnica e administrativa a SEPUR, SEINFRA e a SAP serão responsáveis por articular outras Secretarias da Prefeitura, como a Secretaria de Governo (SEGOV), Secretaria de Assistência Social (SAS), Secretaria de Meio Ambiente (SAMA), Procuradoria-Geral do Município (PGM), Secretaria de Comunicação (SECOM), Secretaria da Fazenda (SEFAZ), Companhia Águas de Joinville (CAJ) e Secretaria de Proteção Civil (SEPROT) no âmbito de ações específicas de cada Secretaria.

A SAP, por intermédio da UCP, será responsável por assegurar o cumprimento das diretrizes operacionais e financeiras OPEP/FONPLATA, utilizando sua experiência prévia na execução de projetos internacionais e colaborando com as estruturas permanentes da Prefeitura de Joinville.

Joinville já possui ampla experiência na execução de projetos em parceria com organismos multilaterais, a exemplo do BID e FONPLATA, acumulando aprendizados relevantes em diferentes áreas de gestão, planejamento e execução. Essa expertise permite que grande parte das atividades previstas no Programa seja conduzida com a equipe atual, mantendo os padrões de qualidade e eficiência, mesmo diante das dificuldades de cada Programa. Para potencializar ainda mais os resultados, serão incorporados profissionais especializados em áreas estratégicas, indicados pela SEPUR e SEINFRA, garantindo alinhamento integral às exigências OPEP/FONPLATA e às melhores práticas internacionais. Dessa forma, a cidade consolida um modelo de gestão híbrido, que alia a competência de sua equipe interna com reforços direcionados para assegurar a excelência na execução do Programa.

O organograma do arranjo institucional está apresentado no **Anexo 3**.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Administração e Planejamento (SAP)
Órgãos parceiros:
Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano (SEPUR)
Secretaria da Saúde (SES)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A UCP é composta por uma equipe técnica qualificada formada por servidores municipais efetivos, com pelo menos 08 (oito) anos de experiência na execução de operação crédito externo, sendo um Coordenador Executivo e especialistas em áreas específicas, com destaque para as seguintes que terão atuação mais direta com o Programa:

- Coordenador Executivo

- Especialista Administrativo

- Especialista Financeiro

- Especialista em Planejamento

- Especialista em Obras de Infraestrutura

- Especialista em Gestão Ambiental

- Especialista em Geoprocessamento

Além da UCP, o Programa contará com uma equipe técnica qualificada da SEPUR e da SEINFRA, incluindo servidores municipais e consultores contratados, todos com experiência relevante em suas áreas. Tendo no mínimo os seguintes especialistas:

- Especialista em Planejamento Urbano: profissional com experiência em regularização fundiária e projetos de habitação social, para garantir a organização e a qualidade dos espaços;

- Especialista em Obras de Arte Especial: profissional com experiência em projetos e execução de obras de arte especiais.

Ainda, destaca-se a existência da Comissão Permanente de Licitações (CPL), vinculada à Unidade de Licitações da SAP (integrante do Comitê de Operações e Obras) que será responsável pelos processos de seleção e de aquisição necessários, em consonância com a legislação vigente e as normas da OPEP/FONPLATA.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidade.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade do Programa no que se refere a gastos de pessoal, operacionalização e manutenção de obras, estará a cargo da Prefeitura e respectivas secretarias responsáveis. Os projetos do Programa são de responsabilidade da SEPUR, enquanto as obras estão a cargo da SEPUR e da SEINFRA, secretaria responsável pelas obras e serviços de infraestrutura urbana. A manutenção de pontes, pavimentação e sistemas de drenagem são de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA). A conservação e manutenção das áreas de lazer ficarão a cargo da Secretaria de Meio Ambiente (SAMA), responsável pelo cuidado de áreas públicas, como parques, praças, áreas de lazer e seus respectivos equipamentos.

O Plano Plurianual (PPA), possui recursos previstos para as ações executadas pelas secretarias citadas, compatíveis com as intervenções previstas neste Programa. Para os próximos anos haverá a necessidade de acréscimo no orçamento para manutenção e acompanhamento das intervenções executadas, dessa forma as despesas do Programa serão apropriadas na LDO e LOA com ação específica, na época da sua execução.

No âmbito federal, o Programa dialoga com o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 no que diz respeito principalmente ao enfrentamento às mudanças climáticas, ampliar o acesso à saúde, à redução de desigualdades, além dos demais objetivos estratégicos elencados no item relativo às áreas estratégicas desta Carta Consulta.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

As ações do Programa estão em consonância com os planos existentes/em elaboração/em revisão, bem como as ações do Plano Plurianual (2022-2025) do município, ação denominada Eixo Ecológico Leste, no **Anexo 4**, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável do Município, com base nas diretrizes estratégicas definidas para superar o déficit quantitativo e qualitativo de infraestrutura e equipamentos urbanos. Considera-se, ainda, a articulação das propostas com as diretrizes e metas do Governo Federal e Estadual, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável bem como com programas e diretrizes urbanas vigentes. Na sequência, encontram-se os planos existentes/em elaboração/em revisão no Município:

Plano de Saneamento Básico - PMSB (2024): instrumento de planejamento integrado dos quatro componentes do saneamento: água, esgoto, drenagem, resíduos, num horizonte de 20 anos.

Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (PDDU): em execução a revisão e atualização do plano de 2011: traz o mapeamento das características hidrológicas e hidráulicas da rede de macrodrenagem do rio Cachoeira e seus afluentes. Apresenta uma série de propostas de intervenções para solucionar os problemas relacionados às inundações. Importante ferramenta para planejar a mitigação da problemática das inundações na área urbana.

Plano de Mobilidade Sustentável (2015): estabelece diretrizes, ações, instrumentos e metas, para qualificar a mobilidade urbana e rural no que se refere aos modos, serviços e infraestrutura viária e de transporte que garantam os

deslocamentos de pessoas e bens em seu território, além da gestão e operação do sistema de mobilidade.

Plano Viário (revisado em 2022): traz o planejamento do sistema viário num horizonte de 30 anos, com a representação da malha viária, assegurando a mobilidade sustentável em curto, médio e longo prazos.

Plano Municipal de Arborização (2022): define as diretrizes de planejamento, implantação e manutenção da Arborização Urbana compatibilizando-as com os equipamentos públicos.

Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (2020): conservação, a partir do conhecimento existente sobre as comunidades, o uso do solo e os vetores de transformação da paisagem, a fim de subsidiar o melhor planejamento e gestão ambiental com sustentabilidade.

Plano de Infraestrutura e Equipamentos Públicos Urbano e Rural (2022): integra e otimiza a disponibilidade democrática de infraestrutura e equipamentos públicos no Município.

Plano Municipal de Saúde (2021): baseado em uma análise situacional, define intenções e resultados a serem buscados pelo município num período de quatro anos (2022 a 2025), expressos em diretrizes, objetivos, metas e indicadores e configura-se como base para a execução, o acompanhamento e a avaliação da gestão do sistema de saúde.

Plano Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres (PMGRD): Em execução (conclusão em junho/2025), será um instrumento estratégico de planejamento e gestão de prevenção e mitigação de riscos e desastres, com o objetivo de enfrentar vulnerabilidades e ameaças presentes no município, visando, principalmente, proteger a integridade física da população além da redução de danos materiais e ao meio ambiente, sempre considerando os conceitos e melhores práticas de inteligência urbana, resiliência territorial, sustentabilidade, gestão integrada, segurança hídrica e garantia de mobilidade.

3. 4. **Anexos**

Anexo 3 - Organograma - Arranjo Institucional

Anexo 4 - PPA 2022-2025 LOA2025

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: RISCOS CONTRATUAIS - Morosidade nos processos licitatórios
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A morosidade nos processos licitatórios representa um risco potencial à execução tempestiva do programa, especialmente nas etapas de contratação de estudos, projetos e obras. Esse risco decorre da necessidade de observância simultânea à legislação nacional e aos procedimentos de aquisição estabelecidos pelos organismos financiadores internacionais, neste caso o FONPLATA e a OPEP.

Embora o Município de Joinville já possua experiência consolidada em programas com financiamento do FONPLATA, a OPEP configura uma nova institucionalidade para o ente executor, podendo haver desafios operacionais relacionados à adequação dos processos locais às diretrizes e exigências específicas desse novo agente. Diferenças procedimentais ou dúvidas interpretativas podem gerar atrasos na preparação, análise ou formalização de contratos, com impactos sobre o cronograma físico-financeiro, especialmente na fase inicial do programa.

Prevenção e Mitigação:
Como ação preventiva, destaca-se a experiência prévia do Município de Joinville na execução de programas com financiamento do FONPLATA, o que garante familiaridade com os principais marcos operacionais, normas de aquisição e exigências fiduciárias desse organismo. Essa bagagem institucional representa um ativo importante para a estruturação e gestão do novo programa.

Em relação à OPEP, com quem o município firmará financiamento pela primeira vez, estão previstas ações de capacitação específicas durante as missões preparatórias, especialmente voltadas à equipe técnica e jurídica envolvida nos processos de licitação e contratação. A realização de oficinas operacionais, alinhamento de fluxos e esclarecimento de dúvidas sobre os procedimentos aplicáveis contribuirão para mitigar riscos de atrasos por desconhecimento ou inconsistência documental.

Adicionalmente, será promovida a integração entre os setores responsáveis pelos processos de compras públicas, com destaque para a Procuradoria do Município, área técnica, controle interno e unidade gestora do programa, garantindo agilidade, uniformidade e conformidade nas contratações. O cronograma de implementação também prevê margens de tempo adequadas para a superação de eventuais entraves administrativos.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: RISCOS REGULATÓRIO E INSTITUCIONAL - Morosidade na Lei Autorizativa
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A tramitação da Lei Autorizativa é etapa essencial para a formalização da operação de crédito externo e, por isso, representa um ponto crítico de atenção institucional. Apesar de o texto já estar minutado, sua aprovação está condicionada à deliberação favorável da COFIEX e à continuidade do processo junto aos órgãos financiadores.

A morosidade ou eventual resistência durante a tramitação na Câmara Municipal de Joinville pode comprometer o cronograma de negociação com o financiador e o Governo Federal, impactando diretamente os prazos para a emissão da garantia da União, aprovação pelo Senado Federal e posterior assinatura do contrato.

Além disso, o cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e demais requisitos legais e fiscais é etapa obrigatória, o que exige atenção às condições de endividamento e à demonstração da capacidade de pagamento do ente federativo.

Prevenção e Mitigação:
O Município de Joinville já iniciou ações de articulação política e institucional com o Poder Legislativo, promovendo reuniões com vereadores, esclarecendo dúvidas e apresentando os objetivos, impactos e benefícios do programa para a cidade. Essa comunicação prévia tem como objetivo reduzir resistências e acelerar o processo de tramitação da Lei

Autorizativa assim que o pleito for aprovado pela COFIEX.

Além disso, a proposta de lei já está minutada e tecnicamente alinhada aos requisitos legais, possibilitando sua rápida formalização. Paralelamente, a equipe técnica da Prefeitura vem acompanhando os requisitos fiscais e preparando a documentação necessária para comprovação da conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), incluindo indicadores de endividamento, capacidade de pagamento e limites legais.

Essas ações preventivas aumentam a segurança jurídica e institucional do processo, garantindo maior celeridade nas etapas subsequentes junto ao Governo Federal, ao Senado e aos agentes financiadores.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: RISCOS CONTRATUAIS - Políticas de aquisição do agente
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O risco de dificuldades na aplicação das políticas de aquisição e contratação do agente financeiro decorre do fato de que este será o primeiro financiamento firmado entre o Município de Joinville e a OPEP. A ausência de experiência prévia com esse organismo pode gerar incertezas quanto à correta interpretação e operacionalização dos procedimentos, o que pode resultar em morosidade na condução dos processos licitatórios, especialmente na fase inicial do programa.

Embora existam semelhanças entre as políticas de diferentes financiadores internacionais, cada agente possui especificidades procedimentais, e a falta de familiaridade com as normas da OPEP pode representar um ponto de atenção para a conformidade técnica e para o cumprimento dos prazos previstos.

Prevenção e Mitigação:
Está prevista a realização de capacitações específicas voltadas às normas e políticas de aquisição da OPEP, estendidas às equipes da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e às secretarias municipais diretamente envolvidas nos processos de contratação. O próprio agente financiador já confirmou o fornecimento de treinamentos complementares à unidade executora e parceiros conveniados, visando assegurar o domínio técnico das diretrizes operacionais.

Além disso, o programa contará com:

- Acompanhamento sistemático do calendário de licitações, para identificar antecipadamente eventuais gargalos ou atrasos;

- Disponibilização de modelos-padrão de documentos licitatórios (editais, contratos, termos de referência) adaptados às regras da OPEP;

- Atuação articulada entre as áreas jurídica, técnica e administrativa, assegurando alinhamento institucional e respostas ágeis às exigências do agente financeiro.

Adicionalmente, destaca-se que o Município de Joinville possui experiência consolidada na execução de programas com financiamento internacional, como nos contratos em andamento com o FONPLATA e o BID. Embora cada organismo possua normas específicas, há um nível significativo de convergência nos padrões de execução, o que favorece a adaptação institucional e a mitigação desse risco.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: RISCOS CONTRATUAIS - Licitações desertas/vazias/impugnadas
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Existe o risco de que as licitações voltadas à contratação de projetos executivos e à execução de obras restem desertas, sem interessados, ou sejam impugnadas por eventuais falhas de edital, recursos administrativos ou baixa atratividade técnica e econômica. Tais ocorrências podem comprometer os prazos previstos no cronograma de

execução e impactar a entrega tempestiva dos produtos programados.

Esse risco é especialmente relevante em projetos com escopo técnico complexo, exigências ambientais específicas ou localizados em áreas com baixa capacidade instalada de empresas executoras, além de cenários econômicos adversos que afetam a mobilização do setor da construção civil.

Prevenção e Mitigação:
O Município dispõe de uma Comissão Permanente de Licitação (CPL) com equipe técnica qualificada, capaz de atuar de forma ágil, preventiva e responsiva em todas as fases dos procedimentos licitatórios. A atuação integrada entre setores técnicos, jurídicos e administrativos contribui para minimizar inconsistências nos editais e aumentar a segurança jurídica das contratações.

Além disso, a experiência acumulada em programas com financiamento internacional, como os realizados com o BID e o FONPLATA, reforça a capacidade institucional do município para conduzir processos licitatórios com exigências complexas e regulamentos específicos de organismos multilaterais.

Como medida adicional de mitigação, será promovida a ampla divulgação das licitações, com publicação em canais especializados e articulação com entidades representativas do setor, a fim de aumentar a competitividade e reduzir o risco de processos sem interessados. Editais-padrão, revisões prévias e capacitação interna também serão utilizados como instrumentos de qualificação dos certames.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: RISCOS REGULATÓRIO E INSTITUCIONAL - Extinção/destituição da UCP
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A Unidade de Coordenação do Programa (UCP), instituída pelo Decreto Municipal nº 30.953, de 27 de março de 2018, é o núcleo técnico e administrativo responsável pela execução de programas oriundos de operações de crédito externo. Vinculada à Secretaria de Administração e Planejamento (SAP), a UCP conta com equipe multidisciplinar qualificada, formalmente designada, com atribuições que envolvem desde o planejamento e monitoramento das ações até a gestão de contratos, aquisições e execução física e financeira.

Embora sua estrutura esteja consolidada e sua atuação tenha se mostrado eficaz na gestão de programas com organismos internacionais, é necessário registrar o risco institucional de descontinuidade ou extinção da UCP, por decisão administrativa ou reestruturação organizacional. Tal cenário poderia comprometer a continuidade da execução, a memória técnica acumulada e o alinhamento com os procedimentos dos financiadores, gerando impactos operacionais relevantes.

Prevenção e Mitigação:
A principal ação de mitigação consiste na inclusão expressa da UCP no arranjo institucional formal do Programa, reconhecendo-a como instância permanente durante toda a vigência da operação de crédito. Tal disposição será incorporada nos documentos contratuais e nos atos normativos de regulamentação do programa, conferindo segurança jurídica à sua manutenção.

Adicionalmente, a experiência consolidada da equipe da UCP na gestão de programas com financiamentos internacionais (como FONPLATA e BID) garante uma estrutura técnico-operacional estável e reconhecida internamente. Essa legitimidade institucional reduz o risco de descontinuidade por mudança administrativa ou perda de prioridade política.

Por fim, a manutenção da UCP será respaldada por resultados mensuráveis, por sua capacidade de articulação intersetorial e pelo cumprimento rigoroso dos marcos operacionais, o que reforça sua relevância no ciclo de vida do programa.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: RISCOS CONTRATUAIS - Descumprimento contratual pelas empresas contratadas
Impacto: Alto

Probabilidade: Baixa

Descrição:
O descumprimento de obrigações contratuais por parte de empresas contratadas, sejam consultorias ou empreiteiras, representa um risco à execução plena do programa. Situações como atrasos injustificados, abandono de obras, não conformidade técnica ou inadimplência contratual podem comprometer o cronograma, a qualidade e a integridade dos resultados esperados.

Quando ocorrem, esses descumprimentos geralmente exigem processos formais de notificação, aplicação de penalidades contratuais e eventual rescisão contratual, seguidos de novos processos licitatórios ou substituição de fornecedores, o que pode resultar em atrasos significativos e aumento de custos.

Prevenção e Mitigação:
A Prefeitura de Joinville possui experiência consolidada na execução e gestão de contratos oriundos de operações de crédito externo, especialmente com organismos como o BID e o FONPLATA, e aplicará os padrões técnicos e jurídicos exigidos pelo FONPLATA e OPEP também neste programa.

Entre as ações de prevenção estão:

Capacitação prévia das equipes técnicas e jurídicas envolvidas na elaboração e acompanhamento dos contratos, com foco nas exigências dos financiadores;

Priorização de produtos críticos, com maior impacto estratégico no programa, de modo a monitorá-los com atenção redobrada desde a contratação;

Elaboração de cláusulas contratuais robustas, prevendo penalidades, mecanismos de advertência, multas e rescisão em caso de descumprimento, conforme diretrizes FONPLATA/OPEC;

Monitoramento contínuo da execução física e financeira dos contratos, por meio da supervisão técnica e relatórios periódicos de desempenho;

Gestão ativa de contratos, com comunicação transparente e registro de todas as não conformidades para possibilitar ações corretivas rápidas e juridicamente amparadas.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: RISCO AMBIENTAL – Não obtenção ou atraso na emissão de licenças ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Algumas das intervenções previstas no programa, especialmente aquelas relacionadas à implantação das obras viárias e Obras de Arte Especiais (pontes e acessos), estão localizadas em áreas de sensibilidade ambiental ou em zonas de transição entre o ambiente natural e o construído. A obtenção das licenças ambientais é condição prévia para a execução de diversas etapas do programa, e o não cumprimento dos requisitos legais, atrasos na análise dos órgãos competentes ou necessidade de complementações técnicas podem gerar impactos diretos no cronograma e na viabilidade das obras.

Além disso, mudanças nas normativas ambientais, exigências de compensações adicionais ou manifestações contrárias de órgãos colegiados (como conselhos ambientais) também podem ampliar o tempo necessário para a tramitação dos processos e trazer incertezas ao planejamento.

Prevenção e Mitigação:
O programa contempla um produto específico para elaboração dos estudos técnicos e obtenção do licenciamento ambiental (Produto 1.1.2), com equipe técnica dedicada e cronograma antecipado em relação às fases de execução. Essa estratégia permite tempo hábil para tramitação, revisões e complementações, sem comprometer o início das obras.

As principais ações de mitigação incluem:

- Antecipação da contratação de estudos ambientais, com escopos aderentes às exigências dos órgãos licenciadores;

- Diálogo técnico permanente com os órgãos ambientais locais e estaduais, promovendo alinhamento institucional e previsibilidade no processo;

- Planejamento ambiental integrado, com inserção de soluções baseadas na natureza, drenagem sustentável e respeito às zonas de preservação;

- Acompanhamento jurídico e técnico especializado, para assegurar conformidade legal e minimizar riscos de judicialização;

- Adequação dos projetos às condicionantes ambientais, desde as fases iniciais de concepção, evitando retrabalho e interferências não autorizadas.

A gestão ambiental será conduzida de forma proativa, respeitando a legislação vigente e priorizando a sustentabilidade como eixo central do programa, o que reforça a legitimidade social e institucional das intervenções.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: RISCOS SOCIAIS - Transtornos à população durante a execução das obras
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Embora o programa tenha como objetivo a melhoria das condições urbanas e da qualidade de vida da população, a fase de execução das obras pode gerar transtornos temporários aos moradores, comerciantes e usuários das áreas diretamente impactadas. Entre os principais incômodos estão o aumento da circulação de veículos pesados, interdições viárias parciais ou totais, ruídos, poeira, alterações na logística urbana, e restrições de acesso a residências e estabelecimentos comerciais.

Tais impactos, mesmo que pontuais e transitórios, podem gerar insatisfação social, resistência às obras, prejuízos econômicos locais e desgaste institucional, principalmente se não houver estratégias de comunicação e mediação eficazes com a comunidade envolvida.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar os impactos sociais temporários decorrentes da execução das obras, o programa prevê a implementação de um plano de comunicação social estruturado, elaborado em parceria com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Joinville.

As medidas incluem:

- Ações de informação e diálogo antecipado com a população afetada, explicando o cronograma, etapas e efeitos das obras;

- Divulgação de rotas alternativas, mudanças no trânsito e alterações no acesso local, com antecedência adequada;

- Campanhas de sensibilização quanto aos benefícios permanentes das intervenções, reforçando a importância coletiva das obras;

- Canal permanente de escuta e atendimento à população, para receber manifestações, dúvidas e sugestões durante todo o período de execução;

- Monitoramento de impactos sociais locais, com respostas rápidas a situações críticas identificadas.

Essas ações buscam garantir transparência, engajamento comunitário e minimização de conflitos, contribuindo para a aceitação social do programa e para a fluidez de sua implementação.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: RISCOS FUNDIÁRIOS: Indenizações e/ou Desapropriações
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

A necessidade de desapropriações de imóveis privados para a implantação de obras previstas no programa pode gerar conflitos entre o poder público e os proprietários, sobretudo nos casos em que há divergência quanto ao valor da indenização, contestação da utilidade pública, ou resistência à desocupação. Essas situações podem gerar incertezas jurídicas, atrasos no cronograma e aumento de custos, além de impactos sociais e institucionais negativos para o andamento do programa.

O risco é intensificado quando há número elevado de imóveis a serem adquiridos, dificuldades cadastrais, ou quando os processos expropriatórios evoluem para vias judiciais, o que pode estender o prazo necessário para a liberação das áreas e, consequentemente, para o início das obras.

Prevenção e Mitigação:
A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Administração e Planejamento (SAP), adota um protocolo institucional consolidado para condução dos processos de desapropriação, coordenado pela Unidade de Patrimônio Imóvel (SAP.UPI).

As ações de mitigação incluem:

- Contato prévio com os proprietários, com foco em comunicação transparente sobre o objetivo público da intervenção e os benefícios esperados para a coletividade;

- Propostas de aquisição amigável com base em avaliações justas, respaldadas por critérios técnicos e fundamentação legal;

- Decretação formal da utilidade pública, conforme rito legal, assegurando segurança jurídica e respaldo institucional à ação expropriatória;

- Previsão orçamentária para indenizações com recursos próprios, garantindo a viabilidade financeira do processo;

- Adoção de diretrizes urbanísticas e planejamento prévio, visando minimizar o número de imóveis afetados e priorizar soluções consensuais.

Essas medidas buscam reduzir o grau de litigiosidade, os atrasos e os custos associados às desapropriações, garantindo que os trâmites legais sejam conduzidos com celeridade, equidade e alinhamento com os objetivos do programa.

4. 10. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	Dólar	1.0000	20.000.000,00	20.000.000,00
Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo	Dólar	1.0000	86.250.000,00	86.250.000,00

5. 1. 1. Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	174	240

Juros aplicáveis:
SOFR + taxa à partir de 2% a.a
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Sobre o saldo empenhado e não desembolsado do financiamento, o Mutuário pagará comissão de compromisso, em dólares americanos, de 0,25% a.a.
Comissão de Avaliação:
0,00
Taxa de Abertura:
Será de 0,25% sobre o total dos recursos financiados.
Outros encargos:

Não há.

Outras Informações:

Não há.

5. 1. 2. Fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	174	240

Juros aplicáveis:
A taxa de juros anual será composta pela Taxa de Juros SOFR acrescida de spread fixo a ser determinado na assinatura do contrato (estimativa atual do spread de 1,75% a.a.).
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Sobre o saldo empenhado e não desembolsado do financiamento, o Mutuário pagará comissão de compromisso, em dólares americanos, de 0,25% a.a.
Comissão de Avaliação:
0,00
Taxa de Abertura:
Será de 0,25% sobre o total dos recursos financiados.
Outros encargos:

Não há.

Outras Informações:

Não há.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
1 - Revitalização Urbana					
Tipo de condição					
F17					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Tipo de condição					
F155					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
260.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
460.000,00	0,00	360.000,00	0,00		

Nome do componente					
2 - Infraestrutura Urbana Sustentável e Conectividade Territorial					
Tipo de condição					
F17					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Tipo de condição					
F155					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.000.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
13.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00		

Nome do componente					
3 - Ampliação de Atenção Primária à Saúde e Qualidade de Vida					
Tipo de condição					
F17					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Tipo de condição					
F155					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		

Nome do componente					
4 - Gestão de Desapropriações e Contrapartidas Imobiliárias					
Tipo de condição					
F155					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00		
Tipo de condição					
F17					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
5 - Gestão do Programa					
Tipo de condição					
F17					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Tipo de condição					
F155					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
140.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
390.000,00	0,00	390.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

Não se aplica.

5. 4. **Anexos**

Cronograma de Desembolsos

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Abaixo, listamos as ações prévias que o Município já realizou, necessárias para execução do Programa:

- Projeto da Ponte Espinheiros (300 m);

- Projeto dos acessos da ponte Espinheiros 6 km;

- Projeto Executivo de 2 km de pavimentação de vias na poligonal SUL;

- Projeto de 350m trecho inicial via parque (Baltazar Buschle / Rua Max Boehm);

- Projeto Executivo de 8 km de vias na poligonal de área de influência da Av. Alvino Hansen (Via de acesso à Ponte Joinville, no bairro Adhemar Garcia);

- Projeto Executivo Parque Ambiental (ETE) zona sul 500 mil m² - Companhia Águas de Joinville;

- Projeto Executivo e Obra de Passeio Público Paranaguamirim;

- Projeto Executivo e Obra de pavimentação de via na área de Influência do Passeio Público Paranaguamirim;

- Projeto Passeio Público Rua Profa. Ivete Rocha da Silva Miano;

- Projeto de Passeio Público Manoel de Borba Rosa (obra em contratação).

- Obra da Ponte Joinville, encontra-se em execução, com avanço de 15% do cronograma físico pactuado.

- Expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto sanitário na área de intervenção do Programa, com trechos já executados, outros em execução e ainda alguns no plano de expansão previsto pela concessionária local, e que vem apresentando a gradual recuperação da qualidade das águas e da fauna.

Com relação às ações da área da Saúde (Contrapartida)

- Todos os terrenos para as obras das UBSF são de posse do Município;

- UBSF Itaum inaugurada (construção);

- UBSF Aventureiro II inaugurada (construção);

- UBSF Ulysses Guimarães inaugurada (reforma e ampliação);

- Obras para construção da UBSF da Ilha em execução;

- Obras para construção da UBSF Jardim Edilene em execução;

- Obras para reforma e ampliação da UBSF Adhemar Garcia em fase de licitação;

- Projetos executivos para construção das demais UBSF.

Joinville firmou contratos de empréstimos externos nos últimos anos e possui experiência na gestão desses contratos. A gestão do Programa será executada por técnicos (servidores efetivos) que atuam em gestão de contratos de financiamentos externos, não sendo necessários custos adicionais com contratação de mão-de-obra externa, uma vez que já possui equipe de Coordenação e Execução do Programa (Decreto Municipal nº 30.953, de 27/03/18) e comissão de licitação específica e capacitada para a condução dos processos licitatórios de aquisições custeadas por órgãos financiadores externos.

No que diz respeito aos custos para execução do Programa,estes foram levantados com base nos valores de outros projetos semelhantes em andamento e elaborados pela Prefeitura, em cada Unidade Envolvida.

6. 2. Anexos

Sem anexos.
