PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Superação da Pobreza - Estado de São Paulo

Proponente: Estado de São Paulo
Processo SEI: 03101.001951/2025-12
Código do pleito: 845453340/2025
Versão: 1

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 82.320.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 20.580.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 08
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 08
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 08
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 09
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 09
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 10
1. 5. Componentes 10
1. 5. 1. Informações do 1° componente 10
1. 5. 2. Informações do 2° componente 12
1. 5. 3. Informações do 3° componente 12
1. 5. 4. Informações do 4° componente 13
1. 6. Beneficiários 14
1. 7. Anexos 15
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 17
2. 1. Áreas estratégicas 17
2. 2. Anexos 17
3. GESTÃO 18
3. 1. Arranjo institucional 18
3. 1. 1. Descrição 18
3. 1. 2. Orgãos Executores 20
3. 1. 3. Estrutura Operacional 20
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 22
3. 2. Operacionalização e Manutenção 22
3. 3. Planejamento Estratégico 22
3. 4. Anexos 23
4. RISCOS 24
4. 1. Informações do 1° risco 24
4. 2. Informações do 2° risco 24
4. 3. Informações do 3° risco 24
4. 4. Informações do 4° risco 24
4. 5. Informações do 5° risco 25
4. 6. Anexos 25
5. FINANCIAMENTO 26
5. 1. Condições Financeiras da Operação 26
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 26
5. 2. Cronograma de Desembolso 29
5. 3. Contragarantias 30
5. 4. Anexos 30
6. ETAPAS REALIZADAS 31
6. 1. Etapas realizadas 31
6. 2. Anexos 32

.

7. CONTATOS 33
7. 1. Contatos 33
7. 2. Anexos 34

.

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Superação da Pobreza - Estado de São Paulo
Sigla: SuperAção/SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado de São Paulo, com cerca de 44,4 milhões de habitantes, possui a maior população do Brasil e responde por aproximadamente um terço do PIB nacional. Essa relevância econômica, contudo, contrasta com a persistência de desigualdades e da pobreza em diferentes regiões do estado. Apesar de concentrar polos industriais e tecnológicos, São Paulo abriga bolsões de pobreza que afetam milhões de pessoas. Dados da Fundação SEADE mostram que, embora a renda média estadual seja de R$ 2.492,00, os 10% mais ricos recebem mais de 29 vezes a renda dos 10% mais pobres.

Atualmente, há mais de 13 milhões de pessoas inscritas no CadÚnico no estado, sendo 10,2 milhões com cadastro atualizado, distribuídas em 4,5 milhões de famílias. Dessas, cerca de 44% têm renda per capita de até R$ 218,00, sendo elegíveis para o Bolsa Família. Mesmo com a ampliação do programa, cerca de 103 mil famílias seguem abaixo da linha de pobreza, já considerando o valor do benefício. Além disso, quase 90% das famílias no CadÚnico ainda possuem renda per capita inferior a meio salário-mínimo (R$ 759,00), evidenciando a limitação da política de transferência de renda quando isolada de outras estratégias.

A pobreza, no entanto, vai além da renda e expressa um conjunto de privações que comprometem o acesso a direitos básicos como educação, saúde, moradia digna, trabalho e participação social. Em São Paulo, essas privações são especialmente intensas em territórios com alta vulnerabilidade. Segundo a SEADE, 7,5% das famílias vivem em superlotação, 5,9% não têm água canalizada e 5,7% enfrentam esgotamento sanitário inadequado. A PNAD-C (2023) aponta que cerca de 4% da população sofre de insegurança alimentar grave. Mais de 25% das famílias cadastradas no CadÚnico acumulam privações simultâneas nessas áreas.

Essas múltiplas vulnerabilidades estão fortemente associadas ao baixo nível educacional da população, refletido nas altas taxas de evasão escolar e baixa escolaridade entre adultos (Silva-Laya et al., 2018). Tais fatores reduzem significativamente as oportunidades de desenvolvimento humano e autonomia das famílias. Entre os 10% mais pobres da população paulista, predominam a informalidade (62%) e a subutilização da força de trabalho (51%), bem acima das médias estaduais (37% e 11%, respectivamente), o que revela obstáculos reais à inclusão produtiva — e não falta de disposição para o trabalho.

A pobreza afeta de forma desproporcional determinados grupos: mulheres, jovens, pessoas negras e famílias monoparentais femininas enfrentam maiores barreiras de acesso à renda, como falta de creches, baixa escolaridade, ausência de qualificação profissional, desconhecimento sobre políticas públicas e dificuldade de acesso ao crédito e à formalização econômica.

Além disso, São Paulo apresenta significativas desigualdades regionais. Em 2010, São Caetano do Sul registrava IDHM de 0,862 (muito alto), enquanto municípios como Ribeirão Branco alcançavam apenas 0,639 (médio). A média estadual de 0,783 oculta disparidades internas marcantes, exigindo abordagens sensíveis ao território.

Diante desse cenário, é evidente que o enfrentamento da pobreza requer mais do que políticas compensatórias. São necessárias estratégias integradas que articulem: (i) acesso a bens e serviços públicos; (ii) desenvolvimento de competências profissionais; e (iii) inserção produtiva. A coordenação dessas ações, com foco territorial, é fundamental para promover a mobilidade social de famílias em situação de vulnerabilidade.

O fortalecimento de políticas que aliem proteção social e inclusão produtiva deve ser prioridade. Estímulos à geração de empregos, empreendedorismo e inclusão financeira podem ampliar as oportunidades de renda e autonomia para os segmentos mais vulneráveis.

Nesse contexto, o Programa de Superação da Pobreza surge como uma resposta integrada a esses desafios. Com foco em acompanhamento familiar, acesso a políticas intersetoriais e desenvolvimento de competências, o Programa se inspira em modelos internacionais como o Graduation Approach, que articula proteção social, capacitação e incentivos progressivos à geração de renda, promovendo a autonomia socioeconômica das famílias vulneráveis.

1. 2. 2. Problema:

As famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de São Paulo enfrentam obstáculos que perpetuam ciclos de pobreza e exclusão, em nível intra e intergeracional. Esses desafios vão além da insuficiência de renda e incluem precariedade habitacional, baixa escolaridade, insegurança alimentar e escasso acesso a políticas públicas, sobretudo em territórios com fraca presença estatal. Essas privações comprometem o acesso a direitos, a autonomia econômica e a inserção produtiva na sociedade.

A pobreza, portanto, manifesta-se de forma estrutural e multidimensional, afetando diretamente as condições de vida das famílias e suas possibilidades de superação. Estudos do IPEA indicam que a presença de pessoas analfabetas nos domicílios está associada a maiores níveis de pobreza, evidenciando a relação entre exclusão educacional e vulnerabilidade.

Além disso, há barreiras que dificultam o acesso a oportunidades de geração de renda e inserção produtiva: baixa escolaridade, falta de qualificação profissional, escassez de apoio na busca por emprego e ausência de redes de cuidado. Tais fatores afetam a população de formas desiguais. Domicílios chefiados por mulheres, pessoas pretas ou pardas e com baixa escolaridade concentram índices de pobreza superiores à média estadual.

A superação da pobreza depende da capacidade das famílias de gerar renda de forma autônoma, especialmente por meio do trabalho de seus membros em idade ativa (Barros & Machado, 2022). Dados mostram que 77% da renda média no Estado tem origem no trabalho (SEADE, 2023), mas entre os 10% mais pobres, cerca de 63% estão na informalidade (IBGE, 2024). A informalidade compromete a estabilidade da renda, o acesso a direitos e a previdência. Essa realidade é especialmente crítica em famílias monoparentais femininas, geralmente chefiadas por mulheres negras, que enfrentam múltiplas desvantagens como baixa escolaridade, responsabilidades exclusivas de cuidado e restrições de tempo e mobilidade.

Essas famílias não estão fora do mercado de trabalho por falta de iniciativa, mas por enfrentarem obstáculos estruturais. Tais barreiras dificultam o desenvolvimento individual e a conquista da autonomia, exigindo políticas públicas integradas que garantam acesso à proteção social, promovam a dignidade humana e estimulem a inclusão produtiva. Para isso, é fundamental ampliar o acesso ao trabalho decente, qualificar o empreendedorismo e criar oportunidades reais de geração de renda.

A vulnerabilidade também é agravada por privações severas, como insegurança alimentar, fragilidade das redes de apoio e dificuldades de acesso a serviços públicos. A insuficiência de proteção social e as barreiras no acesso contínuo a programas e benefícios comprometem a capacidade das famílias de romper com o ciclo de pobreza. Muitas vivem sem suporte institucional, o que amplia a sobrecarga com cuidados e limita o acesso a oportunidades de qualificação, inclusão produtiva e empreendedorismo formal.

A falta de acompanhamento técnico e de estratégias que promovam a permanência das famílias em políticas de superação da pobreza gera descontinuidade nos processos de desenvolvimento. Isso eleva o risco de retorno à dependência de transferências monetárias, perpetuando a vulnerabilidade crônica. A ausência de um modelo de acompanhamento personalizado e de incentivo à permanência faz com que muitas iniciativas percam força ao longo do tempo. Sem apoio técnico e perspectivas reais, as famílias mais vulneráveis acabam se desvinculando de programas e retornando à dependência estatal.

Diante dessa realidade, torna-se evidente que políticas compensatórias e ações pontuais são insuficientes. É necessário um novo arranjo institucional que combine transferência de renda, acompanhamento familiar, fortalecimento de capacidades e incentivos progressivos à inclusão produtiva, considerando o ritmo e o contexto de cada família. O Programa de Superação da Pobreza surge como resposta a essa lacuna estrutural, articulando proteção social e promoção da autonomia em uma abordagem intersetorial, gradual e orientada por resultados.

1. 2. 3. **Solução:**

O Programa SuperAção/SP tem como objetivo romper o ciclo da pobreza no Estado de São Paulo, promovendo autonomia, inclusão produtiva e melhoria das condições de vida de famílias vulneráveis. São elegíveis aquelas inscritas no CadÚnico, com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda per capita inferior a R$ 759,00 (meio salário mínimo nacional), excluídos os benefícios sociais. A partir de diagnóstico inicial, os núcleos familiares são classificados conforme grau de vulnerabilidade e potencial de inclusão produtiva.

- Trilha de Proteção Social: voltada a famílias em extrema vulnerabilidade, como aquelas sem adultos em idade ativa, com alto grau de dependência, em situação de rua ou fora de programas de transferência de renda. São

acompanhadas prioritariamente pelo SUAS, com acesso aos serviços do PAIF, PAEFI, benefícios sociais e atualização do CadÚnico. Famílias abaixo da linha de pobreza e insegurança alimentar grave podem receber auxílio financeiro.

- Trilha de Superação da Pobreza: destinada a famílias com perfil para inclusão produtiva que aderirem voluntariamente ao Programa. Cada núcleo é acompanhado por um Agente de SuperAção — técnico capacitado que elabora, com a família, um Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF), com metas e compromissos pactuados. O acompanhamento dura até dois anos, prorrogável por mais seis meses, com acesso a apoios financeiros vinculados ao avanço nas etapas.

As ações do Programa estão estruturadas em três módulos articulados:

- Proteger: acesso a políticas públicas, segurança alimentar e benefícios, incondicionais ou condicionais ao cumprimento do PDF;
- Desenvolver: fortalecimento de competências para autonomia social e produtiva;
- Incluir: apoio à inserção no mercado de trabalho, empreendedorismo e economia solidária.

Componentes estruturantes do Programa:

i) Focalização territorial e familiar

A atuação combina critérios territoriais e familiares, priorizando municípios com alto número de pessoas em situação de pobreza, elevado PIB e taxa de ocupação — combinação que reflete necessidade e potencial de inclusão produtiva. O planejamento em ondas considera diagnóstico da SEDS, que identificou a dispersão das famílias como desafio em programas anteriores.

ii) Acompanhamento personalizado

Cada família conta com apoio contínuo de um Agente de SuperAção, que realiza escuta qualificada, articula políticas públicas, constrói o PDF e acompanha o progresso. O vínculo com o agente é essencial para fortalecer a autonomia familiar e superar vulnerabilidades.

iii) Atuação intersetorial e integrada

O Programa articula políticas públicas estaduais nas áreas de desenvolvimento social, saúde, educação, meio ambiente, qualificação profissional e economia solidária. Prevê arranjos de governança entre Estado, municípios, sociedade civil e setor privado, com instâncias de coordenação, deliberação e monitoramento.

iv) Transferência de renda articulada ao desenvolvimento familiar

Os apoios financeiros acompanham o progresso da família no PDF. Além do auxílio para insegurança alimentar grave, há incentivo à conclusão do plano (R$ 200,00), bônus por certificação profissional (R$ 600,00) e incentivo à inserção produtiva (até R$ 1.804,00), conforme metas pactuadas.

v) Auxílio de Proteção Social

Famílias com renda per capita inferior a R$ 218,00 e em insegurança alimentar grave podem receber benefício de R$ 150,33 por pessoa, por até 12 meses, prorrogáveis por mais 12 na Trilha de Proteção (via CRAS) ou 6 na Trilha de Superação (via Agente).

vi) Apoio técnico e financeiro aos municípios aderentes ao SuperAção

O Programa prevê suporte técnico e financeiro aos municípios aderentes, incluindo cofinanciamento estadual e a disponibilização gratuita de um sistema digital para monitoramento e avaliação das metas locais da assistência social e das ações do Programa.

vii) Fortalecimento da Política de Assistência Social nos municípios paulistas

O Estado ampliará o cofinanciamento da assistência social para todos os municípios paulistas, fortalecendo a rede socioassistencial em todo o território. Será criada a carreira de Especialista Social, com salários atrativos e critérios claros de progressão, valorizando os profissionais da área. Também será implementado o Projeto de Desenvolvimento da Vigilância Socioassistencial, com foco na padronização de metodologias, qualificação de indicadores e consolidação de dados territoriais.

Alinhamento ao PPA Federal 2024–2027

As ações do SuperAção/SP estão alinhadas aos seguintes Objetivos Estratégicos do PPA da União:

- OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza
- OE 103 – Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental
- OE 105 – Fortalecer a economia criativa
- OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social
- OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres
- OE 110 - Assegurar proteção previdenciária a todas as formas de ocupação
- OE 207 – Ampliar a geração de trabalho e inclusão produtiva
- OE 214 – Reduzir desigualdades regionais
- OE 302 – Aprimorar a capacidade do Estado

1. 2. 18. **Resultado:**

1 – Promover maior equidade regional por meio da priorização dos municípios mais desiguais e da redistribuição do cofinanciamento de todos os municípios paulistas

Priorizar a implementação do Programa SuperAção SP nos 49 municípios que apresentam os maiores níveis de desigualdade socioeconômica, fortalecendo a capacidade desses territórios para enfrentar as privações sociais e econômicas. De forma simultânea, ampliar o cofinanciamento estadual para os 645 municípios paulistas, com revisão dos critérios de repasse, promovendo maior equilíbrio entre diferentes portes populacionais, incluindo a definição de teto para metrópoles e piso para municípios de pequeno porte.

2 – Ampliar a cobertura e a efetividade do acompanhamento socioassistencial de famílias em extrema vulnerabilidade nos territórios prioritários, por meio da Trilha de Proteção Social

Identificar, conectar e acompanhar cerca de 140 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente nos municípios prioritários selecionados. Garantir que essas famílias tenham acesso aos serviços do SUAS, incluindo a atualização contínua do Cadastro Único e sua inserção nos programas federais de transferência de renda. Promover a proteção social por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), do Serviço de Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e dos demais benefícios sociais disponíveis.

3 – Acompanhar de forma personalizada famílias da Trilha de Superação da Pobreza com Planos de Desenvolvimento Familiar, conduzidos por Agentes de SuperAção capacitados

Oferecer acompanhamento técnico qualificado e contínuo a 70.000 famílias com perfil para inclusão produtiva, por meio da atuação direta de Agentes de SuperAção capacitados. Esses profissionais serão responsáveis por elaborar e

executar Planos de Desenvolvimento Familiar (PDF) personalizados, com metas claras e pactuadas, integrando ações dos módulos Proteger, Desenvolver e Incluir. O vínculo próximo e contínuo fortalecerá a autonomia das famílias e impulsionará seu progresso socioeconômico sustentável.

4 – Fortalecer a integração entre políticas públicas estaduais e a interlocução com os municípios, assegurando respostas coordenadas às múltiplas dimensões da pobreza

Implementar mecanismos permanentes de articulação intersetorial e entre entes federativos, nos municípios aderentes ao Programa, promovendo ações integradas nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, habitação e segurança alimentar. Essa articulação qualificada visa aprimorar o atendimento às famílias acompanhadas, assegurando respostas coordenadas e territoriais às causas complexas e multifacetadas da pobreza.

5 – Conceder benefícios financeiros vinculados ao progresso das famílias na Trilha de Superação da Pobreza
Ofertar transferências financeiras moduladas conforme o avanço das famílias nas etapas definidas no Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF), atuando como incentivo para a permanência no Programa, conclusão de certificações profissionais e inserção produtiva. Esses benefícios financeiros estimulam o engajamento das famílias, promovendo uma autonomia gradual, sustentável e orientada por resultados concretos.

6 – Reduzir a insegurança alimentar grave entre famílias em situação de pobreza por meio da concessão do Auxílio de Proteção Social

Garantir a entrega do benefício financeiro às famílias com renda per capita abaixo da linha de pobreza, conforme diagnóstico realizado pelas equipes do CRAS (Trilha de Proteção Social) e pelos Agentes de SuperAção (Trilha de Superação da Pobreza). O resultado esperado é a redução significativa do número de famílias em situação de insegurança alimentar grave, assegurando proteção imediata, dignidade e melhoria das condições básicas de vida.

7 – Fortalecer e qualificar a execução da Política de Assistência Social nos municípios que aderirem ao Programa

Repassar recursos financeiros adicionais aos municípios aderentes para apoiar a implantação qualificada do Programa. Entre as ações previstas estão mobilização e sensibilização intersetorial, fortalecimento da Vigilância Socioassistencial, ampliação da capacidade de acompanhamento familiar pelas equipes do CRAS, adequação da rede de serviços socioassistenciais e estruturação de ofertas como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Atendimento Domiciliar de Proteção Social Básica e Especial. Essa estratégia visa garantir a continuidade, a efetividade e a qualidade da oferta socioassistencial local.

8 – Fortalecer a gestão e o monitoramento das ações socioassistenciais em pelo menos 100 municípios paulistas
Implantar e operacionalizar o sistema SIGMA como plataforma digital integrada para gestão, monitoramento e avaliação das ações do SUAS e do Programa SuperAção/SP. O sistema permitirá o registro detalhado dos atendimentos individuais e familiares, a geração de indicadores territorializados e o monitoramento em tempo real das atividades. Espera-se maior eficiência, transparência e qualidade na execução das políticas sociais, fortalecendo a articulação entre Estado e municípios e subsidiando a formulação de políticas públicas mais eficazes.

9 – Promover a inclusão produtiva e a autonomia econômica de até 35.000 famílias acompanhadas pelo Programa

Concluir o ciclo de acompanhamento familiar com a inserção sustentável das famílias no mundo do trabalho formal ou informal. Por meio de ações articuladas que envolvem qualificação profissional, acesso ao emprego, empreendedorismo e economia solidária, garantir a elevação consistente da renda familiar e a ampliação da autonomia econômica das famílias atendidas, promovendo sua transição efetiva para fora da situação de vulnerabilidade.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral:

Contribuir para o rompimento do ciclo da pobreza e promover a autonomia e a melhoria das condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade.

(ii) Objetivos Específicos:

a) Fortalecer a capacidade institucional e a equidade territorial das políticas de proteção social no Estado de São Paulo

Promover a equidade regional e o aprimoramento da gestão das políticas socioassistenciais por meio da priorização de municípios mais desiguais, da ampliação do cofinanciamento estadual com critérios redistributivos, da qualificação da rede de serviços, e da implantação do sistema SIGMA para gestão digital e monitoramento territorializado. A estratégia inclui o fortalecimento da Vigilância Socioassistencial, e modernização da capacidade estatal nos municípios aderentes, promovendo uma execução mais eficiente, integrada e sensível às múltiplas dimensões da pobreza.

Correlação com Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza
- OE 214 – Reduzir desigualdades regionais
- OE 302 – Promover a ampliação das capacidades estatais

Componentes relacionados:

- Componente 2 – Assistência Técnica (qualificação de serviços e apoio à gestão municipal)
- Componente 3 – Fortalecimento Institucional (implantação de governança, sistemas e mecanismos intersetoriais)
- Componente 4 – Gestão do Programa (monitoramento, avaliação, estrutura técnica central e auditoria)

Indicadores relacionados:

- Indicador 4: Famílias com acompanhamento ativo e com Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF) elaborado (Trilha de Superação da Pobreza)
- Indicador 6: Taxa de registros de atendimentos da assistência social no SIGMA, em relação ao total informado no PMASweb (municípios aderentes ao Programa SuperAção/SP)
- Indicador 7: Percentual de famílias que avaliam positivamente o acompanhamento técnico após capacitação dos agentes

b) Ampliar o acesso de famílias em extrema vulnerabilidade à proteção social, promovendo segurança alimentar, acesso a direitos e articulação intersetorial

Garantir acompanhamento técnico e acesso a serviços e benefícios para famílias em extrema pobreza, com foco especial na insegurança alimentar grave, na articulação com políticas públicas essenciais e na promoção da dignidade e cidadania. A atuação ocorrerá por meio da Trilha de Proteção Social, integrando ações dos CRAS ao Auxílio de Proteção Social para famílias em insegurança alimentar grave, e da Trilha de Superação, conectando os Agentes de Superação às ações do CRAS, educação, saúde, habitação e segurança alimentar, além de fomentar diálogo intersetorial e federativo para respostas coordenadas às múltiplas privações dessas famílias.

Correlação com Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza
- OE 103 – Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental

- OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social
- OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres

Componentes relacionados:

- Componente 1 – Acompanhamento e Desenvolvimento Familiar
- Componente 3 – Fortalecimento Institucional (articulação intersetorial e integração de políticas públicas)

Indicadores relacionados:

- Indicador 1: Taxa de domicílios com insegurança alimentar grave (%) (Trilhas de Proteção Social e de Superação da Pobreza)
- Indicador 4: Famílias com acompanhamento ativo e com Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF) elaborado (Trilha de Superação da Pobreza)
- Indicador 5: Percentual de famílias que concluem as metas previstas no seu Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF) do Módulo Proteger.

c) Promover a autonomia econômica de famílias em vulnerabilidade, por meio de acompanhamento qualificado, capacitação e inclusão produtiva sustentável

Realizar o acompanhamento familiar personalizado de núcleos com potencial de geração de renda, por meio de Agentes de SuperAção, elaboração de Planos de Desenvolvimento Familiar e concessão de apoios financeiros condicionados ao progresso das famílias. A estratégia contempla ações de qualificação profissional, empreendedorismo, inclusão produtiva e estímulos à participação feminina, promovendo transição efetiva das famílias para a autonomia econômica e contribuindo para o rompimento do ciclo da pobreza.

Correlação com Objetivos Estratégicos do PPA:

- OE 105 – Fortalecer a economia criativa
- OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres
- OE 110 – Assegurar proteção previdenciária a todas as formas de ocupação
- OE 207 – Ampliar a geração de trabalho e inclusão produtiva

Componente relacionados:

- Componente 1 – Acompanhamento e Desenvolvimento Familiar (Planos de Desenvolvimento Familiar, agentes e supervisores)

Indicadores relacionados:

- Indicador 2: População ocupada de 16 a 59 anos entre os 40% mais pobres com proteção previdenciária (%)
-

Indicador 3: Proporção de famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo nacional após o período de acompanhamento (Trilha de Superação da Pobreza)

- Indicador 6: Taxa de registros de atendimentos da assistência social no SIGMA, em relação ao total informado no PMASweb (municípios aderentes ao Programa SuperAção/SP)

1. 30. **Indicadores**

1. 30. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador 1: População ocupada de 16 a 59 anos entre os 40% mais pobres com proteção previdenciária (%)

Descrição:

Indicador SMART: Percentual de famílias participantes da Trilha de Superação da Pobreza que, ao final do ciclo de acompanhamento, têm pelo menos um integrante entre 16 e 59 anos inserido em ocupação com proteção previdenciária ativa (CLT ou contribuinte individual/MEI).

S – Específico: Mede o resultado da inclusão produtiva promovida pelo Programa SuperAção/SP, ao identificar a proporção de famílias acompanhadas na Trilha de Superação da Pobreza que, após o ciclo de até 24 meses, possuem pelo menos um integrante em ocupação com vínculo de proteção previdenciária (trabalho formal ou contribuição individual ao INSS, como MEI).

M – Mensurável: Será calculado pela razão entre o número de famílias da Trilha de Superação da Pobreza com pelo menos um membro entre 16 e 59 anos com vínculo de proteção previdenciária ativa ao final do acompanhamento (CLT, MEI ou contribuinte individual) pelo total de famílias que concluíram o ciclo completo da Trilha de Superação da Pobreza entre 2025 e 2029, multiplicado por 100.

A – Atingível: A meta considera o histórico de programas similares, a atuação de parceiros como o SEBRAE, os incentivos à formalização, a capacitação ofertada e o vínculo estabelecido com os Agentes, favorecendo a articulação com o mercado de trabalho e serviços de intermediação de mão de obra. A possibilidade de inserção como MEI ou contribuinte individual também amplia a factibilidade da meta.

R – Relevante: Está diretamente alinhado ao(s):

- Objetivos Estratégicos (OE) do PPA:

OE 207 – Ampliar a geração de trabalho e inclusão produtiva

OE 105 – Fortalecer a economia criativa

OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres

OE 110 – Assegurar proteção previdenciária a todas as formas de ocupação

- Componente 1 - Acompanhamento e Desenvolvimento Familiar

- Objetivo específico c) Promover a autonomia econômica de famílias em vulnerabilidade, por meio de acompanhamento qualificado, capacitação e inclusão produtiva sustentável

- Resultado Esperado: 9

T – Temporal: O indicador será monitorado anualmente entre 2025 e 2029 e apurado de forma cumulativa ao longo da execução do Programa.

Meta:

- Linha de base (2025): zero, uma vez que o programa ainda não iniciou.
- Meta (2029): Pelo menos 20% das famílias que concluírem a Trilha de Superação da Pobreza terão ao menos um membro em ocupação com proteção previdenciária ativa.

1. 30. 4. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Indicador 2: Proporção de famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo nacional após o período de acompanhamento (Trilha de Superação da Pobreza)

Descrição:

Indicador SMART: Percentual de famílias da Trilha de Superação da Pobreza que, após completarem os 24 meses de acompanhamento, mantêm renda per capita superior a meio salário mínimo nacional, verificada 6 meses após o fim do ciclo do Programa.

S – Específico: Mede a sustentabilidade dos efeitos do Programa na renda das famílias que completaram o ciclo de 24 meses da Trilha de Superação da Pobreza, verificando se, seis meses após o encerramento do acompanhamento, continuam com renda per capita superior a meio salário mínimo nacional.

M – Mensurável: Calcula-se o percentual dividindo-se o número de famílias que completaram o ciclo da Trilha, e que atingiram renda superior a meio salário mínimo per capita 6 meses após a conclusão do acompanhamento pelo número total de famílias que completaram os 24 meses de participação na Trilha de Superação da Pobreza, multiplicado por 100.

A – Atingível: A meta foi definida com base na atuação intensiva dos Agentes, incentivos de inclusão produtiva, vínculos intersetoriais e acompanhamento qualificado. A mensuração seis meses após o encerramento permite avaliar a consolidação de ganhos com mais realismo, sem considerar famílias que abandonaram ou não concluíram o ciclo.

R – Relevante: Está diretamente alinhado ao(s):

- Objetivos Estratégicos (OE) do PPA:

OE 101 - Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza
OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres
OE 214 – Reduzir desigualdades regionais
- Componente 3 – Fortalecimento Institucional e Governança Intersetorial
- Objetivos Específicos c) Promover a autonomia econômica de famílias em vulnerabilidade, por meio de acompanhamento qualificado, capacitação e inclusão produtiva sustentável
- Resultado Esperado: 5; 9
T – Temporal: Será monitorado anualmente de forma acumulada entre 2027 e 2029, com base nas famílias que completaram os 24 meses da Trilha.

Meta:
- Linha de base (2025): zero, uma vez que o programa ainda não iniciou.
- Meta (2029): Ao menos 10% das famílias que completarem o ciclo completo de 24 meses do programa devem manter renda superior a meio salário mínimo seis meses após o encerramento do acompanhamento.

1. 30. 7. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Indicador 3: Percentual de famílias que concluem as metas previstas no seu Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF) do Módulo Proteger.

Descrição:
Indicador SMART: Percentual de famílias da Trilha de Superação da Pobreza que concluem o Módulo Proteger cumprindo integralmente ou majoritariamente (por exemplo, 75% ou mais) as metas estabelecidas em seus Planos de Desenvolvimento Familiar (PDF).
S – Específico: Mede a proporção de famílias da Trilha de Superação da Pobreza que, ao final da conclusão do Módulo Proteger dentro do ciclo do programa, cumpriram pelo menos 75% das metas previstas no respectivo PDF para essa etapa.
M – Mensurável: Calcula-se dividindo-se o total acumulado de famílias que concluíram o Módulo Proteger e cumpriram pelo menos 75% das metas previstas no PDF dessa etapa (monitoradas no sistema do programa), pelo total de famílias que aderiram à Trilha de Superação da Pobreza e tiveram seu PDF elaborado, multiplicado por 100.
A – Atingível: A meta é realista considerando a atuação dos Agentes, o suporte técnico das entidades executoras, o sistema digital de gestão e as estratégias de prevenção à evasão, apoiando o alcance da conclusão das metas do módulo.
R – Relevante: Está diretamente alinhado ao(s):
Objetivos Estratégicos (OE) do PPA:
OE 103 – Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental
OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social
OE 302 – Aprimorar a capacidade do Estado
- Componente 1 - Acompanhamento e Desenvolvimento Familiar
Objetivos Específicos: b) Ampliar o acesso de famílias em extrema vulnerabilidade à proteção social, promovendo segurança alimentar, acesso a direitos e articulação intersetorial
- Resultado Esperado: 2; 3; 4
T – Temporal: Apuração anual acumulada, com ênfase no resultado consolidado ao final do programa (2029), considerando as famílias que concluíram o Módulo Proteger em diferentes ciclos de entrada e conclusão.

Meta:
- Linha de base (2025): zero, uma vez que o programa ainda não iniciou.
- Meta (2029): Ao menos 60% das famílias que completarem o Módulo Proteger devem concluir esta etapa cumprindo ao menos 75% das metas do respectivo Plano de Desenvolvimento Familiar.

1. 30. 10. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador 4: Taxa de registros de atendimentos da assistência social no SIGMA, em relação ao total informado no PMASweb (municípios aderentes ao Programa SuperAção/SP)

Descrição:
Indicador SMART: Percentual de atendimentos e acompanhamentos realizados por servidores municipais da assistência social, nos municípios aderentes ao Programa SuperAção/SP, que foram devidamente registrados no sistema SIGMA (prontuário eletrônico do SUAS), em relação ao total de atendimentos informados no sistema PMASweb.
S – Específico: Mede o grau de adesão dos servidores municipais ao uso do SIGMA como ferramenta oficial de registro de atendimentos e acompanhamentos socioassistenciais nos municípios que aderirem ao SuperAção/SP, tomando como referência o total de atendimentos informados no PMASweb.
M – Mensurável: Calcula-se dividindo o número de atendimentos registrados no SIGMA pelos municípios aderentes pelo total de atendimentos declarados no PMASweb para o mesmo período e universo municipal, multiplicado por 100.
A – Atingível: A meta é viável devido à obrigatoriedade de uso do SIGMA, à capacitação ofertada aos municípios, ao apoio técnico da SEDS e à disponibilização de infraestrutura mínima para acesso ao sistema.

R – Relevante: Está diretamente alinhado ao(s):
- Objetivos Estratégicos (OE) do PPA:
OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social
OE 302 – Aprimorar a capacidade do Estado
- Componente 2 - Assistência Técnica
- Objetivos Específicos: a) Fortalecer a capacidade institucional e a equidade territorial das políticas de proteção social no Estado de São Paulo; e c) Promover a autonomia econômica de famílias em vulnerabilidade, por meio de acompanhamento qualificado, capacitação e inclusão produtiva sustentável
- Resultado Esperado: 2; 8
T – Temporal: Monitoramento semestral com apuração acumulada anual de 2025 a 2029.

Meta:
- Linha de base (2025): 0% (fase de implantação do SIGMA)
- Meta (2029): Alcançar 70% de registro dos atendimentos informados no PMASweb devidamente lançados no SIGMA, nos municípios aderentes ao Programa.

1. 30. 13. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador 5: Percentual de famílias que avaliam positivamente o acompanhamento técnico após capacitação dos agentes

Descrição:
Indicador SMART: Percentual de famílias acompanhadas no âmbito do Programa SuperAção/SP que, após a capacitação dos Agentes de Desenvolvimento Familiar, avaliam positivamente o acompanhamento recebido (nota ? 4, em escala de 1 a 5).
S – Específico: Mede a percepção das famílias atendidas sobre a qualidade do acompanhamento técnico recebido após a capacitação dos Agentes, refletindo a efetividade da qualificação institucional e seu impacto direto na ponta do atendimento.
M – Mensurável: Calcula-se por meio de instrumento padronizado de avaliação aplicado às famílias que passaram por pelo menos 6 meses de acompanhamento com agentes capacitados. Considera-se “avaliação positiva” quando a nota atribuída for igual ou superior a 4 (em escala de 1 a 5), dividida pelo total de avaliações válidas.
A – Atingível: A meta é realista, considerando a formação estruturada dos agentes, o suporte técnico contínuo das entidades executoras e o sistema digital que permite monitorar a qualidade do acompanhamento e aplicar as avaliações periodicamente.
R – Relevante: Está diretamente alinhado ao(s):
- Objetivos Estratégicos (OE) do PPA:
OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza
OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social
OE 302 – Aprimorar a capacidade do Estado
- Componente 3 - Fortalecimento Institucional
- Objetivos Específicos: a) Fortalecer a capacidade institucional e a equidade territorial das políticas de proteção social no Estado de São Paulo.
Resultado Esperado: 3; 4; 5
T – Temporal: O indicador será monitorado anualmente entre 2025 e 2029, com foco nas famílias em acompanhamento ativo em cada período.

Meta:
- Linha de base (2025): zero, uma vez que o programa ainda não iniciou.
- Meta (2029): Ao menos 80% das famílias acompanhadas por agentes capacitados avaliam positivamente o acompanhamento técnico recebido.

1. 31. **Componentes**
1. 31. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Acompanhamento e Desenvolvimento Familiar
Valor estimado em Dólar (USD): 89.400.000,00

Descrição:
O Programa SuperAção/SP estrutura uma rede de apoio técnico e social voltada ao acompanhamento personalizado das famílias participantes, com o objetivo central de criar condições reais para que cada uma delas construa sua própria trajetória de superação da pobreza. Com o suporte de profissionais qualificados, essa estratégia combina escuta ativa, fortalecimento dos vínculos com políticas públicas e mobilização das potencialidades familiares.
A base operacional dessa rede é composta pelos Agentes de SuperAção – técnicos de nível superior em ciências humanas ou sociais aplicadas, contratados e capacitados especialmente para o acompanhamento direto das famílias elegíveis. Cada Agente é responsável por até 20 famílias, atuando de forma próxima e contínua, com foco na construção de vínculos, no diagnóstico sociofamiliar e na elaboração dos Planos de Desenvolvimento Familiar (PDFs), sempre individualizados e adaptados ao grau de vulnerabilidade e às condições específicas de cada núcleo. Esse acompanhamento humanizado e permanente garante que metas e estratégias sejam definidas de maneira

realista e efetiva.
Para assegurar a qualidade técnica das ações, os Agentes são acompanhados por supervisores, que orientam metodologicamente as práticas de campo, monitoram os processos e promovem a formação continuada das equipes. Cada supervisor coordena uma equipe de até 15 Agentes e está vinculado a um coordenador geral, responsável pela gestão estratégica, normativa e institucional do componente. O coordenador define metas, diretrizes, acompanha a implementação das ações e articula o alinhamento técnico das equipes, participando também dos processos formativos.
O perfil dos Agentes exige conhecimentos sólidos sobre políticas e programas de assistência social, metodologias de acompanhamento familiar, estratégias de superação da pobreza, inclusão produtiva, geração de renda, direitos sociais e acesso a serviços públicos. Entre as habilidades esperadas estão escuta ativa, comunicação acessível, atendimento personalizado, mediação de conflitos, trabalho em equipe, gestão de equipe e capacidade de adaptação. Atitudes como empatia, proatividade, ética, respeito à diversidade e foco na autonomia das famílias são fundamentais para o exercício qualificado da função.
As atribuições dos Agentes incluem o mapeamento e diagnóstico das famílias elegíveis; a elaboração e o acompanhamento dos PDFs; o encaminhamento das famílias aos programas e serviços vinculados ao PSP; a participação em formações contínuas; e a articulação direta com os supervisores. Já os supervisores são responsáveis pela gestão das equipes, planejamento e monitoramento das ações, elaboração de relatórios de gestão, articulação com diferentes níveis de governo, organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias, além de promover a troca de experiências entre os profissionais e participar da formação continuada. O coordenador geral responde pela gestão estratégica e normativa, articulação institucional, definição de metas e diretrizes, e pelo acompanhamento integral da execução.
Todos os profissionais da rede – Agentes, supervisores e coordenador geral – passarão por formação inicial e capacitação continuada, com atualização metodológica permanente, inclusive no uso de sistemas informatizados. Para viabilizar as atividades de campo, a estrutura contará com equipamentos essenciais como tablets, chips de dados, materiais de registro e transporte, garantindo cobertura em todo o território estadual.
A entrada das famílias será escalonada por trimestres, sempre iniciando pelo Módulo Proteger. A progressão para as etapas seguintes dependerá das condições específicas de cada família e da evolução do seu Plano de Desenvolvimento Familiar. Esse modelo permite ajustar o número de famílias atendidas, a intensidade das visitas e a alocação de profissionais. Cada Agente realizará, em média, quatro visitas por dia (20 por semana), sendo as visitas mais frequentes nos primeiros meses, período essencial para a construção de vínculos e o início das ações estruturantes do Programa.

Descrição de subcomponentes e produtos:
a) Produto 1: Contratação dos Técnicos para acompanhamento familiar (Agentes de SuperAção, Supervisores e Coordenador)
Os profissionais responsáveis pelo acompanhamento direto das famílias, pela elaboração dos Planos de Desenvolvimento Familiar e pela orientação continuada ao longo do Programa serão os Agentes de SuperAção. Assim como os Supervisores e o Coordenador Geral, esses profissionais serão contratados por uma ou mais organizações da sociedade civil parceiras, que atuarão em cooperação com o Governo do Estado na execução do Programa. Os Agentes terão como atribuições principais o atendimento qualificado às famílias, com foco na facilitação do acesso a serviços públicos, na orientação sobre direitos sociais e no fortalecimento do exercício da cidadania. Sua atuação busca ampliar os vínculos comunitários, fortalecer redes de apoio e promover o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas, contribuindo de forma decisiva para a construção de trajetórias sustentáveis de superação da pobreza. Serão contratados 567 Agentes de SuperAção e 38 Supervisores que farão atendimento de cerca de 17.000 famílias por mês. O valor mensal estimado por Agente é de aproximadamente R$ 6.500,00, enquanto o valor por Supervisor gira em torno de R$ 11.000,00. O Coordenador Geral, responsável pela gestão estratégica do componente, terá remuneração estimada em R$ 28.000,00 mensais. Todos os valores consideram o salário base acrescido do 13º proporcional e encargos trabalhistas. Esses custos estão previstos no orçamento do Programa, garantindo os recursos necessários para a implementação qualificada, a continuidade do acompanhamento e a capilaridade das ações nos municípios prioritários que aderirem ao Programa.
- Valor estimado: 80 MM
- Meta física: Atendimento de 17.000 famílias por mês

b) Produto 2: Aquisição de Equipamentos para Técnicos da OSC (Agentes de SuperAção, Supervisores e Coordenador)
Fornecimento de computadores, tablets, celulares, materiais de registro e acesso à internet ilimitado, com cobertura adequada nos territórios de atuação. Os equipamentos deverão ser compatíveis com o sistema de acompanhamento familiar disponibilizado pela SEDS e utilizados para a execução das atividades de campo. A quantidade deverá ser proporcional ao número de Agentes de SuperAção e Supervisores contratados simultaneamente.
- Valor estimado: 1,4 MM
- Meta física: 600 técnicos de campo equipados com equipamentos adequados para suas atividades

c) Produto 3: Assistência na gestão de OSCs parceiras (Gestão e Transporte)
Apoio técnico e logístico para qualificação da gestão da entidade executora do Programa, a OSC responsável pela contratação dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento direto das famílias.
- Valor estimado: 4 MM
- Meta física: 600 técnicos realizando visitas in loco por mês

d) Produto 4: Formação continuada para Técnicos (Agentes de SuperAção, Supervisores e Coordenador)
Serão realizadas capacitações periódicas dos 600 técnicos contratados pela OSC ao longo dos quatro anos do Programa, com foco em metodologias de escuta qualificada, gestão de casos e articulação intersetorial. Adicionalmente, cerca de 400 servidores da assistência social dos municípios prioritários serão formados para operar o sistema SIGMA SUAS.
- Valor estimado: 4 MM
- Meta física: 600 técnicos capacitados com a metodologia do programa

1. 31. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Assistência Técnica
Valor estimado em Dólar (USD): 4.500.000,00

Descrição:
O Componente 3 tem como objetivo fortalecer a capacidade dos municípios para a implementação qualificada do Programa SuperAção SP, por meio de ações articuladas de assistência técnica. O foco está na promoção da equidade territorial, no fortalecimento da rede socioassistencial local e na modernização da gestão por resultados, com ênfase nos territórios mais desiguais do Estado. A definição da primeira onda de municípios a serem contemplados pelo Programa será realizada com base na análise de três critérios socioeconômicos principais: o Índice Absoluto de Pobreza (IAP), que permite identificar os territórios com maior concentração de pobreza; o Produto Interno Bruto (PIB) Municipal elevado, como indicativo de economias desenvolvidas e com potencial de absorção de investimentos sociais; e a Taxa de Ocupação, que aponta os municípios com maior capacidade de inserção de trabalhadores, favorecendo a inclusão produtiva.
Conceder assistência técnica aos municípios aderentes constitui, assim, uma etapa estratégica e estruturante, com o intuito de prepará-los para uma implantação eficiente, qualificada e adaptada às realidades locais. Esse apoio incidirá sobre diversas dimensões-chave, como a mobilização e sensibilização intersetorial.

Descrição de subcomponentes e produtos:
a) Produto 1: Implementação e operação do sistema SIGMA SUAS de monitoramento das famílias do SuperAção e da Assistência Social
O produto do Componente 2 visa modernizar a gestão municipal da assistência social e do Programa SuperAção SP por meio da implantação do sistema SIGMA, destinado ao registro, acompanhamento e monitoramento territorializado das ações. Originalmente cedido à SEDS pela Prefeitura Municipal de Vitória, com código-fonte aberto, o SIGMA será aprimorado pela Secretaria para atender às especificidades do Programa. Sua implementação nos municípios-piloto constitui uma estratégia central de digitalização da gestão e qualificação dos registros administrativos, promovendo maior eficiência, integração de dados e capacidade analítica. O sistema permitirá o registro detalhado dos atendimentos individuais e familiares realizados nas Trilhas de Proteção Social e de Superação da Pobreza; o acompanhamento sistemático de indicadores de desempenho dos serviços e das famílias atendidas; além da geração de relatórios periódicos para uso da Vigilância Socioassistencial municipal e da gestão estadual.
O SIGMA será desenvolvido de forma interoperável com sistemas já existentes, como o PMASweb, o CadÚnico e o Prontuário SUAS, evitando sobreposição de esforços e fortalecendo a integração entre bases de dados. Sua implantação envolverá ações coordenadas de capacitação e suporte técnico contínuo às equipes municipais, monitoramento da taxa de preenchimento e da efetiva utilização do sistema, bem como avaliação da qualidade, completude e consistência dos dados inseridos. Esse processo busca consolidar uma cultura de gestão orientada por evidências, fortalecendo a capacidade dos municípios de planejar, executar e avaliar suas ações de maneira mais estratégica, integrada e responsiva.
- Valor estimado: 4,5 MM
- Meta física: Disponibilização do sistema SIGMA para os 49 municípios aderentes

1. 31. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Fortalecimento Institucional
Valor estimado em Dólar (USD): 5.000.000,00

Descrição:
O Componente 3 tem como objetivo consolidar os instrumentos de governança, gestão e articulação intersetorial do Programa SuperAção SP, promovendo uma atuação integrada entre diferentes níveis de governo e áreas envolvidas. A efetividade de um programa com essa complexidade exige uma base institucional sólida, que viabilize a tomada de decisão qualificada, o monitoramento sistemático e a cooperação entre secretarias, municípios e organizações da sociedade civil.

Tem como objetivo consolidar os instrumentos de governança, gestão e articulação intersetorial do Programa de Superação da Pobreza, promovendo uma atuação integrada e coordenada entre os diferentes níveis de governo e as diversas áreas envolvidas. A efetividade de um programa com essa complexidade depende de uma base institucional sólida, que permita a tomada de decisão qualificada, o monitoramento sistemático das ações e a colaboração entre secretarias, municípios e parceiros da sociedade civil. A proposta organiza-se em duas frentes principais: Instrumentos de Governança e Gestão e Workshops e Formação Intersetorial. Com essas ações, o componente busca garantir a sustentabilidade e o aprimoramento contínuo do Programa, por meio de mecanismos institucionais que promovam a cooperação, a transparência e a capacidade adaptativa diante dos desafios da política pública de superação da pobreza.

Descrição de subcomponentes e produtos:
a) Produto 1: Instrumentos de Governança e Gestão
Desenvolvimento e institucionalização de normas, protocolos, comitês, acordos de cooperação e fluxos operacionais, com definição clara de atribuições e instâncias decisórias, consolidando um modelo de gestão compartilhada, transparente e eficiente.
- Valor estimado: 2,6 MM
- Meta física: Pelo menos 40.000 manuais impressos e distribuídos para gestores municipais, Agentes e famílias beneficiárias

b) Produto 2: Workshops e Formação Intersetorial
Realização de encontros formativos e técnicos com representantes de diferentes áreas e esferas de governo, voltados ao fortalecimento da articulação intersetorial, à promoção de uma cultura colaborativa e ao alinhamento estratégico das equipes.
- Valor estimado: 2,4 MM
- Meta física: Pelo menos 250 gestores capacitados e sensibilizados com a metodologia do programa
1. 31. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 4.000.000,00

Descrição:
Este componente reúne as ações necessárias à coordenação central, supervisão, avaliação, auditoria e gestão financeira da operação de crédito e do Programa SuperAção SP como um todo. Por se tratar de uma iniciativa multicomponente, com forte articulação entre diferentes níveis de governo e setores da administração pública, é fundamental contar com uma estrutura de gestão robusta, que assegure a consistência técnica das ações, o cumprimento dos marcos operacionais, a conformidade regulatória e o uso eficiente dos recursos.
A unidade executora do Programa será responsável pela coordenação geral, planejamento e consolidação das informações técnicas, operacionais e financeiras. Para isso, contará com equipe dedicada, infraestrutura mínima e sistemas de informação que permitam o acompanhamento da execução dos componentes e a interlocução com o agente financiador. Esse arranjo será apoiado por mecanismos de supervisão interna e externa, com foco no controle técnico da implementação e na identificação de riscos, desvios e oportunidades de melhoria.
O componente também contempla o desenho e a execução de uma estratégia de avaliação de impacto, voltada à mensuração dos efeitos do Programa sobre a vida das famílias beneficiárias e à produção de evidências para subsidiar a formulação e o aprimoramento de políticas públicas. Além disso, inclui a realização de auditoria independente, conforme exigido pelo agente financiador, e a celebração de contrato bancário específico para a operacionalização dos repasses financeiros, em conformidade com critérios de rastreabilidade e controle contábil definidos pela legislação vigente e pelos acordos de empréstimo internacionais.

Descrição de subcomponentes e produtos:
a) Produto 1: Unidade Executora do Programa
A Unidade Executora será o núcleo técnico-administrativo responsável por gerir o Programa com financiamento do BID. O recurso será utilizado para contratação de equipe multidisciplinar e desempenhará as seguintes funções:
- Planejamento e supervisão da execução dos componentes do Programa;
- Articulação institucional com municípios, órgãos de controle e parceiros privados.
- Gestão de aquisições;
- Operação do sistema digital de monitoramento e consolidação de indicadores.
- Elaboração de relatórios de progresso e prestação de contas ao BID, garantindo conformidade com as exigências do banco.
- Valor estimado: 0,5 MM
- Meta física: 1 UGP

b) Produto 2: Desenho e avaliação de impacto do Programa
Elaboração e execução da estratégia de avaliação, incluindo definição metodológica, construção de linha de base e realização de estudos sobre os efeitos do Programa nos beneficiários.
- Valor estimado: 3 MM
- Meta física: Realização de avaliação de impacto do programa

c) Produto 3: Auditoria
Contratação de auditoria independente para verificação da conformidade financeira e operacional da execução do Programa.
- Valor estimado: 0,2 MM
- Meta física: Realização da auditoria do programa

d) Produto 4: Contrato bancário para operacionalização dos repasses financeiros
Celebração de instrumento com agente bancário responsável pela movimentação dos recursos da operação, conforme regras de rastreabilidade e controle estabelecidas.
- Valor estimado: 0,3 MM
- Meta física: Operação para pagamento de 392.000 auxílios e benefícios por ano para as famílias

1. 32. **Beneficiários**


A atuação do Programa SuperAção SP será territorialmente focalizada, com base na análise de indicadores socioeconômicos combinados, que permitiram mapear municípios com alta concentração de pobreza, baixa formalização e potencial econômico relevante. Esses municípios compõem uma tipologia de territórios com desafios complexos, mas também com capacidade de absorver investimentos sociais estruturantes. A seleção considerou três indicadores principais:
- PIB per capita: calculado a partir da divisão do Produto Interno Bruto anual pelo número de habitantes do município (IBGE, 2022), o indicador reflete a riqueza média por habitante e sinaliza o dinamismo econômico local;
- Concentração de pobreza: medida pelo número absoluto de pessoas com renda familiar per capita de até R$ 218,00, conforme registros atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses (referência: agosto de 2024), o indicador aponta a magnitude da população em situação de pobreza em cada município;
- Taxa de formalização: obtida pela soma de vínculos trabalhistas ativos (RAIS, 2022) e de microempreendedores individuais formalizados (MEI/SEFAZ), dividida pela população em idade economicamente ativa (18 a 64 anos), com base no Censo Demográfico de 2022. Este indicador expressa o nível de formalização do mercado de trabalho e o potencial de absorção da força de trabalho local.

Para refinar a priorização territorial, o Programa utilizou técnicas estatísticas georreferenciadas, com destaque para a aplicação do Índice de Moran, ferramenta que mede a autocorrelação espacial de uma variável, ou seja, o grau de similaridade entre valores de um mesmo indicador em áreas vizinhas. Essa abordagem permitiu identificar padrões de concentração (clusters) e áreas de transição, fundamentais para o planejamento territorial. O Índice de Moran Local (Ii) foi representado por meio de scatterplots, que classificam os municípios em quatro quadrantes:
- Q1 (alto-alto – AA): municípios com valores elevados cercados por vizinhos com igualmente altos valores, indicando aglomerados de alta vulnerabilidade ou de alta renda;
- Q2 (baixo-baixo – BB): municípios com valores baixos cercados por vizinhos com baixos valores, representando aglomerados de baixa vulnerabilidade;
- Q3 (alto-baixo – AB): municípios com altos valores cercados por vizinhos com baixos valores, caracterizando zonas de contraste socioeconômico;
- Q4 (baixo-alto – BA): municípios com valores baixos cercados por vizinhos com valores altos, também considerados territórios de transição.

A identificação dos clusters AA e BB foi fundamental para reconhecer territórios com maior urgência ou menor necessidade de intervenção, enquanto os quadrantes AB e BA apontaram áreas sujeitas à transição e instabilidade socioeconômica. Essa análise orientou a definição dos 49 municípios prioritários que compõem a primeira fase de implementação do Programa.
O público prioritário do SuperAção SP será composto por famílias em situação de vulnerabilidade social residentes nesses municípios, identificadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) com base em critérios objetivos. Serão consideradas elegíveis ao Programa as famílias com cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nos últimos 24 meses e com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. A partir do CadÚnico, será realizada uma classificação inicial das famílias, com base na existência de barreiras à inclusão produtiva. Famílias com maior grau de vulnerabilidade — tais como: ausência de acesso ao Bolsa Família, apesar de terem direito; inexistência de adultos em idade ativa no domicílio; presença de adultos com impedimentos para o trabalho devido à necessidade de cuidados; ou presença de adultos em situação de rua — serão direcionadas à Trilha de Proteção Social, recebendo atendimento continuado pela rede socioassistencial, especialmente por meio dos serviços PAIF e PAEFI.
As demais famílias elegíveis, sem impedimentos estruturais para a inclusão produtiva, serão direcionadas à Trilha de Superação da Pobreza – Programa, com foco na promoção da autonomia econômica, por meio de acompanhamento, capacitação e incentivos à geração de renda. A tabela a seguir apresenta os quantitativos estimados de famílias elegíveis em ambas as Trilhas nos 49 municípios selecionados, com sua distribuição desagregada por município.

	Famílias com maior vulnerabilidade à inclusão produtiva - Elegíveis à Trilha de Proteção Social	Situação de menor vulnerabilidade à inclusão produtiva - Elegíveis à Trilha de Superação da Pobreza	Total de famílias com o CadÚnico atualizado
Estado	802.002	2.405.786	3.207.788
49 municípios prioritários	451.195	1.200.364	1.651.559

Image not found or type unknown

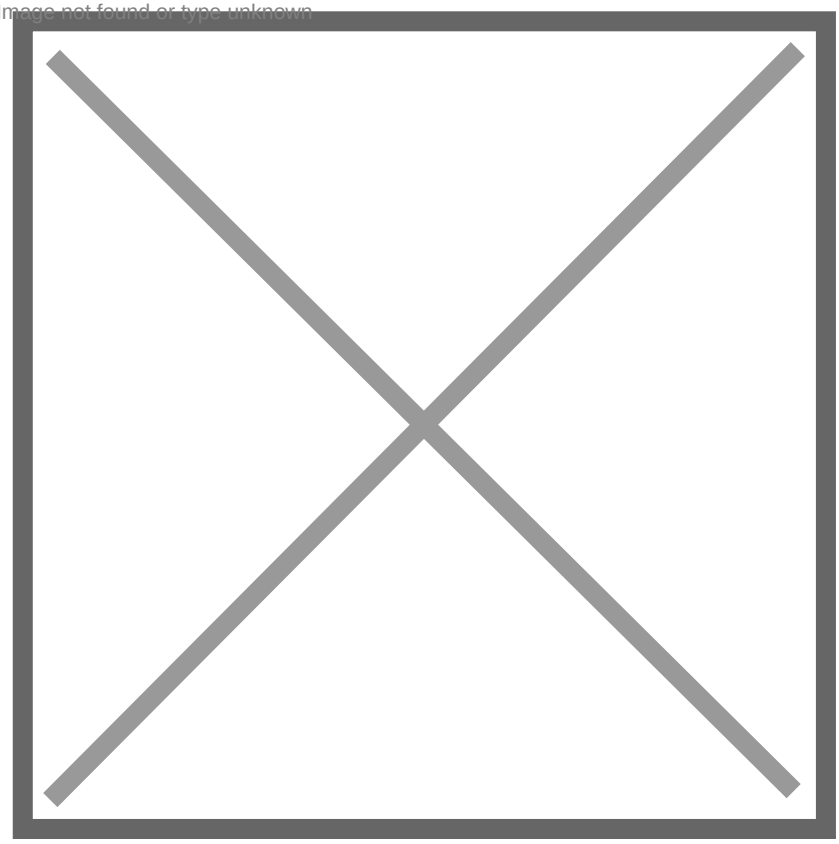

As principais carências enfrentadas pelas famílias inseridas na Trilha de Superação da Pobreza dizem respeito a barreiras estruturais e contextuais que dificultam sua inclusão produtiva e sua participação plena no mundo do trabalho. Entre os principais obstáculos, destacam-se a ausência de vagas em creches ou redes de apoio para cuidados, a escolaridade incompleta, a baixa ou nenhuma qualificação profissional, a falta de orientação para o desenvolvimento de trajetórias produtivas, a dificuldade de acesso ao microcrédito ou a outros meios de capitalização e a desinformação — ou mesmo exclusão — quanto ao acesso a políticas públicas federais, como o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Adicionalmente, essas famílias, em sua maioria, apresentam composições marcadas por chefia feminina, presença de pessoas com deficiência, responsabilidades intensivas de cuidado ou vínculos frágeis com os sistemas de saúde e educação. Essa configuração reforça o caráter multidimensional da exclusão vivenciada. Ao reconhecer tais vulnerabilidades, o Programa SuperAção SP propõe uma abordagem integrada, combinando ações de proteção social, desenvolvimento de capacidades e promoção da inclusão produtiva. A estratégia adotada busca responder de forma ajustada ao perfil e às necessidades de cada núcleo familiar, promovendo a superação das barreiras que perpetuam a pobreza no Estado de São Paulo.

1. 33. **Anexos**

ANEXO 1 - Critério de Seleção dos Municípios prioritários do Programa

ANEXO 1.2 - Análise do perfil das famílias, por município

Carta de manifestação de interesse do BID

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa de Superação da Pobreza está diretamente alinhado à **Prioridade Estratégica I – Combate à fome e redução das desigualdades, conforme disposto no §3º do art. 15 da Resolução Normativa nº 1/2024.** Essa prioridade estrutura toda a lógica da operação, que integra transferência de renda, segurança alimentar, acesso a direitos, proteção social e inclusão produtiva progressiva, especialmente em territórios com alta vulnerabilidade social.

A proposta está fortemente conectada à **Área Estratégica 101 – Redução da Pobreza e das Desigualdades Sociais**, constituindo o eixo central dos componentes, objetivos e resultados da operação. As ações enfrentam de forma articulada os múltiplos fatores que perpetuam a pobreza, aliando apoio financeiro a estratégias de capacitação, acompanhamento familiar e desenvolvimento de trajetórias personalizadas de inclusão no mundo do trabalho. O programa atuará com cerca de 35 mil famílias em todo o estado.

Também se destaca a aderência à **Área Estratégica 207 – Trabalho, Emprego e Renda**, na medida em que o programa prevê mecanismos efetivos para a geração de oportunidades econômicas, como qualificação profissional, bonificação por metas alcançadas, incentivo ao empreendedorismo e articulação com o setor produtivo local para facilitar a inserção dos beneficiários em ocupações formais ou informais.

O Programa SuperAção SP contribui para a **Área Estratégica 106 - Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social,** ao adotar uma abordagem centrada em direitos: garante às famílias em situação de pobreza o acompanhamento familiar qualificado (Componente 1) e serviços públicos ofertados pelos municípios (Componente 2), tudo supervisionado por um arranjo de governança voltado à transparência e à participação social (Componente 3). Esses eixos articulados buscam assegurar dignidade, ampliar o acesso a oportunidades e reduzir barreiras que afetam grupos historicamente vulneráveis—entre eles mulheres chefes de família, pessoas negras e famílias em territórios de alta exclusão—promovendo, assim, inclusão social baseada no respeito e na efetivação dos direitos humanos.

Nas etapas de inclusão produtiva, o **Programa está associado a Área Estratégica 110 - Proteção previdenciária**, pois incentiva que as famílias busquem ocupações formalizadas (emprego ou MEI), orientando-as sobre registro no INSS e demais exigências legais, o que amplia a cobertura previdenciária dos novos trabalhadores.

Há relevante contribuição para a **Área Estratégica 205 – Produtividade e Competitividade Econômica**, ao integrar diagnósticos territoriais com estratégias de qualificação da mão de obra e fortalecimento das vocações regionais. A proposta inclui estudos sobre cadeias produtivas locais, articulação com a iniciativa privada e incentivo à geração de pequenos empreendimentos, ampliando a capacidade produtiva e a autonomia das famílias atendidas.

No campo das políticas sociais integradas, o programa contribui com a **Área Estratégica 103 – Educação Básica**, por meio de ações em parceria com a SEDUC voltadas à ampliação da rede de creches nos municípios priorizados, facilitando o acesso de mulheres ao mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças em situação de vulnerabilidade.

Considerando o perfil das famílias beneficiadas, majoritariamente compostas por mulheres chefes de família, a proposta se alinha fortemente à **Área Estratégica 107 – Equidade de Gênero**, promovendo a autonomia financeira, o acesso a direitos e o fortalecimento das redes de proteção a mulheres em situação de risco ou sobrecarga de cuidados.

Além disso, a proposta dialoga com a **Área Estratégica 105 – Economia Criativa, Memória e Cultura Popular,** ao estabelecer interface com políticas de fomento cultural e profissionalização na área da cultura, por meio do CultSP Pro, da Secretaria de Cultura. Essa articulação será especialmente relevante para beneficiários inseridos em cadeias produtivas ligadas à arte, saberes tradicionais e expressões culturais locais.

Quanto à gestão pública, o programa se conecta à **Área Estratégica 214 – Redução das Desigualdades Regionais**, ao estruturar intervenções em territórios com maior vulnerabilidade, promovendo o desenvolvimento local com base em demandas econômicas e sociais identificadas.

Por fim, relaciona-se ainda à **Área Estratégica 302 – Cooperação Federativa e Fortalecimento das Capacidades Estatais**, ao estabelecer mecanismos de apoio técnico aos municípios, com vistas ao aprimoramento da estrutura e dos serviços do SUAS nos territórios priorizados.

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO


3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A estrutura de governança e gestão do Programa SuperAção SP foi desenhada para assegurar a convergência entre os objetivos estratégicos e a entrega eficaz das ações nos territórios. Essa estrutura está organizada em três esferas interdependentes:


- Governo do Estado de São Paulo: é responsável pela condução estratégica do Programa, por meio de instâncias superiores de governança e gestão, assegurando alinhamento institucional, articulação intersetorial, monitoramento de resultados e prestação de contas pública.
- Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS): exerce o papel de órgão executor principal, com responsabilidade sobre a gestão técnica, orçamentária e estratégica do Programa, além de coordenar sua execução junto aos municípios e à entidade executora.
- Governos Municipais: caberá aos municípios implantar estruturas de gestão local, com base nas orientações e pactuações com o Estado, de forma a garantir a efetiva implementação das ações no território, a adesão da rede de proteção local e a interlocução contínua com as famílias.

Image not found or type unknown

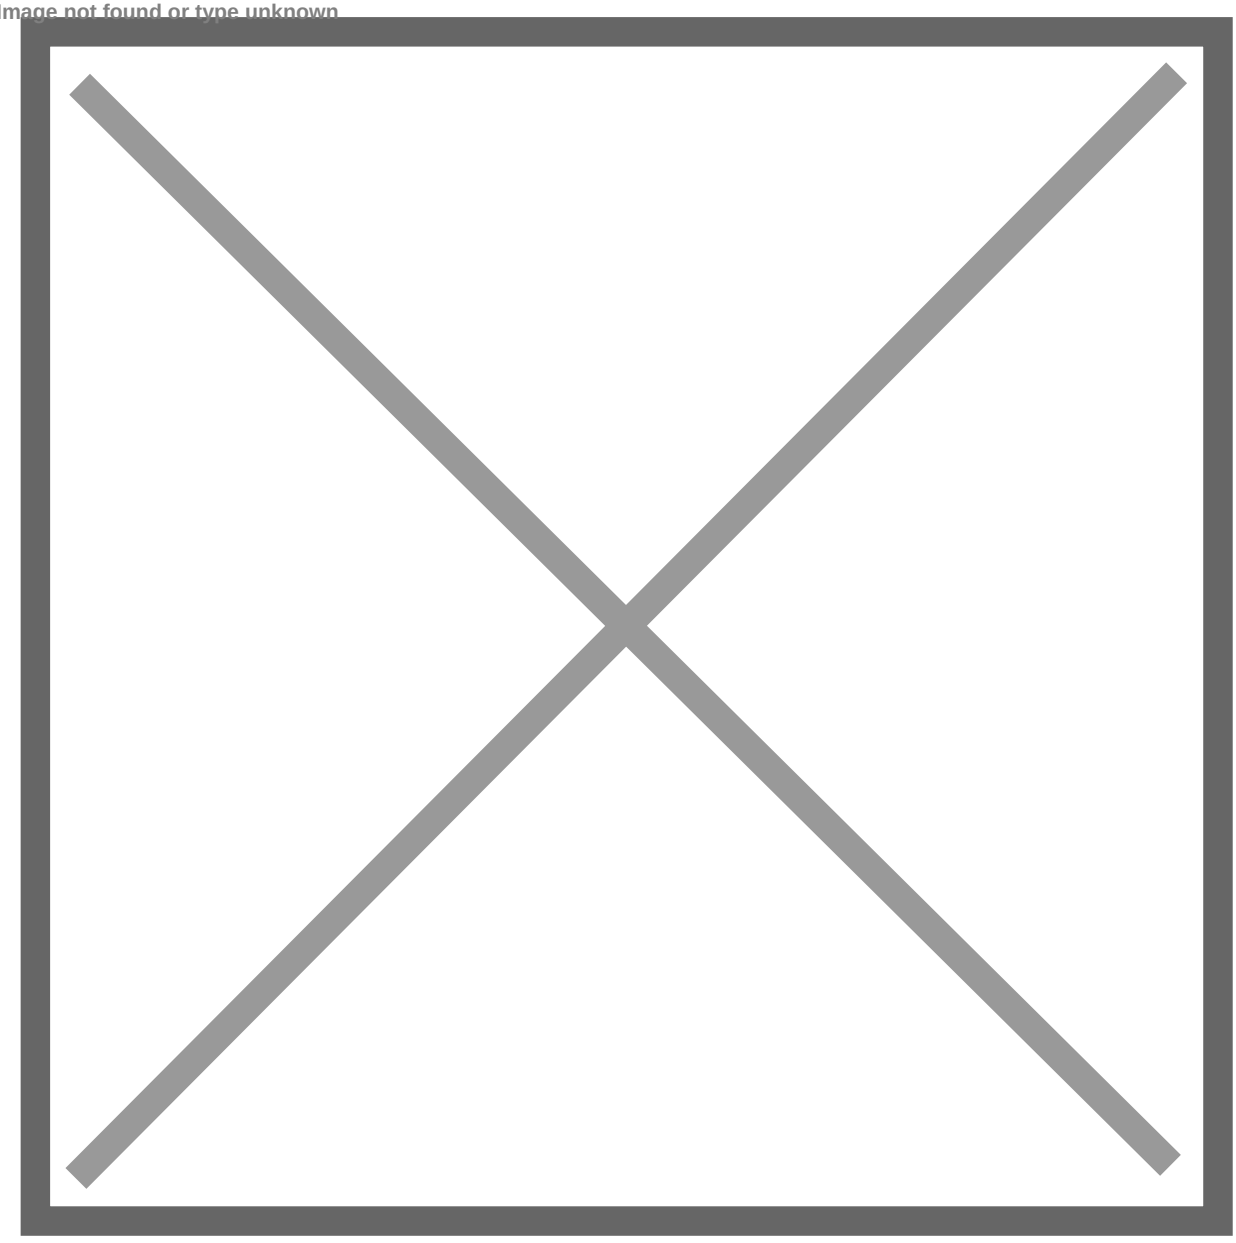

Estrutura de Governança e Gestão:

Image not found or type unknown

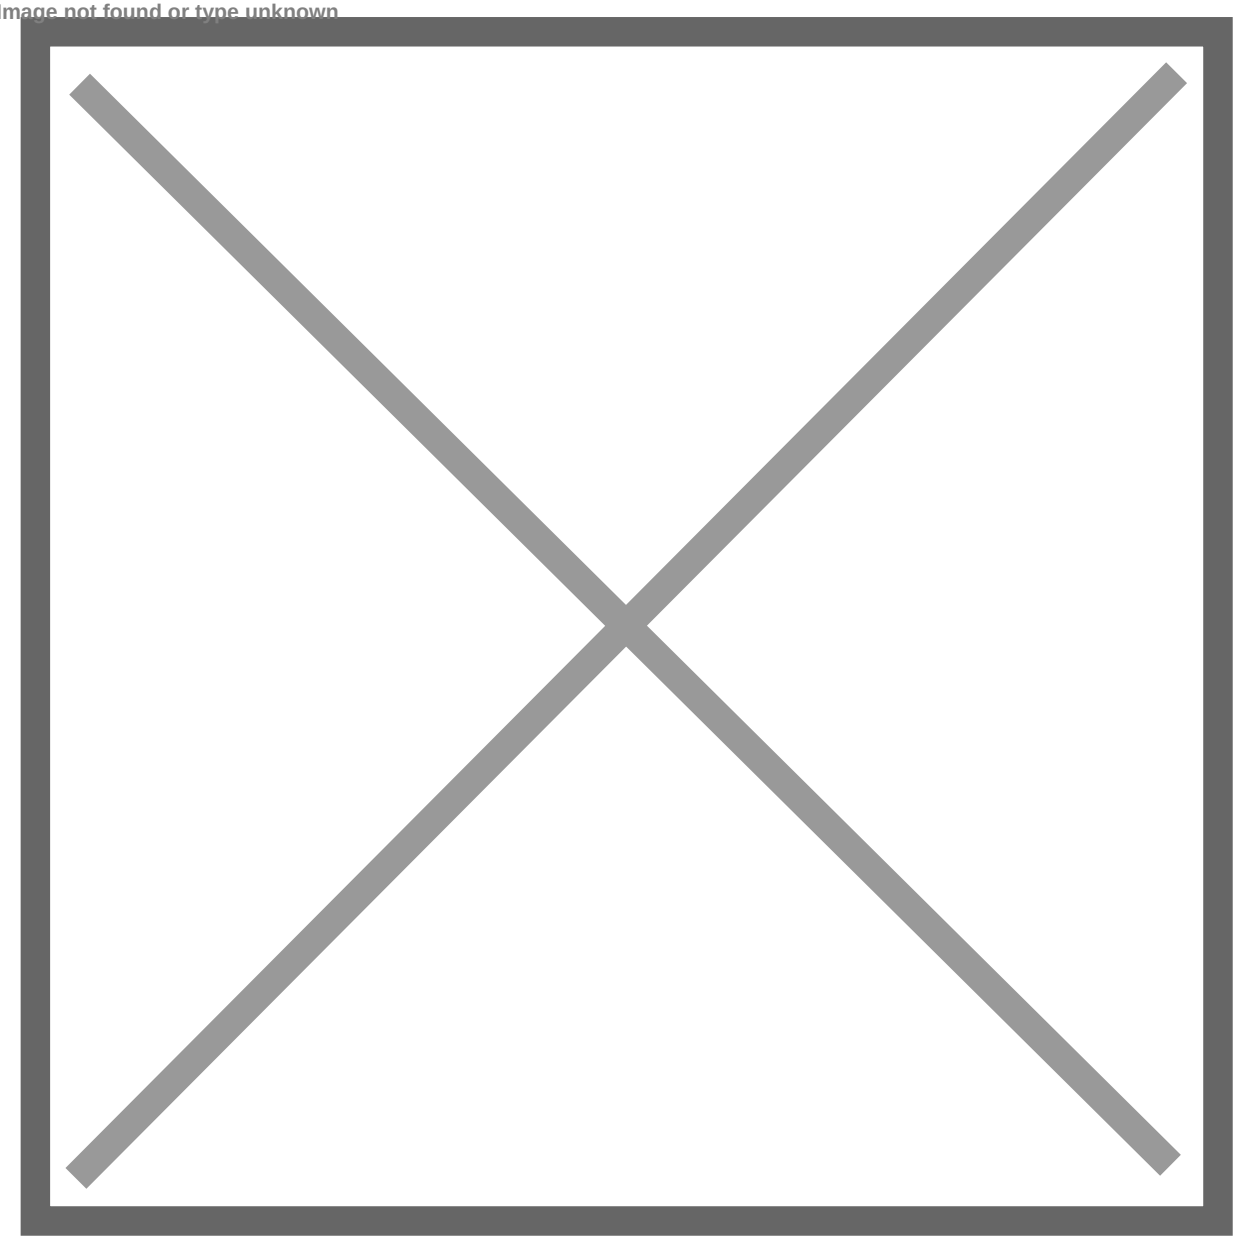

GOVERNANÇA:

- **Coalizão pela Superação da Pobreza**

Instância consultiva presidida pelo Governador do Estado, com representantes da Casa Civil, SEDS, setor produtivo, sociedade civil, academia e municípios. Tem por finalidade promover diálogo intersetorial, garantir transparência e reforçar a legitimidade do Programa. Reúne-se semestralmente para prestação de contas e mobilização de parcerias estratégicas.

- **Comitê Gestor Intersetorial do Programa SuperAção SP**

Instância central de governança, com funções deliberativas e consultivas, presidida pela Casa Civil e composta por titulares das secretarias envolvidas na execução do Programa, incluindo a SEFAZ-SP. É responsável por definir estratégias, metas e diretrizes operacionais; deliberar sobre normas e fluxos; avaliar resultados; e promover a articulação intersetorial. Pode instituir Câmaras Técnicas e Grupos Temáticos. Reuniões trimestrais. A implementação envolve secretarias finalísticas que ofertarão serviços e oportunidades às famílias beneficiárias.

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE): oferta de programas de qualificação profissional (ex: Qualifica SP) e apoio ao empreendedorismo com acesso a microcrédito (Banco do Povo).
- Secretaria da Educação: articulação com a rede pública de ensino e suporte a ações educacionais voltadas às famílias beneficiárias, com destaque para a construção de creches, ensino de jovens e adultos e programas de permanência escolar (ex: Bolsa Estágio Ensino Médio).
- Secretaria da Saúde: articulação com a rede básica de saúde e atenção psicossocial.
- Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas: ações culturais e criativas voltadas à inclusão social e à qualificação profissional na área da indústria criativa (ex: CultSP Pro).

- Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL): apoio a estratégias de desenvolvimento sustentável, mobilidade e infraestrutura social.
- Secretaria da Habitação: interface com programas de melhoria habitacional para famílias vulneráveis.
- Fundo Social do Estado de São Paulo: apoio a ações sociais complementares, parcerias com organizações da sociedade civil e cursos de qualificação e orientação profissional.

Esse conjunto de órgãos reflete o caráter intersetorial e transversal do programa, garantindo sua integração com as políticas públicas existentes e ampliando a capilaridade das ações em todo o território estadual. As secretarias municipais dos municípios aderentes também terão papel essencial, especialmente na oferta de vagas em creches, atendimento pelo SUAS e articulação com a rede local de serviços.

- **Comitê Executivo do Programa SuperAção SP**

Instância de gestão responsável por articular as diretrizes estratégicas com a execução em campo. Coordenado pela Casa Civil e pela SEDS, atua na gestão tática, articulando ações entre as secretarias estaduais, supervisionando a jornada das famílias beneficiárias e subsidiando os Comitês superiores com dados e relatórios analíticos. Reúne-se mensalmente para analisar resultados, avaliar riscos e orientar contramedidas.

- **Aliança Municipal pela Superação da Pobreza**

A estrutura de governança em âmbito municipal será composta por uma instância chamada Aliança Municipal pela Superação da Pobreza, sem caráter hierárquico em relação às instâncias estaduais, mas com papel complementar à coordenação local do Programa.
A Aliança será composta por representantes do Executivo municipal (incluindo o(a) Prefeito(a)), Fundo Social local, sociedade civil, setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa do território. Terá reuniões semestrais, com foco na promoção de pactos, alinhamento de diretrizes, escuta pública, acompanhamento de resultados e engajamento de múltiplos atores na missão de superação da pobreza.

3. 1. 13. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo (SEDS)
Órgãos parceiros:

3. 1. 14. **Estrutura Operacional:**

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) é o órgão executor principal e responsável pela coordenação operacional e tática do Programa SuperAção SP. Com estrutura consolidada, experiência em projetos de grande escala e presença estadual, a SEDS lidera a implementação do Programa.

A Subsecretaria de Políticas Públicas coordena a formulação, execução e supervisão das ações sociais da SEDS. A Diretoria de Desenvolvimento Social, vinculada a essa Subsecretaria, será responsável direta pelo Programa, com atuação técnica, orçamentária e estratégica. Suas atribuições incluem: gestão das ações, apoio aos municípios, e articulação intersetorial com áreas como educação, saúde, segurança alimentar e inclusão produtiva.

Além da Diretoria de Desenvolvimento Social, outras diretorias terão interface constante com o Programa, com destaque para:

- **Diretoria de Assistência Social:** articula os serviços da rede socioassistencial, coordena a Vigilância Socioassistencial e é responsável pela gestão dos sistemas e bases de dados do Cadastro Único;

- **Diretoria de Combate à Fome:** atua no monitoramento das ações relativas à segurança alimentar e nutricional;

- **Diretoria de Formação, Monitoramento e Avaliação:** conduz a formação continuada de trabalhadores, gestores e conselheiros; realiza o monitoramento e avaliação das ações da SEDS; e elabora estudos e pesquisas de apoio à gestão.

O corpo técnico da SEDS é multidisciplinar e atende às exigências legais de titulação e experiência previstas no Decreto Estadual nº 68.742/2024, que regulamenta a Lei nº 1.395/2023 para cargos em comissão e funções de confiança.

A SEDS conta com 26 Divisões Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), que funcionam como braços operacionais nos territórios. As DRADS acompanham a implementação das políticas, prestam suporte técnico aos municípios e promovem o diálogo entre as gestões estadual e local. Cada unidade possui sede própria e equipe técnica dedicada.

A execução direta junto às famílias será realizada por uma entidade executora especializada, contratada por seleção pública, que mobilizará equipes territoriais compostas por tutores e supervisores. Estes profissionais, com formação e experiência compatíveis com o SUAS (conforme Resolução CNAS nº 269/2006), atuarão nos territórios com formação contínua e apoio técnico sistemático.

O Programa contará ainda, para além da estrutura da SEDS e das DRADS, com Núcleos de Gestão articulados em três níveis:

- **Núcleo Estadual do Programa:** Composto pela Casa Civil, SEDS e Coordenadores do Programa. Realiza reuniões mensais com o objetivo de apresentar resultados, metas e riscos, trocar melhores práticas e receber orientação da SEDS para o aprimoramento das ações.

- **Núcleo Regional do Programa:** Composto por Coordenadores e Supervisores. Também com reuniões mensais, tem como função a apresentação dos resultados dos supervisores, revisão de metas e planos de ação, troca de experiências e orientação técnica para melhoria contínua.

- **Núcleo Territorial do Programa:** Composto por Supervisores e Agentes de SuperAção. As reuniões mensais destinam-se à apresentação de resultados dos Agentes de SuperAção, atualização de planos de ação e análise de riscos.

A gestão orçamentária será centralizada, com possibilidade de repasses a municípios, OSCs e à entidade executora mediante critérios definidos e instrumentos jurídicos específicos. Estão previstas contratações de supervisão técnica, auditoria independente e avaliação de impacto, com vistas à qualificação da execução, conformidade com os requisitos do agente financiador e geração de evidências sobre os resultados.

A gestão do Programa SuperAção SP, no âmbito municipal, será conduzida por duas instâncias complementares: a Coordenação Municipal do SuperAção e os Grupos de Trabalho Temáticos (GTTs).

- **Coordenação Municipal do SuperAção**

A Coordenação será composta pelo(a) Prefeito(a), pela Secretaria Executiva designada e por Secretários Municipais de áreas-chave. Essa instância funcionará como núcleo tático de gestão intersetorial do Programa, com reuniões trimestrais e as seguintes atribuições:

  - Coordenar a execução das ações do Programa no território municipal;

  - Assegurar a integração entre as políticas públicas locais;

  - Garantir o cumprimento das metas pactuadas com o Governo do Estado.

- **Grupos de Trabalho Temáticos (GTTs)**

Os GTTs serão formados por Secretários Municipais, técnicos das secretarias envolvidas e convidados, conforme a demanda da Coordenação. Terão caráter operacional e funcionarão como núcleos executores das ações temáticas do Programa, com foco nos eixos prioritários.

  - Atuar na execução integrada das ações definidas pelo Programa;

  - Operar de forma permanente ou temporária, conforme o tema e o ciclo de implementação;

- Realizar reuniões sob demanda da Coordenação Municipal.

3. 1. 31. **Matriz de Responsabilidade:**

ANEXO 2 Matriz de Responsabilidade RACI.docx

3. 2. Operacionalização e Manutenção

O Programa de Superação da Pobreza foi concebido com mecanismos normativos, institucionais, operacionais e financeiros que asseguram sua sustentabilidade ao longo do tempo, mesmo após o encerramento do financiamento externo. As ações estão alinhadas às competências da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) e articuladas à estrutura permanente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), garantindo continuidade no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

A institucionalização do programa será viabilizada por meio de normativas estaduais específicas, incluindo Lei, Decreto e Resolução, assegurando sua integração ao planejamento estratégico da política estadual de desenvolvimento social, inclusive em consonância com o Plano Estadual de Assistência Social. A estrutura de governança contará com a participação do Gabinete do Governador, das secretarias setoriais e dos conselhos de assistência social, consolidando um arranjo intersetorial que contribui para a coordenação e a longevidade da iniciativa.

Para assegurar a manutenção dos serviços e ações implantadas, a SEDS irá fortalecer sua política de cofinanciamento com os municípios, ampliando gradualmente os repasses financeiros e os critérios de indução para qualificar a rede socioassistencial local. Estão previstas transferências regulares de recursos estaduais para ampliar e qualificar a rede socioassistencial do Estado de São Paulo, tanto na Proteção Social Básica, como na Proteção Social Especial. Esse modelo dialoga com a lógica já existente no SUAS e será regulado por instrumentos próprios de pactuação federativa.

A operação contará ainda com uma entidade executora selecionada para implementar parte significativa das ações no território. Essa parceria será firmada com cláusulas de transição, permitindo que, ao longo dos anos, a estrutura seja progressivamente internalizada pelo poder público estadual e municipal, de acordo com os avanços institucionais e orçamentários registrados.

Por fim, o programa foi concebido de forma a fortalecer capacidades locais e fomentar inovação na gestão pública. Os investimentos em digitalização, qualificação profissional, monitoramento e articulação intersetorial não apenas contribuem para a execução imediata das ações, mas também deixam um legado institucional que se traduz em ganho permanente de eficiência e capacidade operacional para a política de superação da pobreza no Estado de São Paulo.

3. 3. Planejamento Estratégico

O Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, realizado por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, conforme artigo 21 da Lei nº 17.898, de 09 de abril de 2024, que instituiu o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2024-2027, prevê, sob o título “Superação da Vulnerabilidade Social”, registrado como Programa nº 3521. Trata-se de uma iniciativa finalística, multissetorial e de abrangência estadual, voltada à redução das desigualdades e ao enfrentamento da pobreza em suas múltiplas dimensões. O programa articula ações de proteção social, apoio à inclusão produtiva, desenvolvimento de capacidades e fortalecimento da gestão descentralizada, sendo um dos pilares estratégicos da política social do governo estadual.

A proposta está alinhada ao Objetivo Estratégico 4 do PPA, que busca reduzir a pobreza e a vulnerabilidade social no Estado, promovendo, além dos auxílios voltados à segurança de renda, oportunidades de trabalho e geração de rendimento, especialmente para famílias residentes em favelas, aglomerados subnormais e pessoas em situação de rua. Esse objetivo também abrange ações voltadas à abordagem, acolhimento e reinserção social de pessoas em situação de rua ou com dependência química, reforçando o caráter intersetorial da proposta.

O programa contribui ainda para o cumprimento de metas da Agenda 2030, em especial os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1 (erradicação da pobreza) e 10 (redução das desigualdades). Nesse escopo, destacam-se as metas 01.3 (oferecer proteção social adequada e abrangente para todos, especialmente os pobres e vulneráveis), 01.a (mobilizar recursos diversificados e suficientes para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões), 10.1 (promover o aumento da renda dos 40% mais pobres acima da média estadual) e 10.2 (promover a inclusão social, econômica e política de todos, sem discriminação).

Como produtos e entregas previstas no PPA, o programa contempla a concessão de benefícios a pessoas em situação de vulnerabilidade, o apoio descentralizado à implementação municipal da política, a sustentação administrativa e tecnológica das ações, e a promoção de qualificação e inserção produtiva para públicos prioritários. Tais entregas estão associadas a indicadores de desempenho que incluem o número de famílias atendidas, a cobertura territorial da política, a ampliação da rede de proteção social e o avanço em trilhas de superação da pobreza.

Vale destacar que, em maio de 2025, a Secretaria da Fazenda e Planejamento convocou a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) para a revisão do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, com o objetivo de alinhar os programas aos planos estaduais e regionais vigentes, como a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC). Essa revisão contempla a reestruturação das cadeias de resultados, por meio de fusões, desmembramentos, criação de novos programas e produtos, bem como a migração de produtos entre programas. Também visa ao aprimoramento dos indicadores de resultado e de produto, com ênfase naqueles que representam mais de 70% dos recursos, além de promover maior coerência entre esses indicadores. Por fim, inclui a revisão e priorização das associações cadastrais dos produtos do PPA, abrangendo políticas públicas, públicos beneficiários e metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Por fim, a proposta está articulada a políticas públicas já existentes e programas em curso no Estado, ampliando sua efetividade e otimizando o uso dos recursos públicos. Sua integração ao PPA e aos instrumentos de planejamento setorial da SEDS assegura condições institucionais e legais para sua execução continuada, com governança compartilhada e monitoramento por resultados.

3. 4. **Anexos**

ANEXO 3 PPA

ANEXO 4 Normativa - qualificação corpo técnico SEDS - LEI COMPLEMENTAR N° 1.395, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

ANEXO 5 Normativa - qualificação corpo técnico SEDS - DECRETO N° 68.742, DE 05 DE AGOSTO DE 2024 - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

ANEXO 6 Normativa - qualificação corpo técnico SEDS - Decreto Estrutura Organizacional e o Quadro Demonstrativo

ANEXO 7 Organograma SEDS

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Baixa adesão ou fraca articulação dos municípios parceiros
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Os municípios são responsáveis por parte significativa da execução local do programa, especialmente no que diz respeito ao acesso das famílias à rede socioassistencial, educação, saúde e demais serviços públicos. Existe o risco de que parte deles não formalize a adesão ao programa ou, mesmo aderindo, enfrente dificuldades para garantir a estrutura e o engajamento institucional necessários, comprometendo a efetividade das ações no território.

Prevenção e Mitigação:
A SEDS adotará uma política ativa de mobilização e apoio técnico aos municípios, com incentivo financeiro estruturado via cofinanciamento estadual e critérios objetivos de indução. Estão previstas a elaboração de manuais operacionais, oficinas regionais de sensibilização, suporte direto pelas Diretorias Regionais da SEDS e o desenvolvimento de um sistema digital de gestão com interface simplificada. Caso parte dos municípios inicialmente previstos não adira ou apresente baixa capacidade de execução, será realizada reprogramação de metas e recursos para os municípios já engajados, com possibilidade de expansão gradual para novos territórios conforme a maturação do programa.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Dificuldade na contratação ou manutenção de Agentes e supervisores
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O acompanhamento familiar personalizado é uma das principais inovações do programa e depende diretamente da atuação de Agentes e supervisores qualificados em todos os territórios atendidos. Existe o risco de dificuldades na contratação, alta rotatividade ou desistência desses profissionais, especialmente em regiões com menor oferta de mão de obra qualificada ou com infraestrutura precária, o que pode comprometer a continuidade e a qualidade do atendimento às famílias.

Prevenção e Mitigação:
A entidade executora será contratada com responsabilidade direta sobre o recrutamento, formação e gestão da equipe técnica. O programa contará com plano de formação inicial e continuada, protocolos de atuação claros e supervisão técnica permanente, além de recursos específicos para apoio operacional (transporte, equipamentos e suporte psicossocial). Serão priorizados profissionais com experiência prévia em acompanhamento social e com vínculo com o território de atuação. Em caso de dificuldade de manutenção das equipes, o programa poderá realocar quadros entre regiões ou promover ciclos extras de formação e reposição com base em banco de talentos previamente constituído.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Atraso ou falhas na implementação, ou baixa adesão e/ou preenchimento do sistema digital de monitoramento
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A implantação do sistema digital de monitoramento é etapa essencial para a gestão eficiente do Programa, pois viabiliza o acompanhamento das famílias, o controle de metas e a articulação entre os diferentes níveis de governo. No entanto, há risco de atrasos no desenvolvimento da ferramenta, dificuldades de integração com outras bases de dados e falhas técnicas que comprometam a coleta e o uso das informações em tempo real. Embora o uso do sistema seja obrigatório para os municípios aderentes, sua não implementação adequada — ou a baixa adesão por parte dos técnicos de acompanhamento familiar e servidores municipais da assistência social — pode dificultar significativamente o monitoramento das ações realizadas pelas famílias e o cumprimento dos compromissos estabelecidos em seus Planos de Desenvolvimento.

Prevenção e Mitigação:
O desenvolvimento do sistema será iniciado ainda na fase preparatória do programa, com equipe técnica especializada e cronograma dedicado. Serão adotadas soluções escaláveis e compatíveis com sistemas já utilizados pela SEDS, com especial atenção à integração com o Cadastro Único e demais bases estaduais. O contrato com a empresa desenvolvedora incluirá cláusulas de garantia, suporte técnico e manutenção contínua. Durante a implantação, será mantida uma solução paralela de registro manual e offline, com posterior migração para o sistema definitivo, evitando interrupções no acompanhamento das ações.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Dificuldade na sustentabilidade financeira após o encerramento da operação de crédito
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Após o encerramento do financiamento externo, existe o risco de redução na capacidade de manutenção das ações implementadas, especialmente aquelas que envolvem transferência de renda, gestão de equipes técnicas, apoio aos municípios e manutenção de sistemas. Caso não haja previsão orçamentária adequada nas leis subsequentes, a continuidade do programa pode ser comprometida ou sofrer descontinuidade parcial, afetando seu impacto de longo prazo.

Prevenção e Mitigação:
O programa será instituído por normativas estaduais específicas (Lei, Decreto e Resolução) que asseguram sua vinculação permanente à política estadual de desenvolvimento social. A SEDS já adota mecanismos regulares de cofinanciamento com os municípios e incorporará os custos recorrentes nas Leis Orçamentárias Anuais a partir de 2025, com recursos do Tesouro Estadual. Além disso, a estrutura operacional será desenhada com escalabilidade e possibilidade de adaptação a cenários orçamentários distintos. Está prevista a formalização de parcerias técnicas e financeiras com outros entes públicos, organismos multilaterais e instituições do terceiro setor, o que diversifica as fontes de financiamento e amplia a sustentabilidade do programa no médio e longo prazo.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Baixa adesão ou desistência das famílias durante os Módulos da Trilha do Programa
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Um dos pilares do programa é a articulação entre a transferência de renda e o avanço progressivo das famílias nas trilhas de superação da pobreza, por meio de capacitações, acesso a serviços e cumprimento de metas pactuadas. Existe o risco de que parte das famílias não adira a essas trilhas, desista ao longo do percurso ou apresente baixa frequência nas atividades previstas, seja por desmotivação, barreiras estruturais (como falta de creche, transporte ou apoio familiar) ou ausência de vínculo com os Agentes.

Prevenção e Mitigação:
O programa adotará uma abordagem centrada na família, com escuta qualificada, plano de desenvolvimento personalizado e acompanhamento próximo por Agentes capacitados. Estão previstas bonificações financeiras por avanço nas trilhas, o que funcionará como incentivo concreto ao engajamento. As equipes de supervisão e a entidade executora realizarão monitoramento contínuo de frequência e adesão, com protocolos específicos para reengajamento e flexibilização de metas quando necessário. Também serão consideradas estratégias de busca ativa e articulação com serviços locais para minimizar barreiras objetivas que dificultem a permanência das famílias no programa.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	102.900.000,00	102.900.000,00	82.320.000,00	20.580.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	222	294

Juros aplicáveis:
SOFR + margem de fundo em relação a SOFR (0,41% para o 1º trimestre 2025) + acrescida de spread de crédito (0,80% para o ano de 2025)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,5% semestral do valor do saldo do desembolso
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

0

Outras Informações:

(i) Gerais:

- Prazo de Desembolso: 60 meses

- Demais encargos e comissões: até 0.75% sobre o saldo não desembolsado. Recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do empréstimo, cobrado semestralmente durante o prazo original de desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos

- A proposta apresentada pelo Estado cumpre o disposto na Resolução nº 17, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre os critérios considerados com relação aos pleitos de operação de crédito externo, pela COFIEX. Assim, a contrapartida acompanha o piso mínimo de 20% do valor total do Programa a ser financiado.

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

A execução do Programa de Superação da Pobreza exige esforços integrados, investimentos de médio e longo prazo e a superação de gargalos estruturais nos sistemas de proteção social do Estado de São Paulo, especialmente nos territórios de maior vulnerabilidade. O volume e a natureza das ações previstas — que envolvem transferência de renda, contratação de equipes técnicas, capacitação de redes municipais, implantação de sistemas de monitoramento e articulação intersetorial — demandam fontes de financiamento estáveis, acessíveis e com suporte técnico especializado.

Nesse contexto, a opção pelo financiamento externo surge como alternativa estratégica e vantajosa. Além de oferecer melhores condições financeiras quando comparado ao mercado nacional — especialmente diante da volatilidade da taxa Selic e dos custos de capital interno —, os organismos multilaterais garantem maior previsibilidade de desembolsos e maior capacidade de apoio técnico à implementação de políticas públicas complexas.

Entre as alternativas existentes, destaca-se a opção pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cuja atuação é historicamente consolidada no Brasil e na América Latina, em particular no campo da proteção social, combate à pobreza e fortalecimento da gestão pública. O BID possui vasta experiência em operações com foco na inclusão produtiva, transferências condicionadas, modernização da assistência social e desenvolvimento de capacidades institucionais. Programas similares já foram implementados com êxito em estados como Ceará, Pernambuco e Bahia, com apoio direto do BID, o que demonstra o conhecimento acumulado do banco em iniciativas estruturantes e com abordagem intersetorial.

Além disso, o BID já possui histórico de cooperação técnica e diálogo institucional com o Estado de São Paulo, facilitando a convergência entre as diretrizes estratégicas do programa e as linhas prioritárias do banco. A proposta também está alinhada com a Estratégia do BID para o Brasil, que contempla, entre seus eixos, a redução das desigualdades, o fortalecimento da proteção social e a melhoria da gestão pública com apoio à transformação digital.

Adicionalmente, o BID oferece condições financeiras altamente favoráveis em termos de prazo, taxa de juros e carência, com flexibilidade para estruturação de projetos multicomponentes e suporte técnico desde a preparação até a avaliação de impacto. Tais condições superam, no atual cenário, aquelas ofertadas por instituições financeiras nacionais ou mesmo por outros organismos internacionais com atuação no Brasil.

Dessa forma, a escolha pelo BID justifica-se não apenas por suas vantagens financeiras, mas sobretudo por sua expertise técnica, seu histórico institucional e sua capacidade de apoiar o Estado de São Paulo na consolidação de uma política inovadora e estruturante de superação da pobreza.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Acompanhamento e Desenvolvimento Familiar					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
9.000.000,00	2.580.000,00	13.000.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
17.000.000,00	4.500.000,00	11.820.000,00	3.000.000,00		

Nome do componente					
Assistência Técnica					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00		

Nome do componente					
Fortalecimento Institucional					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Estados, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

a) receitas próprias a que se refere o art. 155 da Constituição;

b) recursos a que se refere o art. 157 da Constituição; e

c) recursos a que se referem os incisos I, alínea "a", e II do art. 159 da Constituição;

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Estado será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Estado associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado.

5. 4. **Anexos**

MANIFESTACAO DE INTERESSE BID

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O Programa SuperAção SP encontra-se em fase avançada de estruturação, com diretrizes consolidadas e processo formal de institucionalização em curso. Nesse contexto, a FIPE foi contratada para atuar como consultora técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) na concepção e implementação do Programa.

O contrato com a FIPE prevê entregas estratégicas fundamentais à consolidação da iniciativa, incluindo:

1. Diagnóstico da pobreza no Estado de São Paulo;
2. Construção da Árvore de Problemas;
3. Construção da Cadeia Causal do Programa;
4. Análise das políticas estaduais, a serem integradas no escopo do SuperAção
5. Elaboração do Plano de Monitoramento, com indicadores vinculados à Teoria da Mudança; (EM CONSTRUÇÃO)
6. Desenvolvimento do Plano de Avaliação, com perguntas-chave sobre desenho, processos, resultados e impactos; (EM CONSTRUÇÃO)
7. Formulação de modelos de governança e gestão;
8. Estruturação de protocolos operacionais, com materiais técnicos e guias para as equipes; (EM CONSTRUÇÃO)
9. Elaboração da minuta da Resolução que regulamentará o funcionamento do Programa;
10. Criação de guias práticos para as Famílias;
11. Materiais didáticos e metodologia para a capacitação dos Agentes.

As normativas essenciais para a implementação — incluindo a Resolução da SEDS e instrumentos complementares de governança — estão em fase final de elaboração, com previsão de publicação entre maio e junho. A proposta de lei foi encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) em 20 de maio, e o decreto regulamentar já se encontra finalizado. Esses normativos estabelecerão diretrizes operacionais, vinculação orçamentária, critérios de elegibilidade e atribuições das instâncias envolvidas.

Paralelamente, está em andamento o processo de seleção da entidade executora parceira, por meio de chamamento público coordenado pela SEDS. A contratação está prevista para julho, com homologação e publicação do resultado — incluindo eventuais recursos — programadas para ocorrer entre os dias 2 e 5 do referido mês. Após essa etapa, será realizada a capacitação dos tutores e o início das atividades em campo.

Estão em elaboração os planos operacionais detalhados, os protocolos de atendimento e os instrumentos de monitoramento e avaliação que sustentarão a execução do Programa. Avança também o desenvolvimento do sistema informatizado, com a conclusão dos documentos de especificação técnica e prototipação prevista até julho, possibilitando a capacitação da entidade executora e dos técnicos municipais para seu uso.

Simultaneamente, está sendo estruturado o Plano de Monitoramento e Avaliação, que definirá os instrumentos e metodologias para acompanhar a execução, orientar ajustes ao longo do processo e medir os resultados alcançados. Esse plano integrará o uso do sistema, além de indicadores e abordagens que assegurem eficácia, eficiência e efetividade das ações.

A previsão é que o primeiro ciclo de acompanhamento familiar e concessão de benefícios tenha início em meados de agosto, com atendimento direto às primeiras famílias. O cronograma vem sendo acompanhado por equipe técnica

dedicada, em articulação com as diretorias regionais da SEDS e os municípios selecionados, garantindo alinhamento entre ações preparatórias, execução físico-financeira e resultados esperados.

Como parte das ações estratégicas, a SEDS tem articulado parcerias institucionais para qualificar e ampliar o alcance do Programa SuperAção SP. Entre os parceiros já formalizados, destaca-se o Pacto Contra a Fome, com o qual foi celebrado acordo de cooperação técnica voltado à execução de ações diretamente vinculadas ao Programa. Outras parcerias estão em fase de formalização, como com o SEBRAE, que contribuirá com capacitação empreendedora, oferta de cursos e articulação com agentes locais de crédito; e com a Fundação Roberto Marinho, que atuará nas áreas de complemento da educação básica e inclusão produtiva, por meio de conteúdos e metodologias educacionais adaptadas ao público do Programa.

Além disso, a SEDS mantém diálogo contínuo com atores nacionais e internacionais, como o BID e o J-PAL (incluindo sua liderança global), bem como com o PNUD, com quem está em processo de formalização de um PRODOC cujo objetivo é o fortalecimento institucional da SEDS para a implementação do Programa SuperAção, o apoio aos municípios paulistas para a execução descentralizada do Programa, a condução de estudos, produção de evidências e gestão do conhecimento para o aprimoramento do Programa, além da gestão eficiente do projeto e disseminação do conhecimento gerado.

Foram também firmados Termos de Cooperação Técnica com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e o Fundo Social de São Paulo, prevendo a priorização de recursos e beneficiários do Programa nas políticas implementadas por essas instituições.

Destaca-se, ainda, que o BID mantém desde 2021 um Termo de Cooperação com a SDE voltado à qualificação profissional e ao trabalho, e outro com a própria SEDS, por meio do qual possibilitou a vinda de especialistas do Ministério de Desenvolvimento Social do Chile para troca de experiências e fortalecimento técnico.

6. 2. **Anexos**

ANEXO 8.1 a, b, c. Produto FIPE - Diagnóstico, Cadeia Causal e Árvore de Problemas

ANEXO 8.2 d. Produto FIPE - Análise das políticas estaduais, a serem integradas no escopo do SuperAção - FIPE

ANEXO 9 g. Produto FIPE - Estrutura de Governança e Gestão

ANEXO 10 g. Produto FIPE - Estrutura da Gestão Municipal SuperAção

ANEXO 12.1 j. Produto FIPE - Guias práticos para as Famílias

ANEXO 12.2 l. Produto FIPE - Materiais didáticos e metodologia para a capacitação dos Agentes

ANEXO 13 PL assinado e aprovado na ALESP - SuperAção

ANEXO 14.1 Acordos de Cooperação Técnica - Pacto

ANEXO 11 h. Produto FIPE - Materiais técnicos e guias para as equipes Agentes

ANEXO 14.2 Acordos de Cooperação Técnica - SEBRAE OFICIO-Minuta CCT- PLANO DE TRABALHO SEDS

ANEXO 14.3 Acordos de Cooperação Técnica - SEBRAE Minuta CCT- PLANO DE TRABALHO SEDS

ANEXO 14.4 Acordos de Cooperação Técnica - Vitória SIGMA

ANEXO 15.1 Termos de Cooperação Técnica com outras Secretarias CDHU

ANEXO 15.2 Termos de Cooperação Técnica com outras Secretarias FUSSP

ANEXO 15.3 Termos de Cooperação Técnica com outras Secretarias SDE

ANEXO 16.1 CT-INTRA Memo Chile-SEDS - BID VF

ANEXO 16.2 ANEXO 1 Registros fotográficos
