PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes

Proponente: Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes/PE
Processo SEI: 03101.002786/2025-16
Código do pleito: 4485307307/2025
Versão: 4

Fonte: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA
Valor do Financiamento: USD 52.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 13.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 11
1. 2. 3. Soluções 17
1. 2. 4. Resultados 21
1. 3. Objetivo 25
1. 4. Indicadores 28
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 28
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 28
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 29
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 30
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 30
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 31
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 32
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 32
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 33
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 34
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 35
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 35
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 36
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 37
1. 5. Componentes 38
1. 5. 1. Informações do 1° componente 38
1. 5. 2. Informações do 2° componente 39
1. 5. 3. Informações do 3° componente 40
1. 5. 4. Informações do 4° componente 41
1. 6. Beneficiários 42
1. 7. Anexos 44
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 46
2. 1. Áreas estratégicas 46
2. 2. Anexos 53
3. GESTÃO 54
3. 1. Arranjo institucional 54
3. 1. 1. Descrição 54
3. 1. 2. Orgãos Executores 56
3. 1. 3. Estrutura Operacional 56
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 57
3. 2. Operacionalização e Manutenção 57
3. 3. Planejamento Estratégico 59
3. 4. Anexos 62
4. RISCOS 63
4. 1. Informações do 1° risco 63
4. 2. Informações do 2° risco 63
4. 3. Informações do 3° risco 63
4. 4. Informações do 4° risco 63
4. 5. Informações do 5° risco 64
4. 6. Informações do 6° risco 64

4. 7. Informações do 7° risco 65
4. 8. Informações do 8° risco 65
4. 9. Informações do 9° risco 65
4. 10. Informações do 10° risco 66
4. 11. Informações do 11° risco 66
4. 12. Informações do 12° risco 67
4. 13. Informações do 13° risco 67
4. 14. Informações do 14° risco 67
4. 15. Informações do 15° risco 68
4. 16. Informações do 16° risco 68
4. 17. Anexos 69
5. FINANCIAMENTO 70
5. 1. Condições Financeiras da Operação 70
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 70
5. 2. Cronograma de Desembolso 72
5. 3. Contragarantias 73
5. 4. Anexos 73
6. ETAPAS REALIZADAS 74
6. 1. Etapas realizadas 74
6. 2. Anexos 80
7. CONTATOS 81
7. 1. Contatos 81
7. 2. Anexos 81
8. Baixar todos os anexos 82

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes
Sigla: JABOATAO 2030
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes/PE


1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

1.2.1.1 Contexto Socioespacial


O município do Jaboatão dos Guararapes, integrante da Região Metropolitana do Recife- RMR (**Figura 1**) e do Território Estratégico de Suape[1][1] (**Figura 2**), é caracterizado como uma cidade de porte médio, com uma população de 684.293 hab. (IBGE, 2025), uma área de 258km2 (IBGE, 2022), e uma densidade demográfica de 2.489,28 hab/km2, sendo considerada a 9ª cidade mais populosa do Nordeste e a maior do estado de Pernambuco em população depois da capital, de acordo com o Censo de 2022.

FIGURA 1: **Situação do Município do Jaboatão dos Guararapes na RMR.**

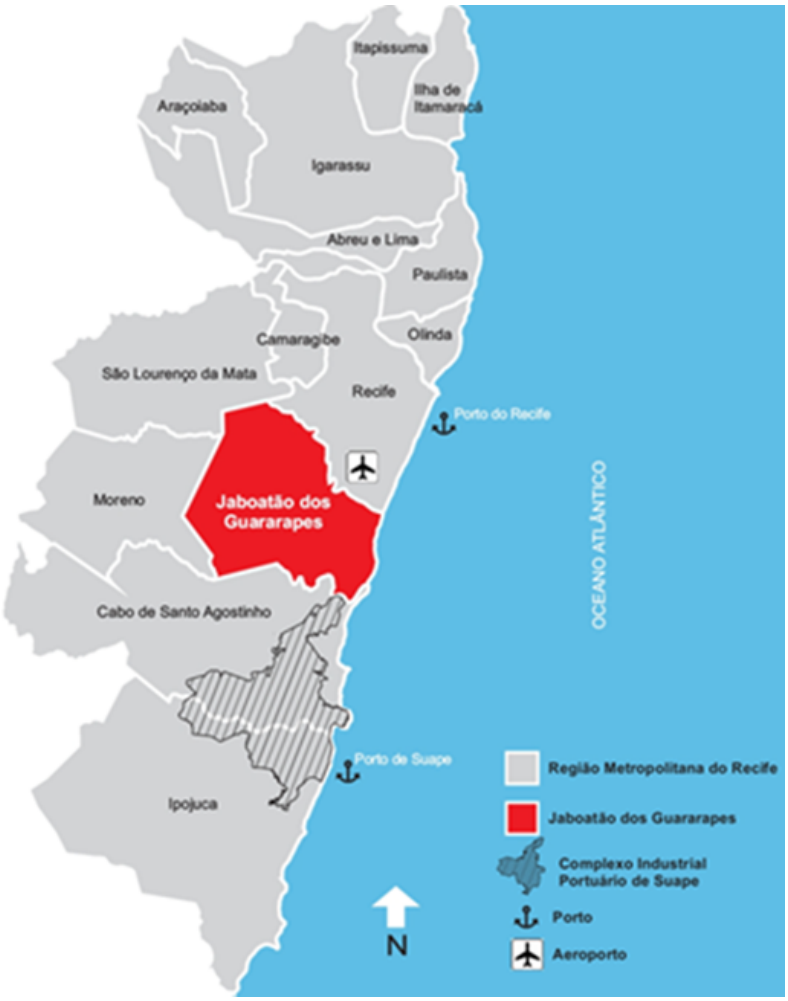

Fonte: Oliveira, 2025.

FIGURA 2: **Situação do Município do Jaboatão Dos Guararapes no Território Estratégico de SUAPE – TES.**

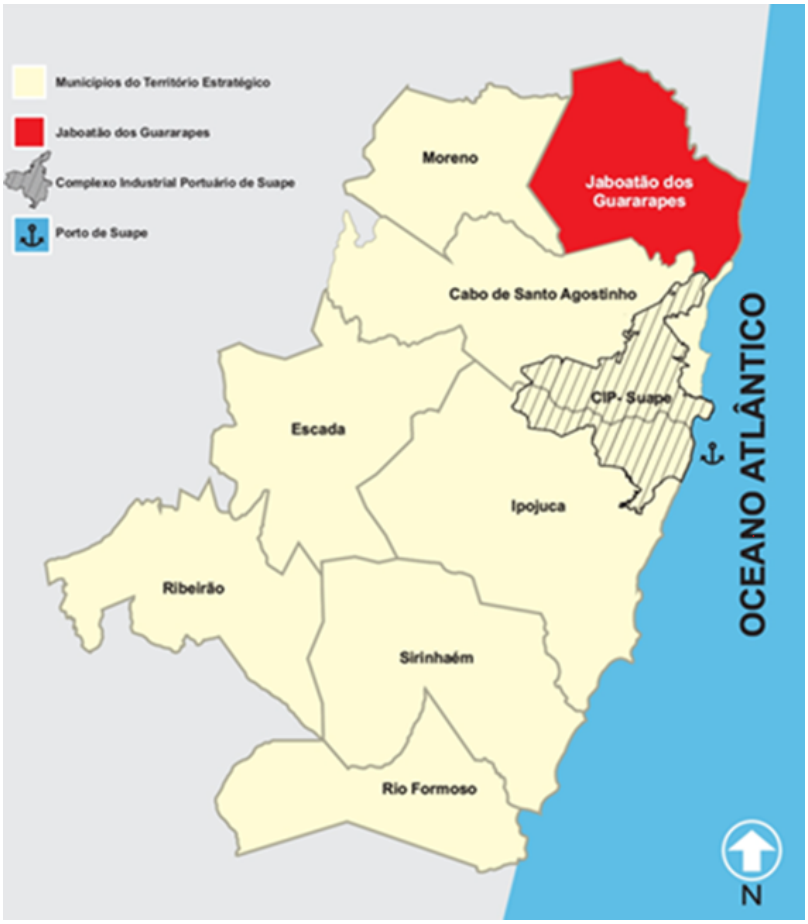

Fonte: OLIVEIRA, 2025.


Esta população está inserida num ambiente espacial diverso, no que tange a geomorfologia de seu sítio, o que vai potencializar relações diferentes entre a sociedade e a natureza em cada parcela do território e o estabelecimento de realidades de parcelamento, uso e ocupação do solo não homogêneas. Conformando, assim, demandas presentes e políticas públicas diversas, com programas e ações que devam refletir essa configuração socioespacial.

O município detém o **segundo maior percentual de população exposta ao risco de deslizamentos de massa e inundações em Pernambuco** e o **sexto maior do Brasil, com 188.026 hab.** (IBGE, 2022). Considerando o percentual de população socialmente vulnerável, **41,4%** dos habitantes do município têm rendimento nominal per capita mensal de até meio salário-mínimo (IBGE, 2010), tendo significativa parcela de população dependente de transferências de renda e auxílios emergenciais, com cerca de 17% (FJP, 2017).

Em contraponto, especialmente nos últimos dez anos, o município vem registrando significativo dinamismo econômico, representado pelo comércio, serviço, pelo parque industrial e pelo seu polo de logística e de distribuição, em estreita relação com Complexo Industrial e Portuário de Suape – CIPS. Tais fatos elevaram o Produto Interno Bruto (PIB) municipal para 16,1 bilhões de reais (CONDEPE/FIDEM, 2021), que representa um aumento de mais de 10% quando comparado com os dados de 2010. Esse desempenho econômico, associado a um processo contínuo de busca por uma gestão eficiente, racionalização dos gastos públicos e modernização administrativa, que marcaram os últimos 8 anos da gestão municipal, estabeleceram uma boa solvência financeira ao município.

Atualmente o município figura como a **segunda maior economia e população estadual**, com **alto grau de integração funcional ao núcleo metropolitano**[2] (**Figura 3),** formando uma mancha contigua de urbanização com Recife e Olinda.

FIGURA 3: **Grau de Integração Funcional dos Municípios Adjacentes a Capital.**

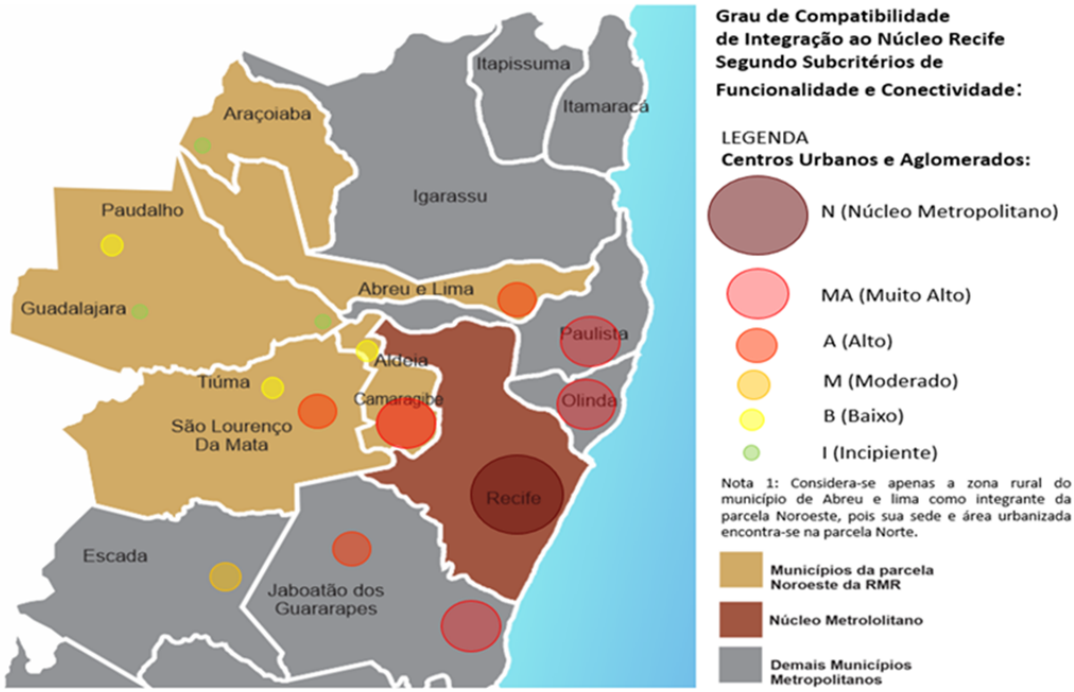

Fonte: Oliveira, 2024.

1.2.1.1 Sobre a Divisão Político-Territorial

O Jaboatão dos Guararapes é um território autônomo (município), delimitado por lei, estadual específica, com área rural e urbana, integrante da Região Metropolitana do Recife, conforme Lei Complementar Federal nº 14, de 1973, e Lei Complementar Estadual nº 10, de 1994, e recentemente integra o Território Estratégico de Suape, através do Decreto Estadual nº 37.160, de 2011.


O município ao longo de seu processo histórico teve em seu território variadas espacializações político-administrativas com influência e jurisdições diversas, até assumir a sua atual configuração espacial, que adota a divisão político-administrativa do seu território em cinco Distritos (**Quadro 1 e Figura 4**), a saber:

QUADRO 01: **Relação dos Distritos Municipais e seus Bairros Correlatos.**

Denominação	**Bairros**
Distrito 1: Jaboatão dos Guararapes - sede municipal, antigo Distrito de Prazeres.	Formado pelos bairros de Barra de Jangada, Cajueiro Seco, Candeias, Piedade, Prazeres, Comportas, Marcos Freire, Muribeca e Guararapes.
Distrito 2: Jaboatão	Formado pelos bairros de Bulhões, Centro, Engenho Velho, Floriano, Manassu, Muribequinha, Santana, Santo Aleixo, Vargem Fria, Vila Rica, Vista Alegre;
Distrito 3: Cavaleiro	Formado pelos bairros de Cavaleiro, Dois Carneiros, Socorro, Sucupira, Zumbi do Pacheco;

Distrito 4: Curado	É formado pelo bairro do Curado;
Distrito 5: Jardim Jordão	Contém os bairros de Jardim Jordão.


FIGURA 4: **Mapa com os Distritos Municipais.**

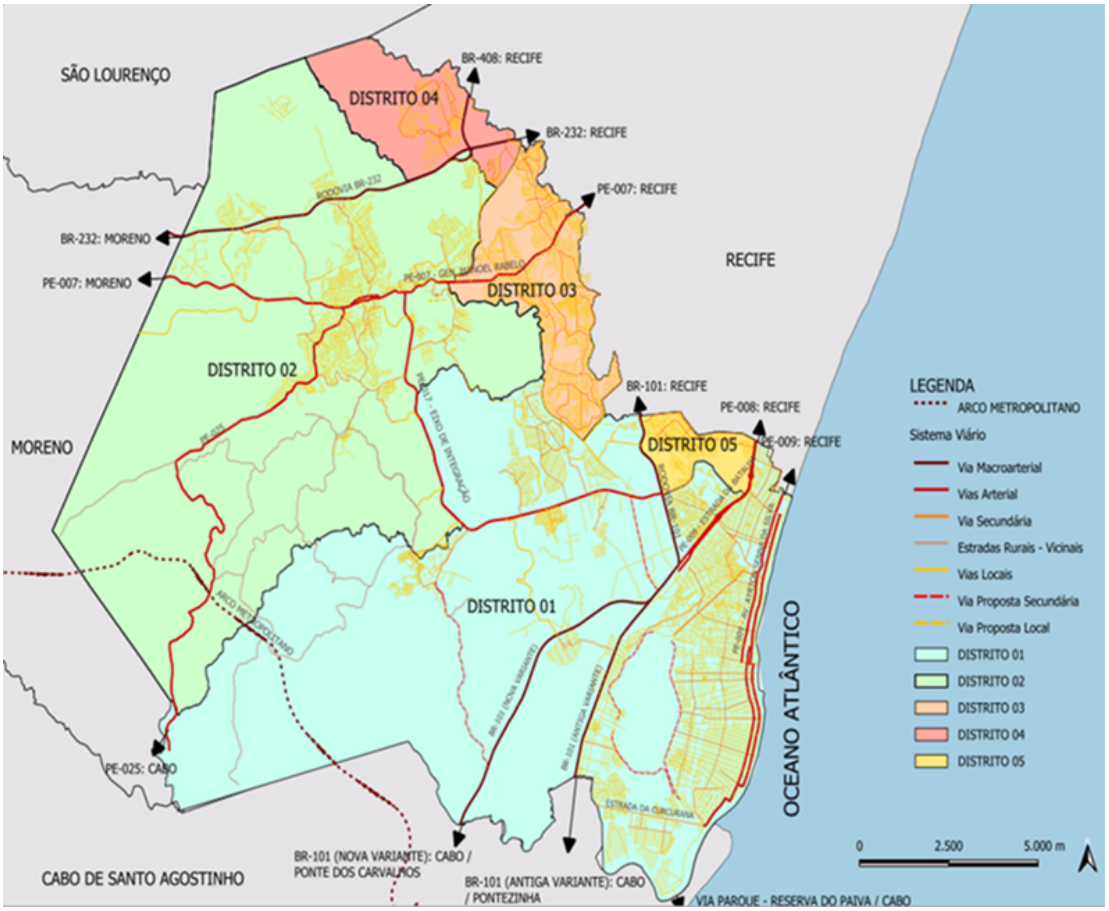

Fonte: Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, 2025.

Sobre a divisão do território por regionais foram criadas 7 sub-regiões (**Figura 5**) de controle administrativo do território, para efeito de formulação, execução e avaliação permanente das políticas e do planejamento governamental, visando a distribuição mais racional dos serviços urbanos e equipamentos públicos.

FIGURA 5: **Regionalização Administrativa.**

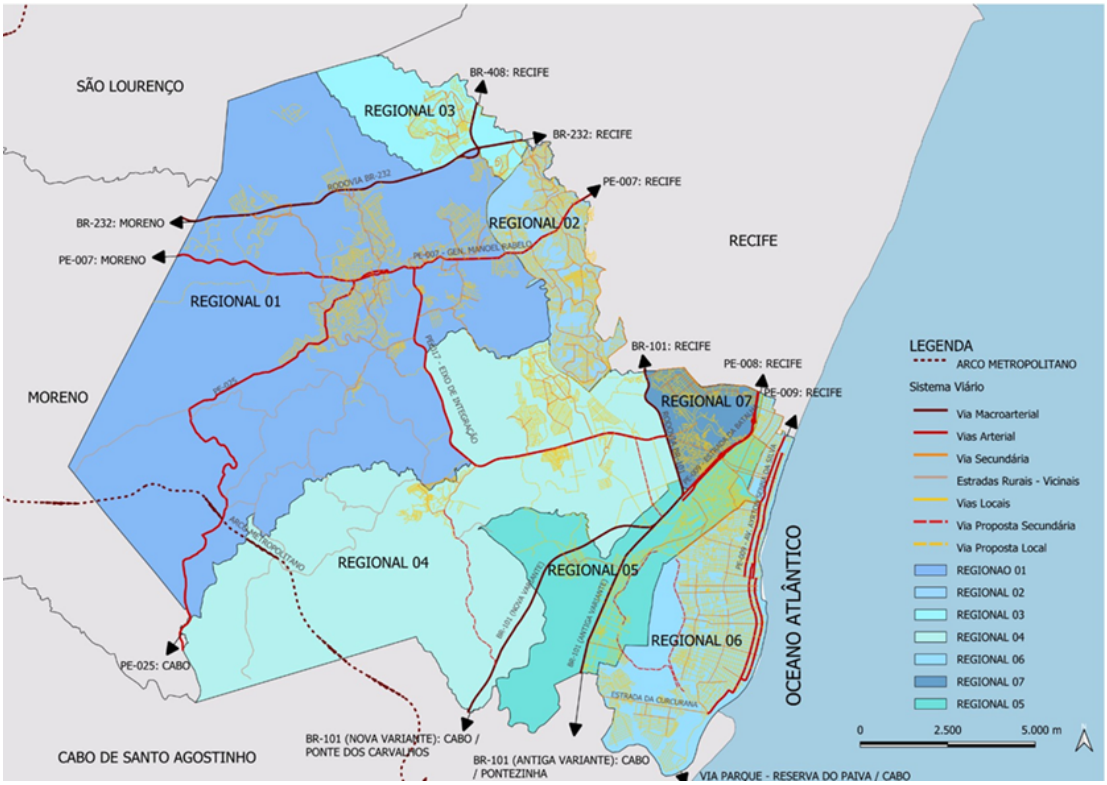

Fonte: Prefeitura Municipal do Jaboatão Dos Guararapes, 2025.

Observa-se significativa diversidade entre os bairros municipais, ora pela forma de parcelamento, uso e ocupação do solo, ora pela densidade populacional (**Tabela 1**) e fatores histórico e culturais.

TABELA 1: **Ranking da População por Bairro segundo Faixa Populacionais.**

BAIRRO	POPULAÇÃO 2022	RANKING	REGIONAL	FAIXA POPULACIONAL
Candeias	72.530	1	Regional 06 - Praias	De 40.001 à 75mil hab.
Piedade	67.421	2	Regional 06 - Praias	
Cajueiro Seco	56.966	3	Regional 05 - Prazeres	
Curado	45.767	4	Regional 03 - Curado	
Barra de Jangada	41.270	5	Regional 06 - Praias	
Guararapes	32.909	6	Regional 07 - Guararapes	De 25.001 à 40.000mil hab.
Prazeres	31.954	7	Regional 05 - Prazeres	
Zumbi do Pacheco	29.362	8	Regional 02 - Cavaleiro	
Vila Rica	29.234	9	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Cavaleiro	27.739	10	Regional 02 - Cavaleiro	
Jardim Jordão	27.337	11	Regional 07 - Guararapes	
Sucupira	25.812	12	Regional 02 - Cavaleiro	
Muribeca	22.023	13	Regional 04 - Muribeca	
Marcos Freire	19.845	14	Regional 04 - Muribeca	
Santo Aleixo	17.967	15	Regional 01 - Jaboatão Centro	De 15.001 à 25.000mil hab.
Dois Carneiros	16.102	16	Regional 02 - Cavaleiro	
Santana	15.013	17	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Centro	13.484	18	Regional 01 - Jaboatão Centro	De 10.001 à 15.000mil hab.
Muribequinha	11.591	19	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Floriano	10.822	20	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Vista Alegre	9.842	21	Regional 01 - Jaboatão Centro	De 5.001 à 10.000mil hab.
Engenho Velho	6.236	22	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Socorro	5.943	23	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Comportas	4.061	24	Regional 05 - Prazeres	De 0001 à 5.000mil hab.
Manassu	2.139	25	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Vargem Fria	430	26	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Bulhões	238	27	Regional 01 - Jaboatão Centro	

Fonte: IBGE, 2022. DADOS RETRABALHADOS: OLIVERA, 2025.

Fonte: Prefeitura Municipal do Jaboatão Dos Guararapes, 2025.


O projeto Jaboatão 2030, utilizará como referência espacial para a sua base de dados de avaliação de resultados, monitoramento e gestão as espacializações dos Distritos, das Regionais e em menor escala, quando possível, dos Bairros e Setores Censitários do IBGE, 2022. Acrescido a estes serão utilizadas bases estatísticas e qualitativas de sistemas específicos das unidades administrativas setoriais, a exemplo do Censo Escolar, do Sistema de Atenção Básica a Saúde, dos Cadastros Mercantis, dos Cadastros de Licenciamento de Empreendimentos e do Sistema de

Monitoramento e Gestão municipal.

Sobre a Estrutura de Mobilidade Estratégica

No município, a mobilidade ganha destaque nas ações de macro acessibilidade ao CIPS e a capital estadual, com as redes de transporte multimodais representadas pelo Metrô de superfície do Recife, representado pelo Ramal Sul, que possui em Jaboatão 4 estações o qual está interligado ao ramal do Veículo Leve sobre Trilhos a Diesel – VLP com dois ramais: o oeste ligando Jaboatão ao Recife, com 2 estações, e o Sul, ligando Jaboatão ao Cabo de Santo Agostinho com 2 estações. O Ramal Centro do Metro do Recife corta o território municipal de leste a oeste, possuindo 4 estações de metrô (**Figura 6**).

FIGURA 6: **Sistema Ferroviário de Transporte de Passageiros da RMR.**

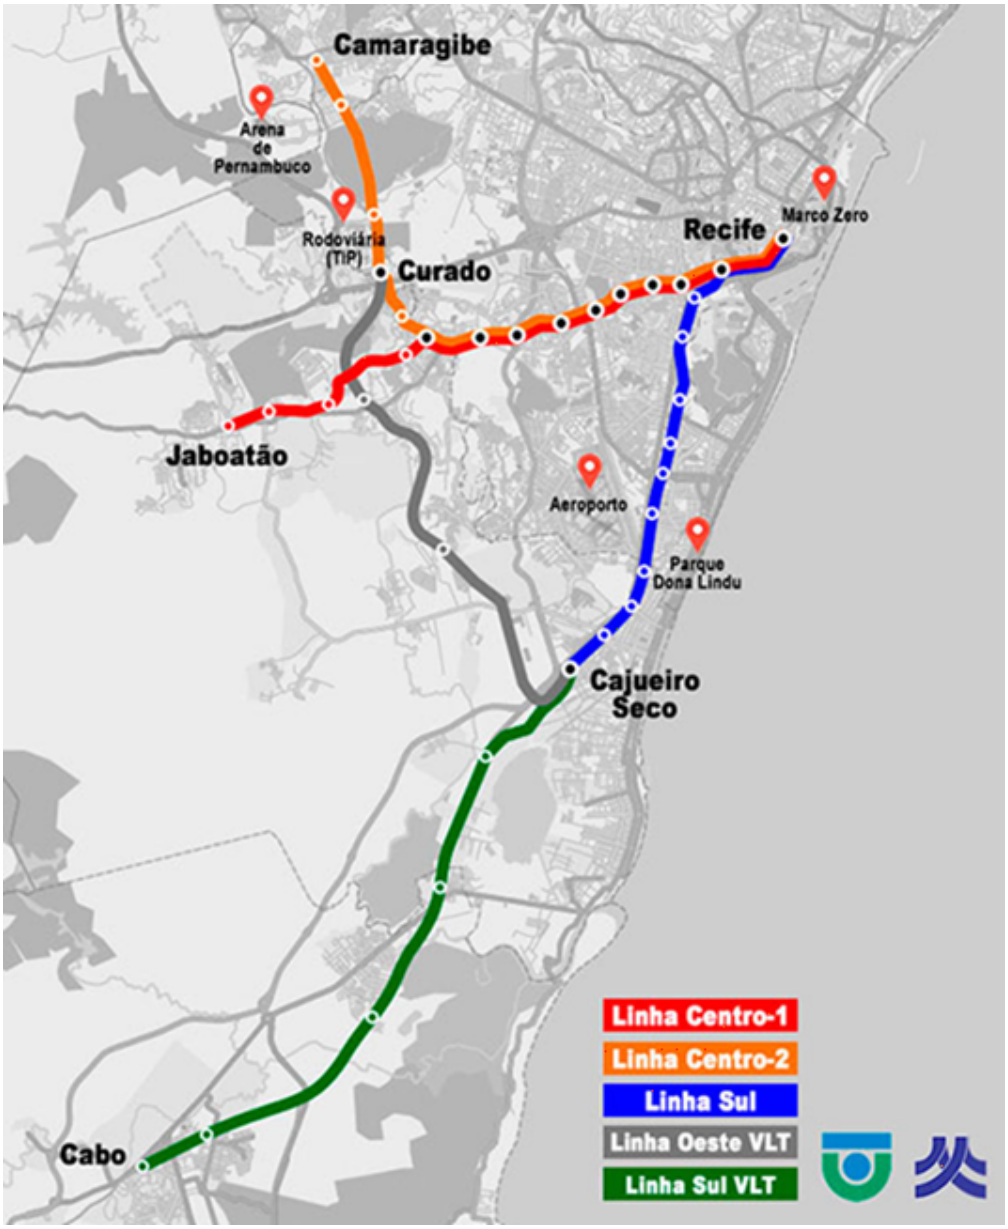


Fonte: CBTU/METROREC, 2025

O sistema ferroviário está interligado ao Sistema Estrutural Integrado (SEI) do Grande Recife Consorcio de Transportes, possuindo 2 terminais integrados (TI) de transporte público de passageiros rodoviários que funcionam como estações de transbordo das Estações do Metro de Prazeres e de Cajueiro Seco. Como principal via estratégica para o desenvolvimento territorial se tem o Arco Metropolitano[3], que se encontra em fase de implantação de seu trecho sul, que corta o município de Jaboatão em sua parcela Sudoeste.

Esse denso sistema de mobilidade municipal pode ser caracterizado como uma vantagem locacional comparativa que funciona como diferencial na atração de investimentos, fortalecendo ainda as redes de conectividade nos espaços local e regional, ampliando a integração funcional com a Região Metropolitana do Recife - RMR (**Figura 7**).

FIGURA 7: **Sistema Rodoviário Principal do Jaboatão dos Guararapes.**

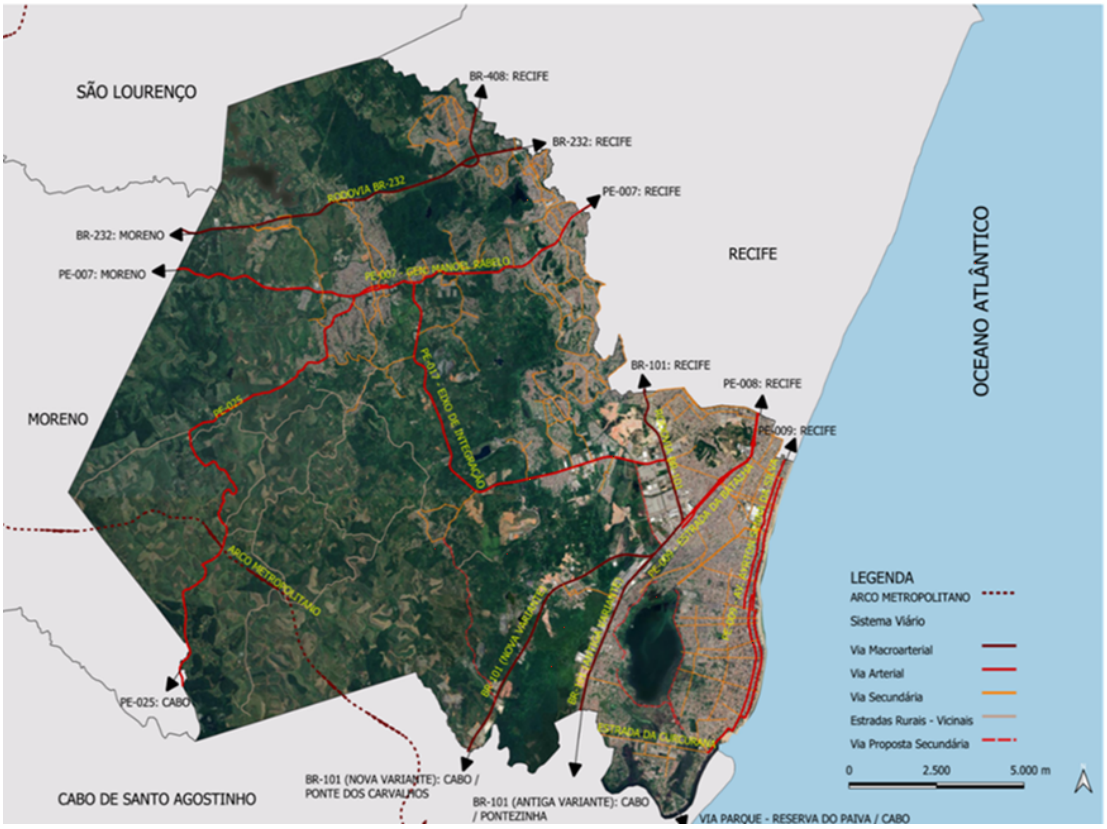

Fonte: Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, 2025.

O município possui uma boa densidade de vias arteriais, que cortam o território de norte a sul e de leste a oeste, dentre as quais destaca-se:

Os trechos da rodovia federal BR-101 (sua antiga e nova variante), a qual possui duas variantes paralelas entre si em sentido norte sul em proximidade ao litoral;

A BR-232 e sua interligação com a e BR-408 no extremo noroeste do município em sentido leste e oeste em vias arteriais, a partir das rodovias estaduais PE-007, PE-008, PE-009, PE-017 e PE-025; vias secundárias, estradas rurais e vias locais.

É pertinente destacar que, este sistema viário está distribuído de forma desigual, tendo as porções oeste e sudoeste do município com baixa integração viária aos núcleos urbanos de Jaboatão Centro e de Prazeres/Praias. Bem como, deve-se considerar que, empreendimentos de impacto regional, como o Arco Metropolitano e o CIPS, devem ser pensados em sua integração funcional e de mobilidade ao sistema existente, para dinamizar seu potencial de difusor de desenvolvimento socioespacial. Contudo, vale salientar, que este sistema ainda carece da implementação e requalificação de conexões entre os diferentes moldais e de estruturação das vias coletoras do transporte público de passageiros. Acrescido a isso, se faz necessário no município a conexão entre os eixos macroestruturais em implantação pelo Governo de Pernambuco, a exemplo do Arco Metropolitano.

Em nível intraurbano o município carece de ligações entre os seus eixos arteriais e destes com as vias coletoras em diversas parcelas do município, apesar de possuir uma população urbana de mais de 500mil habitantes são expressivas as parcelas rurais no território que se caracterizam por baixos níveis de desenvolvimento humano[4] e a necessidade de políticas públicas e alocação de equipamentos e infraestruturas nessas regiões é imprescindível para o desenvolvimento harmônico do município. Ao analisar a estrutura interna dos bairros municipais e em especial os mais populosos observa-se uma **pulverização de Zonas Especiais de Habitação de Interesse Social**, segundo o Plano Diretor Municipal, 2017 (**Anexo 1 –** Mapa das Zonas Especiais de Habitação de Interesse Social) que frequentemente estão sobrepostas as **Áreas de Risco de Deslizamento de Massa e ou Inundações**.

Esta conjuntura de precariedades socioeconômicas e de infraestruturas associada as fragilidades ambientais reforça a necessidade de construção de um projeto que auxilie na promoção do desenvolvimento urbano e social sustentável, com foco em equidade territorial, inclusão produtiva e adaptação as mudanças climáticas no município do Jaboatão dos Guararapes e sua inserção harmônica na Região Metropolitana do Recife.

Para enfrentas o contexto presente na realidade municipal foi elaborado o **Projeto Jaboatão 2030**, este foi estruturado em **4 (quatro) componentes[5]** que focarão em **13 (treze) soluções/produtos** a saber:

Componente 1 - **Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.**

Descrição: Fortalecer a gestão pública municipal através da inovação administrativa, do uso de técnicas e tecnologias de inteligência de planejamento territorial, fiscal e de interoperabilidade entre sistemas adotados no município e destes com outras instituições. Este componente possui três soluções:

1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes.

Componente 2 - Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.

Descrição: Expandir a infraestrutura urbana de forma sustentável objetivando o desenvolvimento do Município com ênfase ambiental, social e econômica. Este componente possui quatro soluções:

2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

2.4 Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Componente 3 - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis.

Descrição: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos para ampliação das políticas de atenção primária em saúde e as etapas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Este componente está subdividido em três soluções:

3.1 Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

3.2. Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Componente 4 – Gestão do projeto.

Descrição: Fortalecer da capacidade institucional e dos processos de planejamento e gestão, com foco no projeto Jaboatão 2030. Este componente está subdividido em três soluções:

4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.

4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.

4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria

Estes componentes em seu conjunto se propõem enfrentar a as demandas socioespaciais em processo, ora pela redução do quadro de vulnerabilidades sociais e econômicas ora pela adaptação das infraestruturas as fragilidades ambientais associadas ao desenvolvimento das cadeias produtivas de forma sustentável.

1.2.1.2. CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Amparado na dinâmica socioespacial presente, nas peculiaridades físico-territoriais e nas potencialidades socioeconômicas, a proposta foi estruturada com componentes que abrigam relações de integração, típico de ações de desenvolvimento em áreas com alta densidade urbana em regiões periféricas, como o nordeste brasileiro, expressa por grandes áreas com populações em situação de vulnerabilidade socioespacial.

Nesse sentido, para alcançar o melhor resultado de sua implantação/execução, bem como, reduzir custos com economia de escala, a proposta apresenta ações interligadas, executadas ora de forma concomitante, ora de forma escalonada com curto e médio espaço temporal.

No que tange ao amparo político e institucional, destaca-se o arcabouço jurídico incidente em nível municipal, a exemplo do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e as Leis Urbanísticas e Ambientais, bem como, a municipalização do licenciamento ambiental há mais de 8 anos. Destaca-se ainda, a existência de planos setoriais, a saber: Plano Municipal de Redução de Riscos, Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, além de Planos Municipais de Mobilidade e de Saneamento Ambiental, atualmente em elaboração.

O município conta com uma estrutura de unidades administrativas que guarda vinculação direta com os objetivos deste Projeto Jaboatão 2030, além de uma equipe técnica com experiência e capacidade gerencial adequada a execução das ações propostas.

Tais fatores, associados a um alinhamento político e institucional em nível estadual, com acoplamento entre as políticas de governo e de ações estratégicas que geram sinergia, a exemplo da construção do Arco Metropolitano - Trecho Sul (Via expressa que cortará o município, e ligará os polos de desenvolvimento de Goiana - Grupo Stellantes, e o Complexo Industrial Portuário de Suape, no município de Ipojuca), e da Parceria Público Privada do Saneamento da Região Metropolitana, coordenada pela Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA.

O **Projeto Jaboatão 2030** se configura, assim, como um **projeto global de obras múltiplas,** reforçando sua escala de atuação na totalidade do território municipal e com beneficiários diretos em escalas e segmentos sociais variados.

Com vistas a viabilizar esse conjunto de ações, faz-se necessário um aporte extra de recursos que possa suportar o volume de investimentos necessários, num curto espaço de tempo. Tal cronograma físico-financeiro só se viabilizará com o aporte de financiamento externo, que potencializará as ações multissetoriais integradas, de forma inovadora e com sustentabilidade fiscal.

[1][1] O Território Estratégico de Suape (TES) é uma área geográfica em Pernambuco, delimitada para o planejamento urbano e ambiental em torno do Complexo Industrial Portuário de Suape, compreendendo vários municípios. A Agência Condepe/Fidem, um órgão estadual de planejamento, coordena o programa que visa o desenvolvimento ordenado e sustentável da região, em parceria com o BNDES e os municípios.

[2] ARCHITECTON-Revista de Arquitetura e Urbanismo. ISSN 2236-6849, Vol. 8, Nº 13. ANÁLISES DO FENÔMENO DE INTEGRAÇÃO ESPACIAL URBANO-METROPOLITANO NA NUCLEAÇÃO OESTE DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/PE. Oliveira, Arthur A. B. de & Lima, Pablo L. F. de. Recife. 2023-2024. p. 01 -15.

[3] Rodovia expressa de alta capacidade de carga que ligará os dois principais polos industriais de Pernambuco o Complexo Industrial e Portuário de Suape na parcela do litoral sul com o Polo Automobilístico, de Biotecnologia e Hemoderivados de Goiana no Litoral norte, servindo de alternativa a BR-101 e funcionando como elo de ligação ao Polo de Serviços de Alto Valor Agregado do Recife (Tecnologia da Informação, Saúde, Coorporativo-Financeiro, Jurídico, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico).

[4] Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do PNUD/ONU (2013). As áreas de desenvolvimento humano rurais do município possuem índice inferior a 0.600, enquanto as áreas urbanas apresentam índices médios acima de 0.700.

[5] Os componentes e as soluções/produtos serão tratados em profundidade nos itens a seguir nesta proposta de projeto.

1. 2. 2. **Problema:**

São descritos a seguir, de forma sucintamente, os principais problemas e necessidades que as ações do projeto propõem a tratar, incluindo suas causas e consequências.

Reconhecendo as demandas em processo da atual realidade de fragilidades socioambientais deste município e a urgente necessidade de adaptação as mudanças climáticas, ratifica-se aqui o reconhecimento dos efeitos destas mudanças e do fomento de ações a adaptação social e territorial.

O município integra a lista de "*Municípios mais suscetíveis a ocorrências de deslizamentos, enxurradas e inundações para serem priorizados nas ações da União em gestão de risco e de desastres naturais*" (Pernambuco, 2024), produzida e atualizada pela Casa Civil, possuindo 397 setores de risco, dentre os quais, 260 classificados como de deslizamentos de massa e 137 com risco de inundação. Possui ainda casos de vulnerabilidade e risco (alagamentos e movimentos de massa) relevantes em seu território, com intervenções em andamento e já realizadas, e que estão sujeitos a agravamento com as projeções dos efeitos das mudanças climáticas nos próximos anos.

A territorialidade municipal, conformada em área de planície litorânea a leste com bacias hidrográficas propensas a efeitos da maré e suscetíveis a inundações em períodos chuvosos, acrescido a isso a oeste tem-se vastas áreas de morros da formação geológico-geomorfológica do grupo barreiras, com áreas de riscos de deslizamentos de massa e que juntas protagonizaram eventos com dezenas de mortos nas chuvas de 2022 e prejuízos financeiros, de infraestruturas e serviços públicos que até hoje não foram solucionados em sua totalidade.

Tal realidade torna ainda mais necessária e urgente a implementação de iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, principalmente no caso do Jaboatão dos Guararapes, que se constitui num município com mais de 74,52 km2 de área urbanizada (IBGE 2019: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/jaboatao-dos-guararapes/panorama), sendo a 3º maior do Estado, com elevada densidade demográfica e uma população que registra um perfil socioeconômico de precariedades.

Considerando a necessidade do enfrentamento dessa conjuntura de precariedades de forma sistêmica, abrangendo a estruturação de diversas áreas de atuação da prefeitura, e ancorado, sobretudo, na nova estratégia de desenvolvimento expressa no novo **Plano Plurianual – PPA 2026-2029** do Jaboatão dos Guararapes, e cuja nova identidade organizacional, diretrizes e objetivos estratégicos já foram aprovados por meio de lei municipal, que instituiu a nova Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026, busca-se expor abaixo uma descrição dos principais problemas observados por resultados, que irão facilitar a compreensão e a conexão com as soluções propostas, suas respectivas metas de atendimento e os indicadores propostos.

Nesse sentido, tem-se como **questões-problemas mais relevantes**:

Necessidade de Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

A instituição do cadastro multifinalitário pretende solucionar a defasagem e a fragmentação das informações sobre os imóveis e o uso do solo urbano, que comprometem tanto a arrecadação tributária quanto o planejamento territorial do Município.

As bases cadastrais atuais apresentam dados desatualizados, falhas de cobertura quanto as políticas públicas desenvolvidas pelo Município e valores imobiliários defasados, o que resulta em baixa eficiência na arrecadação do IPTU e em dificuldade para acompanhar e executar políticas que transformem o espaço urbano. Além disso, a utilização restrita do cadastro apenas para fins fiscais impede a integração das informações com outras áreas da administração pública, limitando a formulação de políticas sociais, ambientais e de infraestrutura. Dessa forma, o cadastro multifinalitário busca garantir maior precisão e atualização dos dados, promovendo justiça tributária, eficiência na distribuição e execução dos serviços públicos e suporte efetivo ao planejamento e à gestão da cidade.

Necessidade de integração e implementação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas da gestão pública municipal.

A conjuntura municipal é caracterizada com fragilidades técnicas e tecnológicas da infraestrutura instalada e dos sistemas de gestão que se espelham na Fragmentação dos sistemas de gestão municipal; Baixa eficiência na arrecadação e controle fiscal; Falta de integração de dados; Dificuldade na comunicação com sistemas estaduais e federais; Dificuldade na disponibilização e usabilidade dos serviços corporativos ao cidadão; Inexistência de plataforma para dispositivos móveis; Equipamentos defasados e na Deficiência de segurança cibernética.

Necessidade de fomentar a Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Considerando a proximidade do município do Jaboatão dos Guararapes com o Recife, os fornecedores locais têm dificuldades de serem vistos pelos grandes empreendimentos, principalmente na área de tecnologia. A partir deste cenário, a Prefeitura executa dois projetos relacionados: um programa de qualificação de fornecedores locais para

atender as empresas âncoras do município e o Núcleo de Inovação que busca conectar as *startups* locais com demandantes de tecnologia.

A capital pernambucana possui um extenso e rico ecossistema de inovação e tecnologia da informação, denominado Porto Digital, que se encontra circunscrito ao território recifense, havendo espaço para desenvolvimento além das fronteiras do município. Jaboatão pode se qualificar para se tornar uma área de expansão natural do Porto Digital.

Atualmente os potenciais iniciativas de inovação e tecnologia gerados no município são naturalmente direcionadas para o ambiente do Porto Digital em Recife, dificultando o desenvolvimento de um ambiente de inovação em Jaboatão.

Capacidade restrita de ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

O atual dinamismo econômico observado no município nos últimos anos não vem sendo acompanhado de forma adequada pela estruturação de suas infraestruturas de suporte, o que tem levado o município a registrar efeitos cumulativos sobre a capacidade de carga das vias existentes, desestruturação dos sentidos dos fluxos sobre os eixos macro arteriais (BR-232 e BR-101), gerando estrangulamento do tráfego, longos períodos de retenção no tempo de deslocamento e deseconomias urbanas. Esse contexto tem levado a perda de competitividade dos arranjos produtivos locais, com a elevação dos custos de operação, sobrecarga das infraestruturas existentes e redução da qualidade de vida dos trabalhados, gerando, por sua vez, um efeito sistêmico no tecido urbano da Região Metropolitana do Recife (RMR) ao impactar a principal via de ligação norte sul (BR-101) e, consequentemente, o acesso ao Complexo Industrial e Portuário de Suape.

Tal situação-problema tem exigido por parte do município uma necessidade urgente no aumento do investimento público na resolução dessa deficiência estrutural, sobretudo na área do seu polo logístico, inclusive na perspectiva de viabilizar novos arranjos institucionais como parcerias público-privado.

Deficiência de conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

A malha viária de Jaboatão dos Guararapes desempenha papel fundamental na integração metropolitana e no acesso a equipamentos urbanos essenciais. O desgaste natural, somado à sobrecarga estrutural e ao crescimento urbano, agravados pela ausência ou deterioração da pavimentação causada pelas chuvas e pelo alto fluxo de veículos, além de drenagem ineficiente e calçadas danificadas, tem comprometido a mobilidade e a segurança urbana, o que tem demandado intervenções emergenciais e planejadas por parte do município. A proposta atuará nos seguintes eixos estratégicos:

- Corredores de Transporte Público: recapeamento asfáltico para melhorar o desempenho dos ônibus e reduzir tempo de viagem;
- Vias Coletoras: recapeamento asfáltico para melhorar o tráfego de veículos dentro dos bairros/comunidades, conectando vias arteriais e locais;
- Vias em Áreas de Interesse Social: pavimentação de pequenas vias para inclusão urbana e redução do isolamento de comunidades vulneráveis.

Necessidade de ampliação das infraestruturas associadas a resiliência climática para enfrentar o contexto de riscos de inundação, deslizamentos de massa e obsolescência das infraestruturas de mobilidade e drenagem.

Este subcomponente está diretamente relacionado a estruturação urbana do entorno da Lagoa Olho D'água, também conhecida como “Lagoa do Náutico”, cujo espelho d'água é de aproximadamente 400 hectares, sendo considerada uma das maiores lagoas de formação de restinga em área urbana do Brasil, sendo duas vezes e meia maior que a Lagoa Rodrigo de Freitas, localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

A Lagoa Olho D'água constitui-se num importante regulador da drenagem urbana da parcela sul do Recife e do Leste do Jaboatão, com seu sistema ambiental lacustre rico em flora e fauna de restinga. O quadro atual de ocupação do seu entorno torna necessária a viabilização de investimento com vistas a gestão do ordenamento/requalificação territorial de setores de risco em áreas ambientalmente sensíveis e com recursos estratégicos a subsistência metropolitana. A lagoa Olho D´Água e sua orla representam um potencial socioeconômico, ora como espaço de lazer, cultura e amenidades ambientais ora como novo *front* de urbanização.

A margens da Lagoa, enquanto região de contato imediato vem sofrendo com processos de urbanização que se intensificaram nos últimos 10 anos, registrando fenômenos de verticalização de médio e alto gabarito e uma série de problemas decorrentes das relações da sociedade com a natureza comuns a regiões periféricas de metrópoles nordestinas. Dentre os quais pode-se destacar alguns aspectos críticos identificados: a ausência de infraestrutura básica nessa área tem comprometido significativamente sua funcionalidade hidráulica e a qualidade ambiental, incluindo os problemas de mobilidade urbana e acesso as comunidades marginais a lagoa em períodos de maior

pluviosidade, bem como ausência de ligação alternativa entre os bairros litorâneos.

O entorno da lagoa é ocupado por comunidades em condições precárias, com habitações improvisadas sobre terrenos vulneráveis a alagamentos e sem infraestrutura adequada. Este cenário compromete o ecossistema e aumenta os riscos para os moradores.

Os investimentos previstos nessa subcomponente no âmbito da implantação da Via Parque visam complementar os investimentos previstos pelo Governo do Estado de Pernambuco, especialmente no âmbito do saneamento básico, por meio da PPP da Companhia Pernambucana de Saneamento, além de outros investimentos previstos para área por meio de recursos pleiteados junto ao PAC. Esses investimentos somados visam enfrentar a complexidade da situação com ações coordenadas nos âmbitos ambiental, social e econômico, envolvendo a requalificação da lagoa, saneamento, criação de infraestrutura habitacional e recuperação ambiental e mobilidade.

Elevada quantidade de setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

O município do Jaboatão tem enfrentado de forma recorrente eventos climáticos extremos, que tem superado significativamente as médias históricas e com a ocorrência em curtos tempos de retorno. A magnitude do último evento ocorrido em **2022** gerou **68 mortos** e elevados **danos as infraestruturas (Figura 8), ao patrimônio e a diversos setores econômicos, em especial a economia popular**. Cujos efeitos ainda se faz presentes no território municipal.

FIGURA 8: **Deslizamento em Área de Morros, Bairro Jardim Monte Verde, Jaboatão dos Guararapes, 2022.**



Fonte: G1.globo.com, 2022,

Esses eventos extremos agravaram setores de risco existentes e geraram novas áreas propensas ao risco geológico-geomorfológico ora sob a forma de movimentos de massa ora através de inundações **(Figuras 9 e 10)**.

FIGURA 9: **Alagamento no Baixo Curso do Rio Jaboatão, Bairro de Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, 2022.**



Fonte: TR Drone, 2022.

FIGURA 10: **Alagamento no Baixo Curso do Rio Jaboatão, Bairro de Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, 2024.**



Fonte: TR Drone, 2024.

No município foram mapeados 394 setores de risco no município de Jaboatão dos Guararapes. Desses, 269 setores correspondem a áreas de risco de deslizamento, no caso dos processos de inundação, foram avaliados 125 setores de risco em áreas informais (assentamentos precários), que foram refinados com os dados do mapa de perigo à inundação com base na aplicação do modelo matemático HEC-RAS, considerando a abrangência dos processos hidrológicos e as áreas sujeitas ao extravasamento das águas em eventos de inundação.

O número de moradores por grau de risco apresentou os seguintes resultados:

- 45.147 moradores em áreas classificadas como R2 – Risco médio;
- 60.417 em R3 – risco alto;
- 53.638 em R4 – risco muito alto.

É importante salientar que, em relação aos setores de deslizamento, 20 deles foram selecionados pelo comitê gestor municipal para receberem obras estruturais de contenção e Soluções Baseadas na Natureza (SBN).

Os investimentos previstos neste subcomponente visam complementar outros projetos já captados junto ao PAC 2025 – Encostas de forma sistêmica, de modo a ampliar a intervenção de âmbito estrutural naqueles setores considerado de maior risco pelo Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres (PMRR) apresentado e, julho de 2025 e elaborado em parceria com o Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em parceria com a Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes e com apoio do Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional das Periferias e da Fundação FIOCRUZ (segue link para baixar os relatórios do Plano Municipal de Redução de Riscos: https://www.ufpe.br/enplageo .

Vastas áreas em vulnerabilidade social descobertas por infraestruturas sociais, necessitando de construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental em territórios periféricos.

O município enfrenta um crescimento da demanda natural por matrículas na rede municipal de ensino do Jaboatão dos Guararapes, os quais se somam ao processo de migração de significativo contingente da rede privada para a pública no pós pandemia do Covid 19. Vale ressaltar que Jaboatão funciona como cidade polo para a microrregião sul da Região Metropolitana do Recife, o que gera movimentos pendulares de alunos das áreas limítrofes ao município que são atendidos pela rede municipal. Essa aludida conjuntura afeta, especialmente, as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, conforme evidenciado no **Anexo 2** (Demanda Reprimida de Matrículas), a atual estrutura do parque escolar tem se mostrado insuficiente para atender com qualidade todas as crianças e estudantes em idade escolar. A escassez de vagas compromete o direito ao acesso e à permanência na escola, impactando negativamente na garantia de uma educação pública, inclusiva, equitativa e de qualidade para todos.

Vastas áreas em vulnerabilidade social descobertas por infraestruturas sociais, necessitando da ampliação e qualificação da atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios periféricos.

Com base nos dados epidemiológicos mais recentes e na análise da cobertura da Estratégia Saúde da Família (eSF) em Jaboatão dos Guararapes, observa-se que a Atenção Primária à Saúde no município apresenta avanços importantes, mas ainda enfrenta desigualdades territoriais significativas. A **cobertura municipal atual é de 57%,** o que significa que pouco mais da metade da população está formalmente adscrita a equipes de ESF. Esse índice, embora represente um esforço de expansão ao longo dos últimos anos, **ainda está aquém da meta de 70% de cobertura**, parâmetro amplamente reconhecido como o mínimo adequado para garantir acesso equitativo, integralidade do cuidado e maior resolutividade da APS.

A análise regionalizada evidencia disparidades entre os territórios, refletindo não apenas a distribuição das equipes, mas também as vulnerabilidades epidemiológicas e sociais de cada regional. Neste sentido as regionais 3, 4, 5, 6 e 7 serão contempladas com essa expansão a fim de homogeneizar a cobertura para 70%. Nesse sentido, considerando a baixa cobertura da ESF na regional 6, que corresponde a 39% e considerando ainda que a regional 6 apresenta altas taxas de mortalidade infantil e materna, além de um número crescente de casos de sífilis em gestantes, sífilis congênita e tuberculose; concentraremos 46% do Projeto no território da 6ª região.

No que diz respeito às demais regionais, destacamos a necessidade de expansão na Regional 3**,** pelos elevados coeficientes de mortalidade geral acima da média municipal, refletindo fragilidades no acompanhamento das condições crônicas e no acesso aos serviços básicos, além de concentração de casos de tuberculose, HIV/AIDS e sífilis em gestantes, evidenciando a necessidade de fortalecimento das ações de rastreio, diagnóstico precoce e tratamento oportuno; na Regional 4, pelo peso das causas externas de mortalidade (violências e acidentes), que exigem atuação multiprofissional e integração intersetorial; na Regional 5, em virtude dos altos índices de prevalência de hanseníase, demandando ampliação da busca ativa e tratamento oportuno; e na regional 7 em virtude da elevada taxa de mortalidade infantil, o que reforça falhas no pré-natal, parto e puerpério. Além da concentração de casos de sífilis congênita, arboviroses e doenças negligenciadas como hanseníase e leptospirose.

A expansão e locação das equipes, reflete as condições de maior vulnerabilidade social e ambiental, com base em critérios epidemiológicos e populacionais, permitirá reduzir desigualdades territoriais, ampliar o acesso, promover equidade e qualificar a APS em Jaboatão dos Guararapes com investimento prioritário nas áreas de maior vulnerabilidade, alinhado às diretrizes do SUS e às metas de desenvolvimento social e sanitário.

Vastas áreas em vulnerabilidade social descobertas por infraestruturas sociais, necessitando da requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

A precariedade dos campos de futebol do município decorre de diversos fatores interligados, como a falta de manutenção periódica, o uso intenso sem pausas para recuperação do solo, deficiências no planejamento urbano e limitações orçamentárias. Além disso, problemas ambientais, como solos encharcados, drenagem inadequada e exposição excessiva ao sol ou às chuvas, contribuem para a degradação dos espaços. Como resultado, muitos campos apresentam gramados danificados e desnivelados, ausência de áreas de convivência, falta de iluminação e arquibancadas, comprometendo a infraestrutura disponível. Essas condições dificultam o pleno aproveitamento dos espaços pela comunidade, limitando o esporte como instrumento de inclusão, lazer e convivência social.

Cabe ressaltar que, dos municípios pernambucanos com mais de 100 mil habitantes, onze estão na lista dos que tiveram a maior taxa de homicídios do Brasil de acordo com o Atlas da Violência 2024 (Ipea / Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Pernambuco teve uma taxa estimada de 37,7 homicídios por 100 mil habitantes, números altos para a média brasileira, tendo o município do Jaboatão dos Guararapes registrado 36 mortes por 100 mil habitantes ocupando, assim, o 83º lugar entre os mais de 5mil municípios do país.

Os índices de violência se concentram notoriamente nos distritos e bairros mais periféricos, com ausência e/ou deficiência de infraestrutura social, sendo mais gritante a precariedade de equipamentos de educação, esporte e lazer. O que torna a implantação e requalificação desses equipamentos fundamental para reduzir estados de vulnerabilidade social.

1. 2. 9. **Solução:**

Com base nos problemas e necessidades identificados nos diversos diagnósticos setoriais realizados pela equipe técnica municipal, consubstanciados no plano diretor do município, atualmente na etapa final de revisão e, ainda, ancorado, sobretudo, na nova estratégia de desenvolvimento expressa no novo Plano Plurianual – PPA 2026-2029 do Jaboatão dos Guararapes, e cuja nova identidade organizacional, diretrizes e objetivos estratégicos já foram aprovados em lei de 2025, que instituiu a nova Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que definiram, por sua vez, a definição dos quatro componentes estratégicos de intervenção prioritária contidos neste Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes – JABOATÃO 2030, foram definidas as propostas de ações para o enfrentamento das questões identificadas, considerando, para tanto, as propostas de ação que tivessem maior magnitude de impacto, elevada abrangência territorial, capacidade de sinergias com outras ações em andamento e previstas.

Além disso, cabe ressalta-se que as soluções ora propostas guardam compatibilidade sinérgica aos instrumentos de planejamento estratégico vigentes, a regulação do arcabouço jurídico incidente em nível Federal, Estadual e Municipal, a exemplo dos **Planos Plurianuais Federal e Estadual**, com especial atenção aos seus eixos estratégicos, além de plano setoriais de políticas públicas específicas. Destaca-se ainda a consideração da conjuntura de acoplamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU ratificados pelo Brasil.

Ressalta-se, ainda, a estreita compatibilidade das soluções propostas ao **Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Jaboatão dos Guararapes**.

Alinhamentos Estratégicos das Soluções Propostas

Este pleito está compatibilizado a múltiplos eixos do **Plano Plurianual Federal (PPA 2024–2027)**, especialmente nas **áreas estratégicas dos eixos**:

- **Combate à desigualdade territorial e inclusão produtiva;**
- **Meio ambiente, resiliência e adaptação climática;**
- **Desenvolvimento social e garantia de direitos e Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental.**

O projeto de operação de crédito reforça o papel de Jaboatão como vetor de desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, promovendo a integração urbana, a competitividade logística, a segurança climática e a qualidade de vida, com impactos positivos sobre a saúde, a educação e o respeito as fragilidades ambientais e a priorização de populações em situação de vulnerabilidade socioambiental.

Como forma de facilitação metodológica segue o abaixo a descrição dessas soluções por **componente e suas respectivas soluções/produtos propostos**:

COMPONENTE 1 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL.

Soluções/produtos:

1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

O serviço de implantação do cadastro multifinalitário propõe como soluções a modernização e atualização do cadastro imobiliário, de forma a garantir a precisão e a completude das informações sobre os imóveis e o território urbano. Para tanto, prevê o georreferenciamento das unidades imobiliárias, a revisão da Planta Genérica de Valores, implantação de banco de terras e equipamentos, elaboração do mapa da base territorial e a integração das bases cadastrais hoje dispersas, modernização de sistemas de gestão e softwares de suporte e reaparelhamento tecnológico como ações de suporte para promover melhorias no ordenamento municipal, nas políticas públicas e na eficiência da arrecadação municipal.

Possibilitando ainda a utilização dos dados de forma multifinalitário, apontando quais as políticas urbanas necessárias para o Município, com a formulação de políticas sociais, ambientais e de infraestrutura, bem como a gestão territorial. Assim, o cadastro multifinalitário constitui instrumento estratégico para fortalecer a autonomia financeira do Município, promover maior transparência administrativa e oferecer suporte técnico consistente às ações de governo e ao atendimento ao cidadão.

Dentre os produtos destaca-se:

- Realização de levantamento aerofotogramétrico acompanhado de restituição estereofotogramétrica atendendo às precisões cartográficas exigidas para cadastro imobiliário conforme NBR 13133 e ET-CQDG da INDE para a escala de 1:1000;
- Atualização do Banco de Dados Geoespacial Vetorial do município para a temática multifinalitária apontada na Infraestrutura de Dados Geoespaciais Municipal;
- Digitalização e georreferenciamento do contexto urbano legal, espacializando todas as plantas de loteamento e base cadastral de 1:5000, pertencentes à mapoteca municipal;
- Atualização da planta genérica de valores do município com base na nova cartografia municipal obtida dos levantamentos aerofotogramétricos;
- Licenciamento e criação de geoportais para operacionalização das bases cadastrais desenvolvidas. Treinamentos dos colaboradores nas novas plataformas SIG WEB;
- Elaboração do mapa de base territorial;
- Atualização do cadastro imobiliário e revisão da planta genérica de valores:
    - Levantamento aerofotogramétrico acompanhado de restituição estereofotogramétrica;
    - Implantação de módulos multifinalitários; Criação do banco de terras;
    - Implantação de ambiente SIG;
    - Aquisição de softwares e customização de soluções de tecnologia da informação;
- Criação do Banco de Terras Municipal;
- Implantação de Módulos Multifinalitários em ambiente SIG;
- Aquisição de softwares e customização de soluções de tecnologia da informação.

1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

Desenvolvimento e implantação da plataforma de interoperabilidade de gestão pública municipal; Integração de sistemas, dados e serviços; Disponibilização e ampliação dos serviços em plataforma web e mobile; Aquisição de softwares e customização de programas; Atualização tecnológica de equipamentos, softwares e sistemas; Implantação de infraestrutura de segurança cibernética; Capacitação e contratação de serviço e/ou força de trabalho técnico municipal para desenvolvimento de sistemas.

1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

A implantação do Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão visa fornecer infraestrutura adequada de ambiente de incubação de negócios inovadores, salas de reunião e espaços de qualificação profissional. Além do espaço físico adequado a desenvolvimento desses negócios, garantir a disponibilização de equipamentos para o desenvolvimento de protótipos de hardware, software e recursos de geradores e internet de alta velocidade.

Destaca-se como diagnóstico de referência do Plano de Ação Estratégica Setorial de Desenvolvimento Econômico, (**Anexo 3** – Plano de Ação Área de Desenvolvimento Econômico)

COMPONENTE 2 – FORTALECER A INFRAESTRUTURA E A HABITABILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL ASSOCIADA AS AÇÕES DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA.

Soluções/produtos:

2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Pavimentar cerca de 8,4km de vias de alta capacidade de carga, viabilizando o escoamento da produção no Polo Industrial e Logístico do Jaboatão dos Guararapes, situado às margens da BR-101 Sul, ampliando, assim, a capacidade de atração/implantação de novos empreendimentos.

Projeta-se preliminarmente a construção de trechos de vias conectando os três principais eixos de desenvolvimento do polo produtivo municipal, a saber: a BR-101 (variante antiga) BR-101 (nova variante sul) e a PE-17 (eixo de integração leste-oeste). (**Anexo 4 -** Mapa de Intervenções Prioritárias do Polo Industrial)

2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

O subcomponente foi estruturado para implantar **27km de pavimentação de vias** e **o recapeamento de 30km das vias existentes**. Compreende a elaboração de projetos básicos e executivos e a execução das vias estruturantes, coletoras e vicinais.

Destaca-se como diagnóstico de referência do Plano de Ação Estratégica Setorial Infraestrutura de Mobilidade, (**Anexo 5** – Plano de Ação Área de Infraestrutura)

2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Implantação de um **trecho da via parque na orla leste da Lagoa Olho D'Água** e suas vias vicinais imediatas com aproximadamente **5km**, com soluções de adaptação as mudanças climáticas. (**Anexo 3** - Mapa de situação da Via Parque projetada)

Destaca-se como diagnóstico de referência do Plano de Ação Estratégica Urbanização da lagoa Olho D'Água, (**Anexo 6** – Plano de Ação da Via Parque) e (**Anexo 7** – Mapa de Situação do Trecho da Via Parque).

2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Intervenção nos **10 setores classificados como de muito alto risco geológico-geomorfológico pelo Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR)** municipal e validados pelo comitê participativo de gestão do PMRR, que terão **impacto em mais de 20% da população exposta ao risco em risco muito alto**.

As soluções baseiam-se ora em intervenções clássicas de engenharia e ordenamento urbano ora em soluções baseadas na natureza de forma principal ou complementar. Visando assim, atender a segurança da habitabilidade como a sustentabilidade ambiental.

Destaca-se como diagnóstico de referência o Plano Municipal de Redução de Riscos, disponível no endereço eletrônico: https://www.ufpe.br/enplageo.

COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA SOCIAL EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.

3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a ampliação e reestruturação do parque escolar municipal por meio da construção de **02 creches e 02 escolas de Ensino Fundamental**, bem como da ampliação da oferta de vagas nessas etapas de ensino.

Essas ações visam atender à crescente demanda da população, assegurando o acesso à educação desde a primeira infância até os anos finais do Ensino Fundamental, em conformidade com as diretrizes da política educacional brasileira e os objetivos estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação (PNE).

Destaca-se como diagnóstico de referência do Plano de Ação Estratégica na área de educação, (**Anexo 8** – Plano de Ação Educação) e (**Anexo 2 –** Demanda de Matrículas Reprimidas).

3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

10 Unidades de Saúde da Família (**USF/UBS) Porte II**, com base no projeto padrão constante no Portal do Ministério da Saúde, e com valores de referência estabelecidos pelo Novo PAC - Programa de Aceleração do

Crescimento; e **01 Unidade de Saúde da Família (USF/UBS) Porte III**, também com base no projeto padrão constante no Portal do Ministério da Saúde, e valores estabelecidos pelo Novo PAC - Programa de Aceleração do Crescimento.

Este subcomponente prevê a implantação e expansão da Estratégia Saúde da Família (eSF), por meio da construção de Unidades de Saúde da Família (USF) e da ampliação do número de equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, com o objetivo de alcançar o patamar mínimo de 70% de cobertura municipal. Essa iniciativa responde diretamente à heterogeneidade da cobertura populacional por regional, às desigualdades socioassistenciais e territoriais da APS, garantindo maior acesso da população aos serviços básicos de saúde, promovendo equidade na distribuição das equipes e fortalecendo o cuidado integral.

A construção das USF atua sobre a necessidade de infraestrutura adequada, garantindo espaços seguros e humanizados para profissionais e usuários, facilitando o acolhimento, melhorando os processos de trabalho e qualificando a resolutividade da APS. A melhoria física das unidades permite o atendimento integrado, potencializa a atenção preventiva e oferece condições para a incorporação de novas tecnologias e práticas de cuidado, fortalecendo o modelo de atenção centrado na comunidade.

A integração da saúde bucal à APS responde à necessidade de cuidado integral e de promoção da saúde em todos os níveis, favorece ações preventivas, acompanhamento contínuo de condições crônicas, educação em saúde e redução de agravos orais que impactam a saúde geral da população.

O impacto dessas soluções sobre os dados epidemiológicos é significativo. A expansão da cobertura e o acompanhamento mais próximo da população contribuem para o monitoramento constante de agravos endêmicos e epidêmicos, como arboviroses, tuberculose e sífilis congênita, possibilitando respostas rápidas e planejadas. Espera-se a melhoria dos indicadores de morbidade e mortalidade, redução da mortalidade infantil e materna e maior equidade no acesso aos serviços, refletindo na qualidade de vida da população e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde com impactos diretos no território municipal.

Destaca-se como diagnóstico de referência do Plano de Ação Estratégica na área de saúde, (**Anexo 9** – Plano de Ação saúde).

3.3: Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Requalificação dos principais espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis, enquanto equipamentos cruciais para a inclusão social e a promoção da saúde física e mental, sobretudo para os grupos populacionais mais vulneráveis como crianças e adolescentes, além de se constituírem como praticamente os únicos espaços de amenização ambiental, em áreas muito adensadas, distribuídos nos cinco distritos municipais, tendo como intervenções prioritárias os equipamentos esportivos e de lazer associados, a exemplo dos seguintes equipamentos/espaços:

- Campo da FEBEM (Cavaleiro);
- Campo de Floriano (Floriano);
- Campo da Estação (Engenho Velho);
- Campo do MEC (Dois Carneiros);
- Campo do Coroa (Vila Rica);
- Campo da Vila UR-06 (Zumbi do Pacheco);
- Campo e Pracinha (Jardim Jordão);
- Campo da Rua Rio Jaboatão (Marcos Freire);
- Capo do Areeiro (Cajueiro Seco);
- Campo e Pracinha (Barra de Jangada);
- Campo da Prefeitura (Prazeres).
- Ginásio Reginaldo Montenegro (Jaboatão Centro).

Além destes equipamentos previamente identificados, poderão ser beneficiados outros equipamentos de lazer, cultura e espaços livre públicos, desde que atendam aos mesmos critérios de localização e finalidade até o limite dos investimentos previstos para este subcomponente.

Destaca-se como diagnóstico de referência o Plano de Ação Estratégica na área de esporte e lazer, (**Anexo 10** – Plano de Ação Esporte e Lazer).

COMPONENTE 4 – GESTÃO DO PROGRAMA

Soluções/produtos:

Visando sobrepor o contexto de precariedade de planejamento de ações estratégicas e de uma gestão por resultados o pleito propõe a requalificação do Setor de Planejamento e Monitoramento da Gestão Estratégica, hoje representado pela secretaria executiva de planejamento orçamento e gestão e pela secretaria executiva de projetos especiais e capitação de recursos, através da criação do núcleo de parcerias e relações institucionais, da Criação do banco de projetos de engenhara e arquitetura de projetos estruturantes e estratégicos, da implantação de espaço próprio e da dotação deste de infraestruturas de tecnologia da informação e equipamentos diversos para implantação do núcleo, além da aquisição de softwares e da customização de *dashboard web* e móvel para dar suporte ao monitoramento estratégico.

Promoção de assistência técnica para a implementação do programa, auxiliando na gestão e gerenciamento do projeto, além de apoiar a criação da UGP, bem como a auditoria e avaliação das ações executadas no âmbito da operação. Apoio as ações de gestão do programa com a realização de aquisição de bens, contratação de consultorias entre outras atividades que visem fortalecer as ações implementadas no programa.

4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.

Ações de fortalecimento à gestão e administração do Programa, entre elas, a potencial contratação de uma empresa que ficará corresponsável pelo gerenciamento do Programa ou a qualificação de equipe interna.

Supervisão das obras a serem executadas pelo Projeto e implantação da metodologia BIM (Modelagem de Informação da Construção) a partir da aquisição tanto do software quanto do hardware necessários para o bom funcionamento da plataforma e, além disso, um processo de capacitação do corpo técnico da gestão municipal para orientação quanto a análise de projetos seguindo as premissas da nova metodologia.

Atualização de Normativas e Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos e Ambientais: Atualização e regulamentação dos principais instrumentos urbanísticos e ambientais previstos no plano diretor.

Reaparelhamento e aquisição de softwares de suporte a gestão e supervisão técnica;

Requalificação do Setor de Planejamento e Monitoramento da Gestão Estratégica;

4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.

Contratação de estudos, projetos e consultoria/apoio técnico especializado, no que couber, com vistas a implementação das ações do projeto, a exemplo da realização do Trabalho Técnico Social antes, durante e após a execução das intervenções, com o apoio da Secretaria Municipal de Ação Social, com vistas a promover a participação social e a promoção da cidadania como um dos principais valores do Programa.

4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria

Capacitar as equipes de auditoria interna e contratar auditoria externa para o acompanhamento do projeto Jaboatão 2030, bem como apoiar ações de divulgação do Programa, por meio de publicação de materiais ou promoção de eventos, com o objetivo de disseminar as boas práticas e soluções empregadas, além das lições aprendidas.

1. 2. 39. **Resultado:**

São apresentados abaixo os benefícios diretos e externalidades positivas que se espera obter com a implementação deste projeto, tendo por base o contexto, os problemas e as soluções propostas anteriormente apresentados nos capítulos anteriores.

De partida, é importante ressaltar que as ações objeto deste pleito **possuem impacto sistêmico e cumulativo sobre a totalidade do território e da população municipal**, podendo variar em escalas intraurbana e com resultados diversos segundo a natureza da política pública vinculada diretamente a cada um de seus componentes estruturadores.

Vale salientar que se tem como resultado ampliado, em potencial, **promover o desenvolvimento urbano e social sustentável, com foco em equidade territorial, inclusão produtiva e adaptação as mudanças climáticas no município do Jaboatão dos Guararapes**, e que deverá ser alcançado a partir da soma dos resultados parciais esperados segundo o atendimento aos objetivos específicos propostos.

A seguir são descritos os **resultados esperados** por cada um dos componentes:

COMPONENTE 1 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL.

Resultados Esperados:

1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Como resultados esperados, temos a modernização da gestão municipal, com a atualização contínua das informações geoespaciais do território, resultando em dados com alta precisão de confiabilidade.

A integração de cadastros temáticos (fiscais, sociais, ambientais, patrimoniais, habitacionais e de infraestruturas) numa única base, fortalecerá a operação entre os órgãos da administração e reduzirá custos. O reconhecimento das áreas formais e informais do Município, ampliando a abrangência das políticas e serviços públicos e de regularização fundiária. Neste sentido, serão implantadas uma tributação mais justa e a promoção da função social da propriedade urbana.

1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

Como resultados projeta-se: o aumento da eficiência administrativa e fiscal com a integração; Melhoria da formulação de políticas públicas baseadas em evidências; Ampliação do acesso do cidadão a serviços digitais; Maior transparência e participação social; Redução de custos operacionais; Fortalecimento da cooperação federativa; Benefício direto para o total da população municipal 647mil habitantes e os mais de 6mil funcionários municipais.

1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Benefícios diretos e externalidades positivas: Aumento de número de startups/empresas locais atuando na área de inovação e tecnologia; aumento de negócios/parcerias fechadas entre grandes empresas do município e startups/empresas locais; aumento do número de cursos de formação e qualificação na área de TIC e correlatas e aumento da força de trabalho atuando em inovação e tecnologia no município.

Beneficiários: estudantes de TIC e correlatos; empreendedores locais; grandes empresas; instituições de ensino e entidades do setor público.

1.4 Implantação do Núcleo de Gestão de Projetos e Monitoramento – NGPM.

Com a implantação do Núcleo Gestão de Projetos e Monitoramento espera-se como resultados a ampliação da eficiência do monitoramento das ações estratégicas para o município, a minimização de ações oriundas de órgãos de controle externo e interno, a ampliação da capitação de recursos, a padronização de fluxos de processos e capacidade de carga de operação dos contratos e convênios, a qualificação dos recursos humanos, em especial o quadro efetivo.

A construção de um espaço físico adequado e de equipamentos de suporte ampliarão a capacidade de gestão e possibilitaram concentrar as diversas áreas afetas a capitação de recursos, ao monitoramento e gestão.

COMPONENTE 2 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

Resultados Esperados:

2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Melhoria da infraestrutura viária, garantindo condições adequadas de tráfego para veículos de carga e transporte de mercadorias, pavimentando e implantando sistemas de drenagem eficiente para evitar danos causados por chuvas, priorizando rotas de escoamento de produção e de distribuição. Fortalecendo, assim, as vantagens locais comparativas na atração e ampliação de empreendimentos, ampliando, desta forma, a arrecadação do município e a geração de emprego formal e a melhoria da renda dos trabalhadores. (**Anexo 4 -** Mapa de Intervenções Prioritárias do Polo Industrial)

2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

Reduzir os buracos e deformações, proporcionando maior conforto e segurança no deslocamento de veículos e pedestres, melhorar a eficiência do sistema de drenagem pluvial, com melhor escoamento das águas das chuvas e diminuição de danos estruturais, otimizar a circulação de veículos, especialmente em corredores de transporte público e vias coletoras. Diminuir os custos de manutenção recorrente, com pavimentação e drenagem mais resistentes e planejadas, implantando calçadas acessíveis, seguras e contínuas, promovendo a mobilidade ativa (a pé ou de bicicleta), fazendo uso de soluções sustentáveis, reduzindo os riscos de quedas, colisões e outros acidentes urbanos.

2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Promover a estruturação sustentável do entorno da Lagoa Olho D'água; Ampliar a conexão entre os bairros mais populosos do município (Piedade, Candeias e Barra de Jangada); ampliar a extensão dos moldais não motorizados, adaptar a infraestrutura ao movimento das marés e aos eventos climáticos extremos. (**Anexo 7 -** Mapa de Intervenção do Trecho da Via Parque Projetada)

A Implantação de trecho da Via Parque da Lagoa Olho D'água criará uma alternativa de mobilidade as comunidades que ficam isoladas nos períodos de chuvas intensas associadas a alta das marés, bem como servirá de rota de ligação alternativa para 160mil habitantes nos bairros litorâneos. Com o projeto espera-se salvaguardar as áreas de amortecimento da drenagem natural, redirecionar fluxos estrangulados da microdrenagem tributária a lagoa e ampliar em 4km as vias não motorizadas (ciclovias, ciclofaixas, e calçadão linear arborizado, ampliando assim o percentual de arborização urbana e a consolidação de vergetação de restinga as margens da lagoa.

2.4: Redução dos setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Garantir segurança, condições dignas de moradia e melhor qualidade de vida para as famílias que residem nas áreas de risco para as populações residentes nas áreas de risco contempladas com as intervenções nos 10 setores de muito alto risco selecionados. Ampliando, assim, a efetividade das ações previstas no Plano Municipal de Redução de Riscos. As intervenções preveem a consolidação do sistema de alertas da Defesa Civil municipal em cerca de 25% das áreas de muito alto risco.

COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA SOCIAL EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.

Resultados Esperados:

3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Espera-se um incremento das matrículas nas regionais planejadas atingido diretamente a ODS 4 e de forma transversal as ODS 1 e 2, com o aumento de estudantes matriculados e qualificação da educação desses estudantes. Desse modo com essa ampliação planejada os incrementos dar-se-ão dá seguinte forma:

- Regional 01 – educação infantil (pré-escola) com aumento de 11,44% e no ensino fundamental (anos iniciais) de 8,5%;
- Regional 03 – educação infantil (creche) aumento de 42,73%, educação infantil (pré-escola) 8,03% e no ensino fundamental (anos iniciais) de 24,23%;
- Regional 05 - educação infantil (creche) aumento de 40,16% e educação infantil (pré-escola) de 11,54%;
- Regional 06 - ensino fundamental (anos finais) aumento de 6,83%.

O aumento de matrículas na Rede Municipal de Ensino representa não apenas a ampliação do acesso à educação, mas também a possibilidade de maior captação de recursos para o município. Assim, cada nova matrícula contribui diretamente para o incremento das receitas destinadas à manutenção e ao desenvolvimento da educação, fortalecendo as condições de investimento em infraestrutura, profissionais e práticas pedagógicas de qualidade.

3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

A implementação do projeto de construção e ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF) permitirá alcançar resultados diretos e mensuráveis, beneficiando de forma ampla a população do município, especialmente os territórios mais vulneráveis. Espera-se a ampliação da cobertura da ESF de 57% para 70%, com a implantação de novas equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, beneficiando aproximadamente 63.000 habitantes da Regional 6, região mais populosa e com maior déficit assistencial, além de atender às necessidades de outras regionais com cobertura abaixo da meta.

Os benefícios diretos incluem o aumento do acesso a serviços de atenção primária, o acompanhamento contínuo da população, o fortalecimento da resolutividade local e a redução da sobrecarga nos serviços de média e alta complexidade. Espera-se maior adesão a tratamentos de doenças crônicas, diminuição de agravos como tuberculose, sífilis congênita e arboviroses, e melhoria nos indicadores de morbidade e mortalidade infantil e materna.

A infraestrutura adequada das UBS permitirá atendimento qualificado, condições seguras de trabalho para os profissionais e ampliação das ações preventivas e educativas, garantindo cuidado integral e humanizado.

Entre as externalidades positivas, destacam-se a promoção da equidade territorial, com redução das desigualdades históricas no acesso à saúde; o fortalecimento do vínculo entre comunidade e equipe de saúde; a geração de dados epidemiológicos mais precisos, possibilitando planejamento e monitoramento mais eficazes; e a valorização do capital humano local, com melhoria das condições de trabalho e motivação das equipes.

Adicionalmente, espera-se impacto positivo em determinantes sociais da saúde, como educação em saúde, higiene e prevenção de doenças, refletindo em melhor qualidade de vida e produtividade da população atendida.

3.3: Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Como benefícios diretos e externalidades positivas tem-se que a requalificação dos campos de futebol do município proporcionará melhoria dos gramados, instalação de iluminação e arquibancadas e criação de áreas de convivência, garantindo espaços seguros e adequados para a prática esportiva e lazer. Espera-se, assim, promover bem estar, inclusão social e fortalecimento da convivência comunitária, além de contribuir para redução da vulnerabilidade de jovens em áreas de risco.

Este subcomponente atuará diretamente sobre problemas como falta de manutenção, uso intenso sem planejamento, limitações orçamentárias e condições ambientais adversas, oferecendo soluções estruturais e sustentáveis que transformem os espaços esportivos e de lazer em instrumentos de cidadania e qualidade de vida em Jaboatão dos Guararapes.

COMPONENTE 4 – GESTÃO DO PROGRAMA

Resultados Esperados:

4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.

Espera-se com esta ação o fortalecimento das equipes de gestão e administração municipal, em especial atenção através da capacitação e qualificação dos recursos humanos das unidades executoras dos projetos - gestores de contratos, ordenadores e fiscais de contratos.

Implantação da metodologia BIM (Modelagem de Informação da Construção) a partir da aquisição tanto do software quanto do hardware necessários para o bom funcionamento da plataforma e, além disso, um processo de capacitação do corpo técnico da gestão municipal para orientação quanto a análise de projetos urbanísticos e ambientais, elaboração e gestão de projetos de engenharia e arquitetura.

Atualização de normativas e regulamentação de instrumentos urbanísticos e ambientais: Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) e regulamentação dos principais instrumentos urbanísticos e ambientais previstos no plano diretor.

O reaparelhamento de equipamentos e mobiliários, associado a aquisição de softwares de suporte a gestão e supervisão técnica irá dinamizar os setores finalísticos da execução de obras das unidades administrativas municipais.

Com a requalificação do Setor de Planejamento e Monitoramento da Gestão Estratégica espera-se que seja fortalecida a gestão por resultados, o monitoramento de forma continuada das ações estratégicas.

4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.

Realização do Trabalho Técnico-Social antes, durante e após a execução das intervenções, a fim de garantir a participação social e a promoção da cidadania como um dos principais valores do Programa. A implantação do núcleo de parcerias e relações institucionais, proporcionará sinergias entre as ações das diversas instituições públicas e privadas, levando a minimização de custos, ausência de sobreposições de ações e potencialização de resultados.

A criação do banco de projetos de engenhara e arquitetura e dos estudos de viabilidade das ações estratégicas para o município irá potencializar a captação de recursos, irá reduzir o tempo de execução das obras e direcionará os recursos do tesouro municipal de forma mais equilibrada.

4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.

O projeto prevê a capacitar das equipes de auditoria interna e a contratação de auditoria externa para o acompanhamento do projeto Jaboatão 2030, bem como apoiar ações de divulgação do programa, por meio de publicação de materiais ou promoção de eventos, com o objetivo de disseminar as boas práticas e soluções

empregadas, além das lições aprendidas.

A aquisição de infraestrutura e equipamentos irá assegurar as condições de trabalho necessárias ao desempenho do controle dos recursos públicos e a garantia da transparência dos atos da gestão municipal e um ambiente favorável a interlocução social.

1. 3. **Objetivo**

O Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes – JABOATÃO 2030, tem como Objetivo Geral:

Promover o desenvolvimento urbano e social sustentável, com foco em equidade territorial, inclusão produtiva e adaptação as mudanças climáticas no município do Jaboatão dos Guararapes/PE, na perspectiva de sua inserção enquanto município metropolitano.

E como objetivos específicos:

1. Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.
2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.
3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis, com elevados índices de violência urbana, alta dependência de transferências assistenciais de suas populações.

Para clarificar a correlação entre os Objetivos e os componentes e seus resultados apresenta-se o **quadro 2** ilustrativo a seguir.

QUADRO 2: **Correlação entre os Objetivos, Componentes e Resultados do Projeto JABOATÃO 2030.**

OBJETIVO GERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	COMPONENTE	RESULTADOS
Promover o desenvolvimento urbano e social sustentável, com foco em equidade territorial, inclusão produtiva e adaptação as mudanças climáticas no município do Jaboatão dos Guararapes/PE	**1.** Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.	**Componente 1** - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.	**1.1:** Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.
			1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.
			1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes.

OBJETIVO GERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	COMPONENTE	RESULTADOS
2 Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.	**Componente 2 –** Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.	**2.1:** Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.	
		2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.	
		2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.	
		2.4 Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.	
3 Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.	**Componente 3** - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis.	**3.1** Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.	
		3.2. Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.	

OBJETIVO GERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	COMPONENTE	RESULTADOS
3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.			
1. Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.	**Componente 4** – Gestão do Programa.	**4.1** Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras. **4.2** Apoio ao Gerenciamento do Programa. **4.3** Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.	

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Quantitativo de módulos multifinalitários disponibilizados a gestão municipal (MMD).

Descrição:

Fórmula de cálculo do indicador:

MMD = Total de módulos (Tm) previstos dividido pelo total de módulos implantados (Tmi).

Descrição do Indicador: Referência ao Objetivo Específico:

O indicador “Quantidade de setores atendidas por módulos multifinalitários” contribui diretamente para Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal, pois, a implantação desses módulos possibilita a centralização de serviços, a coleta estruturada de dados e o atendimento qualificado ao cidadão, promovendo maior agilidade administrativa e uso racional dos recursos públicos.

Ao mensurar a presença desses módulos em diferentes unidades administrativas e seus respectivos setores, o indicador expressa o avanço das ações voltadas à transformação digital e à eficiência fiscal, em consonância com o objetivo específico estabelecido.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos;

Vinculado ao objetivo específico:

1. Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.

Componente vinculado: 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

Produto vinculado: 1.1 Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Meta:

META: 1.1 - Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Descrição: Implantação do Cadastro Multifininalitário.

Valor da meta: 50%

Unidade de medida da meta: und

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2029

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Percentual de cobertura da atualização do cadastro imobiliário (CACI).

Descrição:

Fórmula de cálculo do indicador:

CACI = Total de km^2 de imagens coberta e restituídas (Tir) multiplicado por 100 e dividido pela área total em km^2 do território municipal (Att).

Descrição do Indicador: Referência ao Objetivo Específico:

O indicador “Quantidade de setores atendidas por módulos multifinalitários” contribui diretamente para Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal, pois, a implantação desses módulos possibilita a centralização de serviços, a coleta estruturada de dados e o atendimento qualificado ao cidadão, promovendo maior agilidade administrativa e uso racional dos recursos públicos.

Ao mensurar a presença desses módulos em diferentes unidades administrativas e seus respectivos setores, o indicador expressa o avanço das ações voltadas à transformação digital e à eficiência fiscal, em consonância com o objetivo específico estabelecido.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos;

Vinculado ao objetivo específico:

1.Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.

Componente vinculado: 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

Produto vinculado: 1.1 Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Meta:
META: 1.1 - Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Descrição: Implantação do Cadastro Multifininalitário.

Valor da meta: 85%

Unidade de medida da meta: km^2

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2029

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Índice de integração de sistemas ativos e acessíveis online (IIC).

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

ICC = Relação percentual entre o quantitativo de sistemas integrados multiplicado por 100 dividido pelo total de sistemas operados pelo município.

Descrição do Indicador - Referência ao Objetivo Específico:

O indicador Índice de integração dos sistemas (IIC) reflete o percentual de serviços públicos ativos e acessíveis online e está diretamente relacionado ao objetivo de modernização da gestão pública municipal.

Ao mensurar esse dado, demonstra-se o esforço da administração em tornar os serviços mais ágeis, acessíveis e eficientes, por meio de plataformas digitais que reduzem filas, deslocamentos e burocracias, fortalecendo o governo digital e promovendo maior racionalidade na gestão dos recursos públicos.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população;

Vinculado ao objetivo específico:

1.Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.

Componente vinculado: 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

Produto vinculado: 1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

Meta:
META: 1.2 - Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

Descrição: Implantação das infraestruturas de TI e das plataformas de interoperabilidade entre sistemas.

Valor da meta: 65%

Busca-se estabelecer a meta mínima de 30% dos sistemas integrados em 2 anos e de **65%** dos sistemas integrados até o final do Projeto.

Unidade de medida da meta: und

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2029

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Quantidade de ações e oportunidades geradas pelo Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

Somatório de (Ações + Oportunidades geradas) no período de referência.

Descrição do Indicador - Referência ao Objetivo Específico:

O indicador “Quantidade de ações e oportunidades geradas pelo Centro de Desenvolvimento” está alinhado ao objetivo de modernização da gestão pública municipal, ao demonstrar o esforço da administração em promover inovação, qualificação e estímulo ao empreendedorismo.

Ao mensurar esse dado, evidencia-se o impacto direto das iniciativas voltadas à geração de valor, fortalecimento institucional e dinamismo na oferta de soluções estratégicas para o território.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

209 - Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade;

Vinculado ao objetivo específico:

1. Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.

Componente vinculado: 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

Produto vinculado: 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Meta:
META: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes.

Descrição: Ampliação da quantidade de ações e oportunidades geradas pelo Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Valor da meta: 20

Unidade de medida da meta: und

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2029

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Número de profissionais capacitados.

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

Somatório do número de profissionais capacitados pelo equipamento público implantado.

Descrição do Indicador - Referência ao Objetivo Específico:

O indicador “Número de profissionais capacitados” está alinhado ao objetivo de modernização da gestão pública municipal, pois demonstra o investimento na qualificação técnica dos servidores. Ao mensurar esse dado, evidencia-se o esforço da administração em preparar equipes para atuar com inovação, tecnologia e eficiência, especialmente no contexto da implantação do Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

209 - Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade;

Vinculado ao objetivo específico:

1.Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.

Componente vinculado: 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

Produto vinculado: 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Meta:
META: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes.

Descrição: Disponibilização de vagas e pessoas qualificadas pelo núcleo.

Valor da meta: 100

Unidade de medida da meta: pessoas

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2029

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Percentual de pavimentação concluída em áreas priorizadas.

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

(Extensão pavimentada concluída em km / Extensão total planejada em km) × 100

Descrição do Indicador: Referência ao Objetivo Específico:

O indicador “Percentual de pavimentação concluída em áreas priorizadas” está alinhado ao objetivo de expansão da infraestrutura urbana estratégica, ao demonstrar o avanço das obras que organizam o polo logístico do município e fortalecem os territórios potencialmente produtivos e ampliam as vantagens locacionais comparativas. A pavimentação melhora a mobilidade, reduz riscos e contribui para o desenvolvimento da geração de oportunidades de emprego formal.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios;

Vinculado ao objetivo específico:

2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.

Componente vinculado: Componente 2 - Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.

Produto vinculado: 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Meta:
META: 2.1 - Ampliação da infraestrutura do polo industrial e logístico do município.

Descrição: Pavimentar cerca de 7900 m de vias de alta capacidade de carga, com serviços de microdrenagem, acessibilidade e arborização urbana.

Valor da meta: 80%

Unidade de medida da meta: m

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Variação na arrecadação tributária de empresas localizadas nas áreas beneficiadas

Descrição:
Nome do indicador: Variação na arrecadação tributária de empresas localizadas nas áreas beneficiadas

Fórmula de cálculo do indicador:

[(Arrecadação Atual - Arrecadação Período Anterior) / Arrecadação Período Anterior] x 100

Descrição do Indicador:

O indicador “Variação na arrecadação tributária de empresas localizadas nas áreas beneficiadas” está diretamente associado ao objetivo de expansão da infraestrutura urbana estratégica, ao demonstrar o impacto econômico das intervenções realizadas. O crescimento na arrecadação reflete o fortalecimento da atividade empresarial nas regiões atendidas e sinaliza maior dinamismo econômico, geração de oportunidades e integração ao polo logístico do município. Esse resultado reforça a coerência entre os investimentos em infraestrutura e o desenvolvimento territorial sustentável.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios;

Vinculado ao objetivo específico:

2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.

Produto vinculado: 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Meta:
META: 2.1 - Ampliação da infraestrutura do polo industrial e logístico do município.

Descrição: Ampliar a arrecadação mediante a implantação de 7900 m de vias de alta capacidade de carga, com serviços de microdrenagem, acessibilidade e arborização urbana.

Valor da meta: 8%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência: 2027

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Percentual de pavimentação e recapeamento executado.

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

(Extensão pavimentada concluída em km / Extensão total planejada em km) × 100

Descrição do Indicador:

O indicador “Percentual de pavimentação e recapeamento executado” está vinculado ao objetivo de expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, ao refletir o avanço das obras que melhoram a conectividade entre os modais de transporte público de passageiros. Essas intervenções qualificam os corredores viários, reduzem vulnerabilidades em áreas periféricas e ampliam a integração territorial, contribuindo para uma mobilidade mais eficiente, segura e inclusiva.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios;

210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem;

Vinculado ao objetivo específico:

2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.

Produto vinculado: 2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

Meta:
META: Ampliar a integração entre os diversos moldais de transporte, com serviços de microdrenagem, acessibilidade e arborização urbana.

Descrição: Extensão de vias pavimentadas e/ou recapeadas concluídas em metros nas áreas prioritárias definidas.

Valor da meta: 80%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2029

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Indicador de Condição de Manutenção (ICM).

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

Formula de Cálculo: ICM=IP x 0,70 + IC x 0,30

Descrição do Indicador:

Este indicador será utilizado para avaliar os resultados da implantação de infraestruturas adaptadas a eventos climáticos extremos, no caso em questão as máximas de precipitação associadas a picos de elevação da mare.

O Indicador de Condição de Manutenção (ICM) foi introduzido por meio da Portaria nº 761, de 07 de agosto de 2025, do Ministério dos Transportes. Ele permite avaliar a condição de manutenção das rodovias, e servir de referência para o acompanhamento da condição de manutenção da malha Rodoviária.

O cálculo do indicador é composto pelo Índice de Pavimentação - IP (panelas, remendos e trincas), que representa 70% do valor final, e pelo Índice de Conservação - IC (roçada, drenagem e sinalização horizontal e vertical), que representa os 30% restantes, conforme o apresentado na Resolução DNIT nº 5/2022. A determinação do ICM se baseia no registro dos seguintes itens, cuja definições estão elencadas na Norma DNIT 005/2003 - TER Defeitos nos pavimentos flexíveis e semirrígidos.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

Vinculado ao objetivo específico:

2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.

Produto vinculado: 2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Meta:
META: Ampliar a disponibilidade de infraestruturas resilientes a eventos extremos climáticos e ambientes suscetíveis a mudanças climáticas.

Descrição: Extensão de vias pavimentadas e adaptadas eventos extremos climáticos e ambientes suscetíveis a mudanças climáticas concluídas em metros nas áreas prioritárias definidas.

Valor da meta: 80%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência: 2028

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Indicador de Chamados da Ocorrências da Defesa Civil (ICO).

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

ICO = Nº anual de chamados da Defesa Civil Municipal dos setores de risco muito alto (NCAB) do ano base dividido pelo Nº anual total chamados da Defesa Civil Municipal (NCTA) dos setores de risco muito alto dos anos subsequentes.

ICO = Nº Chamados Ano do Base (NCAB) dividido pelo Nº Chamados Total por Ano (NCTA).

Descrição do Indicador:

O indicador “Número de ocorrências de deslizamentos registradas” está alinhado ao objetivo de expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, ao permitir avaliar a efetividade das intervenções realizadas em áreas suscetíveis a desastres. A redução desse número ao longo do tempo sinaliza o impacto positivo das obras de drenagem e requalificação urbana, especialmente em territórios periféricos classificados como de alto risco, reforçando o compromisso da gestão com a segurança da população e a adaptação às mudanças climáticas.

A formula do indicador expressa a relação entre a quantidade de chamados recebidos anualmente pelos canais da Defesa Civil da Prefeitura em função da quantidade de chamados de ocorrências recebidas no ano base. A partir dele, é possível obter a avaliação anual da evolução da eficiência e do impacto das intervenções executadas nos setores prioritário.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas;

Vinculado ao objetivo específico: 2 - Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.

Produto vinculado: 2.4 Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Meta:
META: Reduzir o número de ocorrências em áreas suscetíveis a riscos de deslizamentos de massa e inundações provenientes de eventos extremos climáticos.

Descrição: Redução do número de ocorrências nos setores de risco muito alto definidos como intervenção prioritária pelo Plano Local de Redução de Riscos.

Valor da meta: 30%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE) Anos iniciais do ensino fundamental.

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

Fonte: Portal da Educação de Pernambuco. SAEPE x Taxa de Aprovação

SAEPE: Representa a média das notas obtidas pelos alunos nas provas de língua portuguesa e matemática, que são padronizadas em uma escala de 0 a 10. Essa média é obtida a partir dos resultados da Prova SAEPE.

Taxa de Aprovação: Refere-se à porcentagem de alunos que foram aprovados em relação ao total de alunos matriculados. Essa taxa varia de 0% a 100% e é calculada com base nas taxas de aprovação, reprovação e abandono nas escolas.

Descrição do Indicador:

O indicador IDEPE também está alinhado ao objetivo de ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção à educação em territórios periféricos vulneráveis, pois, assim como o IDEB, o IDEPE mede o desempenho educacional, mas com um diferencial: por ser um indicador exclusivo de Pernambuco, ele regionaliza a análise. Isso permite uma leitura mais precisa da realidade educacional do território, a fim de acompanhar os efeitos das políticas públicas com maior sensibilidade ao contexto estadual.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes;

Vinculado ao objetivo específico:

3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

Produto vinculado: 3.1 Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Meta:
META: Ampliar o desempenho educacional através de uma vinculação regionaliza.

Descrição: A meta se propõe a estabelecer a busca pela ampliação do desempenho educacional, mas com o diferencial de se utilizar um indicador de Pernambuco que espelha uma comparabilidade entre realidades semelhantes de forma a regionalizar a análise.

Valor da meta: 5%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**

Nome: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) Anos iniciais do ensino fundamental.

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

Fonte: Inep/MEC - N×P

Dados coletados: Proficiência (N): Representa a média das notas obtidas pelos alunos nas provas de língua portuguesa e matemática, que são padronizadas em uma escala de 0 a 10. Essa média é obtida a partir dos resultados da Prova Brasil (SAEB).

Taxa de Aprovação (P): Refere-se à porcentagem de alunos que foram aprovados em relação ao total de alunos matriculados. Essa taxa varia de 0% a 100% e é calculada com base nas taxas de aprovação, reprovação e abandono nas escolas.

Descrição do Indicador:

O indicador “IDEB” está alinhado ao objetivo de ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis, ao demonstrar os efeitos da criação e adaptação de novas unidades escolares para os anos iniciais. A melhoria no IDEB para anos iniciais reflete avanços na qualidade da educação e no acesso ao ensino em áreas com alta vulnerabilidade social.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes;

Vinculado ao objetivo específico:

3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

Produto vinculado: 3.1 Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Meta:
META: Ampliar o desempenho educacional através de uma vinculação regionaliza.

Descrição: A meta se propõe a estabelecer a busca pela ampliação do desempenho educacional, mas com o diferencial de se utilizar um indicador de Pernambuco que espelha uma comparabilidade entre realidades semelhantes de forma a regionalizar a análise.

Valor da meta: 5%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde no território municipal.

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

(Pessoas cadastradas pelas equipes de APS / População estimada pelo IBGE) × 100

Descrição do Indicador:

O indicador “Cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde no território municipal” está alinhado ao objetivo de ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis, com elevados índices de violência urbana, alta dependência de transferências assistenciais de suas populações, ao refletir os avanços na oferta de serviços essenciais de saúde.

No contexto de ampliação e qualificação da Atenção Primária à Saúde em Jaboatão dos Guararapes, por meio da construção de novas unidades, esse indicador permite acompanhar a expansão do acesso equitativo, a redistribuição territorial dos serviços e a melhoria da qualidade do cuidado. O aumento da cobertura populacional sinaliza maior presença do Estado em áreas vulneráveis, fortalecendo a prevenção, o vínculo comunitário e a resolutividade da atenção básica.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

102 -Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS);

Vinculado ao objetivo específico:

3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

Componente Vinculado: Componente 3 - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis.

Produto vinculado: 3.2. Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

Meta:
META: Ampliar a cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde nos territórios periféricos com maior vulnerabilidade socioeconômica.

Descrição: A meta se propõe a ampliar os serviços e atendimentos a população em zonas descobertas e com maior vulnerabilidade socioeconômica.

Valor da meta: 20%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Número de intervenções nos equipamentos de lazer e esportes.

Descrição:
Fórmula de cálculo do indicador:

Somatório de ações realizadas em equipamentos de lazer e esportes no período.

Descrição do Indicador:

O indicador “Número de intervenções nos equipamentos de lazer e esportes” está alinhado ao objetivo de ampliação das infraestruturas sociais em territórios periféricos vulneráveis. Medir esse indicador permite avaliar o andamento da requalificação de espaços de lazer e esportes que contribuem para transformar áreas antes negligenciadas em ambientes mais seguros, ativos e integradores.

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

Vinculado ao objetivo específico:

3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

Componente Vinculado: Componente 3 - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis.

Produto vinculado: 3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Meta:

META: Ampliar a o número de equipamentos e espaços requalificados para o uso esportivo e de lazer.

Descrição: A meta se propõe a ampliar o número de equipamentos e espaços requalificados para o uso esportivo e de lazer nas áreas periféricas com maior vulnerabilidade socioeconômica e onde se registra os maiores índices de mortes violentas letais intencionais.

Valor da meta: 35%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência: 2026

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: COMPONENTE 1 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 7.020.000,00

Descrição:
Fortalecer a gestão pública municipal através da inovação administrativa, do uso de técnicas e tecnologias de inteligência de planejamento territorial, fiscal e de interoperabilidade entre sistemas adotados no município e destes com outras instituições.

Descrição de subcomponentes e produtos:
PRODUTO 1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Descrição: Modernização da gestão administrativa e fiscal, por meio da instituição do cadastro multifinalitário. Criar uma base cartográfica georreferenciada única e confiável com camadas de dados de informações territoriais e imobiliárias, usada para apoiar decisões de governo e melhorar a gestão urbana e a eficiência fiscal, visando alcançar a redução das desigualdades socioeconômicas, a modernização do planejamento urbano, o aprimoramento dos serviços públicos e a excelência da administração municipal.

Resultados:

- Realização de levantamento aerofotogramétrico acompanhado de restituição estereofotogramétrica;
- Implantação de módulos multifinalitários;
- Criação do banco de terras;
- Atualização do cadastro imobiliário e revisão da planta genérica de valores;
- Implantação de ambiente SIG;
- Aquisição de softwares e customização de soluções de tecnologia da informação;
- Elaboração do mapa de base territorial.

PRODUTO 1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

Descrição: Compreende a implantação de plataforma de interoperabilidade entre sistemas, dados, informações e serviços da gestão pública em ambiente único, permitindo a integração tecnológica e a disponibilização ao cidadão em ambiente WEB e Móvel. Compreendendo: Sistemas e Serviços Digitais; Cooperação de Dados, Serviços e Informações; Plataforma Única ao Cidadão (Web e Mobile); Atualização Tecnológica; Capacitação Técnica – formação; Modernização/aquisição de equipamentos e infraestruturas de tecnologia da informação e internet das coisas; Aquisição de Software e Customização de programas.

Resultados:

- Desenvolvimento e implantação da plataforma de interoperabilidade de gestão pública municipal;
- Integração de sistemas, dados e serviços; Disponibilização e ampliação dos serviços em plataforma web e mobile;
- Aquisição de softwares e customização de programas;
- Atualização tecnológica de equipamentos, softwares e sistemas;
- Implantação de infraestrutura de segurança cibernética;
- Capacitação e contratação de serviço e/ou força de trabalho técnico municipal para desenvolvimento de sistemas.

PRODUTO 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Descrição: O núcleo irá proporcionar um ambiente físico e institucional com equipamentos modernos de suporte a startups/empresas locais atuando na área de inovação e tecnologia, fomentando assim, o aumento de negócios/parcerias com empresas do município com potencial de inovação e agregação de valor, bem como servirá de espaço para cursos de formação e qualificação na área de TIC e correlatas, visando ampliar o atendimento da demanda crescente por recursos humanos nas áreas de inovação e tecnologia no município, agindo em complementariedade as potencialidades geradas pelo Porto Digital em Recife, maior ambiente de geração de conhecimento e inovação em TI do Nordeste.

O Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão será composto por: ambiente de incubação e aceleração de negócios inovadores (com equipamentos para desenvolvimento de protótipos de hardware/software), salas de reunião e espaços de qualificação profissional (com equipamentos de projeção e apresentação). Todos estes ambientes devem possuir internet de alta velocidade e geradores que permitam que o ambiente continue em funcionamento apesar de alguma intempérie

Resultados:

- Adequação física do Centro Cultural Miguel Arraes para fornecer infraestrutura para ambiente de incubação de negócios inovadores, salas de reunião e espaços de qualificação profissional;
- Aquisição de equipamentos para desenvolvimento de protótipos de hardware, software e recursos de geradores e internet de alta velocidade;
- Cursos e atividades voltadas a capacitação profissional;
- Elaboração de estudos de viabilidade e prospecção de atividade com capacidade de inovação e agregação de valor.

1. 5. 19. **Informações do 2° componente:**
Nome: COMPONENTE 2 - FORTALECER A INFRAESTRUTURA E A HABITABILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL ASSOCIADA AS AÇÕES DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA.
Valor estimado em Dólar (USD): 35.403.000,00

Descrição:
Fortalecer e expandir a infraestrutura e a habitabilidade urbana de forma sustentável, objetivando o desenvolvimento do Município com ênfase ambiental, social e econômica, de modo associado às ações de resiliência climática.

Descrição de subcomponentes e produtos:
PRODUTO 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Descrição: Fortalecer a competitividade municipal na atração e consolidação de empreendimentos vinculados ao polo industrial e dinamizar o arranjo produtivo da logística e distribuição em complementariedade ao Complexo Industrial e Portuário de Suape/PE. Visando ampliar investimentos públicos e privados em cadeias produtivas e de serviços de suporte com maior valor agregado.

Resultados:

Pavimentar cerca de 8,4 km de vias de alta capacidade de carga, com serviços de microdrenagem, acessibilidade e arborização urbana.

PRODUTO 2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

Descrição: Executar a pavimentação e/ou recapeamento das vias de conexão entre os moldais do transporte público de passageiros dos sistemas rodoviário e ferroviário (metrô elétrico de superfície e veículos leves sobre trilhos a diesel, ambos operados pela CBTU/METROREC), bem como ampliar pavimentações e recapeamentos das vias coletoras e a pavimentação das pequenas vias de capilaridade comunitárias.

Resultados:

- Pavimentar 27km de vias com serviços de microdrenagem, acessibilidade e arborização urbana quando couber;
- Recapear 30km das vias existentes.

PRODUTO 2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Descrição: Implantar infraestruturas de mobilidade associadas a soluções de adaptação as mudanças climáticas na área de influência direta da Lagoa Olho D'Água.

Resultados:

- Implantar trecho de via parque com aproximadamente 5 km.

PRODUTO 2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Descrição: Intervenção em 10 setores classificados pelo Plano Municipal de Redução de riscos (2025) como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos, através da priorização de soluções baseadas na natureza de forma integrada.

Resultados:

- Elaborar planos urbanísticos e projetos executivos para 10 áreas de intervenção classificadas como de risco muito alto;
- Realizar obras de intervenção em 10 setores de risco classificados como de risco muito alto.

1. 5. 25. **Informações do 3° componente:**
Nome: COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA SOCIAL EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.
Valor estimado em Dólar (USD): 16.915.000,00

Descrição:
Construção, ampliação e qualificação da infraestrutura em territórios vulneráveis para ampliação das políticas de atenção primária em Saúde, de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, de lazer e esportes, com vistas a promoção do bem-estar da população.

Descrição de subcomponentes e produtos:
PRODUTO 3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Descrição: Construção, ampliação e qualificação (mobiliários e equipamentos) de 04 (quatro) unidades educacionais, nas regionais 01, 03, 05 e 06, que atendam as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, em áreas de alta vulnerabilidade e demandas de matrículas reprimidas.

Resultados:

- Implantar 4 (quatro) unidades de ensino que atendam as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

PRODUTO 3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

Descrição: O componente prevê a implantação de 10 Unidade de Saúde da Família (USF/UBS) Porte II e 1 Unidade de Saúde da Família (USF/UBS) Porte III, que darão suporte a consolidação de 18 equipes e qualificação do processo de trabalho de 05 equipes de Atenção Primária à Saúde (APS), priorizando áreas de maior vulnerabilidade social, epidemiológica e déficit de cobertura assistencial. Cada equipe será composta por 5 a 6 ACS, médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas e auxiliares, garantindo cobertura de 3.500 a 4.500 habitantes, com atenção integral, longitudinal e contínua.

Dessa forma, a estruturação permitirá uma ampliação de **145.728 atendimentos anuais**, expandindo o acesso e resolutividade. As construções seguirão os modelos arquitetônicos e funcionais estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com teleatendimento e salas multissensoriais visando fortalecer a resolutividade da Atenção Primária à Saúde. Haverá capacitação contínua das equipes, protocolos clínicos, educação em saúde e uso de tecnologias digitais.

Resultados:

- Construção de 10 (dez) Unidade de Saúde da Família (USF/UBS) Porte II.
- Construção de 01 (uma) Unidade de Saúde da Família (USF/UBS) Porte III.

PRODUTO 3.3: Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Descrição: Constitui-se na requalificação dos espaços comunitários de lazer e esportes. Prevê a execução de intervenções estruturais, restauração ou substituição de gramados danificados ou nivelamento e compactação do solo, a recuperação dos campos com gramados deteriorados, garantindo condições adequadas para a prática esportiva em espaços de lazer e esportes existentes. Inclui ainda a instalação de sistemas de iluminação de LED, implementação de iluminação de alta eficiência para possibilitar o uso noturno dos campos, ampliando a acessibilidade, construção de arquibancadas e pequenas áreas de lazer, pintura esportiva, recuperação de telhado e pintura esportiva, garantindo condições adequadas para a prática esportiva, com vistas a melhoria dos índices de saúde usando o esporte como vetor de prevenção.

Resultados:

- Requalificar equipamentos /espaços de lazer e esportes em áreas periféricas com elevada vulnerabilidade socioeconômica.

1. 5. 30. **Informações do 4° componente:**
Nome: COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Dólar (USD): 5.662.000,00

Descrição:
Este componente integra ações destinadas ao gerenciamento e administração do Programa, com ênfase na supervisão técnica, ambiental e social, apoio à UGP e auditorias externas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
PRODUTO 4.1 - Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.

Espera-se com esta ação os seguintes resultados:

- O fortalecimento das equipes de gestão e administração municipal, em especial atenção através da capacitação e qualificação dos recursos humanos das unidades executoras dos projetos - gestores de contratos, ordenadores e fiscais de contratos.
- Implantação da metodologia BIM (Modelagem de Informação da Construção) a partir da aquisição tanto do software quanto do hardware necessários para o bom funcionamento da plataforma e, além disso, um processo de capacitação do corpo técnico da gestão municipal para orientação quanto a análise de projetos urbanísticos e ambientais, elaboração e gestão de projetos de engenharia e arquitetura.
- Atualização de normativas e regulamentação de instrumentos urbanísticos e ambientais.
- O reaparelhamento de equipamentos e mobiliários, associado a aquisição de softwares de suporte a gestão e supervisão técnica irá dinamizar os setores finalísticos da execução de obras das unidades administrativas municipais.

Com a requalificação do Setor de Planejamento e Monitoramento da Gestão Estratégica espera-se que seja fortalecida a gestão por resultados, o monitoramento de forma continuada das ações estratégicas.

PRODUTO 4.2 - Apoio ao Gerenciamento do Programa.

Contempla a realização do Trabalho Técnico-Social antes, durante e após a execução das intervenções, a fim de garantir a participação social e a promoção da cidadania como um dos principais valores do Programa.

Além disso, está prevista a implantação do núcleo de parcerias e relações institucionais, com vistas a proporcionar sinergias entre as ações das diversas instituições públicas e privadas, levando a minimização de custos, ausência de sobreposições de ações e potencialização de resultados.

De forma complementar, a criação do banco de projetos de engenhara e arquitetura e de estudos de viabilidade das ações estratégicas para o município visa potencializar a captação de recursos, irá reduzir o tempo de execução das obras e direcionará os recursos do tesouro municipal de forma mais equilibrada.

PRODUTO 4.3 - Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.

O projeto prevê a capacitação das equipes de auditoria interna e a contratação de auditoria externa para o acompanhamento do projeto Jaboatão 2030, bem como o apoio às ações de divulgação do programa, por meio de publicação de materiais ou promoção de eventos, com o objetivo de disseminar as boas práticas e soluções empregadas, além das lições aprendidas.

A aquisição de infraestrutura e equipamentos irá assegurar as condições de trabalho necessárias ao desempenho do controle dos recursos públicos e a garantia da transparência dos atos da gestão municipal e um ambiente favorável a interlocução social.

1. 6. **Beneficiários**

BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JABOATÃO 2030

O Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes – Jaboatão 2030 - terá impacto na totalidade do território e, consequentemente, beneficiará todos os grupos populacionais do município, direta ou indiretamente.

Com vistas a uma maior apropriação dos grupos populacionais beneficiados diretamente com as ações previstas neste Projeto, apresentamos a seguir, em pormenor, a identificação desses grupos e ou segmentos populacionais específicos por componente.

COMPONENTE 1 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL.

Através deste componente espera-se ter como beneficiários dos seus produtos:

1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto na totalidade do território e atuará diretamente na gestão pública municipal e beneficiará os 683.285 habitantes do município. Possibilitará a integração entre funcional e de bancos de dados e sistemas informatizados de várias unidades administrativas através da implantação do cadastro em ambiente SIG com módulos multifinalitários.

1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto na totalidade do território e atuará diretamente na gestão pública municipal, em especial os mais de seis mil funcionários e beneficiará os 683.285 habitantes do município. Tendo como unidades administrativas diretamente beneficiadas as Secretarias Municipais – da Fazenda (Sistemas Psal, Siafin), Planejamento e Gestão (Sistema de monitoramento Web e Mobile e dashboard de orçamento, Intranet, etc.), Assistência Social (Sistemas de CADUnico, Cadastros Municipais de Assistência, etc.), da Saúde (SIAB, SILOG e Dispensação de Medicamentos; Agendamentos de Consultas, etc.), de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (Sistemas de Licenciamento Ambiental e Urbanístico), Desenvolvimento Econômico (Sistemas de Cadastros de Empresas) e de forma indireta o conjunto dos mais de 6mil funcionários nas diversas unidades da gestão.

1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Estudantes de TIC e correlatos; empreendedores locais; grandes empresas; instituições de ensino e entidades do setor público e do terceiro setor.

1.4 Implantação do Núcleo de Gestão de Projetos e Monitoramento – NGPM.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Tendo como beneficiário finalístico a população municipal em sua totalidade o subcomponente possui como foco o conjunto da gestão municipal, enquanto recursos humanos de suporte, representado pelos mais de 6.5 mil funcionários diretos e as diversas empresas fornecedoras de insumos e serviços.

COMPONENTE 2 - FORTALECER A INFRAESTRUTURA E A HABITABILIDADE URBANA ASSOCIADA AS AÇÕES DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA.

Através deste componente espera-se ter como beneficiários dos seus produtos:

2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto na totalidade do território e atuará diretamente sobre as empresas instaladas no polo industrial e logístico, ampliará as oportunidades de emprego e renda da população economicamente ativa, ampliará a arrecadação, em especial atenção o ISS, o IPI e o IPTU e beneficiará de forma indireta os 683.285 habitantes do município.

2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto em parcelas de todos os Distritos municipais e atuará diretamente sobre o sistema de transporte público de passageiros e indiretamente a cerca de 60% dos 683.285 habitantes do município.

2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Este subcomponente terá impacto direto em 4 bairros densamente povoados Piedade com 67.421 hab., Candeias com 72.530 hab., Cajueiro Seco com 56.966 hab. e Barra de Jangada com 41.270 hab.) que serrão cortados pela via principal e de forma indireta nas Regionais Administrativas 5 e 6 que totalizam juntas 274.202 hab. (IBGE, 2022). Criando uma alternativa ao transporte público de passageiros metropolitano.

Considerando a projeção de impacto, através do agrupamento dos setores censitários do IBGE, 2022 e os perímetros de potencial impacto socioambiental definidos pela prefeitura do Jaboatão, 2025 a Lagoa Olho D'Água está localizada numa área de alta densidade urbana com uma população da Área Diretamente Afetada (ADA) de 52.612 habitantes; com uma população da Área de Influência Direta (AID) de 263.069habitantes e uma população da Área de Influência Indireta (AII) e 346.749habitantes.

2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Beneficiários Diretos e Indiretos: São representados de forma dispersa no território municipal, sendo representado pelas comunidades vinculadas aos setores classificados como de risco muito alto para movimentos de massa e/ou inundação que totalizam segundo o Plano Municipal de Redução de Risco (2025) 60.417 habitantes.

COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.

Através deste componente espera-se ter como beneficiários dos seus produtos:

3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto direto nas três regionais administrativas com menor percentual de cobertura da rede e com presença significativa de populações em estado de vulnerabilidade social nos novos fronts de urbanização do município.

3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

Beneficiários Diretos e Indiretos: A ampliação irá beneficiar diretamente o sistema de atenção básica a saúde ampliando em cerca de 20% o atendimento da totalidade dos usuários. E de forma indireta e transversal na qualidade de vida da população, na redução de gastos e uso de serviços de média e alta complexidade

3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto direto nos 12 bairros com menores indicadores sociais do município e nos que possuem os maiores índices de crimes violentos letais intencionais sobre populações jovens e periféricas. Destacando-se o bairro de Prazeres como o segundo mais violento do Estado de Pernambuco. Os equipamentos atenderam áreas de vulnerabilidade socioeconômica dentro dos elencados bairros, representando áreas consolidadas de ocupação informal

Estes doze bairros totalizam uma população de 255.355 habitantes (IBGE, 2022), cerca de 40% da população municipal e representam 60% da população com rendimento nominal per capita mensal inferior a meio salário-mínimo.

COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA.

Através deste componente espera-se ter como beneficiários dos seus produtos:

4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto direto nos quadros de planejamento, gestão e fiscalização de projetos, contratos e similares da prefeitura municipal. Impactando de forma direta as unidades administrativas finalísticas de obras (Secretarias Municipais de Infraestrutura, Saúde, Educação, Desenvolvimento econômico, etc) e a unidades meios de viabilização (Secretaria Executivas de Licitações e Contratos; Capitação de Recursos e projetos Especiais; Planejamento, Orçamento e Gestão, Projetos de Engenharia e Arquitetura, Controladoria Geral do Município, etc.). Bem como, ao tornar mais eficiente os processos de gestão a população municipal serão beneficiada.

4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação irá dar eficiência aos fluxos de processos e fomentar o monitoramento adequado e a avaliação por resultados das ações do Projeto Jaboatão 2030. Servindo de boa prática e com potencial de replicação do modus operandi para os demais projetos e para a cultura organizacional da prefeitura, beneficiando assim, o conjunto da gestão e seus mais de 6.5mil funcionários.

4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação tem como público diretamente beneficiado o conjunto da sociedade jaboatonense, ao ampliar e qualificar melhor os canais de interlocução social, com a melhoria do atendimento e eficiência dos técnicos municipais das unidades administrativas de controle interno, da ouvidoria municipal e dos sistemas administrativos e financeiros.

1. 7. **Anexos**

ANEXO 03 - Plano de Ação Área de Desenvolvimento Econômico

ANEXO 04 - Mapa de Intervenções Prioritárias do Polo Industrial

ANEXO 06 - Plano de Ação da Via Parque

ANEXO 07 - Mapa de Situação do Trecho da Via Parque

ANEXO 08 - Plano de Ação Educação

ANEXO 09- Plano de Ação saúde

ANEXO 10 - Plano de Ação Esporte e Lazer

ANEXO 12 - Lei Complementar Nº 50/2024, de 31/12/2024

ANEXO 13 - Matriz de Responsabilidade SDE

ANEXO 14 - Matriz de Responsabilidade SDU

ANEXO 17 - Matriz de Responsabilidade INFRAESTRUTURA

ANEXO 18 - Matriz de Responsabilidade EDUCACAO

ANEXO 20 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SDE

ANEXO 21 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SDU

ANEXO 24 - Atestado de Capacidade Tec e Ger INFRAESTRUTURA

ANEXO 25 - Atestado de Capacidade Tec e Ger EDUCACAO

ANEXO 26 - Separata da LOA SDE

ANEXO 27 - Separata da LOA SDU

ANEXO 01 - Mapa de Zoneamento Municipal

ANEXO 31 - Plano Diretor Municipal

ANEXO 32 - CARTA Banco de desenvolvimento FONPLATA

ANEXO 22 - Atestado de capacidade Tec e Ger SEPLAG

ANEXO 15 Matriz de Responsabilidade SEPLAG

ANEXO 02 - Demanda Reprimida de Matrículas

ANEXO 05 - Plano de Ação Área de Infraestrutura

ANEXO 11 - Decreto municipal n 22 de 2025

ANEXO 29 - Separata da LOA SAUDE

ANEXO 23 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SAUDE

ANEXO 33 - Matriz Geral de responsabilidades do projeto Jaboatão 2030.

ANEXO 16 - Matriz de Responsabilidade SAUDE

ANEXO 30 - Separata da LOA INFRAESTRUTURA

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Compatibilidade com as Áreas Estratégicas - Escala Local-municipal.

Em âmbito local/municipal, no que se refere as prioridades da Administração Pública, o projeto JABOATÃO 2030 apresenta uma estreita correlação com as diretrizes e objetivos estratégicos do novo **Mapa da Estratégia** do município, definido no **Plano Plurianual do Jaboatão dos Guararapes (PPA 2026–2029)** que, por sua vez, apresenta-se integralmente alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS da ONU números 6, 9, 10, 11, 13 e 14, contribuindo diretamente para a Agenda 2030 no Brasil.

Além disso, ainda na escala local/municipal, encontra-se alinhado com as diretrizes e objetivos do **Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental** do município, atualmente em revisão, bem como, aos demais instrumentos do planejamento orçamentário municipal LDO e LOA. Registra-se, ainda, que este projeto se enquadra nas prioridades elencadas no diagnóstico socioterritorial resultante do diagnóstico **Plano Estratégico Municipal Jaboatão 500anos**.

Foram definidas quatro diretrizes estratégicas, que traduzem os compromissos centrais da gestão municipal para o quadriênio, orientando a formulação de políticas, programas e projetos. As diretrizes estão desdobradas em treze objetivos estratégicos, com intuito de mensurar os resultados, assegurando a clareza e o foco na entrega de valor à sociedade e estes por sua vez abrigam compatibilidade aos componentes e produtos do Projeto Jaboatão 2030.

Compatibilidade com as Áreas Estratégicas - Escala Nacional.

Considerando o disposto nos termos dos artigos 13º, 14º e 15º da Resolução Cofiex nº01/2024 atualizada, destaca-se que o Projeto Jaboatão 2030 encontra-se diretamente correlacionado aos eixos do **Plano Plurianual Federal (PPA 2024–2027)**, especialmente no que tange as seguintes áreas estratégicas dos eixos:

- **Combate à desigualdade territorial e inclusão produtiva;** (Objetivos Específicos integralmente direcionados: 2, 3 e 4).
- **Meio ambiente, resiliência e adaptação climática;** (Objetivos Específicos integralmente direcionados: 2 e 3).
- **Desenvolvimento social e garantia de direitos e;** (Objetivos Específicos integralmente direcionados: 1 e 4).
- **Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental.** (Objetivos Específicos integralmente direcionados: 1, 2 e 3).

Além disso, considera-se ainda o alinhamento as áreas estratégicas previstas nos artigos 12º, 13º, 14º e 15º da Resolução Cofiex nº32/2025 e do Anexo I da Lei nº 14.802, de 2024, pois é possível constatar que este projeto se encontra diretamente relacionado a mais de uma das prioridades da Administração Pública Federal, a saber:

I - Combate à fome e redução das desigualdades; (Objetivos Específicos transversalmente direcionados: 1, 2 e 4).

II - Educação básica; (Objetivo Específico diretamente direcionado: 4).

III - Neoindustrialização, trabalho, emprego e renda; (Objetivo Específico diretamente vinculados: 1 e 2).

IV - Saúde: atenção primária e especializada; (Objetivo Específico diretamente vinculado: 4).

V - Novo Plano de Aceleração do Crescimento; (Objetivos Específicos diretamente vinculados: 2, 3 e 4).

VI - Combate ao desmatamento; e (Objetivo Específico transversalmente direcionado: 3).

VII - enfrentamento à emergência climática. (Objetivos Específicos diretamente vinculados: 2 e 3).

Apontamos abaixo quais as áreas estratégicas, referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº 1/2024, serão afetadas pelo projeto, correlacionando cada uma dessas áreas aos componentes e respectivos produtos e indicadores de referência do Projeto Jaboatão 2030. Importante ressaltar que este projeto atenderá mais de uma prioridade da Administração Pública Federal, nos termos do § 3º do art. 15 desta Resolução, conforme pode ser constatado, o que reforça ainda mais sua característica de projeto global de ações múltiplas.

Área estratégica nº 303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população;

Está vinculado ao **Componentes 01**: **Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.**

E será atendido através dos **produtos:**

1.1 Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Este produto está vinculado aos indicadores: 1 - Quantitativo de módulos multifinalitários disponibilizados a gestão municipal (MMD); 2 - Percentual de cobertura da atualização do cadastro imobiliário (CACI); 3 - Índice de integração de sistemas ativos e acessíveis online (IIC); 5 - Número de profissionais capacitados; 6 - Percentual de pavimentação concluída em áreas priorizadas.

1.2 Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

Este produto está vinculado aos indicadores: 3 - Índice de integração de sistemas ativos e acessíveis online (IIC);

4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.

Este produto está vinculado aos indicadores: 5 - Número de profissionais capacitados

4.2 Apoio ao gerenciamento do projeto.

Este produto está vinculado aos indicadores: 5 - Número de profissionais capacitados

4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.

Este produto está vinculado aos indicadores: 5 - Número de profissionais capacitados

Área estratégica nº 306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos;

Está vinculado ao **Componentes 01**: **Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.**

E será atendido através do **produto:**

1.1 Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Este produto está vinculado aos indicadores: 1 - Quantitativo de módulos multifinalitários disponibilizados a gestão municipal (MMD); 2 - Percentual de cobertura da atualização do cadastro imobiliário (CACI); 3 - Índice de integração de sistemas ativos e acessíveis online (IIC); 5 - Número de profissionais capacitados; 6 - Percentual de pavimentação concluída em áreas priorizadas.

Área estratégica nº 209 - Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade;

Está vinculado ao **Componentes 01**: **Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.**

E será atendido através do **produto:**

1.3 Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Este produto está vinculado aos indicadores: 4 - Quantidade de ações e oportunidades geradas pelo Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão; 5 - Número de profissionais capacitados.

Área estratégica nº 205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios;

Está vinculado ao **Componentes 02**: **Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.**

E será atendido através do **produto:**

2.1 Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Este produto está vinculado aos indicadores: 6 - Percentual de pavimentação concluída em áreas priorizadas; 7 - Variação na arrecadação tributária de empresas localizadas nas áreas beneficiadas; 9 - Indicador de Condição de Manutenção (ICM).

Áreas estratégicas nº 210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem;

Está vinculado ao **Componentes 02**: **Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.**

E será atendido através do **produto:**

2.2 Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (Rodoviário e Ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

Este produto está vinculado aos indicadores: 8 - Percentual de pavimentação e recapeamento executado; 9 - Indicador de Condição de Manutenção (ICM).

Áreas estratégicas nº 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

Está vinculado ao **Componentes 02**: **Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.**

E será atendido através do **produto:**

2.3 Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Este produto está vinculado aos indicadores: 6 - Percentual de pavimentação concluída em áreas priorizadas; 9 - Indicador de Condição de Manutenção (ICM).

Áreas estratégicas nº 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

Está vinculado ao **Componentes 02**: **Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.**

E será atendido através do **produto:**

2.3 Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Este produto está vinculado aos indicadores: 8 - Percentual de pavimentação e recapeamento executado; 9 - Indicador de Condição de Manutenção (ICM).

Áreas estratégicas nº 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas;

Está vinculado ao **Componentes 02**: **Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.**

E será atendido através do **produto:**

2.4 Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Este produto está vinculado aos indicadores: 10 - Indicador de Chamados da Ocorrências da Defesa Civil (ICO).

Áreas estratégicas nº 103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes

Está vinculado ao **Componentes 03:** Ampliação da infraestrutura social com espacial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social, esportes e lazer, em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

E será atendido através do **produto:**

3.1 Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Este produto está vinculado aos indicadores: 11 - Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE) Anos iniciais do ensino fundamental; 12 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) Anos iniciais do ensino fundamental.

Áreas estratégicas nº 102 -Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Está vinculado ao **Componentes 03:** Ampliação da infraestrutura social com espacial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social, esportes e lazer, em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

E será atendido através dos **produtos:**

3.2 Ampliar e qualificar a Atenção Primária à Saúde em Jaboatão dos Guararapes por meio da construção de novas unidades, promovendo acesso

Este produto está vinculado aos indicadores: 13 - Cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde no território municipal;

Áreas estratégicas nº 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

Está vinculado ao **Componentes 03:** Ampliação da infraestrutura social com espacial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social, esportes e lazer, em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

E será atendido através do **produto:**

3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Este produto está vinculado aos indicadores: 14 - Número de intervenções nos equipamentos de lazer e esportes.

Estas áreas estratégicas da aludida resolução em sua última atualização se desdobram em subáreas, as quais foram incorporadas na concepção do Projeto Jaboatão 2030, conforme ilustrado no **quadro 03** a seguir.

QUADRO 3: **Compatibilidade entre os Componentes e Produtos do Projeto Jaboatão 2030 e as Áreas Estratégicas do Governo Federal (Referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº1/2024).**

ITEM	COMPONENTE	PRODUTO	ÁREAS ESTRATÉGICAS (Referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº1/2024)
1	**Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.**	1.1. Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.	303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população;
			306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos

ITEM	COMPONENTE	PRODUTO	ÁREAS ESTRATÉGICAS (Referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº1/2024)
1.2. Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública. 4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras. 4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa. 4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.	303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população		
1.3. Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.	209 - Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade;		
2	**Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática**	2.1 Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.	205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

ITEM	COMPONENTE	PRODUTO	ÁREAS ESTRATÉGICAS (Referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº1/2024)
2.2 Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (Rodoviário e Ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.	210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem;		
2.3 Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.	111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;		
	201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente		
2.4 Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.	202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas;		

ITEM	COMPONENTE	PRODUTO	ÁREAS ESTRATÉGICAS (Referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº1/2024)
3	**Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis.**	3.1. Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental.	103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes
		3.2. Ampliar e qualificar a Atenção Primária à Saúde em Jaboatão dos Guararapes por meio da construção de novas unidades, promovendo acesso equitativo, redistribuição territorial e melhoria da qualidade do cuidado em territórios vulneráveis.	102 -Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
		3.3. Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.	113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

2. 6. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Antecedentes na execução direta de projetos globais de ações múltiplas pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes

O município do Jaboatão dos Guararapes possui histórico e experiência de execução direta de projetos globais de ações múltiplas, decorrentes de operações de crédito bem-sucedidas, a exemplo do Fundo Nacional de Infraestrutura e Saneamento - FINISA/Caixa Econômica Federal/Brasil – 2023/2025; do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES/Programa de Modernização Administrativa – PMAT 2015/2016.

Em grande medida, o modelo gerencial proposto para execução do Projeto JABOATÃO 2030 tem sido a práxis da administração municipal, enquanto cultura organizacional internalizada pelo corpo funcional, sobretudo em relação aos grandes projetos executados nos últimos anos, a exemplo daqueles captados junto ao PAC Seleções do Governo Federal, bem como, decorrente de operação de crédito, conforme citado anteriormente.

Nesse sentido ainda, cabe ressaltar que, diferentemente de um layout tradicionalmente departamentalizado e segregado de outras prefeituras municipais, o Complexo Administrativo, sede da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes adota um modelo de layout aberto e integrado, a partir de estações de trabalho, onde as equipes das dez secretarias municipais interagem de forma continua e permanente, reduzindo o tempo de resolução dos processos integrados, além de já utilizar, há mais de dois, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), enquanto solução oficial do Governo Municipal para produção e gestão de documentos e processos administrativos eletrônicos.

A própria estrutura administrativa atual, aprovada na Lei Complementar Nº 50/2024, de 31/12/2024 (**Anexo12**) contribui para uma gestão compartilhada de tomada de decisões e resoluções de problemas entre as dez secretarias municipais, especialmente em relação as decisões estratégicas de cunho operacional, uma vez que, os próprios secretários e secretárias municipais dividem um mesmo espaço físico, ao lado do gabinete do Prefeito, em layout aberto, diariamente.

Proposta de Governança do Projeto

O Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes – Jaboatão 2030 adotará um arranjo institucional híbrido e orientado por projeto, capaz de garantir a execução eficiente, efetiva e transparente das ações propostas.


A governança do Projeto será assegurada pela criação de uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP-Jaboatão 2030), vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, responsável pela coordenação central e pela interlocução direta com órgãos de controle, agentes financeiros e instâncias federais e estaduais.

A UGP terá como atribuições principais:

- Garantir o alinhamento da implementação das ações previstas ao PPA 2026–2029, LDO e LOA, bem como, às diretrizes nacionais e internacionais de financiamento;
- Promover a articulação institucional entre as secretarias executoras, órgãos de apoio, conselhos municipais e a sociedade civil, entre outros;
- Promover a gestão integrada da execução físico-financeira, com base em indicadores de desempenho, metas pactuadas e metodologias de monitoramento em tempo real;
- Promover a eficiência administrativa por meio da padronização de processos, com foco em tempestividade e economicidade, com o apoio da Secretaria Municipal de Administração, a quem cabe essa competência de padronização, e demais órgãos coexecutores, no que couber;
- Realizar o controle e auditoria permanentes, assegurando a conformidade legal e a transparência na aplicação dos recursos, com o apoio da Controladoria Geral e da Procuradoria Geral do Município, bem como, com a auditoria independente a ser contratada para essa finalidade

A figura a seguir exemplifica a inserção da UGP no fluxograma matricial de processos da Prefeitura Municipal (Anexo 34).

Organograma da Unidade de Gestão do ProjetoUGP Proposta.

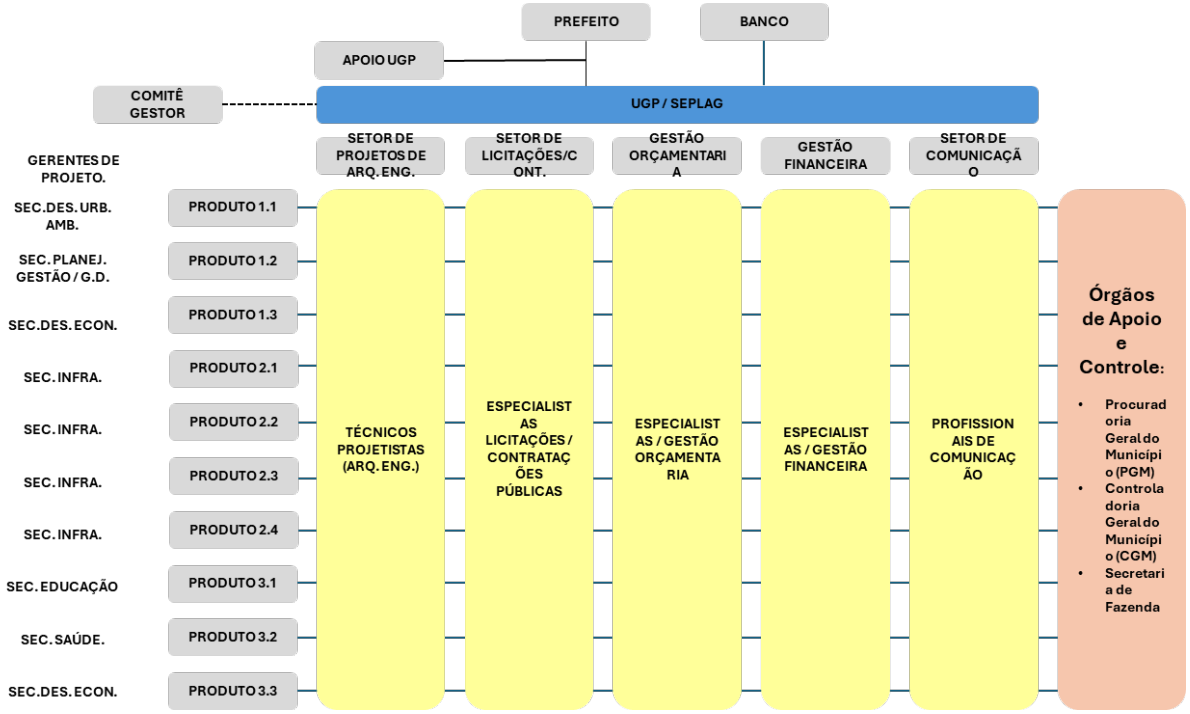

A governança contará ainda com:

- Colegiado Gestor: órgão deliberativo que assegurará decisões colegiadas e integradas, com participação das Secretarias Municipais de Fazenda e Administração, Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Município, que juntos com a Secretaria de Planejamento e Gestão conformam o atual Comitê de Governança do município (criado pelo decreto municipal N°22/2025 - **Anexo 13**).

- Grupo Técnico Intersetorial: composto por servidores qualificados das áreas técnicas e por instituições parceiras, no que couber, a exemplo de universidades, concessionárias de serviços, conselhos, de modo a ampliando a base de conhecimento e especialização.

A gestão do projeto será descentralizada, com responsabilidade compartilhada entre as secretarias municipais, que assumem papéis definidos, otimizando competências institucionais:

a) Órgão Coordenador Principal:

- Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão ? coordenação estratégica, articulação institucional, monitoramento de resultados e integração com Cofiex/STN, agente financeiro e órgãos estaduais.

b) Órgãos Executores Setoriais:

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental - ordenamento territorial, gestão ambiental, regulação do uso do solo, responsável pela implantação do cadastro multifinalitário;
- Secretaria de Municipal de Planejamento e Gestão - governança da área de tecnologia e inovação do governo municipal; realizar as ações de implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública, por meio da Secretaria Executiva de Governo Digital;.
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes - fortalecimento produtivo, inovação, economia criativa, turismo sustentável e esportes, responsável pela implantação do Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão e pela requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis;
- Secretaria Municipal de Infraestrutura - execução de obras de mobilidade, drenagem e requalificação urbana, responsável pelas obras viárias e das encostas previstas no Projeto;
- Secretaria Municipal de Educação - implantação, modernização e manutenção de escolas e equipamentos educacionais;
- Secretaria Municipal de Saúde - ampliação da atenção primária, construção de unidades básicas e fortalecimento da rede preventiva.

c) Órgãos de Apoio e Controle:

- Procuradoria Geral do Município (PGM) ? respaldo jurídico e análise de conformidade legal;
- Controladoria Geral do Município (CGM) ? auditoria, transparência e monitoramento da integridade;
- Secretaria de Fazenda ? gestão financeira, desembolsos e prestações de contas.

Esse arranjo visa promover a efetividade (cada secretaria responde por sua especialidade), eficiência (eliminação de sobreposições e padronização de processos) e controle rigoroso (responsabilidade definida e monitorada).

3. 1. 17. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Órgãos parceiros:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. 1. 18. **Estrutura Operacional:**

O Município do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG, dispõe de capacidade institucional consolidada para a implementação do Projeto JABOATÃO 2030, apoiada por um histórico de execução de políticas públicas integradas por parte de seu corpo técnico e operacional nas áreas de Planejamento, Orçamento e Governo Estratégico; Governo Digital; Projetos Especiais e Captação de Recursos; e Projetos de Arquitetura e Urbanismo.

A estrutura operacional será centralizada na Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), vinculada à SEPLAG, que contará com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais da própria SEPLAG, a exemplo da equipe de monitoramento e acompanhamento de políticas públicas, além de técnicos das demais secretarias municipais responsáveis pela execução nas suas respectivas áreas de competência, que serão distribuídos entre os núcleos de Monitoramento e Controle Operacional e Núcleo Técnico, organizados em coordenações com atribuições específicas e competência técnica comprovada em ações similares, inclusive com experiência prévia em outros projetos financiados por organismos nacionais.

Cada resultado/produto previsto no Projeto terá um gerente de projeto responsável, indicado pela secretaria municipal responsável direta pela ação, que se articulará com as diversas áreas da prefeitura (elaboração de projetos, licitações, contratos, execução de obras etc.) com vistas a viabilizar a execução daquele produto sob a sua responsabilidade.

De um modo geral, a equipe do Núcleo Técnico da UGP contará com perfis técnicos especializados, como engenheiros(as), arquitetos(as), assistentes sociais, analistas de planejamento, técnicos ambientais, economistas, advogados(as), administradores(as), geógrafos e especialistas em aquisições e finanças públicas. Os profissionais terão atribuições claras, formalizadas em instrumento normativo próprio (Portaria de criação da UGP), conforme modelo a ser pactuado entre o agente financeiro e o município.

Além disso, o município prevê a contratação de especialistas e ou consultorias técnicas especializadas, com vistas a apoiar no que couber, a supervisão de obras, elaboração de projetos, gestão do programa, mapeamento socioeconômico, entre outras ações necessárias a implementação das ações, de modo a agregar, quando necessário, capacidade adicional à equipe permanente formada pelos técnicos municipais.

A estrutura operacional contará com:

-Espaço físico exclusivo para a UGP, integrado à estrutura da SEPLAG, no âmbito do Complexo Administrativo da Prefeitura;

-Recursos de TI e sistemas de monitoramento próprios, a exemplo de Dashboard público online - plataforma web e mobile apresentando indicadores em tempo real, permitindo à população acompanhar execução, gastos e resultados, além de Sistema de interoperabilidade: integração de dados do projeto aos sistemas já em implantação (cadastro multifinalitário, interoperabilidade municipal e núcleos de inovação);

-Orçamento para capacitação técnica continuada, fortalecimento institucional e produção de materiais técnicos;

-Veículos e logística para visitas técnicas e mobilização em campo;

-Suporte administrativo-financeiro integrado com o sistema de gestão da Prefeitura.

As coordenações técnicas da UGP serão integradas a um sistema digital de controle e acompanhamento do Plano Operativo Anual (POA) e do Plano de Execução do Projeto (PEP), com relatórios regulares de desempenho físico e financeiro, sob a responsabilidade da Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Governo Estratégico – SEPOG/SEPLAG.

A concepção da estrutura foi pensada de modo a garantir o acompanhamento em tempo real dos avanços do programa e permitir ações corretivas em caso de desvios, a exemplo do é feito com as ações estratégicas da Prefeitura, nos ciclos de monitoramento a cargo da SEPOG/SEPLAG.

A execução financeira do Projeto está preliminarmente prevista para ser centralizada na SEPLAG, por meio da UGP. Os demais órgãos parceiros na consecução das ações do Projeto contribuirão com apoio técnico e operacional, com base em instrumentos formais de cooperação intersetorial. Tal modelo operacional será mais bem detalhado e aperfeiçoado, considerando às diretrizes nacionais e internacionais de financiamento, na etapa posterior de preparação, após apreciação deste pleito por parte da COFIEX.

Essa modelagem assegura a execução eficiente e integrada do programa, combinando capacidade técnica interna, apoio externo qualificado e articulação interinstitucional, garantindo o atingimento dos objetivos e metas do Projeto JABOATÃO 2030 dentro do prazo e escopo pactuados.

Além do acima explicitado, cabe destacar a qualificação atual dos profissionais do corpo técnico da prefeitura, tanto do corpo efetivo, inclusive no que se refere aos mais de 600 egressos do concurso público realizado recentemente pela Prefeitura em diferentes áreas de atuação, quando dos cargos em comissão, com sólida experiência em políticas públicas, planejamento e gestão, diretamente envolvidos com o Projeto e em áreas estratégicas da Prefeitura.

3. 1. 19. **Matriz de Responsabilidade:**

matriz de responsabilidade JABOATAO 2030.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade das ações a serem implementadas pelo Projeto Jaboatão 2030 será assegurada por um conjunto articulado de estratégias voltadas à manutenção das infraestruturas, à operacionalização dos serviços públicos ofertados e à construção de capacidades comunitárias e institucionais de manutenção e zeladoria, a exemplo das ações de requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

COMPONENTE 1 – MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL.

A manutenção das ações implementadas será garantida por meio das ações como:

- Melhor desempenho do IPTU com a implantação do cadastro territorial multifinalitário. Sobre essa ação cabe ressaltar que segundo um estudo de 2016 , aproximadamente 1.500 dos 5.570 municípios brasileiros não arrecadavam o IPTU de maneira eficiente, o que corresponde a cerca de 27% dos municípios. Além disso, a implantação do cadastro territorial multifinalitário permitirá a atualização da base de cálculo do IPTU por parte Poder Executivo Municipal, sem necessidade de aprovação legislativa da planta genérica de valores. No município do porte do Jaboatão dos Guararapes, a implementação de um cadastro multifinalitário e a adesão ao SINTER (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais) se constituem em passos imprescindíveis em direção a uma boa gestão do território urbano e rural. Esses instrumentos melhoram o planejamento e a arrecadação de tributos, além de facilitar a regularização fundiária e a expansão de infraestrutura e serviços públicos. Além disso, eles promovem a transparência, a segurança jurídica e a eficiência administrativa ao centralizar informações territoriais, beneficiando a gestão tributária e o desenvolvimento sustentável, resultando em uma administração pública mais integrada. A melhoria do desempenho do IPTU impactará diretamente a receita municipal, possibilitando o aumento do investimento em ações, sobretudo, de zeladoria urbana;

- Articulação junto às instituições já parceiras da Prefeitura em ações similares como o Sistema S e, ainda, junto a outras instituições como o Porto Digital, no sentido de firmar instrumentos de cooperação técnica e financeira no sentido de promover uma operação compartilhada do Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão, além de parcerias com as empresas instaladas no polo logístico do município.

COMPONENTE 2 – EXPANDIR A INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL

Estão previstas a manutenção dos seguintes itens:

- As ações de melhoria da infraestrutura urbana sustentável, a exemplo do recapeamento asfáltico para melhorar o desempenho dos ônibus e reduzir tempo de viagem dos Corredores de Transporte Público; do recapeamento asfáltico para melhorar o tráfego de veículos dentro dos bairros/comunidades, conectando vias arteriais e locais em Vias Coletoras; da pavimentação de pequenas vias para inclusão urbana e redução do isolamento de comunidades vulneráveis de Vias em Áreas de Interesse Social, contarão com a atuação contínua das ações de zeladoria do município, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. No caso específico das ações de melhoria da infraestrutura do polo logístico e industrial, se prevê a manutenção nos primeiro cinco anos dessa infraestrutura, em parte, pela utilização de recursos de compensação ambiental decorrentes da implantação dos novos empreendimentos;

- No caso das ações referentes aos setores de risco, estão previstos a elaboração de Projetos Urbanísticos para revisão e novas intervenções nos territórios; e manutenção das melhorias urbanas realizadas (como escadarias, iluminação, drenagem, entre outras); incluindo a manutenção de ações de resiliência climática e redução de riscos com a continuação dos núcleos de voluntários e novas capacitações, monitoramento das áreas de risco e gestão de grupo para acompanhamento do crescimento ordenado e preservação das áreas verdes;

COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA SOCIAL EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.

Estão previstas a manutenção dos seguintes itens:

- Manutenção da infraestrutura social de Educação e Saúde que foram construídos por meio do incremento do repasse de recursos pelos respectivos fundos constitucionais, a partir da operação dos referidos equipamentos;

- Manutenção compartilhada, no que couber, em conjunto com as associações comunitárias locais das comunidades beneficiadas com os espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis requalificados, por meio de processos de educação cidadã e parcerias com o empresariado local.

As ações acima citadas acima serão operacionalizadas com apoio técnico das secretarias e órgãos específicos de cada área de ação, além de incorporarem em seu planejamento as manutenções necessárias após a sua construção e operação. Os órgãos responsáveis por cada uma dessas ações são:

- Secretaria Municipal de Infraestrutura: absorverá ações de zeladoria urbana, incluindo limpeza urbana; manutenção urbana; conservação ambiental urbana; e acessibilidade, por meio da Secretaria Executiva de Conservação Urbana e Patrimonial;

- EMLUME - Empresa Municipal de Energia e Iluminação Pública: manutenção da iluminação pública;

- Secretaria de Governo: policiamento municipal, combate ao vandalismo, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Cidadã;

-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental: implantação e manutenção do cadastro multifinalitário;

-Secretaria de Infraestrutura: monitoramento contínuo das áreas de risco, de intervenções de contenção de encosta resiliência urbana e núcleos de voluntários, por meio da Secretaria Executiva de Defesa Civil;

- Secretaria Municipal de Saúde: operação e manutenção dos equipamentos de saúde implantados.

- Secretaria Municipal de Educação: gestão de escolas e espaços educativos implantados;

- Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania: apoio na implementação das ações nas áreas de periferias e comunidades vulneráveis, e quando a ação exigir ações de desapropriação;

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes: operação e manutenção do Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão e dos espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis requalificados.

Todos esses órgãos terão previsão de recursos operacionais em seus respectivos orçamentos alinhados ao Plano Plurianual (PPA) Municipal 2026–2029, garantindo a cobertura dos custos.

COMPONENTE 4 – GESTÃO DO PROJETO.

Este componente é de fundamental importância com vistas a promover sustentabilidade dos arranjos institucionais e operacionais após a implementação do projeto.

A gestão das ações dos demais componentes será monitorada por um sistema digital integrado, com base em dados georreferenciados, relatórios periódicos, avaliações participativas e capacitação do corpo técnico, permitindo ajustes e correções ao longo do tempo de execução do projeto.

A manutenção e operacionalização desse sistema vai estar sob responsabilidade da UGP, com o apoio da Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Governo Estratégico – SEPOG/SEPLAG.

Por fim, de modo transversal a todas as iniciativas acima descritas, com vistas a assegurar a execução plena das entregas e sua sustentabilidade no tempo, se prever ainda a implementação das seguintes ações:

Matriz de Responsabilidades: definição detalhada das atribuições por componente, subcomponente e secretaria, com metas físicas e financeiras claras. Essa matriz será integrada ao sistema municipal de monitoramento estratégico (dashboard digital);

Contratos de desempenho: cada secretaria executora firmará termo de compromisso com indicadores de entrega e manutenção, vinculando desembolsos à performance;

Gestão integrada por projetos: adoção de metodologia Project Management Office (PMO) municipal, baseada em boas práticas do PMI, com acompanhamento de cronograma físico-financeiro, análise de riscos e relatórios de resultados;

Plano de manutenção preventiva e corretiva: todas as obras e equipamentos entregues terão plano de O&M (Operação e Manutenção) elaborado já na fase de projeto, garantindo sustentabilidade técnica e financeira;

Capacitação continuada: equipes técnicas municipais receberão treinamento em gestão de contratos, operação de sistemas digitais, soluções baseadas na natureza (SBN) e manutenção de infraestrutura urbana;

Parcerias comunitárias: inclusão de associações comunitárias e conselhos locais na fiscalização social da manutenção dos equipamentos, reforçando o controle social e o sentimento de corresponsabilidade.

Por fim, cabe ressaltar que esta proposta de gestão visa incorporar elementos inovadores que aumentam a factibilidade:

Dashboard público online: plataforma web e mobile apresentando indicadores em tempo real, permitindo à população acompanhar execução, gastos e resultados.

Sistema de interoperabilidade: integração de dados do projeto aos sistemas já em implantação (cadastro multifinalitário, interoperabilidade municipal e núcleos de inovação).

Modelo híbrido de execução: combinação de execução direta (secretarias) com parcerias público-privadas (PPPs) e convênios com universidades locais (UFPE, UFRPE), a exemplo do Plano Municipal de Redução de Risco, ampliando assim capacidade técnica e tecnológica, bem como, a contratação de consultorias técnicas especializadas, no que couber.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Correlação do Projeto JABOATÃO 2030 com o novo Mapa da Estratégia do Município (PPA 2026-2029)

No âmbito da escala local/municipal no que se refere as prioridades da Administração Pública, este projeto JABOATÃO 2030 apresenta uma estreita correlação com as diretrizes e objetivos estratégicos do novo **Mapa da Estratégia** do município, definido no âmbito do novo **Plano Plurianual do Jaboatão dos Guararapes (PPA 2026–2029)** que, por sua vez, apresenta-se integralmente alinhado aos **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS** da ONU, contribuindo diretamente para a **Agenda 2030** no Brasil.

Além disso, ainda na escala local/municipal, encontra-se alinhado com as diretrizes e objetivos do **Plano Diretor** do município, atualmente em revisão, bem como, aos demais instrumentos do planejamento orçamentário municipal LDO e LOA. Registra-se, ainda, que este projeto enquadra-se nas prioridades elencadas no diagnóstico socioterritorial resultante do **Plano Estratégico Jaboatão 500anos**.

NOVO MAPA DA ESTRATÉGIA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES (PPA 2026-2029)

Foram definidas quatro diretrizes estratégicas, que traduzem os compromissos centrais da gestão para o quadriênio, orientando a formulação de políticas, programas e projetos. As diretrizes estão desdobradas em treze objetivos estratégicos, com intuito de mensurar os resultados, assegurando a clareza e o foco na entrega de valor à sociedade. Estas diretrizes também estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, como evidenciado a

seguir no Quadro 4:

QUADRO 04: **Correlação Entre as Diretrizes da Estratégia Municipal e os Componentes do Projeto Jaboatão 2030.**

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO DIRETRIZ ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	COMPONENTE RELACIONADO
1: GESTÃO TRANSPARENTE, DIGITAL, COM FOCO EM RESULTADOS E CONECTADA COM AS PESSOAS	Fortalecer a capacidade institucional da administração municipal, promovendo práticas inovadoras de gestão pública orientadas pela transparência, eficiência e participação social. Essa diretriz abrange o aprimoramento da governança, a modernização dos processos administrativos, a transformação digital dos serviços e a integração entre secretarias. Busca ainda consolidar uma gestão pública mais aberta, responsiva e centrada no cidadão, garantindo a utilização eficiente dos recursos públicos, a melhoria contínua da qualidade dos serviços ofertados e o fortalecimento da confiança da população nas instituições municipais.	EQUILÍBRIO FISCAL - Fortalecer a efetividade dos gastos públicos e aumentar a receita, com equilíbrio fiscal. EFICIÊNCIA DA GESTÃO E TRANSPARÊNCIA – Promover transformação digital, aprimorar processos para melhoria da eficiência da gestão e fomentar a transparência e a participação cidadã. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E CULTURA ORGANIZACIONAL – Desenvolver os servidores e fortalecer a cultura organizacional colaborativa com foco na excelência do serviço ao cidadão.	COMPONENTE 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO DIRETRIZ ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	COMPONENTE RELACIONADO
2: INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E INOVADOR	Promover o crescimento econômico aliado à sustentabilidade ambiental, à inovação e ao fortalecimento da infraestrutura urbana. Essa diretriz abrange o planejamento e a ordenação do território, a melhoria da mobilidade urbana, a ampliação do acesso à habitação e ao saneamento, bem como a implementação de soluções tecnológicas e práticas inovadoras que qualifiquem os serviços públicos e estimulem novos investimentos. Seu objetivo é consolidar um ambiente favorável ao empreendedorismo, à geração de emprego e renda, e ao desenvolvimento equilibrado do município, assegurando qualidade de vida à população e maior resiliência diante dos desafios urbanos e ambientais.	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - Ampliar e qualificar a infraestrutura e a mobilidade, promovendo o desenvolvimento urbano e ambiental. NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS – Fortalecer os arranjos produtivos, o empreendedorismo e a geração de emprego e renda, com inovação, sustentabilidade e inclusão. GESTÃO FÍSICO-TERRITORIAL – Melhorar a gestão estratégica do território e a adaptação às mudanças climáticas, promovendo a resiliência e redução de riscos de desastres. HABITAÇÃO E SANEAMENTO - Ampliar a oferta de habitação e saneamento básico, promovendo habitabilidade e qualidade de vida.	COMPONENTE 1: 1.3 Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão. Componente 2 - Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática. 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município. 2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades. 2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas. 2.4 Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos
3: DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM EQUIDADE	Essa diretriz visa a implementação de políticas nas áreas da educação municipal e assistência social, com foco na promoção da inclusão, na redução das desigualdades e na garantia de direitos. Busca assegurar uma educação de qualidade, valorizando a aprendizagem e permanência escolar, ao mesmo tempo em que fortalece a rede de proteção social para as famílias em vulnerabilidade. Também contempla a ampliação de oportunidades e o acesso equitativo a serviços para pessoas com deficiência, promovendo sua participação social.	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – Elevar a qualidade da educação básica de forma universal, inclusiva e inovadora, com atenção à primeira infância. REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES – Fortalecer e ampliar as políticas públicas sociais, reduzindo os índices de vulnerabilidade, a pobreza e as desigualdades. INCLUSÃO – Ampliar a inclusão das pessoas com deficiência, garantindo atendimento humanizado e oportunidades.	Componente 3 - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis. 3.1 Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO DIRETRIZ ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	COMPONENTE RELACIONADO
4: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Essa diretriz tem como foco a promoção do bem-estar da população por meio da ampliação e qualificação dos serviços públicos essenciais. Abrange as áreas da saúde, assegurando acesso universal, atendimento humanizado e o fortalecimento da rede de atenção básica e especializada; a segurança, com iniciativas de prevenção, proteção social e promoção da convivência comunitária; e a cultura, como instrumento de inclusão, cidadania e valorização da identidade local. Seu objetivo é garantir à população serviços eficazes e acessíveis, promovendo o acolhimento, a qualidade de vida e o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões.	SAÚDE PARA TODOS – Qualificar os serviços de saúde, com atenção especial a saúde da família, através do atendimento humanizado, da oferta de medicamentos e da ampliação de vagas em consultas especializadas e exames. CULTURA, ESPORTE E LAZER – Promover atividades descentralizadas de cultura, esporte e lazer, para todas as idades, valorizando as vocações do território. SEGURANÇA – Fortalecer a segurança cidadã por meio de parcerias com a sociedade civil e entidades públicas e privadas para a prevenção da violência e promoção da convivência pacífica.	Componente 3 - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis. 3.2. Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis. 3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

3. 4. **Anexos**

ANEXO 20 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SDE

ANEXO 21 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SDU

ANEXO 23 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SAUDE

ANEXO 24 - Atestado de Capacidade Tec e Ger INFRAESTRUTURA

ANEXO 25 - Atestado de Capacidade Tec e Ger EDUCACAO

ANEXO 13 - Matriz de Responsabilidade SDE

ANEXO 14 - Matriz de Responsabilidade SDU

ANEXO 16 - Matriz de Responsabilidade SAUDE

ANEXO 17 - Matriz de Responsabilidade INFRAESTRUTURA

ANEXO 18 - Matriz de Responsabilidade EDUCACAO

Anexo 22 Atestado de capacidade Tec e Ger SEPLAG

ANEXO 34 - Organograma da UGP - Jaboatão 2030.

ANEXO 15 matriz de responsabilidade seplag

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Dificuldade na obtenção de imageamentos com adequada resolução em função de limitações climáticas para sobrevoo ou de visibilidade de satélites.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A obtenção dos imageamentos é dependente de fatores climáticos, que favorecem ou não a incidência de nuvens em caso de imagens de satélite e sobrevoos, para minimizar tais fatores, a convenção cartográfica estabelece o uso de janelas de sobrevoo nos períodos mais secos, bem como uma sobreposição maior entre os mosaicos aerofotogramétricos.

Esse risco tem como efeito negativo potencial a qualidade das restituições e a ausência de atributos de dados.

Prevenção e Mitigação:
Ação de Mitigação: ajustar o cronograma de execução para períodos de menor intensidade de nuvens e de períodos de maior precipitação.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.**

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Dificuldades de acesso as informações de atualização cadastral em campo.
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A exemplo de eventos como o censo geográfico do IBGE, identificou-se resistências da população em fornecer acesso as unidades edificadas, bem como a informações cadastrais do domicípio. Este processo pode ser alusivo à coleta de informações domiciliar para implantação e higienização do banco de dados para o cadastro multifinalitário. Este risco pode gerar o risco potencial de redução da amostragem.

Prevenção e Mitigação:
Ação de Mitigação: promover campanhas de educação e sensibilização da população municipal.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.**

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Dificuldades/morosidade no acesso a dados cartoriais e informações territoriais.
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Em função da demanda natural dos serviços cartoriais e da potencial dificuldade de levantamento e repasse das informações com tratamentos adequados.

Este contexto foi identificado em processos que demandaram alta quantidade de serviços, a exemplo de processos de regularização fundiária de comunidades em ZEIS. O histórico vislumbrado é tratado aqui como risco potencial e podendo gerar efeitos negativos de morosidade e afetar o cronograma de execução de alguns produtos.

Prevenção e Mitigação:
Ação de Mitigação: Estabelecer acordo de cooperação técnica ou termo de parceria entre a prefeitura municipal e os serviços cartoriais municipais e demais órgão de informação, como a Superintendência de Patrimônio da União – SPU, A Agência de Desenvolvimento e Pesquisas de Pernambuco – Condepe/Fidem e o Instituto Tecnológico de Pernambuco – ITEP, etc.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários**.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Insuficiência de recursos para manutenção após implementação.
Impacto: Alto

Probabilidade: Baixa

Descrição:
Observando-se estudos de caso de ações similares, de projetos de aumento da rede de equipamentos e infraestruturas que requerem a elevação no custo de manutenção e operação se estabeleceu uma analogia ao projeto em potencial.

Para tanto, foi ajustado o escopo do projeto Jaboatão 2030 com ações que geram receita em potencial, que promovem maior eficiência da máquina pública e consequente redução de custos. Acrescido a isso se observou a necessidade de planejamento adequado da curva de investimento do custeio do município pare minimizar os efeitos negativos das novas estruturas sobre a capacidade de investimentos futuros.

Prevenção e Mitigação:
Ações de Mitigação: Previsão de custos de O&M no orçamento municipal e parcerias federais; ações de modernização administrativa e fiscal através do cadastro multifinalitário e fomento a arranjos produtivos locais de alto valor agregado vinculados ao polo industrial e de logística municipal ora por infraestruturas de suporte ora pela desburocratização municipal.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários. 1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes. 4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras. 4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa. 4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria**.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Resistência institucional e cultural à adoção de novas tecnologias
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Ao analisar casos de gestão corporativa de sucesso, identificados como boas práticas, observou-se que os entraves a modernização administrativa e a evolução da eficiência pública estava atrelada ao perfil dos recursos humanos.

Ao analisar o capital humano municipal registra-se baixa resistência a inovação e a adoção de novas técnicas e tecnologias, fato já observado em exemplos de digitalização do fluxo de processos administrativos com a adoção do Sistema SEI e de outros sistemas orçamentários e financeiros. Desta forma, foi possível identificar ações negativas dos setores de maior resistência e formas de minimizar as resistências potenciais.

Prevenção e Mitigação:
Ações de Mitigação: Programa de capacitação e acompanhamento contínuo.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários; 1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública. 1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes. 4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras. 4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.**

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Atrasos em cronogramas de integração tecnológica.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Algumas instituições públicas perdem a capacidade de manutenção e fixação de recursos humanos especializados nas áreas de tecnologia da informação que são associados a fatores de infraestruturas e qualidade e instrumentais adequados dos ambientes de trabalho, bem como a demandas crescentes no setor privado.

Esse contexto frequentemente pode afetar a execução adequada dos cronogramas de implantação.

Prevenção e Mitigação:
Ações de Mitigação: Contratação de equipe técnica especializada e implantação de processos de gestão ágil, valorização da mão-de-obra municipal e valorização salarial de recursos humanos estratégicos.

Este risco está associado aos produtos: **1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.**

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Insuficiência de recursos para manutenção após implementação.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Observando-se estudos de caso de ações similares, de projetos de aumento da rede de equipamentos e infraestruturas que requerem a elevação no custo de manutenção e operação se estabeleceu uma analogia ao projeto em potencial. Para tanto, foi ajustado o escopo do projeto Jaboatão 2030 com ações que geram receita em potencial, que promovem maior eficiência da máquina pública e consequente redução de custos.

Acrescido a isso, observou-se a necessidade de planejamento adequado da curva de investimento do custeio do município pare minimizar os efeitos negativos das novas estruturas sobre a capacidade de investimentos futuros.

Prevenção e Mitigação:
Ações de Mitigação: Previsão de custos de O&M no orçamento municipal e parcerias federais; ações de modernização administrative e fiscal através do cadastro multifinalitário e fomento a arranjos produtivos locais de alto valor agregado vinculados ao pólo industrial e de logística municipal ora por infraestruturas de suporte ora pela desburocratização municipal.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários; 1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública. 1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes. 4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras. 4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.**

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Ameaças de segurança cibernética.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Este risco está associado a ausência ou fragilidades de regulamentação de instrumentos jurídicos próprios e a adoção das leis federais como referência para defesa e segurança cibernética. No Jaboatão dos Guararapes, após alguns episódios de ataques ora frustrados ora exitosos.

Foram estabelecidos protocolos e fluxos de processos, que foram associados ao reforço de infraestruturas e de recursos humanos, acrescidos de treinamentos continuados para minimizar os riscos. Contudo o efeito potencial negativo de ataques cibernéticos permanece.

Prevenção e Mitigação:
Ações de Mitigação: Regulação jurídica municipal compatibilizada as normas nacional para estabelecimento de protocolos e rotinas avançados de segurança, monitoramento contínuo e capacitação dos recursos humanos, investimentos permanentes em infraestruturas de TI e sistemas de segurança e defesa cibernética.

Este risco está associado aos produtos: **1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.**

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Necessidade de remoções de ocupações em áreas públicas.
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Em algumas situações previstas no projeto Jaboatão 2030, observa-se previamente interfaces de necessidade de remoções de ocupações em áreas públicas. Este fato gerará potenciais processos administrativos e/ou judiciais. Que estão sendo antevistos para dar celeridade a potenciais intervenções. A administração deve levar em consideração os direitos constitucionais, contudo o princípio do direito coletivo deverá prevalecer sobre o direito individual, garantindo a função social da propriedade pública urbana.

É sabido que a ocupação de um bem público é considerada mera detenção, não posse, o que impede a aquisição da propriedade por usucapião, não possuindo os ocupantes direito à propriedade ou indenização pelas construções.

Tendo o Estado o dever de garantir o desembaraço das áreas objeto de interesse público.

Prevenção e Mitigação:
Ação de mitigação: O traçado preliminar do projeto já previu a adoção de alternativa com menor percentual de remoções e já iniciou ações para evitar novas ocupações. Bem como, está em processo ações de notificação de ocupantes irregulares.

Este risco está associado aos produtos: **2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.**

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Necessidade de remoções de ocupações em função do detalhamento do plano urbanístico associado a intervenção em áreas de risco.
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Nos casos de comunidades e habitacionais em terras de domínio da União será solicitado junto ao Serviço de Patrimônio da União (SPU) a doação ou cessão da área para o Município, com a finalidade de transferir a propriedade ou o uso do imóvel às famílias por meio dos instrumentos da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S), no caso de doação da área pela União, ou da Cessão do Direito Real de Uso (CDRU), no caso de cessão da área pela União. O levantamento das áreas pertencentes à União encontra-se em realização. Imperioso ressaltar, entretanto, que a Prefeitura do Recife vem em estreito contato junto à SPU desde o início da Gestão, não encontrando, até o presente, entraves técnicos e jurídicos que inviabilizassem quaisquer intervenções planejadas por esta Prefeitura do Recife.

Em caso das poligonais de intervenção estiverem sobrepostas as áreas de interesse social, portanto, via de regra, serão regularizadas conforme o disposto na Lei Federal Nº 13.465/2017 para Regularização Fundiária Urbana de interesse social (Reurb-S), compreendendo medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes, quando for o caso, mediante indicação de plano urbanístico e a consideração das restrições ambientais incidentes que prevaleceram, enquanto princípio da prevalência do público sobre o privado, em consideração ao princípio da precaução e prevenção ambiental e da garantia prevista no conceito de sustentabilidade socioespacial para as futuras gerações.

Prevenção e Mitigação:
Ação de mitigação: Associar a ações integradas de assistência social, regularização fundiária e reassentamentos através dos projetos municipais e do Novo PAC 2024 em andamento. Bem como priorizar sempre que possível a permanência de populações em seu local. Considerar a remoção quando da ocorrência de restrições ambientais e do risco ao patrimônio público.

Este risco está associado aos produtos: **2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas; 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município e 2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.**

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Potencial descompasso entre o cronograma de obra e o calendário letivo da rede municipal.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Em função do andamento de obras físicas de equipamentos de média complexidade como os educacionais propostos, é notório que os cronogramas possam passar de 1 ano, o que pode gerar o descompasso com o calendário letivo. Contudo este é um risco aceitável e ações mitigadoras devem ser executadas. Pois os resultados positivos da implantação prevalecem a médio prazo.

No município, os equipamentos propostos irão ser direcionados para a demanda reprimida o que não afetará a dinâmica do cronograma letivo de alunos. Sendo o cronograma ajustado para a entrega quando possível até fevereiro para evitar o risco potencial de remanejamento de alunos.

Prevenção e Mitigação:

Ação Mitigadora: Realizar um planejamento prévio do cronograma físico-financeiro para minimizar extrapolação do período de entrega da construção além de março do ano corrente;

Este risco está associado aos produtos: **3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.**

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Potencial necessidade de recursos humanos para operação dos equipamentos. Possui alto impacto e baixa probabilidade de ocorrência.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Uma realidade comum a muitos municípios é a defasagem de profissionais nas áreas de educação e saúde para atender a demanda crescente, ao passo que se soma a demanda natural a migração no pós-pandemia Covid-19 de levas de alunos da rede privada para a pública, principalmente em municípios do nordeste brasileiro.

O risco de ausência de recursos humanos é potencial para a operação, fazendo-se necessário mecanismos de soluções temporárias e/ou definitivas para enfrentar esse risco potencial, seja por seleções simplificadas seja pela realização de certames de concurso público.

Prevenção e Mitigação:
Ação Mitigadora: o município realizou concurso público com a previsão do aumento da demanda da rede de educação, encontrando-se o certame em vigência até 2025 podendo ser prorrogado por dois anos para chamamento**.** O município também dispõe de contratos de terceirizados para serviços de suporte a gestão educacional vigentes e poderá executar novos processos em função de necessidades específicas**.**

Este risco está associado aos produtos: **3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes.**

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Inexistência de terrenos disponíveis ou adequados para a construção das novas USF no município.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Um risco comum evidenciado em muitos municípios é a falta de terras públicas, o desconhecimento de sua propriedade ou a necessidade de registros cartoriais dos bens. Este fato pode gerar atrasos ou inviabilizar a implantação de equipamentos sociais relevantes em áreas específicas.

Tal fato traz para a criação de banco de terras e bens públicos uma dimensão importante no planejamento e gestão pública. Bem como destaca-se a necessidade de levantamento prévio de imóveis antes da capitação de recursos ou o estabelecimento de programas de aquisição de estoques de terras.

Prevenção e Mitigação:
Ação Mitigadora: Realizar mapeamento prévio dos terrenos disponíveis, considerando localização estratégica, acesso à população e viabilidade urbanística. Negociar cessões de áreas públicas ou parcerias com órgãos municipais para aquisição de terrenos. Garantir integração entre Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Planejamento Urbano e Procuradoria Municipal para agilizar processos de desapropriação ou aquisição. Monitoramento contínuo do cronograma de aquisição e da liberação de áreas, com ajustes no planejamento de obras para evitar atrasos significativos no projeto.

Este risco está associado aos produtos: **3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.**

4. 14. **Informações do 14° risco:**
Nome: Atraso na execução das obras devido a falhas no planejamento, logística ou coordenação entre setores.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Um risco comum evidenciado em muitos municípios é a ausência de expertise, de quadro técnico especializado e de estruturas de gestão permanentes que garantam execução das obras dentro de cronogramas pré-estabelecidos.

Os efeitos negativos desse risco são o descompasso de insumos e serviços com o cronograma de obra gerando atrasos da implantação dos equipamentos e infraestruturas. O projeto Jaboatão 2030, prevê como um dos componentes a Gestão do programa, em espelhamento a boas práticas existentes.

Prevenção e Mitigação:
Ação Mitigadora: Planejamento detalhado do cronograma físico-financeiro, acompanhamento mensal da execução e monitoramento de indicadores. Realização de reuniões periódicas de alinhamento entre Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Planejamento Urbano e Gerência de Obras. Contratos claros com fornecedores e empreiteiras, definição de etapas críticas e adoção de medidas corretivas imediatas em caso de desvios. Possibilidade de reforço de equipes temporárias e integração entre setores para tomada rápida de decisão.

Este risco está associado aos produtos: **3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.**

4. 15. **Informações do 15° risco:**
Nome: Dificuldades de execução das obras nos períodos chuvosos ou em eventos extremos de chuva.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Em muitas regiões do Brasil observa-se períodos chuvosos intensos que acabam por comprometer a execução de obras. Este fato se apresenta como um risco limitante a adequada execução de cronogramas físicos. Levando, assim, a necessidade de adequações de planejamento e gestão ao calendário climático e em especial as médias e máximas de precipitação para evitar períodos chuvosos ou mitigar seus efeitos em etapas construtivas de menor impacto.

Prevenção e Mitigação:
Ação de mitigação: O cronograma irá prever a prioridade de início da execução no período de menor incidência de chuva e ajustará o cronograma das etapas para que as com menor impacto coincidam com os períodos de maior precipitação.

Este risco está associado aos produtos: **3.3: Revitalização de Campos de Futebol e Espaços Esportivos; 3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis; 2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos; 2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas; 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município; 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.**

4. 16. **Informações do 16° risco:**
Nome: Dificuldades de Licenciamento Ambiental, possui médio impacto e média probabilidade de ocorrência.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A ausência de planejamento e do fluxo adequado de processos através da interferência de outros órgãos, notoriamente os competentes pelo licenciamento urbanístico e ambiental geram, entraves a execução de projetos. No intuito de mitigar o risco de entraves técnicos no tocante ao licenciamento ambiental, equipes responsáveis da SMDU serão envolvidas nos projetos, através da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, esta integrante do organograma da Unidade Gerenciamento do Programa, desde a fase conceitual de Projeto, para que estes estejam em completa consonância com as normativas e diretrizes ambientais vigentes.

Há que se considerar, ainda, que os produtos do Projeto Jaboatão 2030 apresentados, quando couber, em consultas públicas com as comunidades locais, sempre que necessário, representantes de Instituições Públicas, Organizações não Governamentais e Conselhos de Classe, dentre outros.

No bojo dos licenciamentos ambientais, caberá também à aludida Secretaria executiva a responsabilidade de emissão de documentos ambientais autorizativos como por exemplo, o licenciamento ambiental único (LAU) para supressão vegetal das espécies da área de intervenção, a autorização para o resgate e transporte de animais silvestres, a emissão dos licenciamentos de operação para as atividades de aterros de inertes, a fim de que essas áreas façam a recepção dos resíduos sólidos gerados na obra, assim como o licenciamento para as áreas de empréstimo mineral (jazidas) e quando necessário, licenciamento ambiental único para perfuração de poços tubulares para canteiro de obras, dentre outros procedimentos de competência do Órgão.

Prevenção e Mitigação:
Ação de mitigação: O licenciamento ambiental da maior parcela das ações do projeto é de competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, uma vez ser este órgão integrante do Sistema Nacional para o licenciamento de obras e atividades de impacto, no temos da Lei Complementar nº 140/2011, de 08/12/2011. Esta Secretaria analisará os estudos ambientais e de viabilidade e emitirá Licença Prévia - LP para as atividades, contemplando as condicionantes e complementações necessárias à emissão da Licença de Instalação - LI, que autoriza o início das obras. Será realizada tratativas prévias de apresentação e consulta a instituições licenciadoras externas para minimizar potenciais entraves.

Este risco está associado aos produtos: **3.1 Ampliar e qualificar equipamentos educacionais em territórios vulneráveis; 3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis; 3.3: Revitalização de Campos de Futebol e Espaços Esportivos;2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos; 2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas; 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município; 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.**

4. 17. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	Dólar	1.0000	52.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	13.000.000,00

5. 1. 1. Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	172	238

Juros aplicáveis:
SOFR + taxa à partir de 2% a.a
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Sobre o saldo empenhado e não desembolsado do financiamento, o Mutuário pagará comissão de compromisso, em dólares americanos, de 0,25% a.a.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
Será de 0,25% sobre o total dos recursos financiados.
Outros encargos:

0

Outras Informações:

0

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
COMPONENTE 1 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.540.750,00	403.750,00	2.323.500,00	807.500,00	1.540.750,00	403.750,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 2 - FORTALECER A INFRAESTRUTURA E A HABITABILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL ASSOCIADA AS AÇÕES DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA.					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.632.600,00	813.000,00	10.677.200,00	1.666.500,00	8.829.900,00	1.473.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.547.300,00	1.128.000,00	381.000,00	254.000,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA SOCIAL EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.234.525,00	372.725,00	4.329.050,00	605.450,00	3.585.700,00	647.300,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.641.200,00	386.800,00	1.873.025,00	239.225,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
372.700,00	729.700,00	469.050,00	1.032.050,00	469.050,00	1.032.050,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
324.525,00	634.775,00	228.175,00	369.925,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Municípios, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

- receitas próprias a que se refere o art. 156 da Constituição;
- recursos a que se refere o art. 158 da Constituição; e
- recursos a que se referem o inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição;

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 7. **Anexos**

CARTA ANUENCIA FONPLATA VPO_NOT-8569_25

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A execução da proposta em tela teve como pressupostos técnicos diversos documentos de base para a constituição dos seus componentes. Considera-se, ainda que, o município fez uso do seu arsenal jurídico existente e de referência para a política municipal de desenvolvimento urbano local, a qual tem como seu principal instrumento o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que passou recentemente por um processo participativo de revisão. Bem como, levou em consideração seus planos setoriais, em especial atenção o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) (**Figura 11**) e o Plano Local de Habitação de Interesse Social.

Figura 11: **Alguns Relatórios do PMRR do Jaboatão dos Guararapes.**



Fonte: PMJG, UFPE, MCidades, 2024-25.

Em nível municipal vale ressaltar, na temática da infraestrutura social, as prioridades estabelecidas pelos conselhos municipais de saúde, educação e de assistência social, bem como os seus respectivos planos.

Vale ressaltar que o município executou uma ampla consulta popular, no período de 12 a 30 de maio de 2025, com uma representação de cerca de 1,6% da população total do município, totalizando mais de 10.837 pessoas participantes nos diversos segmentos sociais, esta consulta serviu como lastro de representação social e definição das demandas sociais presentes. Sobreposto a esse processo de interlocução social, foram desenvolvidos estudos técnicos típicos de base orçamentária e financeira que propiciaram a construção das suas leis orçamentárias (PPA, LDO, LOA), o nono mapa da estratégia municipal (**Figura 12** – Mapa da Estratégia), sendo estas, bases para a análise da capacidade de investimento e endividamento do município.

Figura 12: **Mapa da Estratégia Municipal 2026-2029.**



Fonte: PMJG/SEPLAG, 2025.

É pertinente ressaltar que, o município, em 2025, finalizou o seu Plano de Ação Integrada de caráter operacional para o período de 2025-2028, elencando as ações prioritárias, estratégicas e táticas, com concepções básicas das infraestruras viárias, estudos de viabilidade prévia de ações urbanas, elenco e definição de áreas para locação de empreendimentos de saúde, educação, assistência social, esporte, lazer e cultura. O plano prevê tipologias de equipamentos e análises diversas sobre as áreas prioritárias a serem implantadas as ações.

Dentre as ferramentas de suporte a gestão de contratos desenvolvida pela municipalidade destaca-se a criação do Sistema Digital de Planejamento e Monitoramento, "*App do Prefeito: Monitoramento na palma da mão*" o qual permite o alcance da excelência na gestão pública, visto que demanda aos gestores uma visão sistêmica quanto à importância do desenvolvimento e acompanhamento do planejamento no setor público e que servirá diretamente para a gestão do projeto Jaboatão 2023. Registra-se que o App recebeu o prêmio na categoria "Gestão e monitoramento de projetos" pela instituição Facilit Conecta (**Figura 13**).


Figura 13: **Premiação do App de Planejamento e Gestão - Equipe SEPLAG/PMJG.**



Fonte: Facilit, 2025.

A ferramenta é um instrumento de modernização da administração, acessível, inovadora e de baixo custo desenvolvida permite que o usuário tenha o planejamento da gestão de forma organizada e planejada. Alguns resultados da plataforma: Aplicativo Móvel; Visão sistêmica dos Objetivos Estratégicos; Dados Gerais do Munícipio e também em áreas como Educação, Saúde, Infraestrutura entre outras; *Dashboard* de Resolutividade das Metas e Entregas; Integração da alta gestão com a utilização da ferramenta disseminada na Prefeitura e nas suas secretarias (**Figura 14**).

Figura 14: **App do Prefeito: Monitoramento na Palma da Mão.**

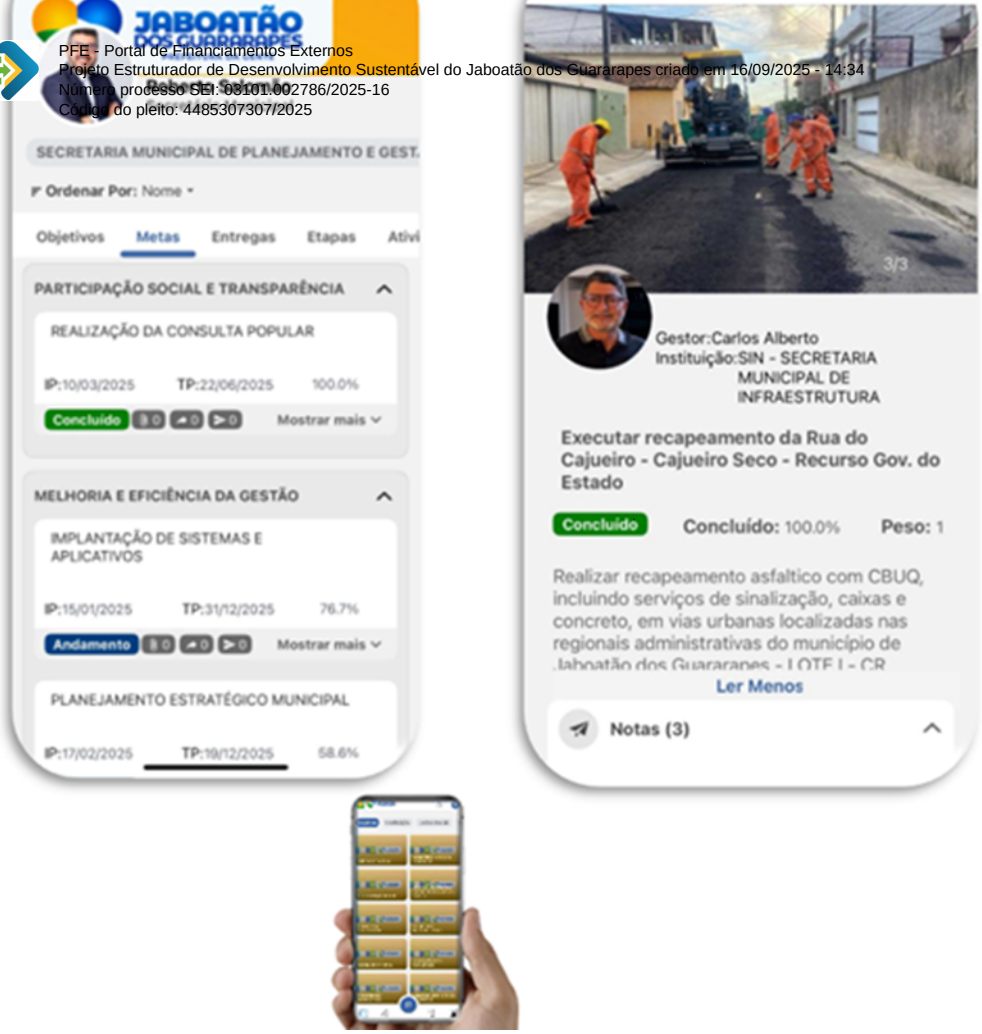

Fonte: PMJG, 2025.

Em nível estadual, destacam-se algumas ações do Governo de Pernambuco que são sinergicas o projeto Jaboatão 2030, considerando que, o município, enquanto integrante da Região Metropolitana do Recife (RMR), dispõe de um Plano Diretor Metropolitano de Desenvolvimento Urbano (PDDUI – RMR), de um Plano Diretor de Trânsito e Transporte Urbano (PDTTU – RMR) e do Plano Diretor do Complexo Industrial e Portuário de Suape (CIPS)[1][1] e deus diagnósticos de suporte, ressalta-se, ainda, que Jaboatão integra o território estratégico do CIPS.

Em nível federal, considera-se as diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 para a definição das relações estratégias e da sinergia dos componentes, aos quais foram sobrepostos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os quais estão alinhados ao novo mapa da estratégia municipal.

Com base nas aludidas ações o município estabeleceu os objetivos previstos no Projeto Jaboatão 2030 e como forma de facilitação metodológica apresenta-se o **quadro 5,** com as ações e instrumentos desenvolvidos e de base para as futuras ações por componente do projeto.

QUADRO 5: **Correlação Entre os Objetivos, Componentes e as Etapas de Suporte Já Realizadas.**

OBJETIVO GERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	COMPONENTES	ETAPAS DE SUPORTE REALIZADAS

Promover o desenvolvimento urbano e social sustentável, com foco em equidade territorial, inclusão produtiva e adaptação as mudanças climáticas no município do Jaboatão dos Guararapes/PE	**1.** Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal;	**Componente 1** - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.	- Definição da nova estrutura administrativa e definição das competências institucionais das unidades da administração direta e indireta (Lei Complementar nº50/2024); - Realização de Concurso Público (vigente até 2026); - Elaboração do Plano de ações integradas 2025-2028 (Finalizado em 2025); - Construção do Novo Mapa da Estratégia 2026-2029;
		Componente 4 – Gestão do Programa.	- Realização de Concurso Público (vigente até 2026); - Criação por lei do Comitê de Governança Municipal; - Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária - POD.
	2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.	**Componente 2** - Expandir e recuperar a infraestrutura urbana sustentável.	- Revisão do Plano Municipal de Redução de Riscos (finalizado em 2025); - Construção do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (Em elaboração); - Revisão do Plano Diretor e das Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (finalizando em 2025); - Elaboração do Plano de ações integradas 2025-2028 (Finalizado em 2025);

3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.	**Componente 3** - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis a desastres.	- Atualização do Plano Municipal de Educação – Demandas Reprimidas; - Elaboração do Plano de ações integradas 2025-2028 (Finalizado em 2025);

[1][1] DECRETO Nº 54.185, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 - Institui o Plano Diretor - SUAPE 2035 e dispõe sobre o ordenamento do uso e ocupação do solo do Complexo Industrial Portuário de Suape - CIPS.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.
