PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes

Proponente: Município de Jaboatão dos Guararapes/PE
Processo SEI: 03101.002786/2025-16
Código do pleito: 4485307307/2025
Versão: 5

Fonte: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA
Valor do Financiamento: USD 52.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 13.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 10
1. 2. 3. Soluções 16
1. 2. 4. Resultados 21
1. 3. Objetivo 24
1. 4. Indicadores 27
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 27
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 28
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 29
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 31
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 32
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 33
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 35
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 36
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 38
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 40
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 42
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 43
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 45
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 46
1. 5. Componentes 48
1. 5. 1. Informações do 1° componente 48
1. 5. 2. Informações do 2° componente 50
1. 5. 3. Informações do 3° componente 54
1. 5. 4. Informações do 4° componente 56
1. 6. Beneficiários 58
1. 7. Anexos 64
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 67
2. 1. Áreas estratégicas 67
2. 2. Anexos 75
3. GESTÃO 76
3. 1. Arranjo institucional 76
3. 1. 1. Descrição 76
3. 1. 2. Orgãos Executores 78
3. 1. 3. Estrutura Operacional 78
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 79
3. 2. Operacionalização e Manutenção 79
3. 3. Planejamento Estratégico 81
3. 4. Anexos 84
4. RISCOS 86
4. 1. Informações do 1° risco 86
4. 2. Informações do 2° risco 86
4. 3. Informações do 3° risco 86
4. 4. Informações do 4° risco 86
4. 5. Informações do 5° risco 87
4. 6. Informações do 6° risco 87

4. 7. Informações do 7° risco 88
4. 8. Informações do 8° risco 88
4. 9. Informações do 9° risco 88
4. 10. Informações do 10° risco 89
4. 11. Informações do 11° risco 89
4. 12. Informações do 12° risco 90
4. 13. Informações do 13° risco 90
4. 14. Informações do 14° risco 90
4. 15. Informações do 15° risco 91
4. 16. Informações do 16° risco 91
4. 17. Anexos 92
5. FINANCIAMENTO 93
5. 1. Condições Financeiras da Operação 93
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 93
5. 2. Cronograma de Desembolso 95
5. 3. Contragarantias 96
5. 4. Anuência do Banco . . . . .
5. 5. Anexos 96
6. ETAPAS REALIZADAS 97
6. 1. Etapas realizadas 97
6. 2. Anexos 103
7. Baixar todos os anexos 105
. . . . . .

1. **PROJETO**

1. 1. **Identificação**

Nome: Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes
Sigla: JABOATAO 2030
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Jaboatão dos Guararapes/PE

1. 2. **Justificativa**

1. 2. 1. **Contexto:**

1. 2. 1. Contexto

Aspectos Gerais do Território

Jaboatão dos Guararapes constitui-se num município integrante da Região Metropolitana do Recife (RMR)[1][1], conforme estabelecido pela Lei Complementar Federal nº 14, de 1973, conformando-se, atualmente, como a *segunda maior economia* e *população do estado de Pernambuco*, conformando uma mancha urbana contígua com a capital Recife e o município de Olinda (Figura 1).

Atualmente, o município apresenta em relação a RMR uma alta integração funcional de seus setores econômicos, além de uma ampla conexão de suas redes de infraestruturas presentes em seu tecido urbano, oportunizando, por um lado, o desenvolvimento em complementariedade aos demais municípios e, por outro, entraves em função das deseconomias urbanas presentes.

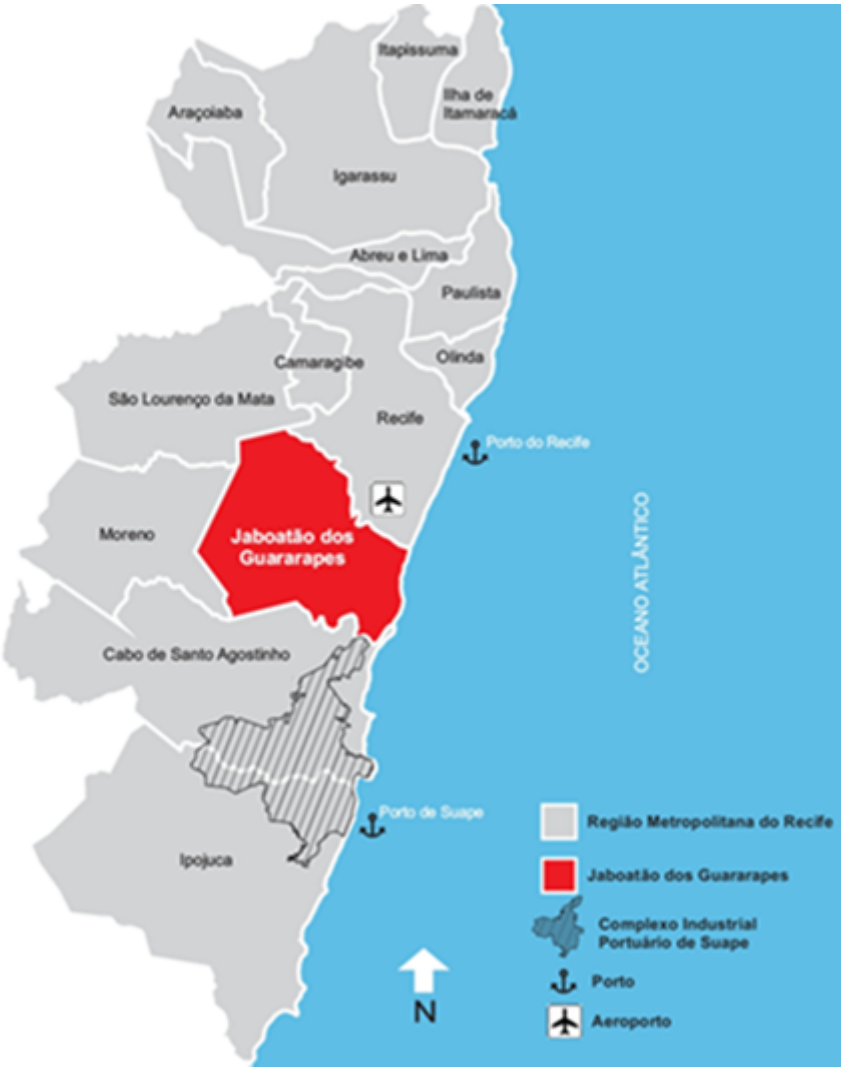


Figura 1 – Situação do Município do Jaboatão dos Guararapes na RMR

Fonte: Oliveira (2025).

Mais recentemente, o município passou a fazer parte do Território Estratégico de Suape (TES)[2][2], principal polo de desenvolvimento econômico de Pernambuco, por meio do Decreto Estadual nº 37.160, de 2011, ampliando, assim, a inserção do Jaboatão dos Guararapes em políticas de desenvolvimento regional e infraestrutura estratégica (Figura 2).

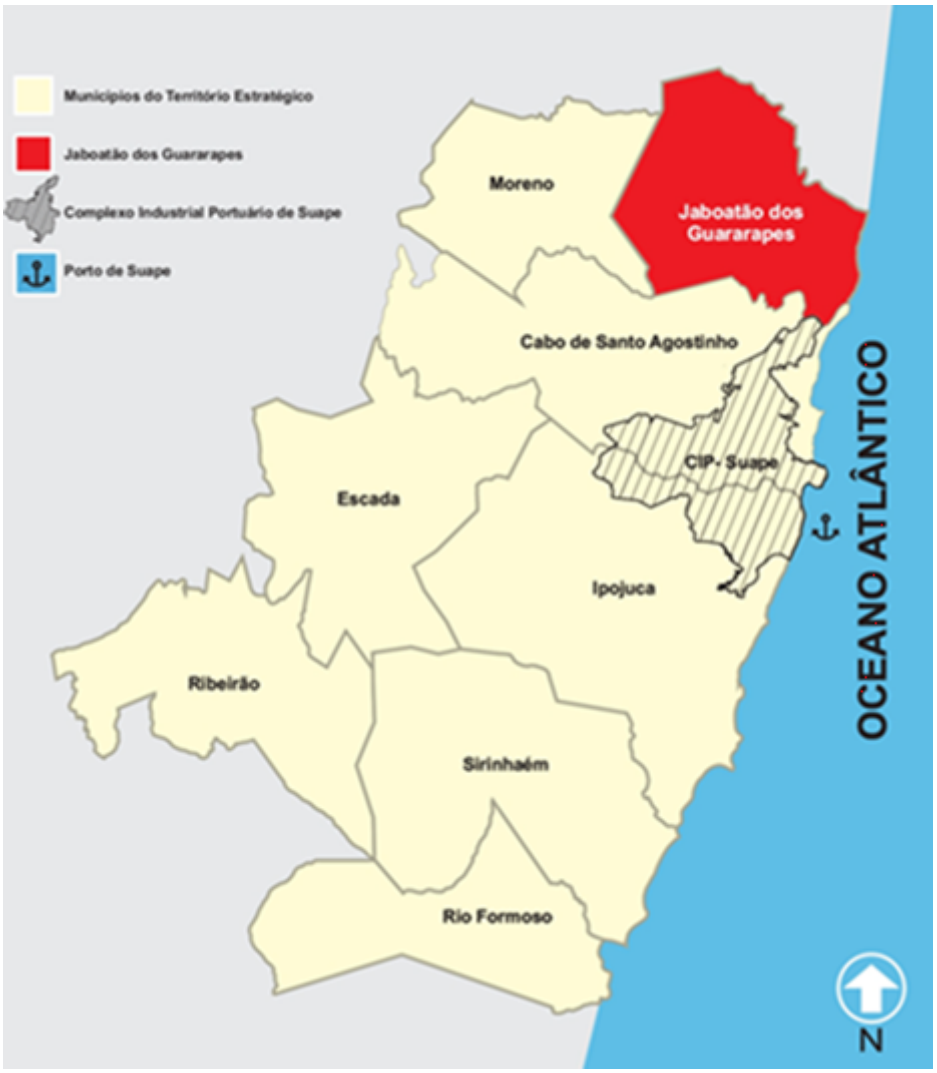


Figura 2 - Situação do Município do Jaboatão dos Guararapes no Território Estratégico de SUAPE – TES

Fonte: Oliveira (2025).

Ao longo de seus mais de 400 anos de histórica, Jaboatão dos Guararapes registrou o deslocamento da dinâmica urbana do interior do município para o litoral, o que gerou realidades urbanas diversas e demandas socioambientais distintas. Nesse processo, o município passou por distintas espacializações político-administrativas, influenciadas por diferentes contextos e jurisdições, culminando na configuração atual: uma divisão conformada em cinco Distritos, os quais se desdobram em sete Regionais administrativas, subdivididas em Bairros, conforme demonstrado nas Figuras 3 e 4 e, ainda, no Quadro 1.

Nesse contexto, cabe destacar que a delimitação desses Distritos e Regionais representa a espacialização de traços de homogeneidade histórica da ocupação territorial, socioeconômica e fisicoambiental, tendo sido seus Bairros definidos pelo processo de pertencimento da população em relação aos marcos históricos da paisagem expressos em seus parcelamentos.

BAIRRO	POPULAÇÃO 2022	RANKING	REGIONAL	FAIXA POPULACIONAL
Candeias	72.530	1	Regional 06 - Praias	De 40.001 à 75mil hab.
Piedade	67.421	2	Regional 06 - Praias	
Cajueiro Seco	56.966	3	Regional 05 - Prazeres	
Curado	45.767	4	Regional 03 - Curado	
Barra de Jangada	41.270	5	Regional 06 - Praias	
Guararapes	32.909	6	Regional 07 - Guararapes	De 25.001 à 40.000mil hab.
Prazeres	31.954	7	Regional 05 - Prazeres	
Zumbi do Pacheco	29.362	8	Regional 02 - Cavaleiro	
Vila Rica	29.234	9	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Cavaleiro	27.739	10	Regional 02 - Cavaleiro	
Jardim Jordão	27.337	11	Regional 07 - Guararapes	
Sucupira	25.812	12	Regional 02 - Cavaleiro	
Muribeca	22.023	13	Regional 04 - Muribeca	De 15.001 à 25.000mil hab.
Marcos Freire	19.845	14	Regional 04 - Muribeca	
Santo Aleixo	17.967	15	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Dois Carneiros	16.102	16	Regional 02 - Cavaleiro	
Santana	15.013	17	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Centro	13.484	18	Regional 01 - Jaboatão Centro	De 10.001 à 15.000mil hab.
Muribequinha	11.591	19	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Floriano	10.822	20	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Vista Alegre	9.842	21	Regional 01 - Jaboatão Centro	De 5.001 à 10.000mil hab.
Engenho Velho	6.236	22	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Socorro	5.943	23	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Comportas	4.061	24	Regional 05 - Prazeres	De 0001 à 5.000mil hab.
Manassu	2.139	25	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Vargem Fria	430	26	Regional 01 - Jaboatão Centro	
Bulhões	238	27	Regional 01 - Jaboatão Centro	

Quadro 1: Ranking da População por Bairro segundo Faixa Populacionais.

Fonte: IBGE, 2022. Dados Retrabalhados: PMJG, 2025

Essa estrutura constitui-se no suporte espacial para a formulação, execução e avaliação contínua de políticas públicas e do planejamento municipal, ao mesmo tempo em que revela desafios significativos, sobretudo nas localidades marcadas por vulnerabilidades sociais. As áreas rurais do município, por sua vez, apresentam singularidades que exigem abordagens específicas, considerando suas dinâmicas socioeconômicas, a dispersão geográfica e as limitações de conectividade.

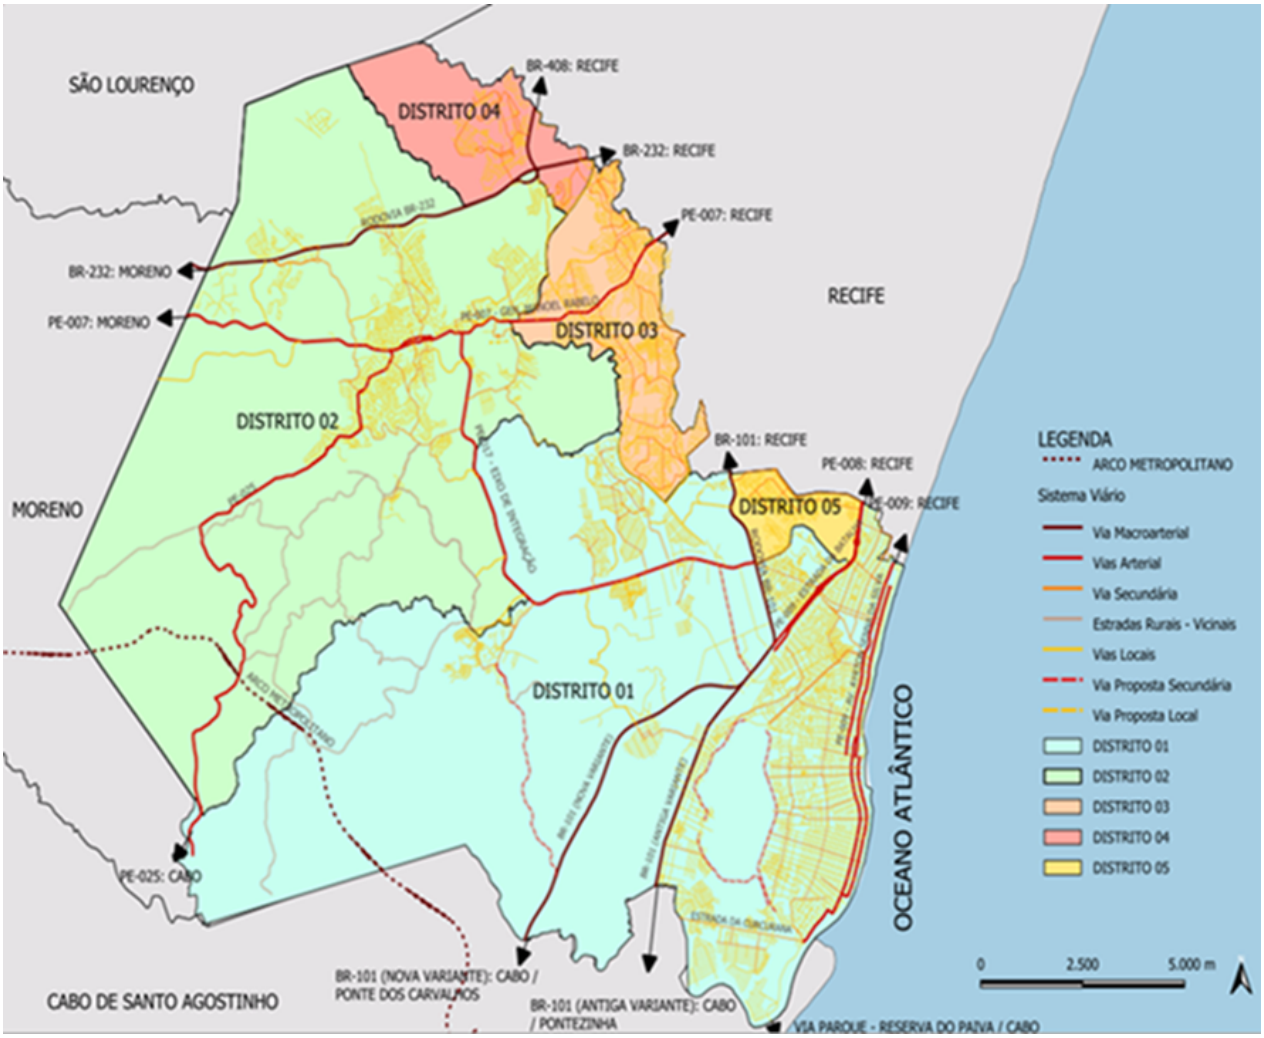


Figura 3 – Mapa com Distritos Municipais

Fonte: Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes (2025).

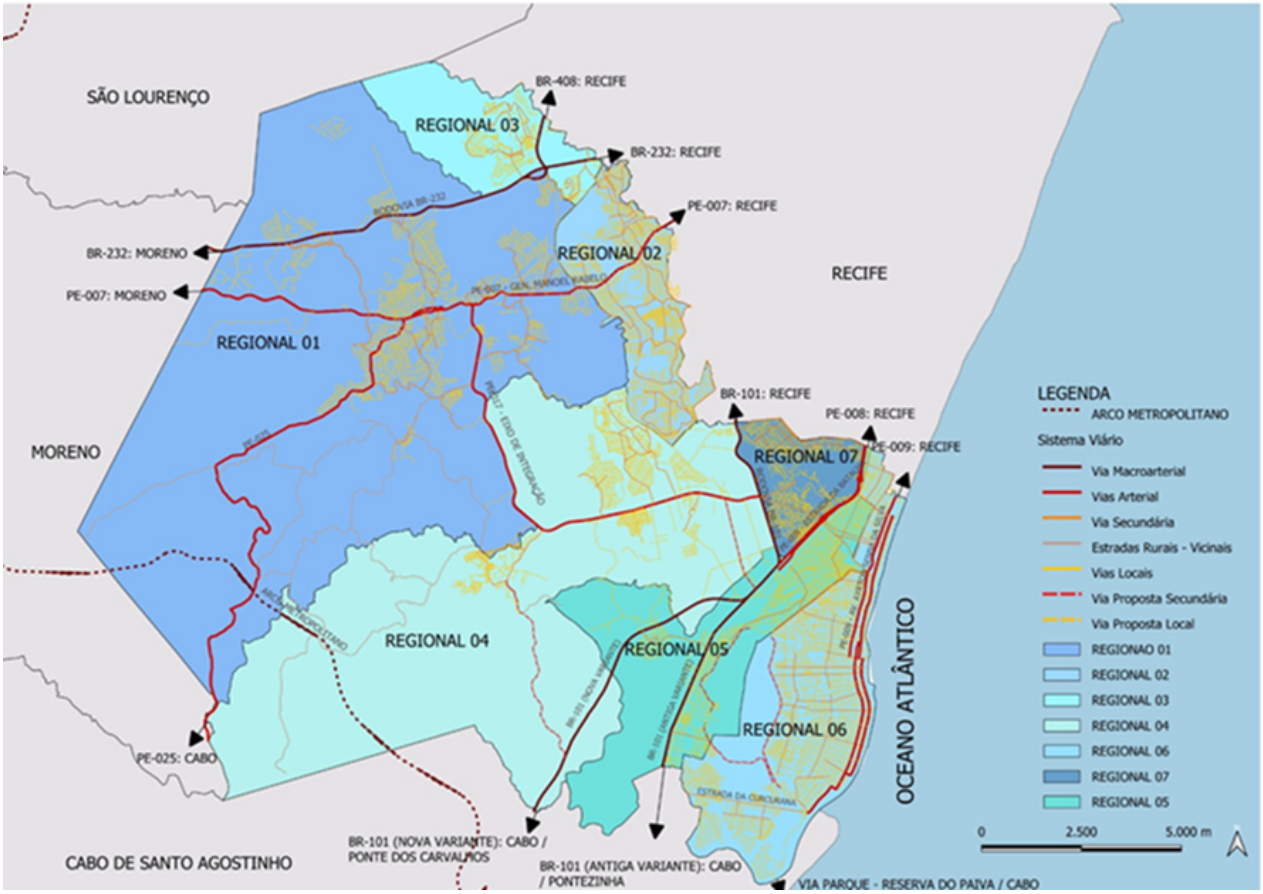


Figura 4 – Regionalização Administrativa

Fonte: Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes (2025).

Contexto Socioeconômico

Classificada como uma cidade de porte médio, Jaboatão dos Guararapes possui uma população de 684.293 habitantes (IBGE, 2025), distribuída em uma área de 258 km² (IBGE, 2022), o que resulta em uma densidade demográfica de 2.489,28 habitantes por km². De acordo com o Censo de 2022, é o 9º município mais populoso do Nordeste e o 2º de Pernambuco, ficando atrás apenas da capital do estado, Recife.

Essa população está inserida em um espaço geográfico caracterizado pela diversidade geomorfológica, o que favorece a formação de relações distintas entre sociedade e natureza em cada porção do território. Essa configuração resulta em padrões heterogêneos de parcelamento, uso e ocupação do solo.

Vale salientar que **41,4%** da população possui rendimento nominal per capita mensal de até meio salário-mínimo (IBGE, 2010), sendo expressiva a parcela dependente de programas de transferência de renda e auxílios emergenciais, estimada em cerca de **17%** (FJP, 2017).

Essa realidade de precariedade foi ainda mais agravada nos últimos 20 anos pelo forte crescimento urbano que não foi acompanhado, na mesma proporção, pela oferta de infraestrutura básica, ou mesmo, pela implantação de forma seletiva e insuficiente dessa infraestrutura, em face, sobretudo, da escassez de investimentos em face desse crescimento da demanda, levando assim, a necessidade de urgentes intervenções.

Em contraponto, nos últimos dez anos, Jaboatão tem apresentado um expressivo dinamismo econômico, impulsionado pelos setores de comércio, indústria e pelos serviços de logística e de distribuição, em estreita articulação com o Complexo Industrial e Portuário de Suape (CIPS). Esse movimento elevou o Produto Interno Bruto (PIB) municipal para R$ 16,1 bilhões (CONDEPE/FIDEM, 2021), representando um crescimento superior a 10% em relação aos dados de 2010.

Tal desempenho, aliado aos esforços contínuos de gestão eficiente, racionalização dos gastos públicos e modernização administrativa, consolidou a solvência financeira do município.

Contudo, cabe ressaltar que essa riqueza se apresenta de modo desigual tanto no que se refere a participação dos setores econômicos, como pela capacidade da população local (sobretudo os grupos sociais mais vulneráveis) de se apropriar dessa riqueza, o que espelha um alto índice de desigualdade, reflexos dessa herança histórica. Essa realidade socioeconômica cria uma variedade de demandas sociais e graus distintos de prioridade, que ocorrem de forma heterogênea no território, ou seja, as realidades entre os distritos e as regionais administrativas são completamente distintas no que tange as soluções de infraestruturas urbanas e sociais, o que tem demandado por parte da administração municipal, cada vez mais, ***ações globais coordenadas com perfil de obras múltiplas***, l evando a necessidade de dotar a municipalidade de instrumentos de gestão mais eficientes e eficazes, incluindo investimentos contínuos e soluções estratégicas que possam abarcar, com um menor custo de implantação – sinergia e economia de escala, a maior parcela de cidadãos, com menor impacto de manutenção.

Nesse sentido, a *ampliação da sustentabilidade e eficiência fiscal* torna-se fundamental para garantir a manutenção dos investimentos públicos. Como exemplo de iniciativas nesse sentido, o município realizou, em 2016, um sobrevoo do território abrangendo 79,82 km^2, cerca de 35% do total da área municipal, propiciando a atualização parcial do cadastro imobiliário, seguida de uma primeira modernização dos sistemas cadastrais em meio digital e um conhecimento maior da realidade municipal. Essas ações *elevaram a arrecadação* de forma significativa, além de ampliar a melhoria e assertividade das políticas públicas com base no planejamento regionalizado.

Com base nessa experiência e, ainda, em *cases* de cidades na região, a exemplo da cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, a ampliação e *atualização dessa base cadastral e a implantação de módulos multifinalitários* associados a uma *interoperabilidade entre os diversos sistemas de gestão existentes* nas diversas unidades administrativas, como também o uso de técnicas e tecnologias mais modernas de gestão, a exemplo do uso de inteligência artificial, da metodologia BIM, de sistemas de informações geográficas, são essenciais para proporcionar um novo salto de qualidade da gestão municipal e atender as demandas sociais com maior eficiência e em amplitude das necessidades dos diversos segmentos sociais.

Aspectos da Infraestrutura e Mobilidade

O município do Jaboatão dos Guararapes, apesar de possuir boa densidade de suas conexões viárias, possui ainda entreves de integração entre os modais rodoviários e ferroviários (metrô elétrico de superfície e o trem urbano a diesel – VLT). Por fazer parte de uma região metropolitana com mais de 3.5 milhões de habitantes, os fluxos de passageiros, mercadorias e informações é elevado, e as redes de conexão apresentam moderado grau de obsolescência, com gargalos de tráfego e deficiência da mobilidade intraurbana e da conexão intermunicipal. (Figura 5).

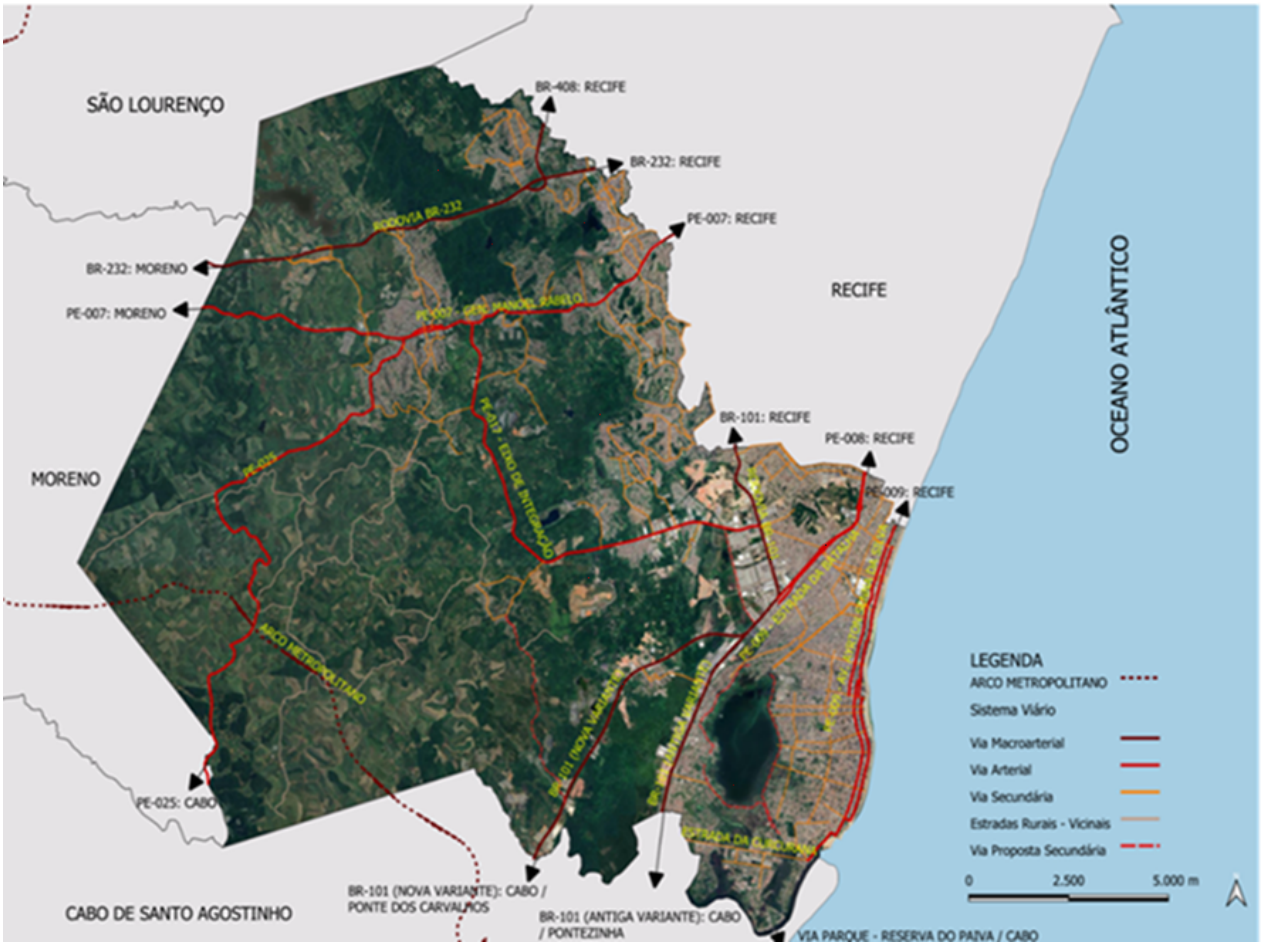


Figura 5 - Sistema Rodoviário Principal do Jaboatão dos Guararapes.

Fonte: Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes (2025).

Cabe salientar que o sistema metroviário (Figura 6) está integrado ao Sistema Estrutural Integrado (SEI) de transporte público de passageiros rodoviários, que dispõe de dois terminais integrados (TI) funcionando como grandes estações de transbordo.

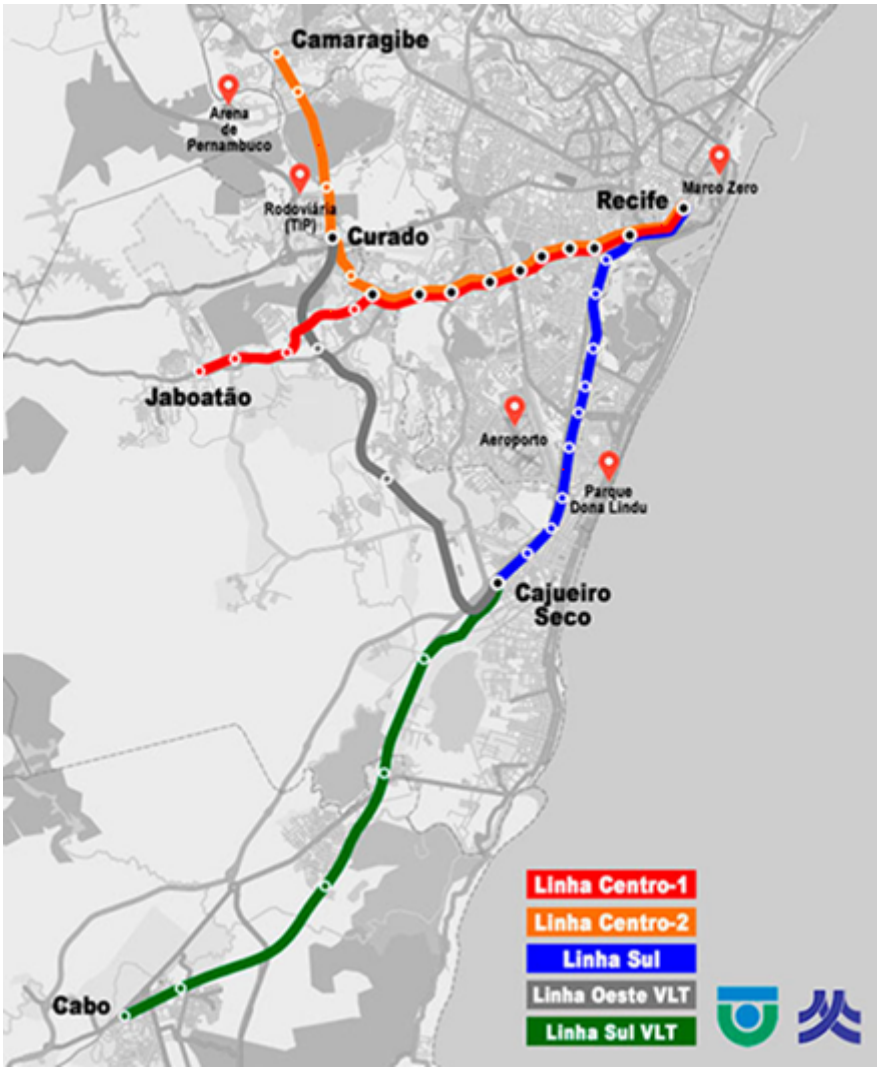


Figura 6 - Sistema Metroviário de Transporte de Passageiros da RMR.

Fonte: CBTU/METROREC, 2025

O município possui vantagens econômicas em comparação aos demais municípios da RMR por possuir boa capilaridade de vias arteriais, contando com cinco rodovias estaduais e duas rodovias federais (dois trechos da rodovia federal BR-101 e a BR-232 que tem ligação direta a BR-408), tornando-o um espaço preferencial para logística e distribuição e espaço de fluidez ao Complexo Industrial e Portuário de Suape.

Com sua configuração multimodal e articulada, a mobilidade do Jaboatão dos Guararapes configura-se como uma vantagem locacional comparativa, funcionando como diferencial na atração de investimentos e no fortalecimento das redes de conectividade local e regional, ampliando a integração funcional com a RMR.

Contudo, ainda se faz necessário no município a conexão entre os eixos macroestruturais, bem como, a implantação de novas vias industriais com vistas a eliminar as deseconomias urbanas presentes. Em nível intraurbano, o município carece de ligações entre os seus eixos arteriais e destes com as vias coletoras do transporte público de passageiros e as estações ferroviárias.

A distribuição é desigual, com as porções oeste e sudoeste do município apresentando baixa integração viária com os núcleos urbanos de Jaboatão Centro e Prazeres/Praias. Ressalta-se, também, que são expressivas as parcelas rurais no território que se caracterizam por baixos níveis de desenvolvimento humano[3][3] e *ausência de infraestruturas urbanas e equipamentos sociais*.

Contexto Socioambiental e de Adaptação as Mudanças Climáticas

Jaboatão dos Guararapes, além de ser um município litorâneo, possui uma boa densidade de recursos hídricos, sendo atravessado por cursos d'água relevantes, que desempenham papel fundamental na conformação da paisagem natural e urbana. Entre eles, sobressaem o Rio Jaboatão e o Rio Duas Unas, que percorrem diferentes

áreas do município e contribuem para a dinâmica ambiental local e, ainda, vastas áreas de mangue e restingas em área urbana associada a estuários.

Dentre os corpos hídricos existentes no município, destaca-se a Lagoa Olho D'Água, importante regulador da drenagem urbana na porção sul do Recife e no leste de Jaboatão, regulando assim, a formação das áreas úmidas e a presença de ecossistemas associados às margens fluviomarinhos. Com aproximadamente 400 hectares de espelho d'água, a Lagoa Olho D'Água é considerada uma das maiores lagoas de formação de restinga em área urbana do Brasil, agrupando uma massa populacional de mais de 180 mil habitantes em seu entorno. Entretanto, a região é suscetível a inundações periódicas, agravadas pelos efeitos das marés, o que afeta a mobilidade nessa porção sul da Metrópole.

Soluções baseadas na natureza (SbN), com vistas a melhorar a ambiência urbana e as infraestruturas sociais correlatas são necessárias, considerando que em suas bordas predomina uma população periférica, de baixa renda, com alta densidade de Zonas Especiais de Interesse Social e altos níveis de vulnerabilidade social e ambiental.

Ao analisar a estrutura interna dos bairros municipais e em especial os mais populosos observa-se uma pulverização dessas Zonas Especiais de Habitação de Interesse Social, (Anexo 1 – **Mapa das Zonas Especiais de Habitação de Interesse Social**) que frequentemente estão sobrepostas as Áreas de Risco de Deslizamento de Massa e ou Inundações.

Por sua vez, a realidade da população presente no ambiente de morros e colinas é marcada por uma geomorfologia desfavorável a ocupação, apesar de apresentarem uma alta densidade habitacional, o que gerou a criação de vastas áreas de risco, levando o município a ocupar a **2º** maior posição em percentual de população exposta ao risco em Pernambuco, e a **6º** maior do Brasil, totalizando **188.026 habitantes em situação de vulnerabilidade** (IBGE, 2022).

No último *evento climático extremo* registrado na região - as **chuvas ocorridas em 2022** - Jaboatão dos Guararapes registrou mais de 60 mortes, além de elevadas perdas materiais e de infraestruturas urbanas e sociais, que até o presente não foram totalmente recuperadas.

Essas áreas de risco são predominantemente ocupadas por parcelas informais e clandestinas de população de baixa renda, onde se registra altas taxas de violência urbana e deficiências de infraestruturas e equipamentos urbanos e sociais.

Dentre o quadro de **precariedades sociais** destaca-se a *ausência de equipamentos educacionais d a primeira infância*, creches e nos anos iniciais (Fundamental 1) para reduzir a demanda reprimida e/ou promover a melhoria dos equipamentos já existentes.

Desta forma, torna-se necessário atuar nesses territórios periféricos que sofreram com os eventos climáticos extremos e que perderam a infraestrutura social já deficiente.

Associado ao quadro educacional se associa as demandas presentes da *atenção primária a saúde*, que ocorrem de forma pulverizada no território, mas que se apresentam de forma mais crítica nas periferias urbanas, áreas que se impõem com níveis elevados de doenças ligadas a pobreza como tuberculose, hanseníase e expressam taxas diferenciadas de mortalidade infantil.

Contexto Político e Institucional

O município do Jaboatão dos Guararapes, especialmente nos dois últimos anos, tem avançado na consolidação de instrumentos e mecanismos de planejamento e gestão institucional, contando com um arcabouço jurídico consolidado, com destaque para o *Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental*, contado com as legislações urbanísticas e ambientais específicas, além da municipalização do licenciamento ambiental, vigente há mais de 8 anos e consolidado de forma digital recentemente. Esse conjunto normativo oferece suporte à gestão territorial e ambiental, contribuindo para o planejamento integrado e sustentável do município.

Complementam esse cenário os planos setoriais existentes recém revisados, a exemplo do *Plano Municipal de Redução de Riscos e do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social*, estando, atualmente, em elaboração os *Planos Municipais de Mobilidade e de Saneamento Ambiental*. Foram ainda elaborados significativos estudos e instrumentos, a exemplo da *carta geotécnica municipal e de estudos de inundações potenciais*, para subsidiar o futuro *Plano de Adaptação as Mudanças Climáticas*.

Tais instrumentos refletem o esforço de institucionalização de políticas públicas voltadas à melhoria das condições urbanas e à redução das vulnerabilidades socioambientais.

O município dispõe ainda de uma estrutura administrativa organizada e de uma equipe técnica com experiência e capacidade gerencial compatíveis com a execução das políticas e dos projetos em curso e previstos. Destaca-se que, o município já executou dois projetos da linha de Financiamento de Infraestruturas de Saneamento (FINISA/CAIXA),

com êxito.

Esse aparato institucional é fortalecido por um alinhamento institucional entre os Plano Plurianuais do Governo Federal e do Município, favorecendo o acoplamento entre políticas públicas e ações estratégicas que geram sinergias territoriais. Estando em execução e recém capitados projetos de Macrodrenagem, contenção de encostas e mobilidade urbana pelo Novo PAC.

Em nível regional, destacam-se iniciativas de impacto na Região Metropolitana do Recife, como a construção do Arco Metropolitano – Trecho Sul, via expressa que atravessará o município do Jaboatão e conectará os polos de desenvolvimento de Goiana (polo automotivo do Grupo Stellantis e de hemoderivados da Hemobrás) e o Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca (Petroquímica, estaleiros e indústria diversificada). Soma-se a isso a Parceria Público-Privada do Saneamento da Região Metropolitana, coordenada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA/BRK), que tem várias áreas prioritárias para os próximos quatro anos no município que se sobrepõem, por sua vez, de modo sinérgico, as áreas de intervenção propostas do projeto Jaboatão 2030, o que reforça a articulação institucional voltada à melhoria da infraestrutura urbana e ambiental do município, em particular, no âmbito do distrito de Prazeres/Praias.

A análise integrada dos aspectos político-institucionais, ambientais, socioeconômicos e de infraestrutura revela um território marcado por contrastes, cujas especificidades demandam abordagens estratégicas e integradas, evidenciando a necessidade de ações coordenadas e multisetoriais. Tal conjuntura só consegue ser abarcada com projetos globais (na escala da totalidade do território) de obras múltiplas (em tipologia de ações e distribuídas no território municipal), que possam gerar efeitos cumulativos e sinergias de impacto potenciais, além de benefícios aos amplos espectros sociais em períodos mais curtos, priorizando as áreas periféricas que se apresentam como dispersas no território.

Torna-se então fundamental a compreensão dos problemas centrais que incidem sobre o município de Jaboatão dos Guararapes, a fim de subsidiar um conjunto coordenado de intervenções qualificadas, bem como, orientar a promoção de um desenvolvimento urbano mais equitativo, resiliente e sustentável.

[1][1] A Região Metropolitana do Recife – RMR é constituída por 14 municípios integrados territorialmente e funcionalmente mais o território insular de Fernando de Noronha.

[2][2] O Território Estratégico de Suape (TES) é uma área geográfica em Pernambuco, delimitada para o planejamento urbano e ambiental em torno do Complexo Industrial Portuário de Suape, compreendendo vários municípios. A Agência Condepe/Fidem, um órgão estadual de planejamento, coordena o programa que visa o desenvolvimento ordenado e sustentável da região, em parceria com o BNDES e os municípios.

[3][3] Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do PNUD/ONU (2013). As áreas de desenvolvimento humano rurais do município possuem índice inferior a 0.600, enquanto as áreas urbanas apresentam índices médios acima de 0.700.

1. 2. 2. **Problema:**

1. 2. 2. Problemas

Em áreas urbanas de ocupação que remontam ao período colonial, pobres e periféricas como ocorre no Nordeste Brasileiro, surgem desafios multisetoriais e multiescalares para enfrentar uma herança de desigualdades. No sentido de promover uma compreensão mais abrangente desse problemática, apresenta-se abaixo os principais eixos de problemas/necessidades que as ações do projeto se propõem a tratar por meio de seus componentes e resultados, apresentando uma síntese de suas principais causas e consequências, a saber:

Eixo de Gestão Territorial e Sustentabilidade Administrativa

Jaboatão dos Guararapes apresenta uma configuração imobiliária que está em constante transformação. Essa dinâmica tem exigido uma base de dados precisa e atualizada para subsidiar a gestão urbana, contudo, o município tem enfrentado a defasagem e a fragmentação das informações sobre os imóveis, bem como sobre as tipologias de uso e as formas de parcelamento do solo, evidenciando um cadastro imobiliário desatualizado e a ausência de cadastro de parcela do território, o que castela um entrave significativo à formulação de políticas públicas eficazes e a perda de recursos.

A utilização restrita do cadastro imobiliário para fins fiscais tem comprometido a arrecadação — especialmente do IPTU/ISS/ITBI — e dificultado a integração das informações com outras áreas da administração, limitando o planejamento e a execução de políticas públicas de forma transversal. Acrescido a isso novos desafios se impõem com a consolidação do novo arcabouço fiscal. Essa limitação estrutural acarreta injustiça tributária, baixa eficiência na prestação de serviços e fragilidade na elaboração de ações voltadas ao ordenamento territorial, à inclusão social, a previsão de infraestruturas e à sustentabilidade.

Acrescenta-se ainda a defasagem dos insumos tecnológicos e de infraestruturas a gestão pública que viabilizem ações de suporte a inovação, apresentando elevada desintegrados dos sistemas de gestão e baixa interoperabilidade entre as unidades administrativas municipais e os órgãos externos. Corrobora a essa precariedade as fragilidades técnicas para manutenção dos dados, suporte ao acesso e transparência pública.

A conjuntura municipal é caracterizada com fragilidades técnicas e tecnológicas da infraestruturas instalada e dos sistemas de gestão que se espelham na fragmentação dos sistemas de gestão municipal; baixa eficiência na arrecadação e controle fiscal; falta de integração de dados; dificuldade na comunicação com sistemas estaduais e federais; dificuldade na disponibilização e usabilidade dos serviços corporativos ao cidadão; Inexistência de plataforma para dispositivos móveis; equipamentos defasados e na deficiência de segurança cibernética.

Eixo da Infraestrutura Social

O município apresenta vastas áreas em vulnerabilidade social descobertas por infraestruturas sociais e consequentemente da prestação de serviços públicos essenciais no que tange a primeira infância e a atenção básica em saúde, necessitando da ampliação da rede através da construção e ampliação dos equipamentos de Educação Infantil (creches) e do Ensino Fundamental 1 em territórios periféricos.

Jaboatão enfrenta um crescimento da demanda natural por matrículas na rede municipal de ensino, os quais se somam ao processo de migração de significativo contingente da rede privada para a pública no pós pandemia do Covid 19.

Vale ressaltar que, Jaboatão funciona como cidade polo para a microrregião sul da Região Metropolitana do Recife, o que gera movimentos pendulares de alunos das áreas limítrofes ao município que são atendidos pela rede municipal. Essa aludida conjuntura afeta, especialmente, as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, conforme evidenciado no Anexo 2 (**Demanda Reprimida de Matrículas**), a atual estrutura do parque escolar tem se mostrado insuficiente para atender com qualidade todas as crianças e estudantes em idade escolar. A escassez de vagas compromete o direito ao acesso e à permanência na escola, impactando negativamente na garantia de uma educação pública, inclusiva, equitativa e de qualidade para todos.

Vastas áreas em vulnerabilidade social encontram-se descobertas por infraestruturas sociais, na atenção primária à saúde notadamente em territórios periféricos.

Com base nos dados epidemiológicos mais recentes e na análise da cobertura da Estratégia Saúde da Família (eSF) em Jaboatão dos Guararapes, observa-se que a Atenção Primária à Saúde no município apresenta avanços importantes, mas ainda enfrenta desigualdades territoriais significativas. A cobertura municipal atual é de 57%, o que significa que pouco mais da metade da população está formalmente adscrita a equipes de ESF. Esse índice, embora represente um esforço de expansão ao longo dos últimos anos, ainda está aquém da meta de 70% de cobertura, parâmetro amplamente reconhecido como o mínimo adequado para garantir acesso equitativo, integralidade do cuidado e maior resolutividade da APS.

A análise regionalizada evidencia disparidades entre os territórios, refletindo não apenas a distribuição das equipes, mas também as vulnerabilidades epidemiológicas e sociais de cada regional.

No que diz respeito às demais regionais, destaca-se a necessidade de expansão na Regional 3, pelos elevados coeficientes de mortalidade geral acima da média municipal, refletindo fragilidades no acompanhamento das condições crônicas e no acesso aos serviços básicos, além de concentração de casos de tuberculose, HIV/AIDS e sífilis em gestantes, evidenciando a necessidade de fortalecimento das ações de rastreio, diagnóstico precoce e tratamento oportuno; na Regional 4, pelo peso das causas externas de mortalidade (violências e acidentes), que exigem atuação multiprofissional e integração intersetorial; na Regional 5, em virtude dos altos índices de prevalência de hanseníase, demandando ampliação da busca ativa e tratamento oportuno; e na regional 7 em virtude da elevada taxa de mortalidade infantil, o que reforça falhas no pré-natal, parto e puerpério. Além da concentração de casos de sífilis congênita, arboviroses e doenças negligenciadas como hanseníase e leptospirose.

A expansão e locação das equipes, reflete as condições de maior vulnerabilidade social e ambiental, com base em critérios epidemiológicos e populacionais, permitirá reduzir desigualdades territoriais, ampliar o acesso, promover equidade e qualificar a APS em Jaboatão dos Guararapes com investimento prioritário nas áreas de maior vulnerabilidade, alinhado às diretrizes do SUS e às metas de desenvolvimento social e sanitário.

No que tange aos equipamentos e espaços de lazer e esportes, observa-se uma ausência e precariedade destes nas periferias e comunidades vulneráveis.

A precariedade dos campos de futebol do município decorre de diversos fatores interligados, como a falta de manutenção periódica, o uso intenso sem pausas para recuperação do solo, deficiências no planejamento urbano e limitações orçamentárias. Destaca-se que estes equipamentos esportivos frequentemente estão associados a espaços livres públicos que se encontram deteriorados ou nunca sofreram processos de intervenção. Além disso, problemas ambientais, como solos encharcados, drenagem inadequada e exposição excessiva ao sol ou às chuvas, contribuem para a degradação dos espaços. Como resultado, muitos campos apresentam gramados danificados e desnivelados, ausência de áreas de convivência, falta de iluminação e arquibancadas, comprometendo a infraestrutura disponível. Essas condições dificultam o pleno aproveitamento dos espaços pela comunidade, limitando o esporte como instrumento de inclusão, lazer e convivência social.

Uma estratégia de redução das tensões sociais em ambiente urbano é a implantação e requalificação de espaços de convivência, lazer e esportes. Cabe ressaltar que, dos municípios pernambucanos com mais de 100 mil habitantes, onze estão na lista dos que tiveram a maior taxa de homicídios do Brasil de acordo com o Atlas da Violência 2024 (Ipea / Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Pernambuco teve uma taxa estimada de 37,7 homicídios por 100 mil habitantes, números altos para a média brasileira, tendo o município do Jaboatão dos Guararapes registrado 36 mortes por 100 mil habitantes ocupando, assim, o 83º lugar entre os mais de 5mil municípios do país.

Os índices de violência se concentram notoriamente nos distritos e bairros mais periféricos, com ausência e/ou deficiência de infraestrutura social, sendo mais gritante a precariedade de equipamentos de educação, esporte e lazer. O que torna a implantação e requalificação desses equipamentos fundamental para reduzir estados de vulnerabilidade social.

Eixo de Desenvolvimento Econômico

A capital pernambucana possui um extenso e rico ecossistema de inovação e tecnologia da informação, denominado Porto Digital, que se encontra circunscrito ao território recifense, havendo espaço para desenvolvimento além das fronteiras do município. Jaboatão pode se qualificar para se tornar uma área de expansão natural do Porto Digital.

Atualmente as potenciais iniciativas de inovação e tecnologia gerados no município são naturalmente direcionadas para o ambiente do Porto Digital em Recife, dificultando o desenvolvimento de um ambiente de inovação em Jaboatão. Ampliar as sinergias e complementariedades é necessário para a difusão do desenvolvimento.

Considerando a proximidade do município do Jaboatão dos Guararapes com o Recife, os fornecedores locais têm dificuldades de serem vistos pelos grandes empreendimentos, principalmente na área de tecnologia. A partir deste cenário, a Prefeitura executa dois projetos relacionados: um programa de qualificação de fornecedores locais para atender as empresas âncoras do município e o Núcleo de Inovação que busca conectar as *startups* locais com demandantes de tecnologia. Necessidade de fomentar a Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão, contudo estas iniciativas são acanhadas para a demanda.

Associado a precariedade do ambiente de inovação, surgem entraves de infraestrutura das redes de mobilidade enquanto suporte a atração de investimentos e ampliação da capacidade do polo logístico e industrial do município. Enfrentando deseconomias de mercado associada as precariedades de infraestruturas.

Eixo de Infraestrutura de Mobilidade

O atual dinamismo econômico observado no município nos últimos anos não vem sendo acompanhado de forma adequada pela estruturação de suas infraestruturas de suporte, o que tem levado o município a registrar efeitos cumulativos sobre a capacidade de carga das vias existentes, desestruturação dos sentidos dos fluxos sobre os eixos macro arteriais (BR-232 e BR-101), gerando estrangulamento do tráfego, longos períodos de retenção no tempo de deslocamento e deseconomias urbanas. Esse contexto tem levado a perda de competitividade dos arranjos produtivos locais, com a elevação dos custos de operação, sobrecarga das infraestruturas existentes e redução da qualidade de vida dos trabalhados, gerando, por sua vez, um efeito sistêmico no tecido urbano da Região Metropolitana do Recife (RMR) ao impactar a principal via de ligação norte sul (BR-101) e, consequentemente, o acesso ao Complexo Industrial e Portuário de Suape.

Tal situação-problema tem exigido por parte do município uma necessidade urgente no aumento do investimento público na resolução dessa deficiência estrutural, sobretudo na área do seu polo logístico, inclusive na perspectiva de viabilizar novos arranjos institucionais como parcerias público-privado.

Deficiência de conexões entre os modais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

A malha viária de Jaboatão dos Guararapes desempenha papel fundamental na integração metropolitana e no acesso a equipamentos urbanos essenciais. O desgaste natural, somado à sobrecarga estrutural e ao crescimento urbano, agravados pela ausência ou deterioração da pavimentação causada pelas chuvas e pelo alto fluxo de veículos, além de drenagem ineficiente e calçadas danificadas, tem comprometido a mobilidade e a segurança urbana, o que tem demandado intervenções emergenciais e planejadas por parte do município. A proposta atuará nos seguintes eixos estratégicos:

Corredores de Transporte Público: recapeamento asfáltico para melhorar o desempenho dos ônibus e reduzir tempo de viagem; Vias Coletoras: recapeamento asfáltico para melhorar o tráfego de veículos dentro dos bairros/comunidades, conectando vias arteriais e locais; Vias em Áreas de Interesse Social: pavimentação de pequenas vias para inclusão urbana e redução do isolamento de comunidades vulneráveis.

Eixo Socioambiental de Adaptação as Mudanças Climáticas

O município integra a lista de "Municípios mais suscetíveis a ocorrências de deslizamentos, enxurradas e inundações para serem priorizados nas ações da União em gestão de risco e de desastres naturais" (Pernambuco, 2024), produzida e atualizada pela Casa Civil, possuindo 397 setores de risco, dentre os quais, 260 classificados como de deslizamentos de massa e 137 com risco de inundação. Possui ainda casos de vulnerabilidade e risco (alagamentos e movimentos de massa) relevantes em seu território, com intervenções em andamento e já realizadas, e que estão sujeitos a agravamento com as projeções dos efeitos das mudanças climáticas nos próximos anos.

A territorialidade municipal, conformada em área de planície litorânea a leste com bacias hidrográficas propensas a efeitos da maré e suscetíveis a inundações em períodos chuvosos, acrescido a isso a oeste tem-se vastas áreas de morros da formação geológico-geomorfológica do grupo barreiras, com áreas de riscos de deslizamentos de massa e que juntas protagonizaram eventos com dezenas de mortos nas chuvas de 2022 e prejuízos financeiros, de infraestruturas e serviços públicos que até hoje não foram solucionados em sua totalidade.

Tal realidade torna ainda mais necessária e urgente a implementação de iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, principalmente no caso do Jaboatão dos Guararapes, que se constitui num município com mais de 74,52 km2 de área urbanizada (IBGE 2019: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/jaboatao-dos-guararapes/panorama), sendo a 3º maior do Estado, com elevada densidade demográfica e uma população que registra um perfil socioeconômico de precariedades.

Considerando a necessidade do enfrentamento dessa conjuntura de precariedades de forma sistêmica, abrangendo a estruturação de diversas áreas de atuação da prefeitura, e ancorado, sobretudo, na nova estratégia de desenvolvimento expressa no novo Plano Plurianual – PPA 2026-2029 do Jaboatão dos Guararapes, e cuja nova identidade organizacional, diretrizes e objetivos estratégicos já foram aprovados por meio de lei municipal, que instituiu a nova Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2026, busca-se expor abaixo uma descrição dos principais problemas observados por resultados, que irão facilitar a compreensão e a conexão com as soluções propostas, suas respectivas metas de atendimento e os indicadores propostos.

Elevada quantidade de setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos. O município do Jaboatão tem enfrentado de forma recorrente eventos climáticos extremos, que tem superado significativamente as médias históricas e com a ocorrência em curtos tempos de retorno. A magnitude do último evento ocorrido em 2022 gerou 68 mortos e elevados danos as infraestruturas (Figura 7), ao patrimônio e a diversos setores econômicos, em especial a economia popular. Cujos efeitos ainda se faz presentes no território municipal.



FIGURA 7: Deslizamento em Área de Morros, Bairro Jardim Monte Verde, Jaboatão dos Guararapes, 2022. (Fonte:G1.globo.com, 2022,)

Esses eventos extremos agravaram setores de risco existentes e geraram novas áreas propensas ao risco geológico geomorfológico ora sob a forma de movimentos de massa ora através de inundações (Figuras 8 e 9).



FIGURA 8: Alagamento no Baixo Curso do Rio Jaboatão, Bairro de Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, 2022. (Fonte: TR Drone, 2022.)



FIGURA 9: Alagamento no Baixo Curso do Rio Jaboatão, Bairro de Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes, 2024. (Fonte: TR Drone, 2024.)

No município foram mapeados 394 setores de risco no município de Jaboatão dos Guararapes. Desses, 269 setores correspondem a áreas de risco de deslizamento, no caso dos processos de inundação, foram avaliados 125 setores de risco em áreas informais (assentamentos precários), que foram refinados com os dados do mapa de perigo à inundação com base na aplicação do modelo matemático HEC-RAS, considerando a abrangência dos processos hidrológicos e as áreas sujeitas ao extravasamento das águas em eventos de inundação.

O número de moradores por grau de risco apresentou os seguintes resultados 45.147 moradores em áreas classificadas como R2 – Risco médio; 60.417 em R3 – risco alto; 53.638 em R4 – risco muito alto.

É importante salientar que, em relação aos setores de deslizamento, 20 deles foram selecionados pelo comitê gestor municipal para receberem obras estruturais de contenção e Soluções Baseadas na Natureza (SBN).

Os investimentos previstos neste subcomponente visam complementar outros projetos já captados junto ao PAC 2025 – Encostas de forma sistêmica, de modo a ampliar a intervenção de âmbito estrutural naqueles setores considerado de maior risco pelo Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres (PMRR) apresentado e, julho de 2025 e elaborado em parceria com o Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em parceria com a Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes e com apoio do Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional das Periferias e da Fundação FIOCRUZ (segue link para baixar os relatórios do Plano Municipal de Redução de Riscos: https://www.ufpe.br/enplageo.

Necessidade de ampliação das infraestruturas associadas a resiliência climática para enfrentar o contexto de riscos de inundação, deslizamentos de massa e obsolescência das infraestruturas de mobilidade e drenagem.

Outro ponto focal estruturação urbana do entorno da Lagoa Olho D'água. O quadro atual de ocupação do seu entorno torna necessária a viabilização de investimento com vistas a gestão do ordenamento/requalificação territorial de setores de risco em áreas ambientalmente sensíveis e com recursos estratégicos a subsistência metropolitana. A lagoa Olho D´Água e sua orla representam um potencial socioeconômico, ora como espaço de lazer, cultura e amenidades ambientais ora como novo front de urbanização.

A margens da Lagoa, enquanto região de contato imediato vem sofrendo com processos de urbanização que se intensificaram nos últimos 10 anos, registrando fenômenos de verticalização de médio e alto gabarito e uma série de problemas decorrentes das relações da sociedade com a natureza comuns a regiões periféricas de metrópoles nordestinas. Dentre os quais pode-se destacar alguns aspectos críticos identificados: a ausência de infraestrutura básica nessa área tem comprometido significativamente sua funcionalidade hidráulica e a qualidade ambiental, incluindo os problemas de mobilidade urbana e acesso as comunidades marginais a lagoa em períodos de maior pluviosidade, bem como ausência de ligação alternativa entre os bairros litorâneos.

O entorno da lagoa é ocupado por comunidades em condições precárias, com habitações improvisadas sobre terrenos vulneráveis a alagamentos e sem infraestrutura adequada. Este cenário compromete o ecossistema e aumenta os riscos para os moradores.

enfrentar a complexidade da situação com ações coordenadas nos âmbitos ambiental, social e econômico, envolvendo a requalificação da lagoa, saneamento, criação de infraestrutura habitacional e recuperação ambiental e mobilidade.

1. 2. 3. **Solução:**

1. 2. 3. Soluções

O enfrentamento do contexto de precariedades municipal expresso nos problemas descritos anteriormente, bem como, nas necessidades identificadas nos diversos diagnósticos setoriais realizados pela equipe técnica municipal e consubstanciados no plano diretor do município, atualmente na etapa final de revisão e, ainda, ancorado, sobretudo, na nova estratégia de desenvolvimento expressa no novo Plano Plurianual – PPA 2026-2029 municipal (**Anexo 03 – PPA Municipal)** cujo projeto de lei encontra-se atualmente em tramitação na Câmara Municipal do Jaboatão dos Guararapes, tendo, contudo, a nova identidade organizacional, diretrizes e objetivos estratégicos já aprovados pela Câmara Municipal, em agosto de 2025, por ocasião da aprovação da nova Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) (**Anexo 04 – LDO Municipal)**. Importante ressaltar que, de acordo com o calendário regimental, a LDO é aprovada antes do novo PPA e a LOA.

Assim, a nova estratégia de desenvolvimento contida na LDO aprovada, e que remete ao novo PPA 2026-2029, contempla os quatro componentes estratégicos de intervenção prioritária contidos neste Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes – JABOATÃO 2030 (**Anexo 05 – Plano de Ação Estratégico Municipal**). Para cada um desses componentes foram definidas um conjunto de propostas de ações coordenadas para o enfrentamento das questões identificadas, considerando, para tanto, as propostas de ação que tivessem maior magnitude de impacto, elevada abrangência territorial, capacidade de sinergias com outras ações em andamento e previstas.

Além disso, cabe ressaltar que as soluções ora propostas guardam compatibilidade sinérgica aos instrumentos de planejamento estratégico vigentes, a regulação do arcabouço jurídico incidente em nível Federal, a exemplo do Planos Plurianual Federal, **com especial atenção as suas áreas prioritárias e seus objetivos estratégicos**, além de plano setoriais de políticas públicas específicas. Destaca-se ainda a consideração da conjuntura de acoplamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU ratificados pelo Brasil.

É pertinente salientar a estreita compatibilidade de alinhamentos Estratégicos das Soluções Propostas a múltiplos eixos do Plano Plurianual Federal (PPA 2024–2027), especialmente nas áreas estratégicas dos eixos:

- **Combate à desigualdade territorial e inclusão produtiva;**
- **Meio ambiente, resiliência e adaptação climática;**
- **Desenvolvimento social e garantia de direitos e Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental.**

O presente pleito de operação de crédito reforça o papel do Jaboatão dos Guararapes como vetor de desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, em resposta a problemática central de vulnerabilidade urbana e ambiental + desigualdade territorial + déficit de infraestrutura adaptada ao clima, promovendo a integração urbana, a competitividade logística, a segurança climática e a qualidade de vida, com impactos positivos sobre a saúde, a educação e o respeito as fragilidades ambientais e a priorização de populações em situação de vulnerabilidade socioambiental.

As soluções seguem descritas abaixo em resposta aos **cinco eixos** de problemas identificados, como forma de estabelecer uma correlação direta entre os desafios e as soluções propostas.

EIXO 1 - DE GESTÃO TERRITORIAL E SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA

Este eixo tem como soluções:

A **Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários:** O serviço de implantação do cadastro multifinalitário propõe como soluções a modernização e atualização do cadastro imobiliário, de forma a garantir a precisão e a completude das informações sobre os imóveis e o território urbano. Para tanto, prevê o georreferenciamento das unidades imobiliárias, a revisão da Planta Genérica de Valores, implantação de banco de terras e equipamentos, elaboração do mapa da base territorial e a integração das bases cadastrais hoje dispersas, modernização de sistemas de gestão e softwares de suporte e reaparelhamento tecnológico como ações de suporte para promover melhorias no ordenamento municipal, nas políticas públicas e na eficiência da arrecadação municipal.

Possibilitando ainda a utilização dos dados de forma multifinalitário, apontando quais as políticas urbanas necessárias para o Município, com a formulação de políticas sociais, ambientais e de infraestrutura, bem como a gestão territorial. Assim, o cadastro multifinalitário constitui instrumento estratégico para fortalecer a autonomia financeira do Município, promover maior transparência administrativa e oferecer suporte técnico consistente às ações de governo e ao atendimento ao cidadão.

Dentre os produtos destaca-se:

- Realização de levantamento aerofotogramétrico acompanhado de restituição estereofotogramétrica atendendo às precisões cartográficas exigidas para cadastro imobiliário conforme NBR 13133 e ET-CQDG da INDE para a escala de 1:1000;
- Atualização do Banco de Dados Geoespacial Vetorial do município para a temática multifinalitária apontada na Infraestrutura de Dados Geoespaciais Municipal;
- Digitalização e georreferenciamento do contexto urbano legal, espacializando todas as plantas de loteamento e base cadastral de 1:5000, pertencentes à mapoteca municipal;
- Atualização da planta genérica de valores do município com base na nova cartografia municipal obtida dos levantamentos aerofotogramétricos;
- Licenciamento e criação de geoportais para operacionalização das bases cadastrais desenvolvidas. Treinamentos dos colaboradores nas novas plataformas SIG WEB;
- Elaboração do mapa de base territorial;
- Atualização do cadastro imobiliário e revisão da planta genérica de valores:
    - Levantamento aerofotogramétrico acompanhado de restituição estereofotogramétrica;
    - Implantação de módulos multifinalitários; Criação do banco de terras;
    - Implantação de ambiente SIG;
    - Aquisição de softwares e customização de soluções de tecnologia da informação;
- Criação do Banco de Terras Municipal;
- Implantação de Módulos Multifinalitários em ambiente SIG;
- Aquisição de softwares e customização de soluções de tecnologia da informação.

A Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública: Ocorrerá através do Desenvolvimento e implantação da plataforma de interoperabilidade de gestão pública municipal; Integração de sistemas, dados e serviços; Disponibilização e ampliação dos serviços em plataforma web e mobile; Aquisição de softwares e customização de programas; Atualização tecnológica de equipamentos, softwares e sistemas; Implantação de infraestrutura de segurança cibernética; Capacitação e contratação de serviço e/ou força de trabalho técnico municipal para desenvolvimento de sistemas.

Fortalecimento do Programa Jaboatão 2030: Visando sobrepor o contexto de precariedade de planejamento de ações estratégicas e de uma gestão por resultados o pleito propõe a requalificação do Setor de Planejamento e Monitoramento da Gestão Estratégica, hoje representado pela secretaria executiva de planejamento orçamento e gestão e pela secretaria executiva de projetos especiais e capitação de recursos, através da criação do núcleo de parcerias e relações institucionais, da Criação do banco de projetos de engenhara e arquitetura de projetos estruturantes e estratégicos, da implantação de espaço próprio e da dotação deste de infraestruturas de tecnologia da informação e equipamentos diversos para implantação do núcleo, além da aquisição de softwares e da customização de *dashboard web* e móvel para dar suporte ao monitoramento estratégico.

Promoção de assistência técnica para a implementação do programa, auxiliando na gestão e gerenciamento do projeto, além de apoiar a criação da UGP, bem como a auditoria e avaliação das ações executadas no âmbito da operação. Apoio as ações de gestão do programa com a realização de aquisição de bens, contratação de consultorias entre outras atividades que visem fortalecer as ações implementadas no programa.

Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras: Através de ações de fortalecimento à gestão e administração do Programa, entre elas, a potencial contratação de uma empresa que ficará corresponsável pelo

gerenciamento do Programa ou a qualificação de equipe interna.

Supervisão das obras a serem executadas pelo Projeto e implantação da metodologia BIM (Modelagem de Informação da Construção) a partir da aquisição tanto do software quanto do hardware necessários para o bom funcionamento da plataforma e, além disso, um processo de capacitação do corpo técnico da gestão municipal para orientação quanto a análise de projetos seguindo as premissas da nova metodologia.

Atualização de Normativas e Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos e Ambientais: Atualização e regulamentação dos principais instrumentos urbanísticos e ambientais previstos no plano diretor.

Destaca-se ainda o reaparelhamento e aquisição de softwares de suporte a gestão e supervisão técnica e requalificação do Setor de Planejamento e Monitoramento da Gestão Estratégica.

Fortalecimento do Gerenciamento do Programa: Através da contratação de estudos, projetos e consultoria/apoio técnico especializado, no que couber, com vistas a implementação das ações do projeto, a exemplo da realização do Trabalho Técnico Social antes, durante e após a execução das intervenções, com o apoio da Secretaria Municipal de Ação Social, com vistas a promover a participação social e a promoção da cidadania como um dos principais valores do Programa.

Fortalecimento dos canais de controle e auditoria: Se dará através da capacitação das equipes de auditoria interna e contratar auditoria externa para o acompanhamento do projeto Jaboatão 2030, bem como apoiar ações de divulgação do Programa, por meio de publicação de materiais ou promoção de eventos, com o objetivo de disseminar as boas práticas e soluções empregadas, além das lições aprendidas.

As ações deste Eixo contribuirão diretamente para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE: 209 - Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade;

OE: 303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população;

OE: 306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos;

EIXO 2 - DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Este eixo tem como soluções:

Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão:_Esta solução está atrelada ao eixo de problemas do Desenvolvimento Econômico**.**

A implantação do Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão visa fornecer infraestrutura adequada de ambiente de incubação de negócios inovadores, salas de reunião e espaços de qualificação profissional. Além do espaço físico adequado a desenvolvimento desses negócios, garantir a disponibilização de equipamentos para o desenvolvimento de protótipos de hardware, software e recursos de geradores e internet de alta velocidade.

As ações deste Eixo contribuirão diretamente para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE: 209 - Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade;

OE: 303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população;

EIXO 3 - SOCIOAMBIENTAL DE ADAPTAÇÃO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Este eixo tem como soluções:

Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas: Implantação de um **trecho da via parque na orla leste da Lagoa Olho D'Água** e suas vias vicinais imediatas com aproximadamente **5km**, com soluções de adaptação as mudanças climáticas. Destaca-se como diagnóstico de referência do Plano de Ação

Estratégica Urbanização da lagoa Olho D'Água, (**Anexo 05**) e (**Anexo 07** – **Mapa de Situação do Trecho da Via Parque**).

Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos: Intervenção nos **10 setores classificados como de muito alto risco geológico-geomorfológico pelo Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR)** municipal e validados pelo comitê participativo de gestão do PMRR, que terão **impacto em mais de 20% da população exposta ao risco em risco muito alto**.

As soluções baseiam-se ora em intervenções clássicas de engenharia e ordenamento urbano ora em soluções baseadas na natureza de forma principal ou complementar. Visando assim, atender a segurança da habitabilidade como a sustentabilidade ambiental.

Destaca-se como diagnóstico de referência o Plano Municipal de Redução de Riscos, disponível no endereço eletrônico: https://www.ufpe.br/enplageo.

As ações deste Eixo contribuirão diretamente para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE: 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

OE: 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

OE: 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas;

EIXO 4 - DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE

Este eixo tem como soluções:

A Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município: A ampliação das vias pavimentadas em cerca de 8,4km de vias de alta capacidade de carga irá viabilizar o escoamento da produção no Polo Industrial e Logístico do Jaboatão dos Guararapes, situado às margens da BR-101 Sul, ampliando, assim, a capacidade de atração/implantação de novos empreendimentos.

Projeta-se preliminarmente a construção de trechos de vias conectando os três principais eixos de desenvolvimento do polo produtivo municipal, a saber: a BR-101 (variante antiga) BR-101 (nova variante sul) e a PE-17 (eixo de integração leste-oeste). (Anexo 06 - **Mapa de Intervenções Prioritárias do Polo Industrial**)

Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades: Através da implantação de **27km de pavimentação de vias** e **o recapeamento de 30km das vias existentes**. Compreende a elaboração de projetos básicos e executivos e a execução das vias estruturantes, coletoras e vicinais. Destaca-se como diagnóstico de referência o Plano de Ação Estratégico Municipal **anexo 05 – Ação de Infraestrutura**.

As ações deste Eixo contribuirão diretamente para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE: 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

OE: 205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios;

OE: 210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem;

EIXO 5 - DA INFRAESTRUTURA SOCIAL

Este eixo tem como soluções:

Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental: Através da ampliação e reestruturação do parque escolar municipal por meio da **ampliação de 2 creches** e a **construção de 01 creche, da construção de 03 escolas de Ensino Fundamental**, ocorrerá a ampliação da oferta de vagas nessas etapas de ensino minimizando, assim, a demanda reprimida (**Anexo**

2 – Demanda de Matrículas Reprimidas).

Essas ações visam atender à crescente demanda da população, assegurando o acesso à educação desde a primeira infância até os anos finais do Ensino Fundamental, em conformidade com as diretrizes da política educacional brasileira e os objetivos estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação (PNE).

Destaca-se como diagnóstico de referência o Plano de Ação Estratégica Municipal **anexo 08 – Ações de Educação**.

Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis: 10 Unidades de Saúde da Família (**USF/UBS) Porte II**, com base no projeto padrão constante no Portal do Ministério da Saúde, e com valores de referência estabelecidos pelo Novo PAC - Programa de Aceleração do Crescimento; e **01 Unidade de Saúde da Família (USF/UBS) Porte III**, também com base no projeto padrão constante no Portal do Ministério da Saúde, e valores estabelecidos pelo Novo PAC - Programa de Aceleração do Crescimento.

Este subcomponente prevê a implantação e expansão da Estratégia Saúde da Família (eSF), por meio da construção de Unidades de Saúde da Família (USF) e da ampliação do número de equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, com o objetivo de alcançar o patamar mínimo de 70% de cobertura municipal. Essa iniciativa responde diretamente à heterogeneidade da cobertura populacional por regional, às desigualdades socioassistenciais e territoriais da APS, garantindo maior acesso da população aos serviços básicos de saúde, promovendo equidade na distribuição das equipes e fortalecendo o cuidado integral.

A melhoria física das unidades permitirá o atendimento integrado, potencializa a atenção preventiva e oferece condições para a incorporação de novas tecnologias e práticas de cuidado, fortalecendo o modelo de atenção centrado na comunidade.

O impacto dessas soluções sobre os dados epidemiológicos é significativo. A expansão da cobertura e o acompanhamento mais próximo da população contribuem para o monitoramento constante de agravos endêmicos e epidêmicos, como arboviroses, tuberculose e sífilis congênita, possibilitando respostas rápidas e planejadas. Espera-se a melhoria dos indicadores de morbidade e mortalidade, redução da mortalidade infantil e materna e maior equidade no acesso aos serviços, refletindo na qualidade de vida da população e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde com impactos diretos no território municipal.

Destaca-se como diagnóstico de referência do Plano de Ação Estratégica Municipal, (**Anexo 09 – Ações de Saúde**).

Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis: Se dará através da requalificação dos principais espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis, enquanto equipamentos cruciais para a inclusão social e a promoção da saúde física e mental, sobretudo para os grupos populacionais mais vulneráveis como crianças e adolescentes, além de se constituírem como praticamente os únicos espaços de amenização ambiental, em áreas muito adensadas, distribuídos nos cinco distritos municipais, tendo como intervenções prioritárias os equipamentos esportivos e de lazer associados, a exemplo dos seguintes equipamentos/espaços:

- Campo da FEBEM (Cavaleiro);
- Campo de Floriano (Floriano);
- Campo da Estação (Engenho Velho);
- Campo do MEC (Dois Carneiros);
- Campo do Coroa (Vila Rica);
- Campo da Vila UR-06 (Zumbi do Pacheco);
- Campo e Pracinha (Jardim Jordão);
- Campo da Rua Rio Jaboatão (Marcos Freire);
- Capo do Areeiro (Cajueiro Seco);
- Campo e Pracinha (Barra de Jangada);
- Campo da Prefeitura (Prazeres).
- Ginásio Reginaldo Montenegro (Jaboatão Centro).

Além destes equipamentos previamente identificados, poderão ser beneficiados outros equipamentos de lazer, cultura e espaços livre públicos, desde que atendam aos mesmos critérios de localização e finalidade.

Destaca-se como diagnóstico de referência do Plano de Ação Estratégica Municipal, (**Anexo 03 – ações de Desenvolvimento Econômico/Esporte e Lazer**).

As ações deste Eixo contribuirão diretamente para os Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

OE: 102 -Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS);

OE: 103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes;

OE: 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

1. 2. 33. **Resultado:**

São apresentados abaixo os benefícios diretos e externalidades positivas que se espera obter com a implementação deste projeto, tendo por base o contexto, os problemas e as soluções propostas anteriormente apresentados nos capítulos anteriores.

De partida, é importante ressaltar que as ações objeto deste pleito **possuem impacto sistêmico e cumulativo sobre a totalidade do território e da população municipal**, podendo variar em escalas intraurbana e com resultados diversos segundo a natureza da política pública vinculada diretamente a cada um de seus componentes estruturadores.

Vale salientar que se tem como resultado ampliado, em potencial, **promover o desenvolvimento urbano e social sustentável, com foco em equidade territorial, inclusão produtiva e adaptação as mudanças climáticas no município do Jaboatão dos Guararapes**, e que deverá ser alcançado a partir da soma dos resultados parciais esperados segundo o atendimento aos objetivos específicos propostos.

A seguir são descritos os **resultados esperados** por cada um dos componentes:

COMPONENTE 1 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL.

Resultados Esperados:

1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Como resultados esperados, temos a modernização da gestão municipal, com a atualização contínua das informações geoespaciais do território, resultando em dados com alta precisão de confiabilidade.

A integração de cadastros temáticos (fiscais, sociais, ambientais, patrimoniais, habitacionais e de infraestruturas) numa única base, fortalecerá a operação entre os órgãos da administração e reduzirá custos. O reconhecimento das áreas formais e informais do Município, ampliando a abrangência das políticas e serviços públicos e de regularização fundiária. Neste sentido, serão implantadas uma tributação mais justa e a promoção da função social da propriedade urbana.

1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

Como resultados projeta-se: o aumento da eficiência administrativa e fiscal com a integração; Melhoria da formulação de políticas públicas baseadas em evidências; Ampliação do acesso do cidadão a serviços digitais; Maior transparência e participação social; Redução de custos operacionais; Fortalecimento da cooperação federativa; Benefício direto para o total da população municipal 647mil habitantes e os mais de 6mil funcionários municipais.

1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Benefícios diretos e externalidades positivas: Aumento de número de startups/empresas locais atuando na área de inovação e tecnologia; aumento de negócios/parcerias fechadas entre grandes empresas do município e startups/empresas locais; aumento do número de cursos de formação e qualificação na área de TIC e correlatas e aumento da força de trabalho atuando em inovação e tecnologia no município.

Beneficiários: estudantes de TIC e correlatos; empreendedores locais; grandes empresas; instituições de ensino e entidades do setor público.

1.4 Implantação do Núcleo de Gestão de Projetos e Monitoramento – NGPM.

Com a implantação do Núcleo Gestão de Projetos e Monitoramento espera-se como resultados a ampliação da eficiência do monitoramento das ações estratégicas para o município, a minimização de ações oriundas de órgãos de

controle externo e interno, a ampliação da capitação de recursos, a padronização de fluxos de processos e capacidade de carga de operação dos contratos e convênios, a qualificação dos recursos humanos, em especial o quadro efetivo.

A construção de um espaço físico adequado e de equipamentos de suporte ampliarão a capacidade de gestão e possibilitaram concentrar as diversas áreas afetas a capitação de recursos, ao monitoramento e gestão.

COMPONENTE 2 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

Resultados Esperados:

2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Melhoria da infraestrutura viária, garantindo condições adequadas de tráfego para veículos de carga e transporte de mercadorias, pavimentando e implantando sistemas de drenagem eficiente para evitar danos causados por chuvas, priorizando rotas de escoamento de produção e de distribuição. Fortalecendo, assim, as vantagens locais comparativas na atração e ampliação de empreendimentos, ampliando, desta forma, a arrecadação do município e a geração de emprego formal e a melhoria da renda dos trabalhadores. (**Anexo 6 - Mapa de Intervenções Prioritárias do Polo Industrial**)

2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

Reduzir os buracos e deformações, proporcionando maior conforto e segurança no deslocamento de veículos e pedestres, melhorar a eficiência do sistema de drenagem pluvial, com melhor escoamento das águas das chuvas e diminuição de danos estruturais, otimizar a circulação de veículos, especialmente em corredores de transporte público e vias coletoras. Diminuir os custos de manutenção recorrente, com pavimentação e drenagem mais resistentes e planejadas, implantando calçadas acessíveis, seguras e contínuas, promovendo a mobilidade ativa (a pé ou de bicicleta), fazendo uso de soluções sustentáveis, reduzindo os riscos de quedas, colisões e outros acidentes urbanos.

2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Promover a estruturação sustentável do entorno da Lagoa Olho D'água; Ampliar a conexão entre os bairros mais populosos do município (Piedade, Candeias e Barra de Jangada); ampliar a extensão dos moldais não motorizados, adaptar a infraestrutura ao movimento das marés e aos eventos climáticos extremos. (**Anexo 7 - Mapa de Intervenção do Trecho da Via Parque Projetada**)

A Implantação de trecho da Via Parque da Lagoa Olho D'água criará uma alternativa de mobilidade as comunidades que ficam isoladas nos períodos de chuvas intensas associadas a alta das marés, bem como servirá de rota de ligação alternativa para 160mil habitantes nos bairros litorâneos. Com o projeto espera-se salvaguardar as áreas de amortecimento da drenagem natural, redirecionar fluxos estrangulados da microdrenagem tributária a lagoa e ampliar em 5km as vias não motorizadas (ciclovias, ciclofaixas, e calçadão linear arborizado, ampliando assim o percentual de arborização urbana e a consolidação de vergetação de restinga as margens da lagoa.

2.4: Redução dos setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Garantir segurança, condições dignas de moradia e melhor qualidade de vida para as famílias que residem nas áreas de risco para as populações residentes nas áreas de risco contempladas com as intervenções nos 10 setores de muito alto risco selecionados. Ampliando, assim, a efetividade das ações previstas no Plano Municipal de Redução de Riscos. As intervenções preveem a consolidação do sistema de alertas da Defesa Civil municipal em cerca de 25% das áreas de muito alto risco.

COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA SOCIAL EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.

Resultados Esperados:

3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Espera-se um incremento das matrículas nas regionais planejadas atingido diretamente a ODS 4 e de forma transversal as ODS 1 e 2, com o aumento de estudantes matriculados e qualificação da educação desses

estudantes. Desse modo com essa ampliação planejada os incrementos dar-se-ão dá seguinte forma:

- Regional 01 – educação infantil (pré-escola) com aumento de 11,44% e no ensino fundamental (anos iniciais) de 8,5%;
- Regional 03 – educação infantil (creche) aumento de 42,73%, educação infantil (pré-escola) 8,03% e no ensino fundamental (anos iniciais) de 24,23%;
- Regional 05 - educação infantil (creche) aumento de 40,16% e educação infantil (pré-escola) de 11,54%;
- Regional 06 - ensino fundamental (anos finais) aumento de 6,83%.

O aumento de matrículas na Rede Municipal de Ensino representa não apenas a ampliação do acesso à educação, mas também a possibilidade de maior captação de recursos para o município. Assim, cada nova matrícula contribui diretamente para o incremento das receitas destinadas à manutenção e ao desenvolvimento da educação, fortalecendo as condições de investimento em infraestrutura, profissionais e práticas pedagógicas de qualidade.

3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

A implementação do projeto de construção e ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF) permitirá alcançar resultados diretos e mensuráveis, beneficiando de forma ampla a população do município, especialmente os territórios mais vulneráveis. Espera-se a ampliação da cobertura da ESF de 57% para 70%, com a implantação de novas equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, beneficiando aproximadamente 45.000 habitantes da Regional 6, região mais populosa e com maior déficit assistencial, além de atender às necessidades de outras regionais com cobertura abaixo da meta.

Os benefícios diretos incluem o aumento do acesso a serviços de atenção primária, o acompanhamento contínuo da população, o fortalecimento da resolutividade local e a redução da sobrecarga nos serviços de média e alta complexidade. Espera-se maior adesão a tratamentos de doenças crônicas, diminuição de agravos como tuberculose, sífilis congênita e arboviroses, e melhoria nos indicadores de morbidade e mortalidade infantil e materna.

A infraestrutura adequada das UBS permitirá atendimento qualificado, condições seguras de trabalho para os profissionais e ampliação das ações preventivas e educativas, garantindo cuidado integral e humanizado.

Entre as externalidades positivas, destacam-se a promoção da equidade territorial, com redução das desigualdades históricas no acesso à saúde; o fortalecimento do vínculo entre comunidade e equipe de saúde; a geração de dados epidemiológicos mais precisos, possibilitando planejamento e monitoramento mais eficazes; e a valorização do capital humano local, com melhoria das condições de trabalho e motivação das equipes.

Adicionalmente, espera-se impacto positivo em determinantes sociais da saúde, como educação em saúde, higiene e prevenção de doenças, refletindo em melhor qualidade de vida e produtividade da população atendida.

3.3: Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Como benefícios diretos e externalidades positivas tem-se que a requalificação dos campos de futebol do município proporcionará melhoria dos gramados, instalação de iluminação e arquibancadas e criação de áreas de convivência, garantindo espaços seguros e adequados para a prática esportiva e lazer. Espera-se, assim, promover bem estar, inclusão social e fortalecimento da convivência comunitária, além de contribuir para redução da vulnerabilidade de jovens em áreas de risco.

Este subcomponente atuará diretamente sobre problemas como falta de manutenção, uso intenso sem planejamento, limitações orçamentárias e condições ambientais adversas, oferecendo soluções estruturais e sustentáveis que transformem os espaços esportivos e de lazer em instrumentos de cidadania e qualidade de vida em Jaboatão dos Guararapes.

COMPONENTE 4 – GESTÃO DO PROGRAMA

Resultados Esperados:

4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.

Espera-se com esta ação o fortalecimento das equipes de gestão e administração municipal, em especial atenção através da capacitação e qualificação dos recursos humanos das unidades executoras dos projetos - gestores de contratos, ordenadores e fiscais de contratos.

Implantação da metodologia BIM (Modelagem de Informação da Construção) a partir da aquisição tanto do software quanto do hardware necessários para o bom funcionamento da plataforma e, além disso, um processo de capacitação do corpo técnico da gestão municipal para orientação quanto a análise de projetos urbanísticos e ambientais, elaboração e gestão de projetos de engenharia e arquitetura.

Atualização de normativas e regulamentação de instrumentos urbanísticos e ambientais: Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) e regulamentação dos principais instrumentos urbanísticos e ambientais previstos no plano diretor.

O reaparelhamento de equipamentos e mobiliários, associado a aquisição de softwares de suporte a gestão e supervisão técnica irá dinamizar os setores finalísticos da execução de obras das unidades administrativas municipais.

Com a requalificação do Setor de Planejamento e Monitoramento da Gestão Estratégica espera-se que seja fortalecida a gestão por resultados, o monitoramento de forma continuada das ações estratégicas.

4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.

Realização do Trabalho Técnico-Social antes, durante e após a execução das intervenções, a fim de garantir a participação social e a promoção da cidadania como um dos principais valores do Programa. A implantação do núcleo de parcerias e relações institucionais, proporcionará sinergias entre as ações das diversas instituições públicas e privadas, levando a minimização de custos, ausência de sobreposições de ações e potencialização de resultados.

A criação do banco de projetos de engenhara e arquitetura e dos estudos de viabilidade das ações estratégicas para o município irá potencializar a captação de recursos, irá reduzir o tempo de execução das obras e direcionará os recursos do tesouro municipal de forma mais equilibrada.

4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.

O projeto prevê a capacitar das equipes de auditoria interna e a contratação de auditoria externa para o acompanhamento do projeto Jaboatão 2030, bem como apoiar ações de divulgação do programa, por meio de publicação de materiais ou promoção de eventos, com o objetivo de disseminar as boas práticas e soluções empregadas, além das lições aprendidas.

A aquisição de infraestrutura e equipamentos irá assegurar as condições de trabalho necessárias ao desempenho do controle dos recursos públicos e a garantia da transparência dos atos da gestão municipal e um ambiente favorável a interlocução social.

1. 3. **Objetivo**

O Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes – JABOATÃO 2030, tem como Objetivo Geral:

Promover o desenvolvimento urbano e social sustentável, com foco em equidade territorial, inclusão produtiva e adaptação as mudanças climáticas no município do Jaboatão dos Guararapes/PE, na perspectiva de sua inserção enquanto município metropolitano.

E como objetivos específicos:

1. Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.
2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.
3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis, com elevados índices de violência urbana, alta dependência de transferências assistenciais de suas populações.

Para clarificar a correlação entre os Objetivos e os componentes e seus resultados apresenta-se o **Quadro 2** ilustrativo a seguir.

QUADRO 2: **Correlação entre os Objetivos, Componentes e Resultados do Projeto JABOATÃO 2030.**

OBJETIVO GERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	COMPONENTE	RESULTADOS
Promover o desenvolvimento urbano e social sustentável, com foco em equidade territorial, inclusão produtiva e adaptação as mudanças climáticas no município do Jaboatão dos Guararapes/PE	**1.** Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.	**Componente 1** - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.	**1.1:** Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.
			1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.
			1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes.
	2 Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.	**Componente 2 –** Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.	**2.1:** Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.
			2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.
			2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.
			2.4 Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

OBJETIVO GERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	COMPONENTE	RESULTADOS
3 Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.	**Componente 3** - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis.	**3.1** Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.	
		3.2. Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.	
		3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.	
1. Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.	**Componente 4** – Gestão do Programa.	**4.1** Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.	
		4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.	
		4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.	

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Quantitativo de módulos multifinalitários disponibilizados a gestão municipal (MMD).

Descrição:

Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador MMD contribui diretamente para Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal, pois, a implantação desses módulos possibilita a centralização de serviços, a coleta estruturada de dados e o atendimento qualificado ao cidadão, promovendo maior agilidade administrativa e uso racional dos recursos públicos.

Ao mensurar a presença desses módulos em diferentes unidades administrativas e seus respectivos setores, o indicador expressa o avanço das ações voltadas à transformação digital e à eficiência fiscal, em consonância com o objetivo específico estabelecido.

Fórmula de cálculo do indicador:

$MMD = \frac{TM}{\sum_{i=1}^{n} TM_i}$	TM: Total de módulos previstos TM_i: Cada módulo implantado individualmente n: Número total de módulos implantados
*TM será coletado no termo de referência do projeto e TM_i e n nos relatórios de prestação de serviço contratual do referido projeto.	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos;

Vinculado ao objetivo específico:

1. Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.

Componente vinculado: 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

Produto vinculado: 1.1 Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: O indicador visa a construção de módulos multifinalitários definidos no termo de referência, destinados a atender múltiplas funções administrativas.

Mensurável: É mensurável pois será considerada cumprida com a execução **de 100% dos módulos previstos no planejamento técnico.**

Atingível: A quantidade de módulos será dimensionada conforme critérios técnicos e orçamentários estabelecidos no termo de referência, garantindo viabilidade física e financeira.

Relevante: A implantação dos módulos contribuirá diretamente para a melhoria da infraestrutura urbana e dos serviços públicos, especialmente em áreas prioritárias.

Temporal: O cumprimento do indicador será monitorado dentro do cronograma estabelecido e linha de base de referência da meta ao longo dos anos de execução do projeto.

Meta:
META: Implantar Módulos Multifinalitários

Descrição: Executar a implantação de 100% dos módulos multifinalitários definidos no termo de referência, conforme planejamento técnico e operacional a ser elaborado.

Valor da meta: 100% dos Módulos Multifinalitários implantados no ano 3

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: Ano 3

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: Atualmente o município não possui módulos multifinalitário - ANO 2025 (MMD_{base}= 0)

Ano 1	Serão elaborados os projetos, peças licitatórias e em seguida adquiridos os equipamentos e infraestrutura.	MMD = 0
Ano 2	Realização de serviços aerofotogramétricos e cadastrais e implantação de sistema SIG. Ao final do ano 2 espera-se que 75% dos Módulos Multifinalitários estejam implementados	MMD = 75%
Ano 3	Implantação da totalidade dos Módulos Multifinalitários	MMD= 100%

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Percentual de cobertura da do cadastro imobiliário atualizado (CACI).

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador CACI contribui diretamente para Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal, evidenciando o impacto direto das ações fundiárias na eficiência fiscal do município. De forma objetiva, os efeitos da regularização imobiliária sobre a ampliação da base tributária e o fortalecimento da arrecadação é demonstrado no resultado do indicador.

Fórmula de cálculo do indicador:

$$CACI = \left(\frac{Tir}{Att}\right) x\ 100$$	Tir: Total de km² de imagens cobertas e restituídas Att: Área urbana total do território municipal em km²
* Tir será coletado nos relatórios de prestação de serviço do contrato e Att está definida no Plano Diretor do Município de Jaboatão dos Guararapes	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos;

Vinculado ao objetivo específico:

1.Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.

Componente vinculado: 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

Produto vinculado: 1.1 Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: A atualização do cadastro imobiliário será realizada por meio de coleta, processamento de imagens e visitas de campo, conforme metodologia específica descrita no termo de referência.

Mensurável: O indicador será mensurado pelo percentual de cobertura cadastral alcançado, com o objetivo de atingir 100% da área urbana.

Atingível: Trata-se de uma prática consolidada na gestão pública, com histórico positivo de execução baseada em imagens georreferenciadas, o que torna viável a conclusão do cadastro na área urbana proposta.

Relevante: A ação é estratégica para o fortalecimento da gestão urbana, tributária e territorial, impactando diretamente na eficiência dos serviços públicos.

Temporal: O indicador deverá ser cumprido dentro do prazo estabelecido no cronograma do projeto e linha de base de referência da meta ao longo dos anos de execução do projeto.

Meta:
META: Atualizar cadastro imobiliário da área urbana total do Município

Descrição: Realizar a atualização cadastral imobiliária de 100% da área urbana do município.

Valor da meta: 100% da cobertura do cadastro imobiliário atualizado da área urbana do Município no ano 4

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: Ano 4

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: Atualmente o município possui 24,5 Km^2 de cobertura do cadastro imobiliário e 79,8 Km^2 de área urbana (CACI 2025= 30,9 %).

Ano 1	Serão elaborados os projetos, peças licitatórias e em seguida adquiridos os equipamentos e infraestrutura.	CACI = 30,9%
Ano 2	Realização de serviços aerofotogramétricos. Ao final do ano 2 espera-se que 55% da cobertura tenha sido realizada.	CACI = 55,0%
Ano 3	100% de cobertura realizada	CACI = 100,0%

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Índice de integração de sistemas ativos e acessíveis online (IIC).

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O IIC reflete o índice de sistemas ativos e acessíveis online e está diretamente relacionado ao objetivo de modernização da gestão pública municipal.

Ao mensurar esse dado, demonstra-se o esforço da administração em tornar os serviços mais ágeis, acessíveis e eficientes, por meio de plataformas digitais que reduzem retrabalho, fortalecendo o governo digital e promovendo maior racionalidade na gestão dos recursos públicos.

Fórmula de cálculo do indicador:

$IIC = \left(\frac{QSI}{TSO}\right)$	QSI: Quantitativo de sistemas integrados TSO: Total de sistemas operados pelo município
*QSI será identificado nos relatórios de resultado de projetos de integração e TSO possui valor fixo de 107 sistemas	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população;

Vinculado ao objetivo específico:

1.Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.

Componente vinculado: 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

Produto vinculado: 1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: Os sistemas digitais ativos da administração municipal serão selecionados com base em critérios de relevância e impacto na prestação de serviços públicos.

Mensurável: O progresso será acompanhado por meio do Índice de Integração de Sistemas (IIC), detalhada em fórmula específica nesse item.

Atingível: Considerando o histórico usado por analogia de desenvolvimento de sistemas pela equipe interna de TI do município, a meta é viável técnica e operacionalmente.

Relevante: A integração dos sistemas é estratégica para a modernização da gestão pública, reduzindo retrabalho, ampliando o acesso aos serviços e promovendo maior eficiência administrativa.

Temporal: O indicador será cumprido dentro do prazo estabelecido no cronograma do projeto e linha de base de referência da meta ao longo dos anos de execução do projeto.

Meta:
META: Integrar Sistemas Computacionais para Modernização da Gestão Pública

Descrição: Integrar sistemas ativos e acessíveis online ao ambiente digital unificado da administração municipal.

Valor da meta: 0,2 no ano 4

Unidade de medida da meta: unidade

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: Ano 2

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: Atualmente o município possui 107 sistemas não integrados (IIC 2025= 0)

Ano 1	Infraestrutura de TI	IIC= 0
Ano 2	Aquisições de softwares e início da customização de programas e sistemas	IIC= 0,05
Ano 3	customização de programas e sistemas	IIC= 0,12
Ano 4	customização de programas e sistemas	IIC= 0,2

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Índice de variação de ET - Empresas em Serviços Técnicos especializados, P&D, Tecnologia e economia criativa (IET).

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador IET está alinhado ao objetivo de modernização da gestão pública municipal, ao demonstrar o esforço da administração em promover inovação, qualificação e estímulo ao empreendedorismo.

Ao mensurar esse dado, evidencia-se o impacto direto das iniciativas voltadas à geração de valor, fortalecimento institucional e dinamismo na oferta de soluções estratégicas para o território.

Fórmula de cálculo do indicador:

$$IET = \frac{(ETP - ETA)}{ETA} X\ 100$$	ETA: Quantidade de ET no período posterior ao projeto ETP: Quantidade de ET no período anterior ao projeto
*ETA e ETP serão coletados na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nos períodos indicados.	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

209 - Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade;

Vinculado ao objetivo específico:

1. Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.

Componente vinculado: 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

Produto vinculado: 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: A ampliação do número de empresas nos setores de serviços técnicos especializados, P&D, tecnologia e economia criativa, é específica pois baseia-se nas atividades econômicas pré-definidas utilizadas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Mensurável: O indicador será monitorado por meio do Índice de Variação de ET (IET), com o objetivo de atingir um crescimento de 4% sobre a base atual de ETs.

Atingível: O indicador é viável considerando o potencial de atração de novos empreendimentos, as políticas de incentivo previstas e o tempo disponível para implementação das ações de fomento.

Relevante: O crescimento desses setores é estratégico para a modernização da economia local, geração de empregos qualificados e fortalecimento da base produtiva voltada à inovação.

Temporal: O aumento deverá ser alcançado até o encerramento do ciclo de execução do projeto, conforme linha de base de referência da meta ao longo dos anos de execução do projeto.

Meta:
META: Promover o crescimento do registro de empresas no município voltadas para a Inovação e tecnologia (ETs)

Descrição: A meta visa fomentar o crescimento do número de empresas atuantes nos setores de serviços técnicos especializados, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e economia criativa, fortalecendo o ecossistema de inovação e desenvolvimento econômico local.

Valor da meta: 4% no ano 4

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2029

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: ANO 2025 - o município possui 1.310 ETs (setembro de 2025), sendo este o marco inicial para a contagem da variação. Portanto, considera-se IET 2025=0%

Ano 1	Requalificações, reformas e novas Infraestruturas	IET= 0%
Ano 2	Aquisição de equipamentos e infraestruturas de tecnologia. Capacitações e treinamento	IET= 0%
Ano 3	Capacitações e treinamento	IET= 2%
Ano 4	Capacitações e treinamento	IET= 4%

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Somatório do número de profissionais capacitados pelo equipamento público implantado (NPCE).

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador NPCE está alinhado ao objetivo de modernização da gestão pública municipal, pois demonstra o investimento na qualificação técnica dos servidores. Ao mensurar esse dado, evidencia-se o esforço da administração em preparar equipes para atuar com inovação, tecnologia e eficiência, especialmente no contexto da implantação do Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Fórmula de cálculo do indicador:

$NPCE = \sum PC$	PC – Profissional capacitado
* PC será coletado nos relatórios de treinamento do Núcleo	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

209 - Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade;

Vinculado ao objetivo específico:

1.Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal.

Componente vinculado: 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

Produto vinculado: 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: A capacitação de profissionais por meio de ações formativas planejadas com base nos déficits de competências identificados em pesquisas realizadas no ecossistema de Inovação e tecnologia da região, é específico pois está alinhada a conteúdos identificados como necessários locais de qualificação técnica.

Mensurável: O indicador será mensurado pelo somatório de profissionais capacitados, de acordo com o registro das ações formativas.

Atingível: O indicador é viável considerando a estrutura do equipamento implantado, a disponibilidade de recursos e a demanda por qualificação técnica do ecossistema.

Relevante: A capacitação está diretamente relacionada ao fortalecimento da gestão pública, promovendo inovação, eficiência e melhoria na prestação de serviços.

Temporal: O indicador deverá ser cumprido dentro do período de execução do projeto, conforme linha de base de referência da meta.

Meta:
META: Capacitar Profissionais para Inovação e Gestão Pública.

Descrição: Capacitar profissionais vinculados ao ecossistema de tecnologia e inovação do município, por meio das atividades desenvolvidas pelo Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Valor da meta: 100

Unidade de medida da meta: pessoas

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2029

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: NPCE 2025=0

Ano 1	Requalificações, reformas e novas Infraestruturas	PC =0
Ano 2	Aquisição de equipamentos e infraestruturas de tecnologia. Capacitações e treinamento	PC = 30
Ano 3	Capacitações e treinamento	PC = 60
Ano 4	Capacitações e treinamento	PC = 100

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Percentual de pavimentação concluída em áreas priorizadas (PPC).

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador PPC está alinhado ao objetivo de expansão da infraestrutura urbana estratégica, ao demonstrar o avanço das obras que organizam o polo logístico do município e fortalecem os territórios potencialmente produtivos e ampliam as vantagens locacionais comparativas. A pavimentação melhora a mobilidade, reduz riscos e contribui para o desenvolvimento da geração de oportunidades de emprego formal.

Fórmula de cálculo do indicador:

$PPC = \frac{EPC}{ETP} \; x \; 100$	EPC: Extensão pavimentada concluída (em km) ETP: Extensão total planejada (em km)
*ETP será coletado no termo de referência do projeto e EPC nos relatórios de prestação de serviço contratual do referido projeto.	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios;

Vinculado ao objetivo específico:

2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.

Componente vinculado: Componente 2 - Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.

Produto vinculado: 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: O indicador inclui a pavimentação, serviços complementares de microdrenagem, acessibilidade e arborização urbana, com o objetivo de promover a integração física entre o polo industrial e o polo logístico do município, melhorar a conexão interna entre os setores e ampliar a acessibilidade às rodovias estaduais e federais, especialmente à BR-101.

Mensurável: O indicador será monitorado por meio do indicador PPC, calculado pela fórmula apresentada nesse item.

Atingível: O indicador é viável técnica e operacionalmente, com base em práticas consolidadas de execução contratual, uso de planejamento detalhado no termo de referência.

Relevante: A pavimentação é estratégica para a organização territorial, integração logística e industrial, ampliação das vantagens locacionais e geração de empregos formais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento urbano e econômico do município.

Temporal: O indicador deverá ser integralmente cumprida conforme a linha de base de referência.

Meta:
META: Pavimentar com o objetivo de integrar o Polo Industrial e Logístico.

Descrição: Executar a pavimentação de aproximadamente 7.900 metros de vias de alta capacidade de carga.

Valor da meta: 100%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: PPC 2025=0%

Ano 1	Elaboração de projetos	PPC= 0%
Ano 2	Serviços preliminares e início da execução da pavimentação, drenagem e arborização	PPC = 10%

Ano 3	Continuação da execução da pavimentação, drenagem e arborização	PPC = 50%
Ano 4	Finalização da execução da Pavimentação, drenagem e arborização	PPC = 100%

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Variação na arrecadação tributária de empresas localizadas nas áreas beneficiadas (VATB)

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador VATB está diretamente associado ao objetivo de expansão da infraestrutura urbana estratégica, ao demonstrar o impacto econômico das intervenções realizadas. O crescimento na arrecadação reflete o fortalecimento da atividade empresarial nas regiões atendidas e sinaliza maior dinamismo econômico, geração de oportunidades e integração ao polo logístico do município. Esse resultado reforça a coerência entre os investimentos em infraestrutura e o desenvolvimento territorial sustentável.

Fórmula de cálculo do indicador:

$VATB = \frac{(AP - AA)}{AA} X\ 100$	AA: Arrecadação atual AP: Arrecadação no período anterior
* AA e AP são coletados no Portal da Transparência do Jaboatão dos Guararapes nos períodos indicados	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios;

Vinculado ao objetivo específico:

2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.

Produto vinculado: 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específica: O indicador estimula o aumento da arrecadação tributária de empresas localizadas nas áreas beneficiadas, Polo Industrial, Logístico e áreas contiguas.

Mensurável: Será monitorado por meio do indicador VATB, com bases em dados de tributação do município.

Atingível: O indicador é viável considerando o potencial de crescimento econômico nas áreas beneficiadas, o histórico de arrecadação e os efeitos esperados das ações de fomento e melhoria da infraestrutura.

Relevante: O indicador está diretamente relacionado à oportunidade de crescimento dos polos industrial e logístico do município, viabilizada por investimentos em infraestrutura urbana estratégica. A variação da arrecadação tributária nas áreas beneficiadas reflete o fortalecimento da atividade econômica local.

Temporal: O indicador segue a projeção da linha de base de referência ao longo dos anos de execução do projeto.

Meta:
META: Aumentar a arrecadação tributária nas áreas de expansão econômica.

Descrição: Promover o crescimento da arrecadação tributária proveniente de empresas situadas nas áreas beneficiadas por ações estruturantes. A meta reflete o impacto direto das políticas públicas sobre o fortalecimento da base produtiva e a sustentabilidade fiscal do município.

Valor da meta: 8%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: VATB 2025 =0%

Ano 1	Elaboração de projetos	VATB = 0%
Ano 2	Serviços preliminares e início da execução da pavimentação, drenagem e arborização	VATB = 0%
Ano 3	Continuação da execução da pavimentação, drenagem e arborização	VATB = 2 %
Ano 4	Finalização da execução da Pavimentação, drenagem e arborização	VATB = 4 %
Ano 5	Finalização da execução da Pavimentação, drenagem e arborização	VATB = 8%

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Percentual de pavimentação e recapeamento executado (PPRE)

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador PPRE está vinculado ao objetivo de expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, ao refletir o avanço das obras que melhoram a conectividade entre os modais de transporte público de passageiros. Essas intervenções qualificam os corredores viários, reduzem vulnerabilidades em áreas periféricas e ampliam a integração territorial, contribuindo para uma mobilidade mais eficiente, segura e inclusiva.

Fórmula de cálculo do indicador:

$$PPRE = \left(\frac{EPC + ERC}{EPT}\right) X\ 100$$	EPC: Extensão pavimentada concluída (em km) ERC: Extensão pavimentada concluída (em km) ETP: Extensão total planejada (em km)
*ETP será coletado no termo de referência do projeto e EPC e ERC nos relatórios de prestação de serviço contratual do referido projeto.	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios;

210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem;

Vinculado ao objetivo específico:

2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.

Produto vinculado: 2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específica: O indicador executa os serviços de pavimentação e recapeamento de vias urbanas, conforme o escopo analisado e pré-definido no termo de referência do projeto.

Mensurável: Monitorado por meio do indicador PPRE, a meta possui fórmula de cálculo definida nesse item e dados disponíveis no termo de referência e relatórios de execução do projeto.

Atingível: O indicador é viável considerando os recursos disponíveis, o cronograma de execução e a metodologia de acompanhamento por relatórios de prestação de serviço contratual.

Relevante: A pavimentação e o recapeamento são fundamentais para a melhoria da infraestrutura urbana, contribuindo diretamente para a mobilidade, segurança viária e valorização dos espaços públicos.

Temporal: O indicador possui linha de base de referência bem definida ao longo do projeto.

Meta:
META: Executar pavimentação e recapeamento de vias para integrar modais de transporte público.

Descrição: A meta inclui a pavimentação ou recapeamento, serviços complementares de microdrenagem, acessibilidade e arborização urbana, com o objetivo de promover a integração física entre os modais de transporte do público do município.

Valor da meta: 100%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2029

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: PPRE 2025=0%

Ano 1	Elaboração de Projetos de Pavimentação e Serviços Preliminares	PPRE = 0%
Ano 2	Início da Execução da Pavimentação, drenagem, arborização e recapeamentos	PPRE = 30%
Ano 3	Início da Execução da Pavimentação, drenagem, arborização e recapeamentos	PPRE = 70%
Ano 4	Início da Execução da Pavimentação, drenagem, arborização e recapeamentos	PPRE = 100%

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Indicador de Condição de Manutenção (ICM).

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O ICM é um indicador utilizado pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para avaliar a qualidade da manutenção das rodovias federais, com base em dois componentes: o Índice de Pavimentação (IP), que representa 70% do valor total e considera defeitos como panelas, remendos e trincas; e o Índice de Conservação (IC), que corresponde aos 30% restantes e avalia as condições de roçada, drenagem e sinalização horizontal e vertical. Cada trecho de 1 km é classificado em quatro categorias — bom, regular, ruim ou péssimo — conforme a pontuação obtida, variando de 0 (péssimo) a 100 (ideal).

Esse indicador está diretamente vinculado ao objetivo de expansão da infraestrutura urbana estratégica, pois permite avaliar, com base técnica, a efetividade das intervenções realizadas. Dessa forma, transforma ações físicas em resultados mensuráveis, alinhando a execução das obras à meta de qualificação da infraestrutura urbana nacional.

Fórmula de cálculo do indicador:

$ICM = (IPx\,0,70) + (ICx0,30)$	IP – Índice de Pavimentação IC – Índice de Conservação IP e IC calculado pelo software DNIT-ICM
* A coleta dos dados que compõem o IP e o IC — como panelas, remendos, roçada e drenagem — será realizada por meio de filmagens em alta resolução com câmeras de ação instaladas em veículos que percorrem os trechos rodoviários. Os vídeos são processados pelo software DNIT-ICM, desenvolvido pelo LabTrans/UFSC, que utiliza visão computacional e redes neurais para identificar automaticamente os elementos do índice. Após essa etapa, será realizado um pós-processamento manual para eliminar falsos positivos e qualificar os itens de conservação. Em seguida, o software gera uma planilha com os resultados do ICM, por quilômetro, conforme o padrão do DNIT.	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

Vinculado ao objetivo específico:

2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o

fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.

Produto vinculado: 2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: Trata-se de um indicador específico, pois sua execução é mensurada em quilômetros de vias concluídas, cujas localizações já estão previamente mapeadas no projeto, permitindo o monitoramento preciso das intervenções e dos elementos complementares associados à acessibilidade e à resiliência urbana.

Mensurável: O indicador será monitorado por meio da extensão (em metros) de vias concluídas com características resilientes, conforme definido no termo de referência do projeto e nos relatórios de prestação de serviço contratual.

Atingível: O indicador é viável considerando a experiência prévia na execução de projetos que utilizam técnicas consolidadas de pavimentação, recapeamento e drenagem. O planejamento detalhado das intervenções, aliado à capacidade técnica e operacional da gestão pública municipal, reforça a possibilidade de cumprimento dos objetivos propostos dentro dos prazos estabelecidos.

Relevante: A qualificação da infraestrutura viária está diretamente alinhada ao enfrentamento da crise climática, ao ampliar a disponibilidade de estruturas urbanas resilientes capazes de suportar eventos extremos, como chuvas intensas, alagamentos e ondas de calor. Ao adaptar as vias às novas condições ambientais, a meta contribui para a redução de vulnerabilidades urbanas e para a construção de cidades mais seguras, sustentáveis e preparadas para os impactos das mudanças climáticas.

Temporal: O indicador segue a projeção da linha de base de referência ao longo dos anos de execução do projeto.

Meta:
META: Qualificar a infraestrutura viária em áreas estratégicas.

Descrição: A meta contempla o beneficiamento e a adaptação de vias em áreas prioritárias, visando torná-las resilientes a eventos climáticos extremos e a condições ambientais suscetíveis às mudanças climáticas. As intervenções incluem pavimentação ou recapeamento, além de serviços complementares de microdrenagem, acessibilidade e arborização urbana.

Valor da meta: 80% dos trechos dentro da classificação regular e/ou bom.

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: O ICM não possui linha de base, em 2025 e anos anteriores, porque será aplicado pela primeira vez em Jaboatão dos Guararapes no escopo desse projeto. Essa justificativa é análoga a justificativa do Programa de Concessões de Rodovias Federais – PROCROFE, sem prejuízo ao uso do indicador.

Ano 1	Elaboração de Projetos	ICM = sem medição anterior
Ano 2	Serviços Preliminares e início da execução da Pavimentação, drenagem e arborização	ICM = sem medição anterior

Ano 3	continuação da execução da Pavimentação, drenagem e arborização	ICM = 80% das vias finalizadas no período
Ano 4	finalização da execução da Pavimentação, drenagem e arborização	ICM = 80% das vias finalizadas ao final do projeto

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Indicador de Chamados da Ocorrências da Defesa Civil (ICO).

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador ICO está alinhado ao objetivo de expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, ao permitir avaliar a efetividade das intervenções realizadas em áreas suscetíveis a desastres. A redução desse número ao longo do tempo sinaliza o impacto positivo das obras de drenagem e requalificação urbana, especialmente em territórios periféricos classificados como de alto risco, reforçando o compromisso da gestão com a segurança da população e a adaptação às mudanças climáticas.

A fórmula do indicador expressa a relação entre a quantidade de chamados recebidos anualmente pelos canais da Defesa Civil da Prefeitura em função da quantidade de chamados de ocorrências recebidas no ano base. A partir dele, é possível obter a avaliação anual da evolução da eficiência e do impacto das intervenções executadas nos setores prioritário.

Fórmula de cálculo do indicador:

$ICO = \frac{NCAB}{NCTA} X\ 100$	NCAB = Número anual de chamados da Defesa Civil Municipal nos setores de risco muito alto no ano base NCTA = Número anual total de chamados da Defesa Civil Municipal nos setores de risco muito alto nos anos subsequentes
* NCAB e NCTA ambos serão coletados nos relatórios e estatísticas da Secretaria Executiva de Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes.	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas;

Vinculado ao objetivo específico: 2 - Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.

Produto vinculado: 2.4 Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: O indicador é específico porque se baseia em um indicador concreto e territorialmente delimitado: o número de chamados registrados pela Defesa Civil em setores classificados como de risco muito alto. Esses chamados refletem diretamente os efeitos das intervenções de infraestrutura urbana — como drenagem e requalificação — voltadas à mitigação de desastres e à adaptação às mudanças climáticas.

Mensurável: O indicador será monitorado e calculado pela fórmula definida nesse item, com o intuito de alcançar uma redução de 30% em relação ao ano base.

Atingível: O indicador é viável considerando o histórico de intervenções urbanas realizadas, os recursos disponíveis e a capacidade técnica da gestão municipal para executar obras em áreas prioritárias e monitorar seus efeitos.

Relevante: A redução de ocorrências em áreas de risco está diretamente alinhada ao objetivo de expansão da infraestrutura urbana estratégica, promovendo segurança, resiliência e desenvolvimento territorial sustentável frente à crise climática.

Temporal: O indicador será avaliado anualmente, com base nos relatórios da Secretaria Executiva de Defesa Civil, durante o período de vigência do plano de intervenção urbana.

Meta:
META: Reduzir o número de ocorrências em áreas suscetíveis a riscos de deslizamentos de massa e inundações provenientes de eventos extremos climáticos.

Descrição: Redução do número de ocorrências registradas pela Defesa Civil Municipal em setores classificados como de risco muito alto como intervenção prioritária pelo Plano Local de Redução de Riscos.

Valor da meta: 30%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: ICO 2025=0%

Ano 1	Elaboração de Plano Urbanístico, Regularização Fundiária e Projetos de Intervenção e início dos serviços Preliminares	ICO =0%
Ano 2	Continuação dos serviços preliminares	ICO =0%
Ano 3	Início da Execução das intervenções	ICO =15%
Ano 4	Finalização da Execução das intervenções	ICO =30%

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE) Anos iniciais do ensino fundamental.

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador IDEPE também está alinhado ao objetivo de ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção à educação em territórios periféricos vulneráveis, pois, assim como o IDEB, o IDEPE mede o desempenho educacional, mas com um diferencial: por ser um indicador exclusivo de Pernambuco, ele regionaliza a análise. Isso permite uma leitura mais precisa da realidade educacional do território, a fim de acompanhar os efeitos das políticas públicas com maior sensibilidade ao contexto estadual.

Fórmula de cálculo do indicador:

$IDEPE_{anos\ iniciais} = NSP\ X\ TAP$	NSP: Nota do SAEPE - Média de proficiência dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática no estado de Pernambuco TAP: Taxa de Aprovação - Proporção de alunos que avançam de série sem reprovação ou abandono
* O IDEPE é disponibilizado anualmente pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE/PE)	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes;

Vinculado ao objetivo específico:

3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

Produto vinculado: 3.1 Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: O indicador busca elevar o IDEPE nos anos iniciais do ensino fundamental por meio da melhoria da proficiência dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática e do aumento da taxa de aprovação escolar, especialmente em territórios periféricos vulneráveis.

Mensurável: O indicador é mensurável porque se baseia no IDEPE, um indicador com valor numérico definido e publicado anualmente pela Secretaria de Educação de Pernambuco. Mesmo sendo calculado externamente, sua regularidade e metodologia padronizada permitem acompanhar com precisão a evolução do desempenho educacional.

Atingível: O indicador é viável porque está ancorada na ampliação da infraestrutura escolar, com a construção de novas unidades educacionais em territórios vulneráveis. Essa expansão permitirá a redução da superlotação, a melhoria do ambiente de aprendizagem e o aumento do acesso à educação de qualidade.

Relevante: O IDEPE é um instrumento estratégico para avaliar a efetividade das políticas públicas educacionais no contexto estadual. Ele permite uma leitura regionalizada da qualidade da educação, alinhando a meta ao objetivo de ampliar as infraestruturas sociais com foco na equidade e no desenvolvimento territorial sustentável.

Temporal: O indicador será monitorado anualmente, com base nos resultados divulgados pela SEE/PE, durante o período de vigência do plano educacional municipal.

Meta:
META: Elevar o IDEPE nos anos iniciais do ensino fundamental do município.

Descrição: A meta busca a melhoria do IDEPE, índice de desempenho educacional do estado de Pernambuco, nos anos iniciais do ensino fundamental em territórios prioritários do município, com foco na ampliação das infraestruturas sociais e na valorização da aprendizagem em áreas de alta vulnerabilidade.

Valor da meta: 5,9

Unidade de medida da meta: unidade

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência:

ANO 2024 - Linha de base: $IDEPE_{\text{anos iniciais (BASE - 2024)}} = 5{,}56$

Ano 1	Elaboração de Projetos e início dos serviços preliminares	IDEPE = 5,56
Ano 2	Continuação dos Serviços Preliminares e início da Execução de obra	IDEPE = 5,67
Ano 3	Continuação dos Serviços Preliminares e da Execução de obra	IDEPE = 5,75
Ano 4	Finalização dos Serviços Preliminares e da Execução de obra	IDEPE = 5,9

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) Anos iniciais do ensino fundamental.

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador “IDEB” está alinhado ao objetivo de ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis, ao demonstrar os efeitos da criação e adaptação de novas unidades escolares para os anos iniciais. A melhoria no IDEB para anos iniciais reflete avanços na qualidade da educação e no acesso ao ensino em áreas com alta vulnerabilidade social.

Fórmula de cálculo do indicador:

$IDEB_{anos\ iniciais} = NSB\ X\ TAP$	NSB: Nota do SAEB - Média de proficiência dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática no estado de Pernambuco TAP: Taxa de Aprovação - Proporção de alunos que avançam de série sem reprovação ou abandono
* O IDEB é disponibilizado bianualmente pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que é vinculado ao Ministério da Educação (MEC).	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes;

Vinculado ao objetivo específico:

3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistênciamsocial e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

Produto vinculado: 3.1 Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: O indicador busca elevar o IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio da melhoria da aprendizagem dos alunos e da redução da reprovação escolar, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. O foco está na combinação de ações pedagógicas e estruturais que impactam diretamente os componentes do indicador.

Mensurável: O IDEB é mensurável e publicado regularmente o que permite o acompanhamento da meta.

Atingível: O indicador é viável considerando a construção de novas escolas em territórios prioritários, o que amplia o acesso, melhora o ambiente de aprendizagem e reduz a superlotação. Esse conjunto de ações cria condições concretas para elevar o IDEB.

Relevante: O IDEB é um dos principais instrumentos de avaliação da educação básica no Brasil. Ele permite medir o impacto das políticas públicas sobre a aprendizagem e o fluxo escolar, sendo diretamente alinhado ao objetivo de ampliar as infraestruturas sociais e promover a equidade educacional em territórios vulneráveis.

Temporal: O indicador será monitorado a cada dois anos, conforme o calendário de divulgação do IDEB pelo INEP, durante o período de vigência do plano educacional municipal.

Meta:
META: Elevar o IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental do município.

Descrição: A meta busca a melhoria do desempenho educacional nos anos iniciais do ensino fundamental em territórios vulneráveis do município, por meio da ampliação da infraestrutura escolar.

Valor da meta: 5,85

Unidade de medida da meta: unidade

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência:

Linha de base: $IDEB_{anos\ iniciais\ (BASE\ -\ 2023)} = 5{,}30$

Ano 1	Elaboração de Projetos e início dos serviços preliminares	IDEB = 5,30
Ano 2	Continuação dos Serviços Preliminares e início da Execução de obra	IDEB = 5,30
Ano 3	Continuação dos Serviços Preliminares e da Execução de obra	IDEB = 5,30
Ano 4	Finalização dos Serviços Preliminares e da Execução de obra	IDEB = 5,85

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde no território municipal (CCAPS).

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador “Cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde no território municipal” está alinhado ao objetivo de ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis, com elevados índices de violência urbana, alta dependência de transferências assistenciais de suas populações, ao refletir os avanços na oferta de serviços essenciais de saúde.

No contexto de ampliação e qualificação da Atenção Primária à Saúde em Jaboatão dos Guararapes, por meio da construção de novas unidades, esse indicador permite acompanhar a expansão do acesso equitativo, a redistribuição territorial dos serviços e a melhoria da qualidade do cuidado. O aumento da cobertura populacional sinaliza maior presença do Estado em áreas vulneráveis, fortalecendo a prevenção, o vínculo comunitário e a resolutividade da atenção básica.

Fórmula de cálculo do indicador:

$CCAPS = \frac{PCF}{PTTM}$	PCF = Pessoas cadastradas pelas equipes de Atenção Primária à Saúde $PTTM$ = População total do território municipal segundo o IBGE
* CCAPS é divulgado pelo Ministério da Saúde	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

102 -Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS);

Vinculado ao objetivo específico:

3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

Componente Vinculado: Componente 3 - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis.

Produto vinculado: 3.2. Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: O indicador busca ampliar a cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde, medida pelo número de pessoas cadastradas pelas equipes de saúde em relação à população total do município. O foco está na construção de novas unidades e na atuação em áreas com alta vulnerabilidade social.

Mensurável: O indicador é mensurável pois o valor da cobertura é divulgado regularmente pelo Ministério da Saúde, permitindo o acompanhamento preciso da evolução da cobertura.

Atingível: O indicador é viável considerando o plano de expansão da rede de Atenção Primária, com a construção de novas unidades em territórios prioritários e o fortalecimento das equipes de saúde. Essas ações estruturantes aumentam a capacidade de cadastramento e atendimento da população.

Relevante: A ampliação da cobertura da Atenção Primária está diretamente alinhada ao objetivo de fortalecer as infraestruturas sociais em territórios vulneráveis, promovendo equidade no acesso à saúde, prevenção de agravos e maior resolutividade no cuidado básico.

Temporal: O indicador será monitorado anualmente, com base nos dados oficiais do Ministério da Saúde, durante o período de vigência do plano municipal de saúde e ao longo da execução do projeto.

Meta:
META: Ampliar a cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde nos territórios periféricos com maior vulnerabilidade socioeconômica.

Descrição: A meta se propõe a ampliar os serviços e atendimentos a população em zonas descobertas e com maior vulnerabilidade socioeconômica, através da construção de unidades básicas da saúde.

Valor da meta: 62%

Unidade de medida da meta: percentual

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência:

ANO 2023 - Linha de base: $CCAPS_{(BASE – dez/2023)} = 54,63\%$

Ano 1	Elaboração de Projetos e início dos serviços preliminares	CCAPS = 54,63%
Ano 2	Continuação dos Serviços Preliminares e início da Execução de obra	CCAPS = 54,63%
Ano 3	Continuação dos Serviços Preliminares e da Execução de obra	CCAPS = 56,70%
Ano 4	Finalização dos Serviços Preliminares e da Execução de obra	CCAPS = 62,00%

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Número de intervenções nos equipamentos de lazer e esportes (NILE)

Descrição:
Descrição do Indicador e Referência ao Objetivo Específico:

O indicador “Número de intervenções nos equipamentos de lazer e esportes” está alinhado ao objetivo de ampliação das infraestruturas sociais em territórios periféricos vulneráveis. Medir esse indicador permite avaliar o andamento da requalificação de espaços de lazer e esportes que contribuem para transformar áreas antes negligenciadas em ambientes mais seguros, ativos e integradores.

Fórmula de cálculo do indicador:

$NILE = \sum_{i=1}^{n} Ai$	A_i: Cada ação ou intervenção realizada no equipamento i(ex: reforma, manutenção, ampliação, instalação de novos itens) n: Total de equipamentos de lazer e esportes com ações registradas no período
* $NILE$ será coletado nos relatórios de prestação de serviço do contrato	

Área Estratégica diretamente vinculada segundo o Anexo II RN Cofiex nº1/2024:

113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

Vinculado ao objetivo específico:

3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.

Componente Vinculado: Componente 3 - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis.

Produto vinculado: 3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Modelo SMART aplicado ao indicador:

Específico: O indicador consiste na realização de intervenções físicas em equipamentos de lazer e esportes, como reformas, construções, ampliações ou instalações de novos itens, com foco em territórios vulneráveis. Cada ação é registrada individualmente, permitindo controle direto sobre o avanço das obras.

Mensurável: O indicador é mensurável porque se baseia em um somatório objetivo de ações realizadas em equipamentos de lazer e esportes. Os dados são coletados diretamente dos relatórios de prestação de serviço dos contratos, o que garante rastreabilidade, controle e acompanhamento preciso do número total de intervenções realizadas ao longo do período.

Atingível: O indicador é viável considerando os recursos alocados, os contratos vigentes e o planejamento técnico para execução das obras.

Relevante: A requalificação de espaços de lazer e esportes está diretamente alinhada ao objetivo de ampliar as infraestruturas sociais em territórios vulneráveis, promovendo inclusão, segurança, saúde e convivência comunitária em áreas com histórico de negligência urbana.

Temporal: O indicador será cumprido dentro do período de vigência dos contratos e do plano de ação municipal, com acompanhamento contínuo por meio dos relatórios técnicos e visitas de fiscalização, conforme linha de base de referência ao longo dos anos de execução do projeto.

Meta:
META: Ampliar a o número de equipamentos e espaços requalificados para o uso esportivo e de lazer.

Descrição: A meta se propõe a ampliar o número de equipamentos e espaços requalificados para o uso esportivo e de lazer nas áreas periféricas com maior vulnerabilidade socioeconômica e onde se registra os maiores índices de mortes violentas letais intencionais.

Valor da meta: 35 intervenções ao final do projeto

Unidade de medida da meta: unidade

Ano de referência para atingimento da meta em relação ao tempo de implementação do Componente: 2030

Linha de base e respectivo ano de referência:

ANO 2025 - Linha de base: NILE 2025 = 0

Ano 1	Elaboração de Projetos e início dos serviços preliminares	NILE = 0
Ano 2	Continuação dos Serviços Preliminares e início da Execução das intervenções	NILE = 0
Ano 3	Continuação dos Serviços Preliminares e da Execução das intervenções	NILE = 14
Ano 4	Finalização dos Serviços Preliminares e da Execução das intervenções	NILE = 35

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: COMPONENTE 1 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 7.020.000,00

Descrição:
Elevar a capacidade institucional, fiscal, tecnológica e regulatória do município, aprimorando a gestão territorial, a arrecadação e os serviços oferecidos ao cidadão, incluindo a promoção de negócios e atração de investimentos tecnológicos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Descrição: Inclui, entre outras ações, o levantamento aerofotogramétrico; atualização cadastral para toda a área urbana; implantação de SIG; revisão da planta genérica de valores (PGV); a criação de banco de terras; a integração com módulos multifinalitários.

Compreende, em particular, a modernização da gestão administrativa e fiscal do município, por meio da instituição do Cadastro Multifinalitário; por meio da criação de uma base cartográfica georreferenciada única e confiável, com camadas de dados de informações territoriais e imobiliárias, a serem utilizadas para apoiar decisões de governo municipal e melhorar a eficiência fiscal e a gestão urbana, com vistas a alcançar a redução das desigualdades socioeconômicas, a modernização do planejamento urbano, o aprimoramento dos serviços públicos e a excelência da administração municipal.

Resultados: Melhoria da eficiência fiscal e do planejamento territorial e ambiental do município.

Produto 1.2: Implantação de Plataforma de interoperabilidade e serviços digitais ao cidadão.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a integração de sistemas; a prestação de serviços públicos digitais (web e mobile); a aquisição e atualização tecnológica de TI; cibersegurança e capacitação técnica.

Compreende, em particular, a implantação de plataforma de interoperabilidade entre sistemas, dados, informações e serviços da gestão pública em ambiente único, permitindo a integração tecnológica e a disponibilização ao cidadão em ambiente WEB e Móvel. Compreendendo: Sistemas e Serviços Digitais; Cooperação de Dados, Serviços e Informações; Plataforma Única ao Cidadão (Web e Mobile); Atualização Tecnológica; Capacitação Técnica – formação; Modernização/aquisição de equipamentos e infraestruturas de tecnologia da informação e internet das coisas e a aquisição de Software e Customização de programas.

Resultados: Ampliação do acesso digital e maior produtividade administrativa.

Produto 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação e Tecnologia.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a implantação em área preexistente a ser requalificada de propriedade do município, de laboratórios de prototipagem; coworking; salas de qualificação e internet de alta velocidade.

Compreende, em particular, a oferta de um ambiente físico e institucional, com equipamentos modernos de suporte instalados, voltado ao atendimento de startups/empresas locais com atuação na área de inovação e tecnologia, com vistas a fomentar o aumento de negócios/parcerias com potencial de inovação e agregação de valor no município, incluindo a promoção de cursos de formação e qualificação na área de TIC e correlatas, de modo a ampliar o atendimento da demanda crescente por recursos humanos nas áreas de inovação e tecnologia no município e na região, atuando de modo complementar as potencialidades geradas pelo Porto Digital[1] no Recife, um dos maiores distritos de inovação da América Latina, é um ambiente de inovação, pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação (TI), especialmente na área mobile, com sede no Bairro do Recife, centro histórico da capital pernambucana.

Resultados: Estímulo ao empreendedorismo e atração de investimentos tecnológicos.

A seguir descreve-se os Quadros Resumo do COMPONENTE 1 – PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)

Produto 1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários (Quadro 3).

Quadro 3: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
1.1.1 Atualização cadastral multifinalitária	Mapeamento cadastral de 100% das edificações da área urbana, aerofotogrametria atualizada; georreferenciamento via SIG integrado com legislação urbanística, riscos, ZEHIS e IPTU; integração com Receita Municipal.	Sistema cadastral unificado e atualizado, integrado às políticas urbanas e fiscais.
1.1.2 Valoração automatizada	Implantação de sistema de Planta Genérica de Valores automatizada com curvas de valorização urbana e atualização anual.	

Produto 1.2: Implantação de Plataforma de interoperabilidade e serviços digitais ao cidadão. (Quadro 4)

Quadro 4: Implantação de Plataforma de interoperabilidade e serviços digitais ao cidadão.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
1.2.1 Plataforma integrada de gestão municipal	Integração plena entre módulos tributário, licenciamento, vigilância sanitária, obras e fiscalizações; com módulos Web e App para serviços ao cidadão.	Governança digital integrada e interoperável entre setores.
1.2.2 Sala de Situação e BI Territorial	Infraestrutura com dashboards integrados para: mobilidade, riscos, educação, saúde, arrecadação e obras; com monitoramento em tempo real.	

Produto 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação e Tecnologia. (Quadro 5)

Quadro 5: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação e Tecnologia.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
1.3.1 Implantação do Núcleo de Inovação e Tecnologia	Espaço com laboratórios de empreendedorismo tech, coworking municipal, incubação de startups e capacitação empresarial (~1.500 m² equipados).	Ecossistema local de inovação e tecnologia fortalecido e articulado ao Porto Digital.

[1] O Porto Digital é um ecossistema que integra startups, empresas, organizações, instituições de ensino e instituições de ciência e tecnologia de diversos segmentos de tecnologia, como TI, comunicação digital, automação e inteligência artificial, além de abrigar iniciativas de educação e formação de profissionais para o futuro do mercado digital.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: COMPONENTE 2 - FORTALECER A INFRAESTRUTURA E A HABITABILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL ASSOCIADA AS AÇÕES DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA.
Valor estimado em Dólar (USD): 35.403.000,00

Descrição:
Reduzir vulnerabilidades e melhorar e ampliar as condições de habitabilidade, mobilidade e drenagem urbana, por meio do fortalecimento e expansão da infraestrutura de forma sustentável, objetivando o desenvolvimento do Município com ênfase ambiental, social e econômica, de modo associado às ações de resiliência climática.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 2.1: Estruturação da infraestrutura do polo industrial e logístico do município.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a pavimentação/requalificação de 8,4 km de vias estruturais, incluindo obras de microdrenagem, arborização, acessibilidade e sinalização.

Compreende, em particular, o fortalecimento da competitividade municipal, com vistas a atrair e consolidar empreendimentos vinculados ao polo industrial e dinamizar o arranjo produtivo de logística e distribuição em complementariedade ao Complexo Industrial e Portuário de Suape/PE, bem como, ampliar os investimentos públicos e privados em cadeias produtivas e de serviços de suporte com maior valor agregado.

Resultados: Ganho logístico - redução do tempo de deslocamento de cargas.

Produto 2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a pavimentação de 27km de vias com serviços de microdrenagem, acessibilidade e arborização urbana, quando couber, e, ainda, o recapeamento de 30km das vias existentes; além do fortalecimento da integração ao metrô.

Compreende, em particular, a execução de pavimentação e/ou recapeamento de vias com conexão entre os moldais do transporte público de passageiros dos sistemas rodoviário e ferroviário (metrô elétrico de superfície e veículos leves sobre trilhos a diesel - ambos operados pela CBTU/METROREC), bem como, a ampliação do número de vias pavimentadas de capilaridade comunitária e o recapeamento de vias estruturais e coletoras.

Resultados: Maior acessibilidade entre modais e melhoria da mobilidade urbana.

Produto 2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a implantação de infraestruturas de mobilidade associadas a soluções de adaptação as mudanças climáticas (soluções baseadas na natureza – SbN), na área de influência direta da Lagoa Olho D'Água.

Compreende, em particular, a implantação de uma via parque com cerca de 5 km, com ciclovia, faixa de pedestres drenante, pista para mobilidade de baixa emissão, áreas de convivência, iluminação LED, bacias de retenção, galerias hidráulicas, estabilização e revegetação de margens, entre outras SbN a serem adotadas quando da elaboração do projeto.

Resultados: Redução de alagamentos, proteção ambiental e qualificação do lazer na área de influência direta da Lagoa Olho D'Água, definida como objeto de intervenção no âmbito deste projeto.

Produto 2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a implantação de soluções baseadas na natureza (SbN) para 10 setores críticos, a exemplo de contenção em solo grampeado, muros de arrimo drenantes, escadarias acessíveis e renaturalização, entre outras.

Compreende, em particular, a intervenção em 10 setores classificados pelo Plano Municipal de Redução de riscos (2025) como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos, através da priorização de soluções baseadas na natureza de forma integrada, por meio da elaboração de planos urbanísticos, projetos executivos e obras de intervenção.

Resultado: Mitigação de riscos, proteção da vida e resiliência comunitária em 10 setores classificados pelo Plano Municipal de Redução de riscos (2025) como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

A seguir descreve-se os Quadros Resumo do COMPONENTE 2 - PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)

2.1. Estruturação da infraestrutura do polo industrial e logístico do município. (Quadro 6)

Quadro 6: Estruturação da infraestrutura do polo industrial e logístico do município.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
2.1.1 Estruturação viária do polo industrial	Pavimentação e recapeamento de vias arteriais e coletoras estruturantes (~8,4 km) com: drenagem ampliada, faixas de rolamento ampliadas, sinalização, baias para carga/descarga	Expansão da capacidade de operação e atração de novos empreendimentos.

2.2. Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades. (Quadro 7)

Quadro 7: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
2.2.1 Corredores de transporte público	Requalificação de ~30 km de corredores com pavimento rígido/flexível, pontos acessíveis, iluminação LED e segurança viária	Mobilidade urbana aprimorada e integração modal ampliada.
2.2.2 Conexões coletoras-arteriais e pavimentação local	Pavimentação de ~27 km em comunidades vulneráveis, drenagem superficial, calçadas acessíveis; prioridade para ZEIS	

2.3. Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas - entorno da Lagoa Olho D'Água (Quadro 8).

Quadro 8: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas - entorno da Lagoa Olho D'Água.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO

2.3.1 Implantação de Via Parque Resiliente – 5 km, incluindo a requalificação da orla lacustre.	Implantação de infraestrutura de mobilidade (Via Parque) associadas a soluções de adaptação as mudanças climáticas (soluções baseadas na natureza – SbN), a exemplo de: 1) faixas para veículos de baixa emissão; 2) ciclovia bidirecional; 3) calçadões drenantes; 4) jardins de chuva e bacias de retenção; 5) estações de descanso e lazer; 6) iluminação LED e mobiliário urbano; 7) passagens hidráulicas e galerias reforçadas; 8) recuperação de margem com estabilização natural; 9) manejo vegetação nativa da restinga.	Redução de riscos de inundação; conexão metropolitana aprimorada; maior resiliência a eventos extremos no territorial do entorno da Lagoa Olho D'água.
	Outras soluções de adaptação as mudanças climáticas (soluções baseadas na natureza – SbN) associadas a implantação da via parque, a exemplo de Implantação de decks em madeira ecológica, passarelas, parques lineares, sistemas de drenagem filtrante.	

2.4. Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos (Quadro 9).

Quadro 9: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
2.4.1 Obras de estabilização em 10 setores classificados pelo Plano Municipal de Redução de riscos (2025) como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.	Implantação de soluções baseadas na natureza (SbN) em 10 setores classificados pelo Plano Municipal de Redução de riscos (2025) como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos, a exemplo de contenção em solo grampeado, muros de arrimo drenantes, escadarias acessíveis e renaturalização, entre outras.	Comunidades seguras e resilientes; redução de perdas humanas e materiais.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA SOCIAL EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.
Valor estimado em Dólar (USD): 16.915.000,00

Descrição:
Construção, ampliação e qualificação da infraestrutura social em territórios vulneráveis, com vistas a ampliação das políticas de atenção primária em Saúde, de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, de lazer e esportes, com vistas a promoção do bem-estar da população.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários voltadas as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a implantação de 4 (quatro) unidades de ensino voltadas as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Compreende, em particular, a construção, ampliação e qualificação (incluindo mobiliário e equipamentos) de 04 (quatro) unidades educacionais, nas regionais 01, 03, 05 e 06, voltadas ao atendimento das etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, em áreas de alta vulnerabilidade e demandas de matrículas reprimidas.

Resultados: Ampliação de matrículas e inclusão educacional em áreas de alta vulnerabilidade e demandas de matrículas reprimidas.

Produto 3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a construção de 10 UBS Porte II e 1 UBS Porte III; incluindo a infraestrutura para implantação de teleatendimento; sala de vacina e de saúde bucal.

Compreende, em particular, a implantação de 10 Unidade de Saúde da Família (USF/UBS) Porte II e 1 Unidade de Saúde da Família (USF/UBS) Porte III, que darão suporte a consolidação de 18 equipes e qualificação do processo de trabalho de 05 equipes de Atenção Primária à Saúde (APS), priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social, epidemiológica e déficit de cobertura assistencial. Cada equipe será composta por 5 a 6 ACS, médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas e auxiliares, garantindo cobertura de 3.500 a 4.500 habitantes por equipe, com atenção integral, longitudinal e contínua.

A implantação dessas novas unidades de saúde da família permitirá uma ampliação de **145.728 atendimentos anuais**, expandindo o acesso e resolutividade. As construções seguirão os modelos arquitetônicos e funcionais estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com teleatendimento e salas multissensoriais, com vistas a fortalecer a resolutividade da Atenção Primária à Saúde. Além disso, a ação prever ainda a implementação de ações de formação continuada das equipes, protocolos clínicos, educação em saúde e uso de tecnologias digitais.

Resultados: Aumento da cobertura assistencial e prevenção em saúde em áreas de alta vulnerabilidade.

PRODUTO 3.3: Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a requalificação de espaços livres/equipamentos esportivos, em periferias e comunidades vulneráveis, incluindo a implantação de iluminação LED, equipamentos e mobiliário urbano de apoio como arquibancadas, áreas de convivência, entre outros.

Compreende, em particular, na requalificação dos espaços comunitários de lazer e esportes, por meio da execução de intervenções estruturais, restauração ou substituição de gramados danificados ou nivelamento e compactação do solo, a recuperação dos campos com gramados deteriorados, de modo a garantir condições adequadas para a prática esportiva em espaços de lazer e esportes existentes.

Contempla ainda a instalação de sistema de iluminação de LED, implementação de iluminação de alta eficiência com vistas a possibilitar o uso noturno dos campos, ampliando a acessibilidade, construção de arquibancadas e pequenas áreas de lazer, pintura esportiva, recuperação de telhado e pintura esportiva, garantindo, assim, as condições adequadas para o lazer, prática esportiva e fortalecimento da convivência social, com vistas a melhoria dos indicadores de saúde baseados no esporte como vetor de prevenção e segurança social.

Resultados: Promoção da saúde preventiva e fortalecimento da convivência social em áreas periféricas com elevada vulnerabilidade socioeconômica.

A seguir descreve- se os Quadros Resumo do COMPONENTE 3 - PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)

3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. (Quadro 10)

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
3.1.1 Construção de 04 (quatro) unidades educacionais	Construção de 04 (quatro) unidades educacionais, voltadas as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com base na estrutura padrão FNDE + salas multiuso + eficiência energética.	Ampliação da oferta e qualidade da educação básica.

3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis. (Quadro 11)

Quadro 11: Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
3.2.1 Construção de 04 (quatro) unidades básicas de saúde	Construção de 10 UBS Porte II e 1 UBS Porte III; incluindo a infraestrutura para implantação de teleatendimento; sala de vacina e de saúde bucal.	Cobertura da Estratégia de Saúde da Família ampliada em 145.728 atendimentos anuais, em todo território municipal.

3.3: Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis. (Quadro 12)

Quadro 12: Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO

3.3.1 05 Espaços livres/espaços esportivos requalificados	Requalificação de espaços livres/equipamentos esportivos, em periferias e comunidades vulneráveis, incluindo a implantação de iluminação LED, equipamentos e mobiliário urbano de apoio como arquibancadas, áreas de convivência, áreas inclusivas, drenagem e paisagismo.	Promoção da saúde preventiva e melhoria na convivência e inclusão social através do esporte.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Dólar (USD): 5.662.000,00

Descrição:
Este componente integra ações destinadas ao gerenciamento e administração do Programa, com ênfase na supervisão técnica, ambiental e social, elaboração de estudos e projetos, apoio à UGP e auditorias externas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 4.1 - Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a implantação de BIM no processo de elaboração dos projetos e na execução e supervisão das obras; auditoria técnica; capacitação de fiscais; controle de qualidade.

Compreende, em particular, no fortalecimento das equipes de gestão e administração municipal, em especial atenção através da capacitação e qualificação dos recursos humanos das unidades executoras dos projetos - gestores de contratos, ordenadores e fiscais de contratos.

Além disso, contempla a implantação da metodologia BIM (Modelagem de Informação da Construção) a partir da aquisição tanto do software quanto do hardware necessários para o bom funcionamento da plataforma, incluindo a realização de um processo de capacitação do corpo técnico da gestão municipal para orientação quanto a análise de projetos urbanísticos e ambientais, elaboração e gestão de projetos de engenharia e arquitetura.

Contempla ainda a atualização de normativas e regulamentação de instrumentos urbanísticos e ambientais; o reaparelhamento de equipamentos e mobiliários, associado a aquisição de softwares de suporte a gestão e supervisão técnica irá dinamizar os setores finalísticos da execução de obras das unidades administrativas municipais, bem como, a requalificação do Setor de Planejamento e Monitoramento da Gestão Estratégica com vistas ao seu fortalecimento da gestão por resultados e o monitoramento de forma continuada das ações estratégicas.

Resultados: Maior eficiência na execução e conformidade das obras.

Produto 4.2 - Apoio ao Gerenciamento do Programa.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a elaboração de estudos e projetos, incluindo a realização do Trabalho Técnico-Social antes, durante e após a execução das intervenções, a fim de garantir a participação social e a promoção da cidadania como um dos principais valores do Programa.

Compreende, em particular, na implantação do núcleo de parcerias e relações institucionais, com vistas a proporcionar sinergias entre as ações das diversas instituições públicas e privadas, levando a minimização de custos, ausência de sobreposições de ações e potencialização de resultados.

Compreende ainda, de forma complementar, a criação do banco de projetos de engenhara e arquitetura e de estudos de viabilidade das ações estratégicas para o município visa potencializar a captação de recursos, irá reduzir o tempo de execução das obras e direcionará os recursos do tesouro municipal de forma mais equilibrada.

Resultados: Governança da área de planejamento e gestão fortalecida.

Produto 4.3 - Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.

Descrição: Inclui, entre outras ações, a implementação do portal de monitoramento; comunicação e participação social.

Compreende, em particular, na capacitação das equipes de auditoria interna e na contratação de auditoria externa para o acompanhamento do projeto Jaboatão 2030, bem como o apoio às ações de divulgação do programa, por meio de publicação de materiais ou promoção de eventos, com o objetivo de disseminar as boas práticas e soluções empregadas, além das lições aprendidas. Além disso, prevê a melhoria da infraestrutura e aquisição de equipamentos com vistas a assegurar as condições de trabalho necessárias ao desempenho do controle dos recursos públicos e a garantia da transparência dos atos da gestão municipal e um ambiente favorável a interlocução social.

A seguir descreve- se os Quadros Resumo do COMPONENTE 4 - PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)

4.1 - Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras. (Quadro 13)

Quadro 13: Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
4.1. Fiscalização e controle de qualidade das obras	Contratação de equipe multidisciplinar para fiscalização, ensaios de pavimentos e concretos, BIM para monitoramento	Gestão eficiente e acompanhamento sistemático das obras.

Produto 4.2 - Apoio ao Gerenciamento do Programa (Quadro 14).

Quadro 14: Apoio ao Gerenciamento do Programa.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
4.2. UGP estruturada	Aquisição de equipamentos, softwares, consultorias, auditoria e compliance, além da elaboração de estudos e projetos, ações de treinamento e capacitação.	Execução eficiente e transparente do projeto.

Produto 4.3 - Fortalecimento dos canais de controle e auditoria. (Quadro 15).

Quadro 15: Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.

PRODUTO (BENS/SERVIÇOS)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA	RESULTADO ESPERADO
4.3. Fortalecimento dos canais de controle e auditoria	Implantação e operacionalização do Portal de informação do Projeto, incluindo dados abertos, indicadores, mapas e monitoramento em tempo real.	Governança e accountability aprimorados.

1. 6. **Beneficiários**

O Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes – Jaboatão 2030 - terá impacto na totalidade do território e, consequentemente, beneficiará todos os grupos populacionais do município, direta ou indiretamente.

Com vistas a uma maior apropriação dos grupos populacionais beneficiados diretamente com as ações previstas neste Projeto, apresentamos a seguir, em pormenor, a identificação desses grupos e ou segmentos populacionais específicos por componente a seguir, tendo sua síntese expressa no **quadro 16**.

COMPONENTE 1 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL.

Através deste componente espera-se ter como beneficiários dos seus produtos:

1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto na totalidade do território e atuará diretamente na gestão pública municipal e beneficiará **200.937 domicílios/estabelecimentos** ampliando a cobertura cadastral do município para 100% da área urbana. Possibilitará a integração entre funcional e de bancos de dados e sistemas informatizados de várias unidades administrativas através da implantação do cadastro em ambiente SIG com módulos multifinalitários.

1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto na totalidade do território e atuará diretamente na gestão pública municipal, em especial os mais de seis mil funcionários e beneficiará os 683.285 habitantes do município.

Tendo como unidades administrativas diretamente beneficiadas as Secretarias Municipais – da Fazenda (Sistemas Psal, Siafin), Planejamento e Gestão (Sistema de monitoramento Web e Mobile e dashboard de orçamento, Intranet, etc.), Assistência Social (Sistemas de CADUnico, Cadastros Municipais de Assistência, etc.), da Saúde (SIAB, SILOG e Dispensação de Medicamentos; Agendamentos de Consultas, etc.), de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (Sistemas de Licenciamento Ambiental e Urbanístico), Desenvolvimento Econômico (Sistemas de Cadastros de Empresas) e de forma indireta o conjunto dos mais de 6mil funcionários nas diversas unidades da gestão.

1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Estudantes de TIC e correlatos; empreendedores locais; grandes empresas; instituições de ensino e entidades do setor público e do terceiro setor.

1.4 Implantação do Núcleo de Gestão de Projetos e Monitoramento – NGPM.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Tendo como beneficiário os usuários do Centro Social Miguel Arraes e o atendimento de 100 instituições com projetos e ações na área de tecnologia nos setores de educação, terceiro setor, empresarial e governamental a través da criação de 1 núcleo de inovação.

COMPONENTE 2 - FORTALECER A INFRAESTRUTURA E A HABITABILIDADE URBANA ASSOCIADA AS AÇÕES DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA.

Através deste componente espera-se ter como beneficiários dos seus produtos:

2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.

Beneficiários Diretos e Indiretos: A ampliação de 8.4 km de rodovias de alta capacidade carga no Distrito Industrial e Logístico beneficiará diretamente mais de 120 empresas de médio e grande porte já instaladas e possibilitando a triplicação da área útil.

Esta ação terá impacto indireto na totalidade do território e atuará diretamente sobre as empresas instaladas no polo industrial e logístico, ampliará as oportunidades de emprego e renda da população economicamente ativa, ampliará a arrecadação, em especial atenção o ISS, o IPI e o IPTU e do município.

2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.

Beneficiários Diretos e Indiretos: A pavimentação de 27 km de vias vias coletoras e vicinais e recapeamento de 30km de vias coletoras e arteriais irá beneficiar cerca de 235 mil habitantes. Esta ação terá impacto em parcelas de todos os Distritos municipais e atuará diretamente sobre o sistema de transporte público de passageiros e indiretamente a cerca de 60% dos 683.285 habitantes do município.

2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.

Beneficiários Diretos e Indiretos:

A implantação de uma via parque com cerca de 5 km, com ciclovia, faixa de pedestres drenante, pista para mobilidade de baixa emissão, áreas de convivência, iluminação LED, bacias de retenção, galerias hidráulicas, estabilização e revegetação de margens, entre outras SbN, terá um impacto na área diretamente afetada beneficiando 32 mil habitantes em um raio de 750m de intervenção.

Este subcomponente terá impacto direto em 4 bairros densamente povoados Piedade com 67.421 hab., Candeias com 72.530 hab., Cajueiro Seco com 56.966 hab. e Barra de Jangada com 41.270 hab.) que serrão cortados pela via principal e de forma indireta nas Regionais Administrativas 5 e 6 que totalizam juntas cerca de 181.000 hab. (IBGE, 2022). Criando uma alternativa ao transporte público de passageiros metropolitano.

Considerando a projeção de impacto, através do agrupamento dos setores censitários do IBGE, 2022 e os perímetros de potencial impacto socioambiental definidos pela prefeitura do Jaboatão, 2025 a Lagoa Olho D'Água está localizada numa área de alta densidade urbana com uma população da Área Diretamente Afetada (ADA) de 52.612 habitantes; com uma população da Área de Influência Direta (AID) de 263.069 habitantes e uma população da Área de Influência Indireta (AII) e 346.749habitantes.

2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.

Beneficiários Diretos e Indiretos: A intervenção em 10 áreas de risco e 16 setores vinculados em área de muito alto risco de deslizamento de massa e/ou inundação nas áreas de maior vulnerabilidade social, beneficiará cerca de 16 mil habitantes nas áreas das microbacias hidrográficas associadas diretamente.

Contudo os pontos são representados de forma dispersa no território municipal, nos diversos distritos municipais pelas comunidades vinculadas aos setores classificados como de risco muito alto para movimentos de massa e/ou inundação que totalizam segundo o Plano Municipal de Redução de Risco (2025) 60.417 habitantes.

COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.

Através deste componente espera-se ter como beneficiários dos seus produtos:

3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto direto nas cinco regionais administrativas com menor percentual de cobertura da rede e com presença significativa de populações em estado de vulnerabilidade social nos novos fronts de urbanização do município.

Como benefícios diretos ampliação das vagas ofertadas na educação infantil de promoverá um acréscimo de: 11,44% na regional 1, de 49% na regional 3, de 24,23% na regional 5 e 53% na regional 5; E no Ensino Fundamental de 8,5% na regional 1; 24,23 na regional 3 e de 6,8% na regional 6.

3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.

Beneficiários Diretos e Indiretos: A ampliação irá beneficiar diretamente o sistema de atenção básica a saúde ampliando em cerca de 20% o atendimento da totalidade dos usuários. E de forma indireta e transversal na qualidade

de vida da população, na redução de gastos e uso de serviços de média e alta complexidade.

Ampliação da cobertura da atenção primária em saúde das ESF de 57% para 70%, com a implantação de novas equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, beneficiando aproximadamente 45.000 habitantes.

3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto direto nos 10 bairros com menores indicadores sociais do município e nos que possuem os maiores índices de crimes violentos letais intencionais sobre populações jovens e periféricas. Destacando-se o bairro de Prazeres como o segundo mais violento do Estado de Pernambuco. Os equipamentos atenderam áreas de vulnerabilidade socioeconômica dentro dos elencados bairros, representando áreas consolidadas de ocupação informal. Estes dez bairros totalizam uma população de 220.000habitantes mil habitantes aproximadamente, representando cerca de 35% da população municipal e representam 60% da população com rendimento nominal per capita mensal inferior a meio salário-mínimo.

Ampliação dos espaços/equipamentos de lazer e esportes em 10 comunidades periféricas de elevado grau de vulnerabilidade social em todos os distritos municipais. Ampliação do sistema de espaços livres públicos municipal.

COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA.

Através deste componente espera-se ter como beneficiários dos seus produtos:

4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação terá impacto direto nos quadros de planejamento, gestão e fiscalização de projetos, contratos e similares da prefeitura municipal. Impactando de forma direta as unidades administrativas finalísticas de obras (Secretarias Municipais de Infraestrutura, Saúde, Educação, Desenvolvimento econômico etc.) e a unidades meios de viabilização (Secretaria Executivas de Licitações e Contratos; Capitação de Recursos e projetos Especiais; Planejamento, Orçamento e Gestão, Projetos de Engenharia e Arquitetura, Controladoria Geral do Município, etc.). Bem como, ao tornar mais eficiente os processos de gestão a população municipal serão beneficiada.

4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação irá dar eficiência aos fluxos de processos e fomentar o monitoramento adequado e a avaliação por resultados das ações do Projeto Jaboatão 2030. Servindo de boa prática e com potencial de replicação do modus operandi para os demais projetos e para a cultura organizacional da prefeitura, beneficiando assim, o conjunto da gestão e seus mais de 6.5mil funcionários.

4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.

Beneficiários Diretos e Indiretos: Esta ação tem como público diretamente beneficiado o conjunto da sociedade jaboatonense, ao ampliar e qualificar melhor os canais de interlocução social, com a melhoria do atendimento e eficiência dos técnicos municipais das unidades administrativas de controle interno, da ouvidoria municipal e dos sistemas administrativos e financeiros.

Quadro 16: Beneficiários das áreas diretamente afetadas, dos impactos diretos e indiretos por componente d eintervenção.

Cmponente	Solução	Beneficiários		
		Área Diretamente Afetada - Impacto Direto	Impacto Direto	Impacto Indireto

1	**1.1** Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.	200.937 (domicílios / estabelecimentos) cobertura cadastral.	Modernização e atualização cadastro imobiliário e estabelecimemtos de módulos multifinalitários; Ampliação da Arrecadação;	Ampliação da Interação com demais sistemas de gestão e melhoria das políticas públicas.
	1.2 Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.	6.200 funcionários em 10 Unidades Administrativas Municipais e duas autarquias.	Redução da sobreposição de funções e sistemas, integração entre base de dados; estabelecimento de sistemas de monitoramento e gestão por resultados integrado;	Melhoria das políticas públicas setoriais, infraestrutura de dados e redes comoartilhada, gestão mais transparente e acesso de informações ao cidadão.
	1.3 Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.	Requalificação do Centro Social Miguel Arraes e criação de 1 núcleo de inovação; Atender a 100 instituições com projetos e ações na área de tecnologia nos setores de educação, terceiro setor, empresarial e governamental	Ampliação da taxa de crescimento de abertura de novos negócios de tecnologia e inivação; Ampliação das parcerias interistitucionais (público-privado, público e terceiro setor, públicos e educacional, público-público).	Maior capacidade de inovação de atividades econômicas e sociais, ampoliação das empresas de tecnilogia, inovação e de serviços especializados. Ampliação de iniciativas de inovação, econômia criativa, pesquisa e desenvolvimento.
2	**2.1** Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.	Ampliação de 8.4 km de rodovias de alta capacidade carga no Distrito Industrial e Logístico. Beneficiando, beneficiando mais de 120 empresas de médio e grande porte já instaladas e possibilitando a triplicação da área útil.	Ampliação da capacidade de carga, Eliminação de retenções de tráfego e ampliação das conexão entre eixos macroarterias metropolitanos.	Redução da emissão de gases popuidores, ampliação da eficienia logistica e da competitividade empresarial.

2.2 Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (Rodoviário e Ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.	Pavimentação de 27 km de vias vias coletoras e vicinais e recapeamento de 30km de vias coletoras e arteriais. Beneficiando cerca de 235 mil habitantes.	Ampliação da conexão intermoldal e ampliando a fluidez urbana e a acessibilidade universal aos equipamemntos de transporte de massa. Ampiando a capacidade de carga, reduzindo retenções de tráfego na área de transbordo do sistema público de passageiros rodoviário/ferroviária.	Ampliação da mobilidade ativa, das conexões intermodais, ampliando o uso de transporte público d epassageiros e reduzindo o fluxo de veículos unitários.
2.3 Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.	Implantação de uma via parque com cerca de 5 km, com ciclovia, faixa de pedestres drenante, pista para mobilidade de baixa emissão, áreas de convivência, iluminação LED, bacias de retenção, galerias hidráulicas, estabilização e revegetação de margens, entre outras SbN, Com 32 mil habitantes na área diretamente afetada, raio de 750m de intervenção.	Ampliação da mobilidade, de 180 mil habitantes e criação de alternativa viária para a parcela sul metropolitana ligando Jaboatão ao Cabo de St Agostinho; redução de alagamentos e áreas de risco, ampliação dos espaços de laser, esporte e contemplação.	Ampliação da resiliencia urbana voltada aos eventos climáticos extremos e de eventos sazonais de variação da maé associada ao período chuvoso.

2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.	Intervenção em 10 áreas de risco e 16 setores vinculados em área de muito alto risco de deslizamento de massa e/ou inundação nas áreas de maior vulnerabilidade social. Beneficiando 16 mil habitrantes nas áreas das microbacias hidrográficas associadas.	Melhoria da mobilidade e da drenagem urbana associada as áreas de risco; Melhoria da habitabilidade das comunidades objeto da intervenção.	Ampliação da resiliencia urbana, eliminação de situações de perigo em 4 regionais municipais.	
3	**3.1** Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental.	Reforma de 2 creches (Regionais 1 e 3); Construção de 1 creche (Regional 5); Construção de 3 Escolas (Regionais 1, 3 e 6)	Ampliação das vagas ofertadas na educação infantil de: 11,44% na regional 1, de 49% na regional 3, de 24,23% na regional 5 e 53% na regional 5; No Ensino Fundamental de 8,5% na regional 1; 24,23 na regional 3 e de 6,8% na regional 6.	Redução da demanda reprimida, ampliação dos indices de produtividade e consequentememnte da arrecadação e melhoria do acesso e permanencia escolar; melhoria dos indices de apredizagem do ensino.
	3.2 Ampliar e qualificar a Atenção Primária à Saúde em Jaboatão dos Guararapes.	Implantação de 11 equipamentos de Saúde: Construção de 10 UBS tipo II e 1 UBS tipo III, beneficiando 35 mil pessoas e 4,5 mil pessoas respectivamente.	Ampliação da cobertura da atenção primária em saúde das ESF de 57% para 70%, com a implantação de novas equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, beneficiando aproximadamente 45.000 habitantes.	Redução do déficit assistencial, melhoria dos indicadores de produtividade e ampliação dos repasses para a saúde. Ampliação das ações preventivas a população e redução do impacto de atendimemtos de média e alta complexidade.

3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.	Requalificação de 10 espaços/equipame de Esporte associado a infraestruturas de lazer e convivência.	Ampliação dos espaços/equipamentos de lazer e esportes em 10 comunidades periféricas de elevado grau de vulnerabilidasde social em todos os distritos municipais. Ampliação do sistema de espaços livres públicos municipal.	Redução da ociosidade juvenil, ampliação de espaços de convivência comunitária intergeracional, fortalecimento de políticas sociais em áreas vulneráveis;

1. 7. **Anexos**

ANEXO 26 - Separata da LOA EDUCACAO

ANEXO 28 – Carta Fonplata

ANEXO 05 - Plano de Ação Estratégico Municipal - Parte 1

ANEXO 05 - Plano de Ação Estratégico Municipal - Parte 3

ANEXO 10 - Lei Complementar Nº 50/2024, de 31/12/2024

ANEXO 1 – Mapa das Zonas Especiais de Habitação de Interesse Social

ANEXO 02 - Demanda Reprimida de Matrículas

ANEXO 27 - Apresentação GTEC

ANEXO 09- Decreto Municipal N°22/2025

ANEXO 07 - Mapa de Situação do Trecho da Via Parque

ANEXO 08 - Organograma da Unidade de Gestão do Projeto UGP Proposta

ANEXO 09- Decreto Municipal N°22/2025 - Parte 1

QUADRO DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS VERSÕES DE ANEXOS

ANEXO 29 – Plano Municipal de Educação - Parte 1

ANEXO 09- Decreto Municipal N°22/2025 - Parte 2

ANEXO 03 - Plano de Ação Área de Desenvolvimento Econômico

ANEXO 04 - Mapa de Intervenções Prioritárias do Polo Industrial

ANEXO 06 - Plano de Ação da Via Parque

ANEXO 07 - Mapa de Situação do Trecho da Via Parque

ANEXO 08 - Plano de Ação Educação

ANEXO 09- Plano de Ação saúde

ANEXO 10 - Plano de Ação Esporte e Lazer

ANEXO 12 - Lei Complementar Nº 50/2024, de 31/12/2024

ANEXO 13 - Matriz de Responsabilidade SDE

ANEXO 14 - Matriz de Responsabilidade SDU

ANEXO 05 - Plano de Ação Estratégico Municipal - Parte 2

ANEXO 17 - Matriz de Responsabilidade INFRAESTRUTURA

ANEXO 18 - Matriz de Responsabilidade EDUCACAO

ANEXO 20 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SDE

ANEXO 21 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SDU

ANEXO 24 - Atestado de Capacidade Tec e Ger INFRAESTRUTURA

ANEXO 25 - Atestado de Capacidade Tec e Ger EDUCACAO

ANEXO 26 - Separata da LOA SDE

ANEXO 27 - Separata da LOA SDU

ANEXO 01 - Mapa de Zoneamento Municipal

ANEXO 31 - Plano Diretor Municipal

ANEXO 32 - CARTA Banco de desenvolvimento FONPLATA

ANEXO 22 - Atestado de capacidade Tec e Ger SEPLAG

ANEXO 15 Matriz de Responsabilidade SEPLAG

ANEXO 02 - Demanda Reprimida de Matrículas

ANEXO 05 - Plano de Ação Área de Infraestrutura

ANEXO 11 - Decreto municipal n 22 de 2025

ANEXO 29 - Separata da LOA SAUDE

ANEXO 29 – Plano Municipal de Educação - Parte 3

ANEXO 23 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SAUDE

ANEXO 33 - Matriz Geral de responsabilidades do projeto Jaboatão 2030.

ANEXO 05 - Plano de Ação Estratégico Municipal - Parte 4

ANEXO 29 – Plano Municipal de Educação - Parte 4

ANEXO 16 - Matriz de Responsabilidade SAUDE

ANEXO 30 - Separata da LOA INFRAESTRUTURA

ANEXO 06 - Mapa de Intervenções Prioritárias do Polo Industrial

ANEXO 29 – Plano Municipal de Educação - Parte 2

ANEXO 29 – Plano Municipal de Educação - Parte 5

ANEXO 14 - Matriz de Responsabilidade INFRAESTRUTURA

ANEXO 4 LDO 2026 APROVADA

ANEXO 15 - Matriz de Responsabilidade EDUCACAO

ANEXO 16 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SDE

ANEXO 35 MAPA SÍNTESE DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS - JABOATÃO 2030

ANEXO 18 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SAUDE

ANEXO 19 - Atestado de Capacidade Tec e Ger INFRAESTRUTURA

ANEXO 21 - Separata da LOA SDE

ANEXO 23 - Separata da LOA SEPLAG

ANEXO 24 - Separata da LOA SAUDE

ANEXO 25 - Separata da LOA INFRAESTRUTURA

ANEXO 8 ORGANOGRAMA UGP

ANEXO 17 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SDU

ANEXO 20 - Atestado de Capacidade Tec e Ger EDUCACAO

ANEXO 22 - Separata da LOA SDU

ANEXO 11 - Matriz de Responsabilidade SDE

ANEXO 03_B - PROJETO DE LEI PPA 2026-2029

ANEXO 03_A - PROJETO DE LEI PPA 2026-2029

ANEXO 12 - Matriz de Responsabilidade SDU

ANEXO 03_C - PROJETO DE LEI PPA 2026-2029

ANEXO 13 - Matriz de Responsabilidade SAUDE

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Áreas estratégicas

O Projeto Jaboatão 2030 foi estruturado tendo como pressuposto o alinhamento entre políticas públicas nos três níveis de governo, sendo assim, seu **objetivo geral** e os seus **objetivos específicos** consideraram os **eixos do Plano Plurianual Federal (PPA 2024–2027)**, estando integralmente direcionados na maioria dos casos e nos demais transversalmente direcionados as prioridades da administração pública consignadas no referido Plano Plurianual, especialmente nas áreas estratégicas dos eixos:

Combate à desigualdade territorial e inclusão produtiva; (Objetivos Específicos integralmente direcionados: 2, 3 e 4).

Meio ambiente, resiliência e adaptação climática; (Objetivos Específicos integralmente direcionados: 2 e 3).

Desenvolvimento social e garantia de direitos e; (Objetivos Específicos integralmente direcionados: 1 e 4).

Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental. (Objetivos Específicos integralmente direcionados: 1, 2 e 3).

Considera-se ainda o alinhamento as áreas estratégicas previstas nos artigos 12º, 13º, 14º e 15º da Resolução Cofiex nº32/2025 e do Anexo I da Lei nº 14.802, de 2024: a saber:

I - Combate à fome e redução das desigualdades; (Objetivos Específicos transversalmente direcionados: 1, 2 e 4).

II - Educação básica; (Objetivo Específico diretamente direcionado: 3).

III - Neoindustrialização, trabalho, emprego e renda; (Objetivo Específico do pleito diretamente vinculados: 1 e 2).

IV - Saúde: atenção primária e especializada; (Objetivo Específico do pleito diretamente vinculado: 3).

V - Novo Plano de Aceleração do Crescimento; (Objetivos Específicos do pleito diretamente vinculados: 2, 3).

VI - Combate ao desmatamento; e (Objetivo Específico do pleito transversalmente direcionado: 2).

VII - Enfrentamento à emergência climática. (Objetivos Específicos do pleito diretamente vinculados: 2).

Estas áreas estratégicas da aludida resolução em sua última atualização se desdobram em subáreas, as quais foram incorporadas na concepção do Projeto Jaboatão 2030. Pode-se observar uma correlação direta entre o Áreas Estratégicos, os Objetivos do Projeto, seus Componente e Indicadores correlatos conforme Figura 10 e **quadro 17** ,**18 e 19** a seguir.

ÁREAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVO ESPECÍFICO	COMPONENTE / RECURSO ALOCADO	INDICADORES – MONITORAMENTO E RESULTADOS
303; 306; 209.	**1. Modernização** da gestão pública municipal por meio do **fortalecimento do governo digital** e ampliação da **eficiência fiscal**.	**1 –** Gestão e Inovação **(10,8%)**	**1** Quantitativo de módulos multifinalitários disponibilizados a gestão municipal (MMD); **2** Percentual de cobertura da atualização do cadastro imobiliário (CACI); **3** Índice de integração de sistemas ativos e acessíveis online (IIC); **4** Quantidade de ações e oportunidades geradas pelo Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão; **5** Número de profissionais capacitados;
111; 201; 202; 205; 210.	**2.** Expansão da **infraestrutura urbana estratégica** para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos **territórios periféricos** em **áreas suscetíveis a desastres.**	**2 –** Infraestrutura Sustentável e Competitividade Territorial **(54,47 %)**	**6** Percentual de pavimentação concluída em áreas priorizadas; **7** Variação na arrecadação tributária de empresas localizadas nas áreas beneficiadas; **8** Percentual de pavimentação e recapeamento executado; **9** Indicador de Condição de Manutenção (ICM); **10** Indicador de Chamados da Ocorrências da Defesa Civil (ICO);
102; 111; 103; 113.	**3.** Ampliação das **infraestruturas sociais**, com especial atenção aos serviços básicos de **saúde, educação, assistência social e esporte e lazer** em territórios **periféricos** socioeconomicamente **vulneráveis**.	**3 –** Infraestrutura Social **(26,02 %)**	**11** Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE) Anos iniciais do ensino fundamental; **12** Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) Anos iniciais do ensino fundamental; **13** Cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde no território municipal; **14** Número de intervenções nos equipamentos de lazer e esportes..

Quadro 17: C**orrelação dos componentes e subcomponentes com as áreas estratégicas do Anexo II da Resolução Normativa N° 1/2024, atualizada.**

Eixo Central de Intervenção de Correlação entre a Área Estratégica e o Projeto Jaboatão 2030.

OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

O Programa tem neste **OE 111 -** Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura seu eixo central, com forte articulação entre os **Componentes 2 e 3** que juntos representam **80,49% do total do investimento.**

Tendo como objetivos específicos diretamente relacionados:

Expansão da **infraestrutura urbana estratégica em áreas economicamente dinâmicas e com ampliação das conexões intermodais visando** a integração e o desenvolvimento territorial de forma **sustentáve**l, incluindo o fortalecimento dos **territórios periféricos** em **áreas suscetíveis a desastres;**

Ampliação das **infraestruturas sociais**, com especial atenção aos serviços básicos de **saúde**, **educação, assistência social** e **esporte e lazer** em **territórios** periféricos socioeconomicamente **vulneráveis**.

Destaca-se que as metas são viáveis, de alto impacto, mensuráveis e projetam alto potencial de replicabilidade e sinergias ao projeto. Abrangem a redução da vulnerabilidade social, a modernização e ampliação de infraestruturas integradas de mobilidade com diversos modais, ampliam a resiliência das comunidades periféricas aos eventos climáticos extremos e melhoria da habitabilidade.

Eixos Secundários ao Objetivo Central do Programa Jaboatão 2030, mas que Guardam Relação Direta aos Componentes:

OE 210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem, com forte articulação ao objetivo específico 2 e ao Componentes 2;

Promoverá impacto estrutural de alta magnitude com a dotação de infraestrutura de alta capacidade de carga para suporte aos setores econômicos, com especial atenção aos arranjos produtivos industriais e logísticos, revertendo o processo de desindustrialização e dinamizando atividades de maior valor agregado com tecnologias mais modernas, através de um processo de neoindustrialização.

OE 205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios, com forte articulação ao projeto em seu objetivo específico 2 e ao Componentes 2;

Promoverá impacto estrutural de alta magnitude da infraestrutura de suporte aos setores econômicos, minimizando deseconomias urbanas e ampliando as vantagens locacionais comparativas, tornando os empreendimentos mais competitivos.

OE 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente, com forte articulação ao projeto em seu objetivo específico 2 e ao Componentes 2;

Promoverá impacto estrutural de moderada magnitude na reestruturação de espaços urbanos de alta densidade de ocupação em áreas de risco de desastres e suscetíveis a efeitos dos eventos climáticos extremos com atributos de interesse ambiental e paisagens notáveis.

OE 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas, com forte articulação ao projeto em seu objetivo específico 2 e ao Componentes 2;

Promoverá impacto estrutural de alta magnitude na reestruturação de espaços urbanos de alta densidade em áreas de risco de desastres e suscetíveis a efeitos dos eventos climáticos extremos em territórios periféricos e com populações de baixa renda.

OE 103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes, com forte articulação ao projeto em seu objetivo específico 3 e ao Componentes 3;

Promoverá impacto estrutural de moderada magnitude na oferta de serviços de educação e de forma transformadora aparelhando os territórios periféricos com equipamentos e serviços sociais em áreas de alta demanda reprimida e

baixos índices de alfabetização e permanência escolar.

OE 102 -Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), com forte articulação ao projeto em seu objetivo específico 3 e ao Componentes 3;

Promoverá impacto estrutural de alta magnitude nos serviços de atenção básica a saúde e de forma transformadora aparelhando os territórios periféricos com equipamentos e serviços sociais em áreas de alta vulnerabilidade e incidência de agravos a saúde.

OE 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura, com forte articulação ao projeto em seu objetivo específico 3 e ao Componentes 3;

Promoverá impacto estrutural de alta magnitude da ambiência urbana, da competitividade estratégica, da habitabilidade com reestruturação de infraestruturas, redução de riscos e vulnerabilidades a desastres e de forma transformadora aparelhando os territórios periféricos com equipamentos e serviços sociais.

OE 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida, com forte articulação ao objetivo específico 3 e ao Componentes 3;

Promoverá impacto social transformador da ambiência urbana e de habitabilidade com reestruturação de espaços e equipamentos públicos voltados a espaços periféricos e socialmente vulneráveis.

OE 303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população, com forte articulação ao objetivo específico 1 e aos Componentes 1 e 4;

Promoverá impacto estrutural na capacidade de gestão pública e da eficiência das políticas municipais, potencializando os efeitos do projeto.

OE 306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos, com forte articulação ao objetivo específico 1 e aos Componentes 1 e 4.

Promoverá impacto estrutural na capacidade de manutenção do projeto e de investimentos futuros.

OE 209 - Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade, com forte articulação ao objetivo específico 1 e aos Componentes 1 e 4.

Promoverá impacto transformador do ambiente corporativo e da prestação de serviços a população.

ÁREAS ESTRATÉGICAS	PRODUTO
303; 306; 209.	**1.1.** Modernização do **cadastro imobiliário** e implantação de **módulos multifinalitários**.
	1.2. Implantação de **plataformas de interoperabilidade entre sistemas** de gestão pública.
	1.3. Implantar o **Núcleo Municipal de Inovação de Negócios,** Tecnologia e Gestão.
111; 201; 202; 205; 210.	**2.1** Ampliação da **infraestrutura do polo logístico e industrial** do município.
	2.2 Fortalecimento das conexões entre os **moldais de transporte público de passageiros** (Rodoviário e Ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.
	2.3 Ampliação da **infraestrutura associada** a adaptação as **mudanças climáticas**.
	2.4 Intervenção em setores classificados como de muito **alto risco** de deslizamento de massa e alagamentos.
102; 103; 111; 113.	**3.1. Construção, ampliação e qualificação** de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da **Educação** Infantil e Ensino Fundamental.
	3.2. Ampliar e qualificar a Atenção Primária à Saúde em Jaboatão dos Guararapes por meio da construção de novas unidades, promovendo acesso equitativo, redistribuição territorial e melhoria da qualidade do cuidado em territórios vulneráveis.
	3.3. Requalificação de **espaços de lazer e esportes** em **periferias** e comunidades **vulneráveis.**

Quadro 18: **Correlação das áreas estratégicas do Anexo II da Resolução Normativa N° 1/2024, com os Produtos/Soluções Propostas no Projeto Jaboatão 2030.**

ITEM	COMPONENTE	PRODUTO	ÁREAS ESTRATÉGICAS (Referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº1/2024)
1	**Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.**	1.1 Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.	303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população;
			306 - Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos
		1.2 Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.	303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

ITEM	COMPONENTE	PRODUTO	ÁREAS ESTRATÉGICAS (Referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº1/2024)
1.3 Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.	209 - Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade;		
1.4 Implantação do Núcleo de Gestão de Projetos e Monitoramento – NGPM	303 - Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população;		
2	**Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática.**	2.1 Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município.	205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios
		2.2 Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (Rodoviário e Ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades.	210 - Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem;
		2.3 Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.	111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

ITEM	COMPONENTE	PRODUTO	ÁREAS ESTRATÉGICAS (Referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº1/2024)
201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente			
2.4 Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.	202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas;		
3	**Ampliação da infraestrutura social com espacial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social, esportes e lazer, em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.**	3.1 Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental.	103 - Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes
			111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

ITEM	COMPONENTE	PRODUTO	ÁREAS ESTRATÉGICAS (Referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº1/2024)
3.2 Ampliar e qualificar a Atenção Primária à Saúde em Jaboatão dos Guararapes por meio da construção de novas unidades, promovendo acesso equitativo, redistribuição territorial e melhoria da qualidade do cuidado em territórios vulneráveis.	102 -Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)		
	111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;		
3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.	113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida		

ITEM	COMPONENTE	PRODUTO	**ÁREAS ESTRATÉGICAS** (Referidas no Anexo II da Resolução Normativa nº1/2024)
			111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

Quadro 19: C**orrelação dos componentes e subcomponentes com as áreas estratégicas do Anexo II da Resolução Normativa N° 1/2024, atualizada.**

Quanto a análise do nível de adequação e de impacto do projeto a cada área estratégica indicada no pleito em relação a Resolução Normativa Cofiex nº1 de 2024, temos: **(Quadro 19 - A).**

No que se refere ao **objetivo geral** do pleito destaca-se que por tratar-se de um projeto global de obras múltiplas, o Projeto Jaboatão 2030 se adequa a mais de uma área estratégica, expressa através de seus componentes, abrigando vínculos diretos aos objetivos estratégicos da resolução Cofiex e do PPA Federal: 102, 103, 203, 204, 306 e 310. E de forma indireta as áreas estratégicas: 209, 111 e 113.
Quanto aos **Indicadores**, observa-se que a **totalidade dos 14 indicadores** foram estabelecidos conforme a metodologia SMART e possuem metas com vínculo direto aos objetivos específicos das áreas estratégica.
Informa-se que o projeto Jaboatão 2030, possui **alta capacidade de replicabilidade das soluções de seus componentes** com impactos estruturantes em defesa ou transformadores da realidade municipal, principalmente na ampliação da resiliência urbana, redução de riscos e ampliação da capacidade e inovação econômica. As metas foram elencadas para abrigar sinergias com sobreposição de impactos positivos. Destaca-se que as metas possuem fontes de dados base e projeções de alcance real, possuindo maturidade de projetos e detalhamento de cronogramas físico-financeiro. Cabe ressaltar que o município já vem desenvolvendo ações preparatórias a mais de 2 anos visando a atua proposição do pleito.
Informa-se que a maior parcela dos recursos (**cerca de 60%**) está diretamente alocada ao atendimento em compatibilidade a mais de uma área estratégica da, a saber: enfrentamento à emergência climática; educação básica saúde: atenção primária e especializada.
Consideradas as alternativas possíveis, destaca-se que as soluções empregadas para o cumprimento de objetivos e atendimento de metas diretamente relacionadas à área estratégica são altamente **eficientes e viáveis**.
Síntese da Análise: O Projeto apresenta alto nível de adequação e de impacto dos projetos a cada área estratégica indicada no pleito.

Quadro 19-A: **Nível de adequação e de impacto dos programas ou projetos a cada área estratégica indicada no pleito aos condicionantes da Resolução Normativa Cofiex nº1 de 2024.**

Destaca-se ainda que, o projeto guarda estreita compatibilidade aos eixos do **Novo Mapa da Estratégia Municipal** previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias **(LDO)** e no Plano Plurianual municipal **(PPA 2025–2029)** no eixo *"Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade Ambiental e Oportunidade ao Cidadão"* e aos seus Subeixos: urbanismo e meio ambiente e economia sustentável os quais estão atrelados aos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS da ONU**: **6, 9, 10, 11, 13 e 14**, contribuindo diretamente para a **Agenda 2030 no Brasil**.

Ressalta-se a estreita compatibilidade ao **Plano Diretor Municipal** e aos instrumentos de planejamento orçamentário municipal (PPA, LDO e LOA). Registra-se, ainda, que, o pleito enquadra-se nas prioridades elencadas no diagnóstico sócio territorial que conformou o **Plano Estratégico Jaboatão 500anos**.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Antecedentes na execução direta de projetos globais de ações múltiplas pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes

O município do Jaboatão dos Guararapes possui histórico e experiência de execução direta de projetos globais de ações múltiplas, decorrentes de operações de crédito bem-sucedidas, a exemplo do Fundo Nacional de Infraestrutura e Saneamento - FINISA/Caixa Econômica Federal/Brasil – 2023/2025; do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES/Programa de Modernização Administrativa – PMAT 2015/2016.

Em grande medida, o modelo gerencial proposto para execução do Projeto JABOATÃO 2030 tem sido a práxis da administração municipal, enquanto cultura organizacional internalizada pelo corpo funcional, sobretudo em relação aos grandes projetos executados nos últimos anos, a exemplo daqueles captados junto ao PAC Seleções do Governo Federal, bem como, decorrente de operação de crédito, conforme citado anteriormente.

Nesse sentido ainda, cabe ressaltar que, diferentemente de um layout tradicionalmente departamentalizado e segregado de outras prefeituras municipais, o Complexo Administrativo, sede da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes adota um modelo de layout aberto e integrado, a partir de estações de trabalho, onde as equipes das dez secretarias municipais interagem de forma continua e permanente, reduzindo o tempo de resolução dos processos integrados, além de já utilizar, há mais de dois, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), enquanto solução oficial do Governo Municipal para produção e gestão de documentos e processos administrativos eletrônicos.

A própria estrutura administrativa atual, aprovada na Lei Complementar Nº 50/2024, de 31/12/2024 (**Anexo 10**) contribui para uma gestão compartilhada de tomada de decisões e resoluções de problemas entre as dez secretarias municipais, especialmente em relação as decisões estratégicas de cunho operacional, uma vez que, os próprios secretários e secretárias municipais dividem um mesmo espaço físico, ao lado do gabinete do Prefeito, em layout aberto, diariamente.

Proposta de Governança do Projeto

O Projeto Estruturador de Desenvolvimento Sustentável do Jaboatão dos Guararapes – Jaboatão 2030 adotará um arranjo institucional híbrido e orientado por projeto, capaz de garantir a execução eficiente, efetiva e transparente das ações propostas.


A governança do Projeto será assegurada pela criação de uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP-Jaboatão 2030), vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, responsável pela coordenação central e pela interlocução direta com órgãos de controle, agentes financeiros e instâncias federais e estaduais.

A UGP terá como atribuições principais:

- Garantir o alinhamento da implementação das ações previstas ao PPA 2026–2029, LDO e LOA, bem como, às diretrizes nacionais e internacionais de financiamento;
- Promover a articulação institucional entre as secretarias executoras, órgãos de apoio, conselhos municipais e a sociedade civil, entre outros;
- Promover a gestão integrada da execução físico-financeira, com base em indicadores de desempenho, metas pactuadas e metodologias de monitoramento em tempo real;
- Promover a eficiência administrativa por meio da padronização de processos, com foco em tempestividade e economicidade, com o apoio da Secretaria Municipal de Administração, a quem cabe essa competência de padronização, e demais órgãos coexecutores, no que couber;
- Realizar o controle e auditoria permanentes, assegurando a conformidade legal e a transparência na aplicação dos recursos, com o apoio da Controladoria Geral e da Procuradoria Geral do Município, bem como, com a auditoria independente a ser contratada para essa finalidade

A figura a seguir exemplifica a inserção da UGP no fluxograma matricial de processos da Prefeitura Municipal (**Anexo 8 - Organograma da Unidade de Gestão do ProjetoUGP Proposta).**

Organograma da Unidade de Gestão do ProjetoUGP Proposta.

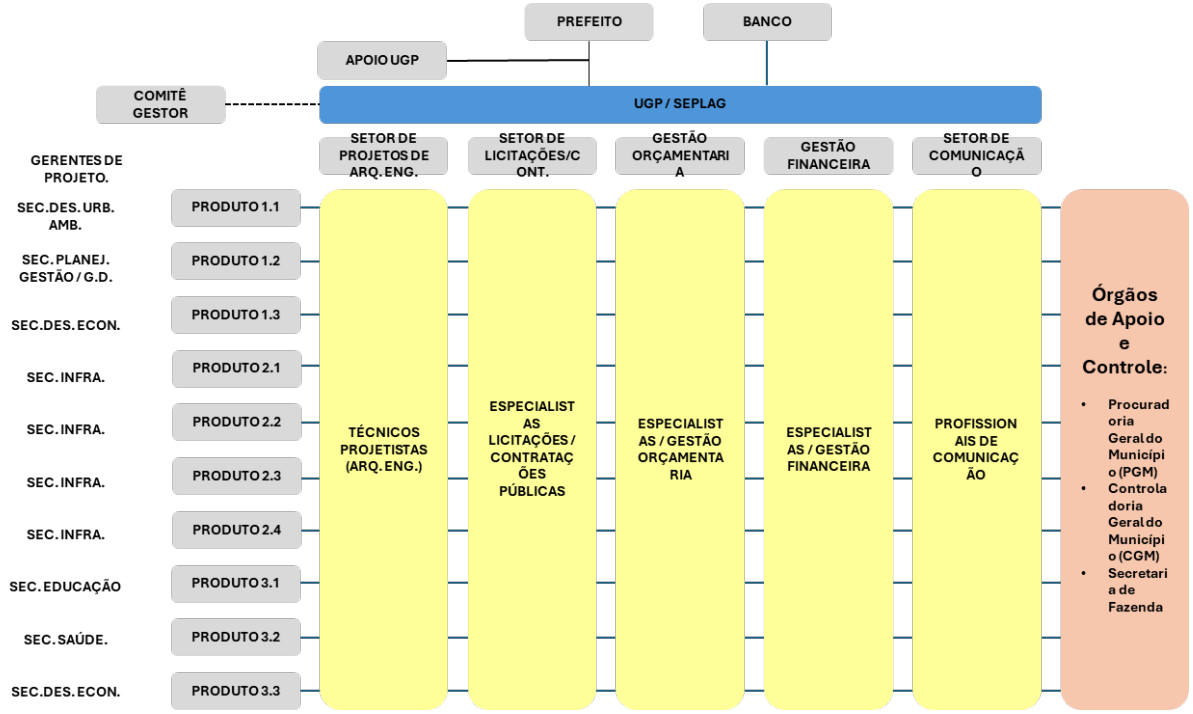

A governança contará ainda com:

- Colegiado Gestor: órgão deliberativo que assegurará decisões colegiadas e integradas, com participação das Secretarias Municipais de Fazenda e Administração, Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Município, que juntos com a Secretaria de Planejamento e Gestão conformam o atual Comitê de Governança do municípal (**Anexo 9 - Decreto Municipal N°22/2025**).

- Grupo Técnico Intersetorial: composto por servidores qualificados das áreas técnicas e por instituições parceiras, no que couber, a exemplo de universidades, concessionárias de serviços, conselhos, de modo a ampliando a base de conhecimento e especialização.

A gestão do projeto será descentralizada, com responsabilidade compartilhada entre as secretarias municipais, que assumem papéis definidos, otimizando competências institucionais:

a) Órgão Coordenador Principal:

- Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão ? coordenação estratégica, articulação institucional, monitoramento de resultados e integração com Cofiex/STN, agente financeiro e órgãos estaduais.

b) Órgãos Executores Setoriais:

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental - ordenamento territorial, gestão ambiental, regulação do uso do solo, responsável pela implantação do cadastro multifinalitário;
- Secretaria de Municipal de Planejamento e Gestão - governança da área de tecnologia e inovação do governo municipal; realizar as ações de implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública, por meio da Secretaria Executiva de Governo Digital;.
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes - fortalecimento produtivo, inovação, economia criativa, turismo sustentável e esportes, responsável pela implantação do Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão e pela requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis;
- Secretaria Municipal de Infraestrutura - execução de obras de mobilidade, drenagem e requalificação urbana, responsável pelas obras viárias e das encostas previstas no Projeto;
- Secretaria Municipal de Educação - implantação, modernização e manutenção de escolas e equipamentos educacionais;
- Secretaria Municipal de Saúde - ampliação da atenção primária, construção de unidades básicas e fortalecimento da rede preventiva.

c) Órgãos de Apoio e Controle:

- Procuradoria Geral do Município (PGM) ? respaldo jurídico e análise de conformidade legal;
- Controladoria Geral do Município (CGM) ? auditoria, transparência e monitoramento da integridade;
- Secretaria de Fazenda ? gestão financeira, desembolsos e prestações de contas.

Esse arranjo visa promover a efetividade (cada secretaria responde por sua especialidade), eficiência (eliminação de sobreposições e padronização de processos) e controle rigoroso (responsabilidade definida e monitorada).

3. 1. 17. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Órgãos parceiros:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. 1. 18. **Estrutura Operacional:**

O Município do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG, dispõe de capacidade institucional consolidada para a implementação do Projeto JABOATÃO 2030, apoiada por um histórico de execução de políticas públicas integradas por parte de seu corpo técnico e operacional nas áreas de Planejamento, Orçamento e Governo Estratégico; Governo Digital; Projetos Especiais e Captação de Recursos; e Projetos de Arquitetura e Urbanismo.

A estrutura operacional será centralizada na Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), vinculada à SEPLAG, que contará com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais da própria SEPLAG, a exemplo da equipe de monitoramento e acompanhamento de políticas públicas, além de técnicos das demais secretarias municipais responsáveis pela execução nas suas respectivas áreas de competência, que serão distribuídos entre os núcleos de Monitoramento e Controle Operacional e Núcleo Técnico, organizados em coordenações com atribuições específicas e competência técnica comprovada em ações similares, inclusive com experiência prévia em outros projetos financiados por organismos nacionais.

Cada resultado/produto previsto no Projeto terá um gerente de projeto responsável, indicado pela secretaria municipal responsável direta pela ação, que se articulará com as diversas áreas da prefeitura (elaboração de projetos, licitações, contratos, execução de obras etc.) com vistas a viabilizar a execução daquele produto sob a sua responsabilidade.

De um modo geral, a equipe do Núcleo Técnico da UGP contará com perfis técnicos especializados, como engenheiros(as), arquitetos(as), assistentes sociais, analistas de planejamento, técnicos ambientais, economistas, advogados(as), administradores(as), geógrafos e especialistas em aquisições e finanças públicas. Os profissionais terão atribuições claras, formalizadas em instrumento normativo próprio (Portaria de criação da UGP), conforme modelo a ser pactuado entre o agente financeiro e o município.

Além disso, o município prevê a contratação de especialistas e ou consultorias técnicas especializadas, com vistas a apoiar no que couber, a supervisão de obras, elaboração de projetos, gestão do programa, mapeamento socioeconômico, entre outras ações necessárias a implementação das ações, de modo a agregar, quando necessário, capacidade adicional à equipe permanente formada pelos técnicos municipais.

A estrutura operacional contará com:

-Espaço físico exclusivo para a UGP, integrado à estrutura da SEPLAG, no âmbito do Complexo Administrativo da Prefeitura;

-Recursos de TI e sistemas de monitoramento próprios, a exemplo de Dashboard público online - plataforma web e mobile apresentando indicadores em tempo real, permitindo à população acompanhar execução, gastos e resultados, além de Sistema de interoperabilidade: integração de dados do projeto aos sistemas já em implantação (cadastro multifinalitário, interoperabilidade municipal e núcleos de inovação);

-Orçamento para capacitação técnica continuada, fortalecimento institucional e produção de materiais técnicos;

-Veículos e logística para visitas técnicas e mobilização em campo;

-Suporte administrativo-financeiro integrado com o sistema de gestão da Prefeitura.

As coordenações técnicas da UGP serão integradas a um sistema digital de controle e acompanhamento do Plano Operativo Anual (POA) e do Plano de Execução do Projeto (PEP), com relatórios regulares de desempenho físico e financeiro, sob a responsabilidade da Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Governo Estratégico – SEPOG/SEPLAG.

A concepção da estrutura foi pensada de modo a garantir o acompanhamento em tempo real dos avanços do programa e permitir ações corretivas em caso de desvios, a exemplo do é feito com as ações estratégicas da Prefeitura, nos ciclos de monitoramento a cargo da SEPOG/SEPLAG.

A execução financeira do Projeto está preliminarmente prevista para ser centralizada na SEPLAG, por meio da UGP. Os demais órgãos parceiros na consecução das ações do Projeto contribuirão com apoio técnico e operacional, com base em instrumentos formais de cooperação intersetorial. Tal modelo operacional será mais bem detalhado e aperfeiçoado, considerando às diretrizes nacionais e internacionais de financiamento, na etapa posterior de preparação, após apreciação deste pleito por parte da COFIEX.

Essa modelagem assegura a execução eficiente e integrada do programa, combinando capacidade técnica interna, apoio externo qualificado e articulação interinstitucional, garantindo o atingimento dos objetivos e metas do Projeto JABOATÃO 2030 dentro do prazo e escopo pactuados.

Além do acima explicitado, cabe destacar a qualificação atual dos profissionais do corpo técnico da prefeitura, tanto do corpo efetivo, inclusive no que se refere aos mais de 600 egressos do concurso público realizado recentemente pela Prefeitura em diferentes áreas de atuação, quando dos cargos em comissão, com sólida experiência em políticas públicas, planejamento e gestão, diretamente envolvidos com o Projeto e em áreas estratégicas da Prefeitura.

3. 1. 19. **Matriz de Responsabilidade:**

ANEXO 30 MATRIZ RACE - RESPONSABILIDADES.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade das ações a serem implementadas pelo Projeto Jaboatão 2030 será assegurada por um conjunto articulado de estratégias voltadas à manutenção das infraestruturas, à operacionalização dos serviços públicos ofertados e à construção de capacidades comunitárias e institucionais de manutenção e zeladoria, a exemplo das ações de requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

COMPONENTE 1 – MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL.

A manutenção das ações implementadas será garantida por meio das ações como:

- Melhor desempenho do IPTU com a implantação do cadastro territorial multifinalitário. Sobre essa ação cabe ressaltar que segundo um estudo de 2016 , aproximadamente 1.500 dos 5.570 municípios brasileiros não arrecadavam o IPTU de maneira eficiente, o que corresponde a cerca de 27% dos municípios. Além disso, a implantação do cadastro territorial multifinalitário permitirá a atualização da base de cálculo do IPTU por parte Poder Executivo Municipal, sem necessidade de aprovação legislativa da planta genérica de valores. No município do porte do Jaboatão dos Guararapes, a implementação de um cadastro multifinalitário e a adesão ao SINTER (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais) se constituem em passos imprescindíveis em direção a uma boa gestão do território urbano e rural. Esses instrumentos melhoram o planejamento e a arrecadação de tributos, além de facilitar a regularização fundiária e a expansão de infraestrutura e serviços públicos. Além disso, eles promovem a transparência, a segurança jurídica e a eficiência administrativa ao centralizar informações territoriais, beneficiando a gestão tributária e o desenvolvimento sustentável, resultando em uma administração pública mais integrada. A melhoria do desempenho do IPTU impactará diretamente a receita municipal, possibilitando o aumento do investimento em ações, sobretudo, de zeladoria urbana;

- Articulação junto às instituições já parceiras da Prefeitura em ações similares como o Sistema S e, ainda, junto a outras instituições como o Porto Digital, no sentido de firmar instrumentos de cooperação técnica e financeira no sentido de promover uma operação compartilhada do Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão, além de parcerias com as empresas instaladas no polo logístico do município.

COMPONENTE 2 – EXPANDIR A INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL

Estão previstas a manutenção dos seguintes itens:

- As ações de melhoria da infraestrutura urbana sustentável, a exemplo do recapeamento asfáltico para melhorar o desempenho dos ônibus e reduzir tempo de viagem dos Corredores de Transporte Público; do recapeamento asfáltico para melhorar o tráfego de veículos dentro dos bairros/comunidades, conectando vias arteriais e locais em Vias Coletoras; da pavimentação de pequenas vias para inclusão urbana e redução do isolamento de comunidades vulneráveis de Vias em Áreas de Interesse Social, contarão com a atuação contínua das ações de zeladoria do município, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. No caso específico das ações de melhoria da infraestrutura do polo logístico e industrial, se prevê a manutenção nos primeiro cinco anos dessa infraestrutura, em parte, pela utilização de recursos de compensação ambiental decorrentes da implantação dos novos empreendimentos;

- No caso das ações referentes aos setores de risco, estão previstos a elaboração de Projetos Urbanísticos para revisão e novas intervenções nos territórios; e manutenção das melhorias urbanas realizadas (como escadarias, iluminação, drenagem, entre outras); incluindo a manutenção de ações de resiliência climática e redução de riscos com a continuação dos núcleos de voluntários e novas capacitações, monitoramento das áreas de risco e gestão de grupo para acompanhamento do crescimento ordenado e preservação das áreas verdes;

COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA SOCIAL EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.

Estão previstas a manutenção dos seguintes itens:

- Manutenção da infraestrutura social de Educação e Saúde que foram construídos por meio do incremento do repasse de recursos pelos respectivos fundos constitucionais, a partir da operação dos referidos equipamentos;

- Manutenção compartilhada, no que couber, em conjunto com as associações comunitárias locais das comunidades beneficiadas com os espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis requalificados, por meio de processos de educação cidadã e parcerias com o empresariado local.

As ações acima citadas acima serão operacionalizadas com apoio técnico das secretarias e órgãos específicos de cada área de ação, além de incorporarem em seu planejamento as manutenções necessárias após a sua construção e operação. Os órgãos responsáveis por cada uma dessas ações são:

- Secretaria Municipal de Infraestrutura: absorverá ações de zeladoria urbana, incluindo limpeza urbana; manutenção urbana; conservação ambiental urbana; e acessibilidade, por meio da Secretaria Executiva de Conservação Urbana e Patrimonial;

- EMLUME - Empresa Municipal de Energia e Iluminação Pública: manutenção da iluminação pública;

- Secretaria de Governo: policiamento municipal, combate ao vandalismo, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Cidadã;

-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental: implantação e manutenção do cadastro multifinalitário;

-Secretaria de Infraestrutura: monitoramento contínuo das áreas de risco, de intervenções de contenção de encosta resiliência urbana e núcleos de voluntários, por meio da Secretaria Executiva de Defesa Civil;

- Secretaria Municipal de Saúde: operação e manutenção dos equipamentos de saúde implantados.

- Secretaria Municipal de Educação: gestão de escolas e espaços educativos implantados;

- Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania: apoio na implementação das ações nas áreas de periferias e comunidades vulneráveis, e quando a ação exigir ações de desapropriação;

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes: operação e manutenção do Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão e dos espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis requalificados.

Todos esses órgãos terão previsão de recursos operacionais em seus respectivos orçamentos alinhados ao Plano Plurianual (PPA) Municipal 2026–2029, garantindo a cobertura dos custos.

COMPONENTE 4 – GESTÃO DO PROJETO.

Este componente é de fundamental importância com vistas a promover sustentabilidade dos arranjos institucionais e operacionais após a implementação do projeto.

A gestão das ações dos demais componentes será monitorada por um sistema digital integrado, com base em dados georreferenciados, relatórios periódicos, avaliações participativas e capacitação do corpo técnico, permitindo ajustes e correções ao longo do tempo de execução do projeto.

A manutenção e operacionalização desse sistema vai estar sob responsabilidade da UGP, com o apoio da Secretaria Executiva de Planejamento, Orçamento e Governo Estratégico – SEPOG/SEPLAG.

Por fim, de modo transversal a todas as iniciativas acima descritas, com vistas a assegurar a execução plena das entregas e sua sustentabilidade no tempo, se prever ainda a implementação das seguintes ações:

Matriz de Responsabilidades: definição detalhada das atribuições por componente, subcomponente e secretaria, com metas físicas e financeiras claras. Essa matriz será integrada ao sistema municipal de monitoramento estratégico (dashboard digital);

Contratos de desempenho: cada secretaria executora firmará termo de compromisso com indicadores de entrega e manutenção, vinculando desembolsos à performance;

Gestão integrada por projetos: adoção de metodologia Project Management Office (PMO) municipal, baseada em boas práticas do PMI, com acompanhamento de cronograma físico-financeiro, análise de riscos e relatórios de resultados;

Plano de manutenção preventiva e corretiva: todas as obras e equipamentos entregues terão plano de O&M (Operação e Manutenção) elaborado já na fase de projeto, garantindo sustentabilidade técnica e financeira;

Capacitação continuada: equipes técnicas municipais receberão treinamento em gestão de contratos, operação de sistemas digitais, soluções baseadas na natureza (SBN) e manutenção de infraestrutura urbana;

Parcerias comunitárias: inclusão de associações comunitárias e conselhos locais na fiscalização social da manutenção dos equipamentos, reforçando o controle social e o sentimento de corresponsabilidade.

Por fim, cabe ressaltar que esta proposta de gestão visa incorporar elementos inovadores que aumentam a factibilidade:

Dashboard público online: plataforma web e mobile apresentando indicadores em tempo real, permitindo à população acompanhar execução, gastos e resultados.

Sistema de interoperabilidade: integração de dados do projeto aos sistemas já em implantação (cadastro multifinalitário, interoperabilidade municipal e núcleos de inovação).

Modelo híbrido de execução: combinação de execução direta (secretarias) com parcerias público-privadas (PPPs) e convênios com universidades locais (UFPE, UFRPE), a exemplo do Plano Municipal de Redução de Risco, ampliando assim capacidade técnica e tecnológica, bem como, a contratação de consultorias técnicas especializadas, no que couber.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Correlação do Projeto JABOATÃO 2030 com o novo Mapa da Estratégia do Município (PPA 2026-2029)

No âmbito da escala local/municipal no que se refere as prioridades da Administração Pública, este projeto JABOATÃO 2030 apresenta uma estreita correlação com as diretrizes e objetivos estratégicos do novo **Mapa da Estratégia** do município, definido no âmbito do novo **Plano Plurianual do Jaboatão dos Guararapes (PPA 2026–2029)** que, por sua vez, apresenta-se integralmente alinhado aos **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS** da ONU, contribuindo diretamente para a **Agenda 2030** no Brasil.

Além disso, ainda na escala local/municipal, encontra-se alinhado com as diretrizes e objetivos do **Plano Diretor** do município, atualmente em revisão, bem como, aos demais instrumentos do planejamento orçamentário municipal LDO e LOA. Registra-se, ainda, que este projeto enquadra-se nas prioridades elencadas no diagnóstico socioterritorial resultante do **Plano Estratégico Jaboatão 500anos**.

NOVO MAPA DA ESTRATÉGIA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES (PPA 2026-2029)

Foram definidas quatro diretrizes estratégicas, que traduzem os compromissos centrais da gestão para o quadriênio, orientando a formulação de políticas, programas e projetos. As diretrizes estão desdobradas em treze objetivos estratégicos, com intuito de mensurar os resultados, assegurando a clareza e o foco na entrega de valor à sociedade. Estas diretrizes também estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, como evidenciado a

seguir no Quadro 4:

QUADRO 04: **Correlação Entre as Diretrizes da Estratégia Municipal e os Componentes do Projeto Jaboatão 2030.**

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO DIRETRIZ ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	COMPONENTE RELACIONADO
1: GESTÃO TRANSPARENTE, DIGITAL, COM FOCO EM RESULTADOS E CONECTADA COM AS PESSOAS	Fortalecer a capacidade institucional da administração municipal, promovendo práticas inovadoras de gestão pública orientadas pela transparência, eficiência e participação social. Essa diretriz abrange o aprimoramento da governança, a modernização dos processos administrativos, a transformação digital dos serviços e a integração entre secretarias. Busca ainda consolidar uma gestão pública mais aberta, responsiva e centrada no cidadão, garantindo a utilização eficiente dos recursos públicos, a melhoria contínua da qualidade dos serviços ofertados e o fortalecimento da confiança da população nas instituições municipais.	EQUILÍBRIO FISCAL - Fortalecer a efetividade dos gastos públicos e aumentar a receita, com equilíbrio fiscal. EFICIÊNCIA DA GESTÃO E TRANSPARÊNCIA – Promover transformação digital, aprimorar processos para melhoria da eficiência da gestão e fomentar a transparência e a participação cidadã. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E CULTURA ORGANIZACIONAL – Desenvolver os servidores e fortalecer a cultura organizacional colaborativa com foco na excelência do serviço ao cidadão.	COMPONENTE 1 - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO DIRETRIZ ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	COMPONENTE RELACIONADO
2: INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E INOVADOR	Promover o crescimento econômico aliado à sustentabilidade ambiental, à inovação e ao fortalecimento da infraestrutura urbana. Essa diretriz abrange o planejamento e a ordenação do território, a melhoria da mobilidade urbana, a ampliação do acesso à habitação e ao saneamento, bem como a implementação de soluções tecnológicas e práticas inovadoras que qualifiquem os serviços públicos e estimulem novos investimentos. Seu objetivo é consolidar um ambiente favorável ao empreendedorismo, à geração de emprego e renda, e ao desenvolvimento equilibrado do município, assegurando qualidade de vida à população e maior resiliência diante dos desafios urbanos e ambientais.	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - Ampliar e qualificar a infraestrutura e a mobilidade, promovendo o desenvolvimento urbano e ambiental. NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS – Fortalecer os arranjos produtivos, o empreendedorismo e a geração de emprego e renda, com inovação, sustentabilidade e inclusão. GESTÃO FÍSICO-TERRITORIAL – Melhorar a gestão estratégica do território e a adaptação às mudanças climáticas, promovendo a resiliência e redução de riscos de desastres. HABITAÇÃO E SANEAMENTO - Ampliar a oferta de habitação e saneamento básico, promovendo habitabilidade e qualidade de vida.	COMPONENTE 1: 1.3 Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão. Componente 2 - Fortalecer a infraestrutura e a habitabilidade urbana sustentável associada as ações de resiliência climática. 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município. 2.2: Fortalecimento das conexões entre os moldais de transporte público de passageiros (rodoviário e ferroviário) e das vias coletoras e suas capilaridades. 2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas. 2.4 Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos
3: DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM EQUIDADE	Essa diretriz visa a implementação de políticas nas áreas da educação municipal e assistência social, com foco na promoção da inclusão, na redução das desigualdades e na garantia de direitos. Busca assegurar uma educação de qualidade, valorizando a aprendizagem e permanência escolar, ao mesmo tempo em que fortalece a rede de proteção social para as famílias em vulnerabilidade. Também contempla a ampliação de oportunidades e o acesso equitativo a serviços para pessoas com deficiência, promovendo sua participação social.	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – Elevar a qualidade da educação básica de forma universal, inclusiva e inovadora, com atenção à primeira infância. REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES – Fortalecer e ampliar as políticas públicas sociais, reduzindo os índices de vulnerabilidade, a pobreza e as desigualdades. INCLUSÃO – Ampliar a inclusão das pessoas com deficiência, garantindo atendimento humanizado e oportunidades.	Componente 3 - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis. 3.1 Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO DIRETRIZ ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	COMPONENTE RELACIONADO
4: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Essa diretriz tem como foco a promoção do bem-estar da população por meio da ampliação e qualificação dos serviços públicos essenciais. Abrange as áreas da saúde, assegurando acesso universal, atendimento humanizado e o fortalecimento da rede de atenção básica e especializada; a segurança, com iniciativas de prevenção, proteção social e promoção da convivência comunitária; e a cultura, como instrumento de inclusão, cidadania e valorização da identidade local. Seu objetivo é garantir à população serviços eficazes e acessíveis, promovendo o acolhimento, a qualidade de vida e o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões.	SAÚDE PARA TODOS – Qualificar os serviços de saúde, com atenção especial a saúde da família, através do atendimento humanizado, da oferta de medicamentos e da ampliação de vagas em consultas especializadas e exames. CULTURA, ESPORTE E LAZER – Promover atividades descentralizadas de cultura, esporte e lazer, para todas as idades, valorizando as vocações do território. SEGURANÇA – Fortalecer a segurança cidadã por meio de parcerias com a sociedade civil e entidades públicas e privadas para a prevenção da violência e promoção da convivência pacífica.	Componente 3 - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis. 3.2. Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis. 3.3 Requalificação de espaços de lazer e esportes em periferias e comunidades vulneráveis.

3. 4. **Anexos**

ANEXO 20 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SDE

ANEXO 21 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SDU

ANEXO 23 - Atestado de Capacidade Tec e Ger SAUDE

ANEXO 24 - Atestado de Capacidade Tec e Ger INFRAESTRUTURA

ANEXO 25 - Atestado de Capacidade Tec e Ger EDUCACAO

ANEXO 13 - Matriz de Responsabilidade SDE

ANEXO 14 - Matriz de Responsabilidade SDU

ANEXO 16 - Matriz de Responsabilidade SAUDE

ANEXO 17 - Matriz de Responsabilidade INFRAESTRUTURA

ANEXO 18 - Matriz de Responsabilidade EDUCACAO

Anexo 22 Atestado de capacidade Tec e Ger SEPLAG

ANEXO 34 - Organograma da UGP - Jaboatão 2030.

ANEXO 15 matriz de responsabilidade seplag

ANEXO 29 – Plano Municipal de Educação - Parte 2

ANEXO 29 – Plano Municipal de Educação - Parte 5

ANEXO 09- Decreto Municipal N°22/2025 - Parte 2

ANEXO 29 – Plano Municipal de Educação - Parte 1

ANEXO 29 – Plano Municipal de Educação - Parte 4

ANEXO 1 – Mapa das Zonas Especiais de Habitação de Interesse Social

ANEXO 29 – Plano Municipal de Educação - Parte 3

ANEXO 09- Decreto Municipal N°22/2025 - Parte 1

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Dificuldade na obtenção de imageamentos com adequada resolução em função de limitações climáticas para sobrevoo ou de visibilidade de satélites.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A obtenção dos imageamentos é dependente de fatores climáticos, que favorecem ou não a incidência de nuvens em caso de imagens de satélite e sobrevoos, para minimizar tais fatores, a convenção cartográfica estabelece o uso de janelas de sobrevoo nos períodos mais secos, bem como uma sobreposição maior entre os mosaicos aerofotogramétricos.

Esse risco tem como efeito negativo potencial a qualidade das restituições e a ausência de atributos de dados.

Prevenção e Mitigação:
Ação de Mitigação: ajustar o cronograma de execução para períodos de menor intensidade de nuvens e de períodos de maior precipitação.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.**

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Dificuldades de acesso as informações de atualização cadastral em campo.
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A exemplo de eventos como o censo geográfico do IBGE, identificou-se resistências da população em fornecer acesso as unidades edificadas, bem como a informações cadastrais do domicípio. Este processo pode ser alusivo à coleta de informações domiciliar para implantação e higienização do banco de dados para o cadastro multifinalitário. Este risco pode gerar o risco potencial de redução da amostragem.

Prevenção e Mitigação:
Ação de Mitigação: promover campanhas de educação e sensibilização da população municipal.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários.**

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Dificuldades/morosidade no acesso a dados cartoriais e informações territoriais.
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Em função da demanda natural dos serviços cartoriais e da potencial dificuldade de levantamento e repasse das informações com tratamentos adequados.

Este contexto foi identificado em processos que demandaram alta quantidade de serviços, a exemplo de processos de regularização fundiária de comunidades em ZEIS. O histórico vislumbrado é tratado aqui como risco potencial e podendo gerar efeitos negativos de morosidade e afetar o cronograma de execução de alguns produtos.

Prevenção e Mitigação:
Ação de Mitigação: Estabelecer acordo de cooperação técnica ou termo de parceria entre a prefeitura municipal e os serviços cartoriais municipais e demais órgão de informação, como a Superintendência de Patrimônio da União – SPU, A Agência de Desenvolvimento e Pesquisas de Pernambuco – Condepe/Fidem e o Instituto Tecnológico de Pernambuco – ITEP, etc.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários**.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Insuficiência de recursos para manutenção após implementação.
Impacto: Alto

Probabilidade: Baixa

Descrição:
Observando-se estudos de caso de ações similares, de projetos de aumento da rede de equipamentos e infraestruturas que requerem a elevação no custo de manutenção e operação se estabeleceu uma analogia ao projeto em potencial.

Para tanto, foi ajustado o escopo do projeto Jaboatão 2030 com ações que geram receita em potencial, que promovem maior eficiência da máquina pública e consequente redução de custos. Acrescido a isso se observou a necessidade de planejamento adequado da curva de investimento do custeio do município pare minimizar os efeitos negativos das novas estruturas sobre a capacidade de investimentos futuros.

Prevenção e Mitigação:
Ações de Mitigação: Previsão de custos de O&M no orçamento municipal e parcerias federais; ações de modernização administrativa e fiscal através do cadastro multifinalitário e fomento a arranjos produtivos locais de alto valor agregado vinculados ao polo industrial e de logística municipal ora por infraestruturas de suporte ora pela desburocratização municipal.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários. 1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes. 4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras. 4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa. 4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria**.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Resistência institucional e cultural à adoção de novas tecnologias
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Ao analisar casos de gestão corporativa de sucesso, identificados como boas práticas, observou-se que os entraves a modernização administrativa e a evolução da eficiência pública estava atrelada ao perfil dos recursos humanos.

Ao analisar o capital humano municipal registra-se baixa resistência a inovação e a adoção de novas técnicas e tecnologias, fato já observado em exemplos de digitalização do fluxo de processos administrativos com a adoção do Sistema SEI e de outros sistemas orçamentários e financeiros. Desta forma, foi possível identificar ações negativas dos setores de maior resistência e formas de minimizar as resistências potenciais.

Prevenção e Mitigação:
Ações de Mitigação: Programa de capacitação e acompanhamento contínuo.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários; 1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública. 1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes. 4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras. 4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.**

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Atrasos em cronogramas de integração tecnológica.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Algumas instituições públicas perdem a capacidade de manutenção e fixação de recursos humanos especializados nas áreas de tecnologia da informação que são associados a fatores de infraestruturas e qualidade e instrumentais adequados dos ambientes de trabalho, bem como a demandas crescentes no setor privado.

Esse contexto frequentemente pode afetar a execução adequada dos cronogramas de implantação.

Prevenção e Mitigação:
Ações de Mitigação: Contratação de equipe técnica especializada e implantação de processos de gestão ágil, valorização da mão-de-obra municipal e valorização salarial de recursos humanos estratégicos.

Este risco está associado aos produtos: **1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.**

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Insuficiência de recursos para manutenção após implementação.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Observando-se estudos de caso de ações similares, de projetos de aumento da rede de equipamentos e infraestruturas que requerem a elevação no custo de manutenção e operação se estabeleceu uma analogia ao projeto em potencial. Para tanto, foi ajustado o escopo do projeto Jaboatão 2030 com ações que geram receita em potencial, que promovem maior eficiência da máquina pública e consequente redução de custos.

Acrescido a isso, observou-se a necessidade de planejamento adequado da curva de investimento do custeio do município pare minimizar os efeitos negativos das novas estruturas sobre a capacidade de investimentos futuros.

Prevenção e Mitigação:
Ações de Mitigação: Previsão de custos de O&M no orçamento municipal e parcerias federais; ações de modernização administrative e fiscal através do cadastro multifinalitário e fomento a arranjos produtivos locais de alto valor agregado vinculados ao pólo industrial e de logística municipal ora por infraestruturas de suporte ora pela desburocratização municipal.

Este risco está associado aos produtos: **1.1: Modernização do cadastro imobiliário e implantação de módulos multifinalitários; 1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública. 1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes. 4.1 Fortalecimento da capacidade de supervisão técnica de obras. 4.2 Apoio ao Gerenciamento do Programa.4.3 Fortalecimento dos canais de controle e auditoria.**

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Ameaças de segurança cibernética.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Este risco está associado a ausência ou fragilidades de regulamentação de instrumentos jurídicos próprios e a adoção das leis federais como referência para defesa e segurança cibernética. No Jaboatão dos Guararapes, após alguns episódios de ataques ora frustrados ora exitosos.

Foram estabelecidos protocolos e fluxos de processos, que foram associados ao reforço de infraestruturas e de recursos humanos, acrescidos de treinamentos continuados para minimizar os riscos. Contudo o efeito potencial negativo de ataques cibernéticos permanece.

Prevenção e Mitigação:
Ações de Mitigação: Regulação jurídica municipal compatibilizada as normas nacional para estabelecimento de protocolos e rotinas avançados de segurança, monitoramento contínuo e capacitação dos recursos humanos, investimentos permanentes em infraestruturas de TI e sistemas de segurança e defesa cibernética.

Este risco está associado aos produtos: **1.2: Implantação de plataformas de interoperabilidade entre sistemas de gestão pública.**

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Necessidade de remoções de ocupações em áreas públicas.
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Em algumas situações previstas no projeto Jaboatão 2030, observa-se previamente interfaces de necessidade de remoções de ocupações em áreas públicas. Este fato gerará potenciais processos administrativos e/ou judiciais. Que estão sendo antevistos para dar celeridade a potenciais intervenções. A administração deve levar em consideração os direitos constitucionais, contudo o princípio do direito coletivo deverá prevalecer sobre o direito individual, garantindo a função social da propriedade pública urbana.

É sabido que a ocupação de um bem público é considerada mera detenção, não posse, o que impede a aquisição da propriedade por usucapião, não possuindo os ocupantes direito à propriedade ou indenização pelas construções.

Tendo o Estado o dever de garantir o desembaraço das áreas objeto de interesse público.

Prevenção e Mitigação:
Ação de mitigação: O traçado preliminar do projeto já previu a adoção de alternativa com menor percentual de remoções e já iniciou ações para evitar novas ocupações. Bem como, está em processo ações de notificação de ocupantes irregulares.

Este risco está associado aos produtos: **2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas.**

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Necessidade de remoções de ocupações em função do detalhamento do plano urbanístico associado a intervenção em áreas de risco.
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Nos casos de comunidades e habitacionais em terras de domínio da União será solicitado junto ao Serviço de Patrimônio da União (SPU) a doação ou cessão da área para o Município, com a finalidade de transferir a propriedade ou o uso do imóvel às famílias por meio dos instrumentos da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S), no caso de doação da área pela União, ou da Cessão do Direito Real de Uso (CDRU), no caso de cessão da área pela União. O levantamento das áreas pertencentes à União encontra-se em realização. Imperioso ressaltar, entretanto, que a Prefeitura do Recife vem em estreito contato junto à SPU desde o início da Gestão, não encontrando, até o presente, entraves técnicos e jurídicos que inviabilizassem quaisquer intervenções planejadas por esta Prefeitura do Recife.

Em caso das poligonais de intervenção estiverem sobrepostas as áreas de interesse social, portanto, via de regra, serão regularizadas conforme o disposto na Lei Federal Nº 13.465/2017 para Regularização Fundiária Urbana de interesse social (Reurb-S), compreendendo medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes, quando for o caso, mediante indicação de plano urbanístico e a consideração das restrições ambientais incidentes que prevaleceram, enquanto princípio da prevalência do público sobre o privado, em consideração ao princípio da precaução e prevenção ambiental e da garantia prevista no conceito de sustentabilidade socioespacial para as futuras gerações.

Prevenção e Mitigação:
Ação de mitigação: Associar a ações integradas de assistência social, regularização fundiária e reassentamentos através dos projetos municipais e do Novo PAC 2024 em andamento. Bem como priorizar sempre que possível a permanência de populações em seu local. Considerar a remoção quando da ocorrência de restrições ambientais e do risco ao patrimônio público.

Este risco está associado aos produtos: **2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas; 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município e 2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos.**

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Potencial descompasso entre o cronograma de obra e o calendário letivo da rede municipal.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Em função do andamento de obras físicas de equipamentos de média complexidade como os educacionais propostos, é notório que os cronogramas possam passar de 1 ano, o que pode gerar o descompasso com o calendário letivo. Contudo este é um risco aceitável e ações mitigadoras devem ser executadas. Pois os resultados positivos da implantação prevalecem a médio prazo.

No município, os equipamentos propostos irão ser direcionados para a demanda reprimida o que não afetará a dinâmica do cronograma letivo de alunos. Sendo o cronograma ajustado para a entrega quando possível até fevereiro para evitar o risco potencial de remanejamento de alunos.

Prevenção e Mitigação:

Ação Mitigadora: Realizar um planejamento prévio do cronograma físico-financeiro para minimizar extrapolação do período de entrega da construção além de março do ano corrente;

Este risco está associado aos produtos: **3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.**

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Potencial necessidade de recursos humanos para operação dos equipamentos. Possui alto impacto e baixa probabilidade de ocorrência.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Uma realidade comum a muitos municípios é a defasagem de profissionais nas áreas de educação e saúde para atender a demanda crescente, ao passo que se soma a demanda natural a migração no pós-pandemia Covid-19 de levas de alunos da rede privada para a pública, principalmente em municípios do nordeste brasileiro.

O risco de ausência de recursos humanos é potencial para a operação, fazendo-se necessário mecanismos de soluções temporárias e/ou definitivas para enfrentar esse risco potencial, seja por seleções simplificadas seja pela realização de certames de concurso público.

Prevenção e Mitigação:
Ação Mitigadora: o município realizou concurso público com a previsão do aumento da demanda da rede de educação, encontrando-se o certame em vigência até 2025 podendo ser prorrogado por dois anos para chamamento**.** O município também dispõe de contratos de terceirizados para serviços de suporte a gestão educacional vigentes e poderá executar novos processos em função de necessidades específicas**.**

Este risco está associado aos produtos: **3.1: Construção, ampliação e qualificação de equipamentos e mobiliários que atendam as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 1.3: Implantar o Núcleo de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão do Centro Cultural Miguel Arraes.**

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Inexistência de terrenos disponíveis ou adequados para a construção das novas USF no município.
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Um risco comum evidenciado em muitos municípios é a falta de terras públicas, o desconhecimento de sua propriedade ou a necessidade de registros cartoriais dos bens. Este fato pode gerar atrasos ou inviabilizar a implantação de equipamentos sociais relevantes em áreas específicas.

Tal fato traz para a criação de banco de terras e bens públicos uma dimensão importante no planejamento e gestão pública. Bem como destaca-se a necessidade de levantamento prévio de imóveis antes da capitação de recursos ou o estabelecimento de programas de aquisição de estoques de terras.

Prevenção e Mitigação:
Ação Mitigadora: Realizar mapeamento prévio dos terrenos disponíveis, considerando localização estratégica, acesso à população e viabilidade urbanística. Negociar cessões de áreas públicas ou parcerias com órgãos municipais para aquisição de terrenos. Garantir integração entre Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Planejamento Urbano e Procuradoria Municipal para agilizar processos de desapropriação ou aquisição. Monitoramento contínuo do cronograma de aquisição e da liberação de áreas, com ajustes no planejamento de obras para evitar atrasos significativos no projeto.

Este risco está associado aos produtos: **3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.**

4. 14. **Informações do 14° risco:**
Nome: Atraso na execução das obras devido a falhas no planejamento, logística ou coordenação entre setores.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Um risco comum evidenciado em muitos municípios é a ausência de expertise, de quadro técnico especializado e de estruturas de gestão permanentes que garantam execução das obras dentro de cronogramas pré-estabelecidos.

Os efeitos negativos desse risco são o descompasso de insumos e serviços com o cronograma de obra gerando atrasos da implantação dos equipamentos e infraestruturas. O projeto Jaboatão 2030, prevê como um dos componentes a Gestão do programa, em espelhamento a boas práticas existentes.

Prevenção e Mitigação:
Ação Mitigadora: Planejamento detalhado do cronograma físico-financeiro, acompanhamento mensal da execução e monitoramento de indicadores. Realização de reuniões periódicas de alinhamento entre Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Planejamento Urbano e Gerência de Obras. Contratos claros com fornecedores e empreiteiras, definição de etapas críticas e adoção de medidas corretivas imediatas em caso de desvios. Possibilidade de reforço de equipes temporárias e integração entre setores para tomada rápida de decisão.

Este risco está associado aos produtos: **3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis.**

4. 15. **Informações do 15° risco:**
Nome: Dificuldades de execução das obras nos períodos chuvosos ou em eventos extremos de chuva.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Em muitas regiões do Brasil observa-se períodos chuvosos intensos que acabam por comprometer a execução de obras. Este fato se apresenta como um risco limitante a adequada execução de cronogramas físicos. Levando, assim, a necessidade de adequações de planejamento e gestão ao calendário climático e em especial as médias e máximas de precipitação para evitar períodos chuvosos ou mitigar seus efeitos em etapas construtivas de menor impacto.

Prevenção e Mitigação:
Ação de mitigação: O cronograma irá prever a prioridade de início da execução no período de menor incidência de chuva e ajustará o cronograma das etapas para que as com menor impacto coincidam com os períodos de maior precipitação.

Este risco está associado aos produtos: **3.3: Revitalização de Campos de Futebol e Espaços Esportivos; 3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis; 2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos; 2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas; 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município; 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.**

4. 16. **Informações do 16° risco:**
Nome: Dificuldades de Licenciamento Ambiental, possui médio impacto e média probabilidade de ocorrência.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A ausência de planejamento e do fluxo adequado de processos através da interferência de outros órgãos, notoriamente os competentes pelo licenciamento urbanístico e ambiental geram, entraves a execução de projetos. No intuito de mitigar o risco de entraves técnicos no tocante ao licenciamento ambiental, equipes responsáveis da SMDU serão envolvidas nos projetos, através da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, esta integrante do organograma da Unidade Gerenciamento do Programa, desde a fase conceitual de Projeto, para que estes estejam em completa consonância com as normativas e diretrizes ambientais vigentes.

Há que se considerar, ainda, que os produtos do Projeto Jaboatão 2030 apresentados, quando couber, em consultas públicas com as comunidades locais, sempre que necessário, representantes de Instituições Públicas, Organizações não Governamentais e Conselhos de Classe, dentre outros.

No bojo dos licenciamentos ambientais, caberá também à aludida Secretaria executiva a responsabilidade de emissão de documentos ambientais autorizativos como por exemplo, o licenciamento ambiental único (LAU) para supressão vegetal das espécies da área de intervenção, a autorização para o resgate e transporte de animais silvestres, a emissão dos licenciamentos de operação para as atividades de aterros de inertes, a fim de que essas áreas façam a recepção dos resíduos sólidos gerados na obra, assim como o licenciamento para as áreas de empréstimo mineral (jazidas) e quando necessário, licenciamento ambiental único para perfuração de poços tubulares para canteiro de obras, dentre outros procedimentos de competência do Órgão.

Prevenção e Mitigação:
Ação de mitigação: O licenciamento ambiental da maior parcela das ações do projeto é de competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, uma vez ser este órgão integrante do Sistema Nacional para o licenciamento de obras e atividades de impacto, no temos da Lei Complementar nº 140/2011, de 08/12/2011. Esta Secretaria analisará os estudos ambientais e de viabilidade e emitirá Licença Prévia - LP para as atividades, contemplando as condicionantes e complementações necessárias à emissão da Licença de Instalação - LI, que autoriza o início das obras. Será realizada tratativas prévias de apresentação e consulta a instituições licenciadoras externas para minimizar potenciais entraves.

Este risco está associado aos produtos: **3.1 Ampliar e qualificar equipamentos educacionais em territórios vulneráveis; 3.2 Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde por meio da construção de novas unidades em territórios vulneráveis; 3.3: Revitalização de Campos de Futebol e Espaços Esportivos;2.4: Intervenção em setores classificados como de muito alto risco de deslizamento de massa e alagamentos; 2.3: Ampliação da infraestrutura associada a adaptação as mudanças climáticas; 2.1: Ampliação da infraestrutura do polo logístico e industrial do município; 1.3: Implantar o Núcleo Municipal de Inovação de Negócios, Tecnologia e Gestão.**

4. 17. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	Dólar	1.0000	52.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	13.000.000,00

5. 1. 1. Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	172	238

Juros aplicáveis:
SOFR + taxa à partir de 2% a.a
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Sobre o saldo empenhado e não desembolsado do financiamento, o Mutuário pagará comissão de compromisso, em dólares americanos, de 0,25% a.a.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
Será de 0,25% sobre o total dos recursos financiados.
Outros encargos:

0

Outras Informações:

0

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
COMPONENTE 1 - MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA COM GOVERNO DIGITAL E EFICIÊNCIA FISCAL					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.540.750,00	403.750,00	2.323.500,00	807.500,00	1.540.750,00	403.750,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 2 - FORTALECER A INFRAESTRUTURA E A HABITABILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL ASSOCIADA AS AÇÕES DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA.					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.632.600,00	813.000,00	10.677.200,00	1.666.500,00	8.829.900,00	1.473.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.547.300,00	1.128.000,00	381.000,00	254.000,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 3 - AMPLIAR A INFRAESTRUTURA SOCIAL EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.234.525,00	372.725,00	4.329.050,00	605.450,00	3.585.700,00	647.300,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.641.200,00	386.800,00	1.873.025,00	239.225,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
FONPLATA					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
372.700,00	729.700,00	469.050,00	1.032.050,00	469.050,00	1.032.050,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
324.525,00	634.775,00	228.175,00	369.925,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Municípios, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

- receitas próprias a que se refere o art. 156 da Constituição;
- recursos a que se refere o art. 158 da Constituição; e
- recursos a que se referem o inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição;

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 7. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 8. **Anexos**

CARTA ANUENCIA FONPLATA VPO_NOT-8569_25

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A execução da proposta em tela teve como pressupostos técnicos diversos documentos de base para a constituição dos seus componentes. Considera-se, ainda que, o município fez uso do seu arsenal jurídico existente e de referência para a política municipal de desenvolvimento urbano local, a qual tem como seu principal instrumento o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que passou recentemente por um processo participativo de revisão. Bem como, levou em consideração seus planos setoriais, em especial atenção o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) (**Figura 11**) e o Plano Local de Habitação de Interesse Social.

Figura 11: **Alguns Relatórios do PMRR do Jaboatão dos Guararapes.**



Fonte: PMJG, UFPE, MCidades, 2024-25.

Em nível municipal vale ressaltar, na temática da infraestrutura social, as prioridades estabelecidas pelos conselhos municipais de saúde, educação e de assistência social, bem como os seus respectivos planos.

Vale ressaltar que o município executou uma ampla consulta popular, no período de 12 a 30 de maio de 2025, com uma representação de cerca de 1,6% da população total do município, totalizando mais de 10.837 pessoas participantes nos diversos segmentos sociais, esta consulta serviu como lastro de representação social e definição das demandas sociais presentes. Sobreposto a esse processo de interlocução social, foram desenvolvidos estudos técnicos típicos de base orçamentária e financeira que propiciaram a construção das suas leis orçamentárias (PPA, LDO, LOA), o nono mapa da estratégia municipal (**Figura 12** – Mapa da Estratégia), sendo estas, bases para a análise da capacidade de investimento e endividamento do município.

Figura 12: **Mapa da Estratégia Municipal 2026-2029.**



Fonte: PMJG/SEPLAG, 2025.

É pertinente ressaltar que, o município, em 2025, finalizou o seu Plano de Ação Integrada de caráter operacional para o período de 2025-2028, elencando as ações prioritárias, estratégicas e táticas, com concepções básicas das infraestruras viárias, estudos de viabilidade prévia de ações urbanas, elenco e definição de áreas para locação de empreendimentos de saúde, educação, assistência social, esporte, lazer e cultura. O plano prevê tipologias de equipamentos e análises diversas sobre as áreas prioritárias a serem implantadas as ações.

Dentre as ferramentas de suporte a gestão de contratos desenvolvida pela municipalidade destaca-se a criação do Sistema Digital de Planejamento e Monitoramento, "*App do Prefeito: Monitoramento na palma da mão*" o qual permite o alcance da excelência na gestão pública, visto que demanda aos gestores uma visão sistêmica quanto à importância do desenvolvimento e acompanhamento do planejamento no setor público e que servirá diretamente para a gestão do projeto Jaboatão 2023. Registra-se que o App recebeu o prêmio na categoria "Gestão e monitoramento de projetos" pela instituição Facilit Conecta (**Figura 13**).


Figura 13: **Premiação do App de Planejamento e Gestão - Equipe SEPLAG/PMJG.**



Fonte: Facilit, 2025.

A ferramenta é um instrumento de modernização da administração, acessível, inovadora e de baixo custo desenvolvida permite que o usuário tenha o planejamento da gestão de forma organizada e planejada. Alguns resultados da plataforma: Aplicativo Móvel; Visão sistêmica dos Objetivos Estratégicos; Dados Gerais do Munícipio e também em áreas como Educação, Saúde, Infraestrutura entre outras; *Dashboard* de Resolutividade das Metas e Entregas; Integração da alta gestão com a utilização da ferramenta disseminada na Prefeitura e nas suas secretarias (**Figura 14**).

Figura 14: **App do Prefeito: Monitoramento na Palma da Mão.**

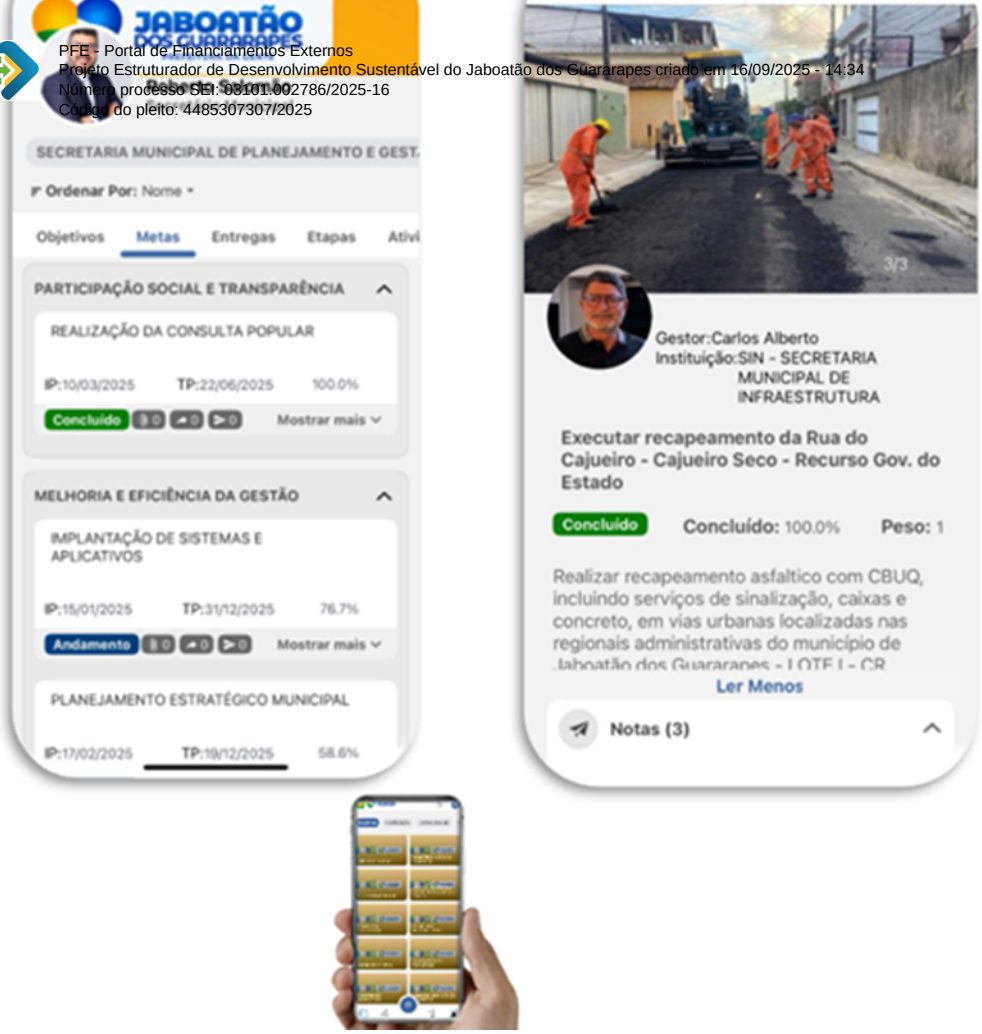

Fonte: PMJG, 2025.

Em nível estadual, destacam-se algumas ações do Governo de Pernambuco que são sinergicas o projeto Jaboatão 2030, considerando que, o município, enquanto integrante da Região Metropolitana do Recife (RMR), dispõe de um Plano Diretor Metropolitano de Desenvolvimento Urbano (PDDUI – RMR), de um Plano Diretor de Trânsito e Transporte Urbano (PDTTU – RMR) e do Plano Diretor do Complexo Industrial e Portuário de Suape (CIPS)[1][1] e deus diagnósticos de suporte, ressalta-se, ainda, que Jaboatão integra o território estratégico do CIPS.

Em nível federal, considera-se as diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 para a definição das relações estratégias e da sinergia dos componentes, aos quais foram sobrepostos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os quais estão alinhados ao novo mapa da estratégia municipal.

Com base nas aludidas ações o município estabeleceu os objetivos previstos no Projeto Jaboatão 2030 e como forma de facilitação metodológica apresenta-se o **quadro 5,** com as ações e instrumentos desenvolvidos e de base para as futuras ações por componente do projeto.

QUADRO 5: **Correlação Entre os Objetivos, Componentes e as Etapas de Suporte Já Realizadas.**

OBJETIVO GERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	COMPONENTES	ETAPAS DE SUPORTE REALIZADAS

Promover o desenvolvimento urbano e social sustentável, com foco em equidade territorial, inclusão produtiva e adaptação as mudanças climáticas no município do Jaboatão dos Guararapes/PE	**1.** Modernização da gestão pública municipal por meio do fortalecimento do governo digital e ampliação da eficiência fiscal;	**Componente 1** - Modernizar a gestão pública com governo digital e eficiência fiscal.	- Definição da nova estrutura administrativa e definição das competências institucionais das unidades da administração direta e indireta (Lei Complementar nº50/2024); - Realização de Concurso Público (vigente até 2026); - Elaboração do Plano de ações integradas 2025-2028 (Finalizado em 2025); - Construção do Novo Mapa da Estratégia 2026-2029;
		Componente 4 – Gestão do Programa.	- Realização de Concurso Público (vigente até 2026); - Criação por lei do Comitê de Governança Municipal; - Implantação do Sistema de Gestão Orçamentária - POD.
	2. Expansão da infraestrutura urbana estratégica para o desenvolvimento territorial de forma sustentável, incluindo o fortalecimento dos territórios periféricos em áreas suscetíveis a desastres.	**Componente 2** - Expandir e recuperar a infraestrutura urbana sustentável.	- Revisão do Plano Municipal de Redução de Riscos (finalizado em 2025); - Construção do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (Em elaboração); - Revisão do Plano Diretor e das Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (finalizando em 2025); - Elaboração do Plano de ações integradas 2025-2028 (Finalizado em 2025);

3. Ampliação das infraestruturas sociais, com especial atenção aos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e esporte e lazer em territórios periféricos socioeconomicamente vulneráveis.	**Componente 3** - Ampliar a infraestrutura social em territórios vulneráveis a desastres.	- Atualização do Plano Municipal de Educação – Demandas Reprimidas; - Elaboração do Plano de ações integradas 2025-2028 (Finalizado em 2025);

[1][1] DECRETO Nº 54.185, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 - Institui o Plano Diretor - SUAPE 2035 e dispõe sobre o ordenamento do uso e ocupação do solo do Complexo Industrial Portuário de Suape - CIPS.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download
