PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Roraima

Proponente: ESTADO DE RORAIMA
Processo SEI: 03101.002787/2025-61
Código do pleito: 874692895/2025
Versão: 1

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 30.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 3.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 08
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 09
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 10
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 11
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 12
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 12
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 14
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 14
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 15
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 17
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 18
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 19
1. 5. Componentes 20
1. 5. 1. Informações do 1° componente 20
1. 5. 2. Informações do 2° componente 21
1. 5. 3. Informações do 3° componente 22
1. 5. 4. Informações do 4° componente 24
1. 6. Beneficiários 24
1. 7. Anexos 25
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 26
2. 1. Áreas estratégicas 26
2. 2. Anexos 27
3. GESTÃO 28
3. 1. Arranjo institucional 28
3. 1. 1. Descrição 28
3. 1. 2. Orgãos Executores 29
3. 1. 3. Estrutura Operacional 29
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 29
3. 2. Operacionalização e Manutenção 29
3. 3. Planejamento Estratégico 30
3. 4. Anexos 30
4. RISCOS 31
4. 1. Informações do 1° risco 31
4. 2. Informações do 2° risco 31
4. 3. Informações do 3° risco 32
4. 4. Informações do 4° risco 32
4. 5. Informações do 5° risco 32
4. 6. Informações do 6° risco 33

4. 7. Informações do 7° risco 33
4. 8. Informações do 8° risco 33
4. 9. Informações do 9° risco 34
4. 10. Informações do 10° risco 34
4. 11. Informações do 11° risco 35
4. 12. Informações do 12° risco 35
4. 13. Informações do 13° risco 35
4. 14. Informações do 14° risco 36
4. 15. Anexos 36
5. FINANCIAMENTO 37
5. 1. Condições Financeiras da Operação 37
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 37
5. 2. Cronograma de Desembolso 39
5. 3. Contragarantias 40
5. 4. Anexos 40
6. ETAPAS REALIZADAS 41
6. 1. Etapas realizadas 41
6. 2. Anexos 41
7. CONTATOS 42
7. 1. Contatos 42
7. 2. Anexos 42

.

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Roraima
Sigla: Profisco III RR
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: ESTADO DE RORAIMA

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Governo de Roraima enfrenta desafios fiscais, sociais e econômicos que reforçam a necessidade de modernização da gestão pública para assegurar sustentabilidade financeira e a implementação de políticas que promovam desenvolvimento social e econômico no estado.

Com uma população de 716,8 mil habitantes em 2024, Roraima é o estado menos populoso do país, mas apresentou a maior taxa de crescimento demográfico nacional entre 2010 e 2024 (59,1%, contra média brasileira de 11,4%). Apesar desse dinamismo, os indicadores sociais do estado permanecem aquém da média nacional: em 2022, 45,1% da população vivia abaixo da linha da pobreza (contra 31,6% no Brasil), enquanto o IDH estadual (0,699) ficou abaixo da média nacional (0,766), colocando o estado entre os oito piores do país nesse indicador. Por outro lado, a taxa de analfabetismo em Roraima (3,9%) era uma das mais baixas do Brasil, mostrando avanços relativos na educação.

Segundo o IBGE a economia de Roraima é a menor do país em 2022, registrou PIB de R$ 21,1 bilhões, com PIB per capita de R$ 33.153 — equivalente a 66,8% da média nacional. A estrutura produtiva é fortemente concentrada no setor de serviços (82,8% do VAB), com destaque para a administração pública, que sozinha representa 47,1% do PIB estadual, quase três vezes a média brasileira (15,6%). A agropecuária, embora relativamente mais representativa que no Brasil (9,1% contra 6,7%), e a indústria (8,1%, contra 26,3% no país) apresentam baixa diversificação e competitividade, o que limita a capacidade de crescimento sustentado e deixa a economia vulnerável às oscilações nacionais.

No mercado de trabalho, a taxa média de desocupação de 2023 (6,75%) foi inferior à nacional (7,41%), mas a informalidade atinge 46,8% da força de trabalho, acima da média do país (39%). Esse quadro evidencia dificuldades estruturais para inserção produtiva formal e para geração de empregos de maior qualidade.

No aspecto fiscal, Roraima apresenta forte dependência de transferências correntes, que representaram 66% das receitas em 2023 — o terceiro maior índice do país. A arrecadação própria, liderada pelo ICMS, vem crescendo, e desde 2019 a participação do estado na arrecadação nacional desse imposto supera sua participação no PIB. Ainda assim, o peso elevado das despesas com pessoal (58,8% da RCL em 2023, acima do limite de alerta da LRF) compromete a flexibilidade fiscal e coloca Roraima entre os estados com maior gasto per capita com pessoal.

Apesar desses desafios, o Estado obteve nota “A” na avaliação de capacidade de pagamento (CAPAG) de 2024, refletidos pelos indicadores: I - Endividamento (“A” - 27,8% da RCL), II Poupança Corrente (“B” - 91,35% da RCL) e III - Liquidez Relativa (“A” - 9,23%). (https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag). A trajetória de evolução do endividamento (DC/RCL) registrou 27,15% em 2022, 27,96% em 2023 e 30,52% em 2024.

No Ranking de Competitividade dos Estados (CLP, 2024 - https://rankingdecompetitividade.org.br/estados), Roraima ocupa a última posição geral (27º lugar), refletindo deficiências crônicas em infraestrutura e baixo dinamismo econômico, apesar de avanços nos pilares de inovação, sustentabilidade ambiental e social. Para informações mais detalhadas vide **Anexo 01 - Diagnóstico Econômico e Social Roraima.**

Diante do atual cenário, é essencial modernizar a gestão fiscal e administrativa de Roraima para ampliar a eficiência da arrecadação, qualificar os gastos públicos, reduzir a dependência de transferências federais e fortalecer setores estratégicos que diversifiquem a economia, promovam inclusão social e aumentem a competitividade do estado.

O principal desafio fiscal será manter o crescimento da arrecadação própria, baseada majoritariamente no ICMS, e reduzir a dependência de recursos federais, já que despesas com pessoal e previdência consomem grande parte do orçamento, limitando investimentos. A Reforma Tributária sobre o Consumo (RTC) exigirá adaptações nas administrações tributária e financeira, com destaque para o novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ICMS e demandará mudanças institucionais e normativas.

Para enfrentar esses desafios, será necessário investir em planejamento e orçamento como base da sustentabilidade fiscal; aprimorar a gestão de recursos estratégicos para acelerar a transformação digital e melhorar o desempenho institucional; aumentar a eficácia tributária por meio da conformidade, redução de disputas fiscais e melhoria do ambiente de negócios; e integrar ferramentas de gestão fiscal às dimensões ambiental e social.

Para enfrentar estes desafios, o Estado pleiteia operação para a linha de crédito do PROFISCO III, cujos desafios da gestão fiscal subnacional e diretrizes do Programa são apresentados no **Anexo 02 - Marco de Referência do PROFISCO III.**

1. 2. 2. **Problema:**

O Estado de Roraima tem enfrentado desafios estruturais de grande relevância. Em 2018, foi submetido a uma intervenção federal em decorrência da crise migratória, do colapso dos serviços públicos e da insuficiência de recursos para atender às demandas emergenciais daquele período. Esse contexto agravou o desequilíbrio fiscal e elevou o nível de endividamento, intensificando a dependência do governo federal e evidenciando a urgência de reformas estruturantes.

Em 2025, foi realizada a aplicação da MD-GEFIS — Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal (vide **Anexo 03 – Relatório MD-GEFIS 2025 – RR**), que identificou fragilidades significativas nos pilares da gestão estratégica, tributária e financeira, além de limitações na qualidade do gasto público. O diagnóstico também apontou baixa inclusão digital e social, restrições tecnológicas e mecanismos incipientes de participação cidadã. Soma-se a esses desafios a necessidade de compatibilização dos processos e sistemas com a Regra de Transição da Reforma Tributária (RTC).

Essas questões foram organizadas conforme a estrutura dos três componentes do PROFISCO III RR, conforme apresentado no **Anexo 05 – Lógica Horizontal de Resultados do PROFISCO III RR**, permitindo uma abordagem integrada e orientada à superação dos entraves que comprometem a eficiência da gestão fiscal estadual.

Nesse contexto foram identificados os seguintes desafios estratégicos:

D.1 A gestão estratégica, de projetos, pessoas e TI apresenta processos ineficientes, com baixa transparência nas relações com a sociedade e participação social limitada. Avaliada como “Iniciante -” na MD-GEFIS, essa condição compromete a eficiência tributária, a justiça social e a qualidade dos serviços públicos.

D.2 O sistema tributário sobre o consumo é excessivamente complexo, com legislações fragmentadas e múltiplas alíquotas. Isso gera cumulatividade, penalizando setores com cadeias produtivas extensas e impactando a população mais pobre. A tributação na origem desestimula investimentos e exportações, intensificando a “guerra fiscal”. A diversidade de alíquotas reduz a transparência ao consumidor e eleva a litigiosidade. Harmonizar a Administração Tributária estadual à Regra de Transição é um dos grandes desafios da gestão fiscal, essencial para criar um sistema mais eficiente, simplificar obrigações e fortalecer a cooperação federativa.

D.3 O ICMS continuará como principal fonte de receita estadual até 2032, quando será substituído pelo IBS. Sua complexidade atual — com múltiplas alíquotas e regras — onera contribuintes e a administração, elevando custos de conformidade, litigiosidade e evasão fiscal, com perdas significativas de arrecadação. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/12/16/novos-tributos-comecam-a-sertestados-em-2026-e-transicao-vai-ate-2033.

D.4 A falta de integração e modernização dos sistemas de planejamento, execução orçamentária e gestão contábil-financeira compromete a produção de informações qualificadas, dificultando decisões e ameaçando a sustentabilidade fiscal. Isso resulta em alocação inadequada de recursos e aumento dos riscos fiscais.

D.5 A baixa adoção de tecnologias digitais e uma cultura de inovação ainda em construção limitam a eficiência da gestão fiscal, gerando serviços públicos de menor qualidade e custos adicionais ao contribuinte. Estudo do BID (2024) classificou o estado como “Iniciante” em maturidade digital, evidenciando a urgência de modernização. **Vide Anexo 06 – Avaliação de Maturidade de Análise Avançada de Dados na AT – RR**.

D.6 O ambiente de negócios é pouco amigável, tanto pela complexidade e custos das obrigações tributárias quanto pela limitada automação dos processos. Isso gera inconformidades, litigância e um contencioso fiscal de baixa recuperação.

D.7 A participação cidadã na gestão fiscal é restrita pela ausência de mecanismos digitais eficazes, dificultando comunicação, engajamento e fiscalização social. É essencial tornar as informações orçamentárias mais acessíveis para ampliar o debate público e a participação nas políticas públicas.

D.8 A baixa presença de mulheres em cargos de liderança na SEFAZ-RR e as dificuldades enfrentadas por produtoras rurais e microempreendedoras na emissão de NFe Avulsa evidenciam a necessidade de ações que promovam a inclusão econômica feminina e a autonomia financeira das empreendedoras.

D.9 O Fisco de Roraima subutiliza fontes renováveis, elevando os custos com energia elétrica e não contribuindo para a meta nacional de 45% de renováveis até 2030. O estado depende de termelétricas a diesel e da energia importada da Venezuela, o que reforça a urgência da transição energética.

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/190502_cadernos_ODS_objetivo_7.pdf

D.10 Não há ações voltadas à segurança hídrica nos órgãos da gestão fiscal, o que prejudica políticas públicas voltadas ao uso sustentável da água — recurso essencial ao desenvolvimento socioeconômico.

1. 2. 3. **Solução:**

Para enfrentar os desafios estruturais da Gestão Fiscal do Estado, especialmente diante das transformações impostas pela Reforma Tributária sobre o Consumo (RTC) e da adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, propõem-se as seguintes soluções, organizadas conforme os eixos estratégicos:

1. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL (GF)

1. Reforçar a capacidade institucional da SEFAZ/RR por meio da realização de um planejamento estratégico, revisão dos processos organizacionais, com foco em resultados e sustentabilidade ambiental, promovendo a gestão da mudança, a transformação digital e a inovação fiscal, em alinhamento às exigências da RTC.
2. Implantar um modelo de dimensionamento da força de trabalho e gestão por competências, acompanhado de um Plano de Capacitação voltado à qualificação dos servidores, contemplando as demandas dos processos, a gestão da mudança, os aspectos ambientais da RTC e a formação de mulheres para cargos de liderança.
3. Estabelecer um modelo de governança que defina diretrizes estratégicas para a inovação e transformação digital, incorporando o uso analítico de dados como ferramenta de apoio à tomada de decisão.
4. Modernizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação, com foco em eficiência energética e adequação às necessidades da Regra de Transição da RTC, incluindo a implementação de modelos de gestão de riscos e segurança da informação.
5. Desenvolver políticas e diretrizes voltadas à Educação Fiscal, ampliando sua atuação junto a pequenos produtores, comunidades e grupos sociais, com atenção especial às mulheres microempreendedoras.
6. Atualizar a política de compras do Estado, incentivando a participação de microempreendedores locais, promovendo práticas sustentáveis, equidade e diversidade de gênero.

2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)

1. Desenvolver uma nova sistemática de projeção de receitas, com implantação de mecanismos de controle sobre benefícios fiscais concedidos, avaliação dos impactos dos riscos ambientais e fiscais na arrecadação, e integração dos sistemas da Administração Tributária ao módulo PCCE-PUCOMEX – Portal do Comércio Exterior.
2. Readequar os processos de trabalho e a estrutura organizacional da Administração Tributária, atualizando normas e sistemas ao novo cenário da RTC, com integração ao Comitê Gestor do IBS.
3. Aperfeiçoar os procedimentos de cobrança da dívida ativa, mediante implantação de sistema de gestão da dívida, capacitação dos servidores e criação de um portal único para acompanhamento da dívida ativa.
4. Modernizar os procedimentos de atualização cadastral no PNR – Portal de Negócios Redesim (RFB), com integração ao Identificador Único (CNPJ alfanumérico) e adoção de soluções de inteligência artificial para identificação e combate a empresas “noteiras”.
5. Qualificar os processos de análise e monitoramento da ação fiscal, utilizando inteligência de dados para aprimorar o controle e a efetividade das ações.
6. Implantar um sistema estruturado de gestão do contencioso fiscal, com uso de inteligência artificial na administração dos processos administrativos tributários, em conformidade com as diretrizes da Reforma Tributária.
7. Fortalecer a relação entre o Fisco e os contribuintes, ampliando os canais de atendimento e os serviços digitais, com foco na simplificação e na melhoria do ambiente de negócios.
8. Aprimorar a governança e o uso de dados na gestão de documentos fiscais, promovendo a simplificação das obrigações acessórias, incluindo a dispensa da declaração mensal de movimentação econômica (GIM).

3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO (AF)

1. Aperfeiçoar os instrumentos de gestão financeira, com monitoramento contínuo da execução orçamentária e melhorias no sistema FIPLAN, por meio da implantação de novas funcionalidades nos módulos de planejamento, execução, contabilidade e gestão de custos.

2. Implementar um programa voltado à sustentabilidade ambiental, contemplando ações de capacitação e conscientização dos servidores, ampliação de áreas verdes, instalação de unidades fotovoltaicas (UFV) e reaproveitamento de águas nas instalações da SEFAZ.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do Projeto representa um avanço estratégico para a sustentabilidade fiscal do Estado de Roraima, promovendo melhorias significativas na gestão das receitas próprias e na eficiência do gasto público. Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID, no **Anexo 04 – Estudo de Avaliação de Impacto do Profisco I**, estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles sem projeto, como Roraima.

Os resultados esperados estão organizados conforme os seguintes eixos:

1. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL (GF)

A governança fiscal será aprimorada por meio da reestruturação dos processos organizacionais, com foco em resultados e alinhamento à transformação digital e à inovação orientada por dados. O corpo técnico e diretivo da SEFAZ será capacitado para atender às novas demandas, com ênfase na gestão da mudança e na ampliação da participação feminina em cargos de liderança.

A infraestrutura de Tecnologia da Informação será expandida com soluções sustentáveis, dimensionada para atender às exigências da Reforma Tributária, e contará com modelos robustos de gestão de riscos e segurança da informação.

Haverá também avanços nas práticas de comunicação institucional com a ampliação dos canais de diálogo com a sociedade. Espera-se maior participação cidadã e fortalecimento do controle social sobre as ações governamentais.

As ações de Educação Fiscal serão ampliadas, com foco em pequenos produtores e mulheres empreendedoras, incentivando a formalização de suas atividades e sua inserção em processos licitatórios, contribuindo para o fortalecimento da autonomia financeira desses grupos.

A política de compras do Estado será atualizada, incorporando diretrizes de sustentabilidade, estímulo à economia local e incentivo à participação de micro e pequenos empreendedores, promovendo inclusão econômica e social com equidade de gênero.

2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)

A administração tributária será aperfeiçoada com a simplificação dos processos fiscais, monitoramento dos benefícios concedidos e avaliação dos impactos dos riscos ambientais e fiscais sobre a arrecadação. A governança de dados será fortalecida, com uso intensivo de tecnologias avançadas para aprimorar a fiscalização e prevenir ilícitos e evasão fiscal.

Os processos de trabalho, a estrutura organizacional, os normativos legais e os sistemas serão adaptados ao novo ambiente de negócios decorrente da Reforma Tributária, promovendo simplificação na apuração e pagamento dos tributos, eliminação de distorções que afetam a competitividade e construção de um sistema tributário mais eficiente e integrado nacionalmente.

Serão implementadas soluções inovadoras como o “split payment”, que reduz a evasão fiscal, e o “cashback”, que devolve tributos à população de baixa renda inscrita no CadÚnico. Tais medidas contribuirão para um sistema mais justo, eficiente e cooperativo, com impacto positivo na competitividade econômica nacional.

Os procedimentos de cobrança da dívida ativa serão aprimorados, com aumento da taxa de recuperação, uso estratégico de dados, redução de despesas e controle da prescrição. Será implantado um sistema de gestão da dívida ativa e criado um portal único para facilitar o atendimento ao contribuinte, otimizando os processos de cobrança e regularização.

Espera-se também a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, com reflexos positivos na conformidade fiscal e no ambiente de negócios.

A administração do contencioso fiscal será modernizada com o uso de Inteligência Artificial na gestão dos processos. A relação entre o Fisco e os contribuintes será aprimorada por meio da ampliação dos canais de atendimento e da

oferta de serviços on-line, promovendo maior acessibilidade, simplificação e melhoria do ambiente empresarial.

3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO (AF)

A gestão contábil-financeira será aperfeiçoada com a modernização do sistema financeiro estadual, revisão de processos e atualização das normas. Serão aprimorados os procedimentos de administração de convênios e transferências governamentais, controle de obrigações, conciliação automatizada, gestão de emendas parlamentares e integração dos sistemas corporativos.

Serão implantadas diretrizes para o controle de custos e despesas públicas, com monitoramento contínuo e maior eficácia no planejamento orçamentário, alinhado às demandas das políticas públicas.

Por fim, será promovida a adoção de práticas sustentáveis nas unidades fazendárias, com uso de energia renovável fotovoltaica e reaproveitamento de águas, contribuindo para a eficiência ambiental e redução de custos operacionais.

Para uma visualização mais direta da conexão lógica envolvendo a Descrição do Problema versus Soluções Propostas versus Resultados Esperados vide **Anexo 05 – Lógica Horizontal de Resultados do PROFISCO III RR.**

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral:

O objetivo do Projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado de Roraima, garantindo um sistema fiscal e tributário confiável, previsível e justo, incentivando a expansão de investimentos e acelerando a transformação digital para melhorar a rapidez e a capacidade de entrega de resultados à população.

(ii) Objetivos Específicos

1. Objetivos Específicos (OE)

1.1. Melhoria da eficácia da gestão das receitas próprias.

Aprimoramento da eficácia da gestão das receitas próprias, através da simplificação do cumprimento fiscal, da diminuição dos litígios fiscais, do incremento da arrecadação e da transformação digital, com estímulo à inovação, a transparência e à participação cidadã, contribuindo para o aprimoramento do ambiente de negócios e promoção da justiça fiscal.

1.2. Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos.

Aprimoramento da eficácia da gestão dos gastos públicos, através da melhoria dos procedimentos de planejamento, execução e avaliação dos gastos públicos, para a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos e o aumento dos investimentos.

2. Objetivos Específicos Complementares (OEC)

2.1. Melhorar a governança fiscal através de um maior alinhamento com a estratégia governamental e um modelo de administração de pessoas, tecnologia e inovação, reforçando as habilidades institucionais para uma entrega de resultados mais eficaz à população.

2.2. Melhorar a gestão fiscal entre os entes federados por meio da implementação da Reforma Tributária sobre o Consumo, consolidando a colaboração entre as entidades federativas e a unidade nacional na prestação de serviços públicos.

2.3. Incrementar a eficiência e competitividade da economia e aprimorar o ambiente de negócios através da simplificação fiscal, diminuição dos custos de conformidade fiscal e diminuição da contenda fiscal.

2.4. Melhorar a eficiência na aplicação de recursos públicos através do aprimoramento do planejamento, implementação e análise dos gastos, auxiliando na sustentabilidade do sistema fiscal e na excelência dos gastos públicos.


2.5. Intensificar a transformação digital e progredir no uso de dados para fortalecer receitas e despesas públicas, auxiliar na sustentabilidade do sistema fiscal e aprimorar o ambiente de negócios no Estado, expandindo a habilidade de entregar resultados à população.

2.6. Aprimorar a transparência fiscal, o controle social e a democracia participativa na administração fiscal, através da atualização do Portal da Transparência, do aumento da participação social nas decisões e das iniciativas de educação fiscal.

2.7 Promover a sustentabilidade ambiental através da eficiência energética e medidas de segurança hídrica, incentivando a introdução de fontes limpas e renováveis e o uso diversificado da água na estrutura física de unidades de administração fiscal.

2.8. Potencializar a política de igualdade de gênero, incentivando a presença feminina em posições de liderança na administração fiscal e fomentando a autonomia financeira de mulheres empreendedoras.

Profisco III RR - Visão da lógica da vinculação entre os objetivos geral, específicos e específicos complementares

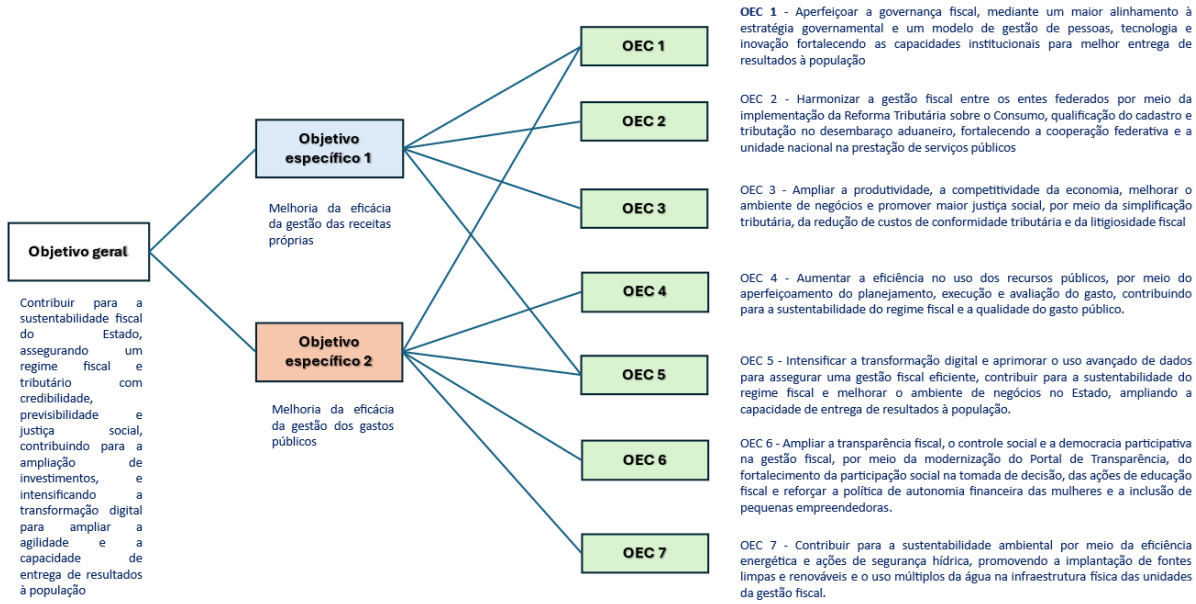

O objetivo geral – OG - Contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado se desdobra em dois objetivos específicos – OE 1 Melhoria da eficácia da gestão das receitas próprias e OE 2- Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos, que se desdobram em sete objetivos específicos complementares e estes se conectam, de forma mais direta com os componentes e seus produtos. Ao longo deste documento será demonstrado com maior detalhamento a vinculação entre os objetivos, componentes, produtos, indicadores e as áreas estratégicas do PPA Federal 2024-2027.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Servidoras da SEFAZ/RR capacitadas para liderança

Descrição:
A busca de uma melhoria da governança fiscal da SEFAZ/RR objetiva a adoção de uma política voltada para a diversidade e inclusão, visando habilitar as mulheres servidoras para ocuparem cargos de liderança na estrutura administrativa, promovendo a diversidade de pensamento, experiências e perspectivas que levem a decisões e soluções mais inovadoras. Assim, através do projeto serão promovidas ações de capacitação em cursos de liderança, para habilitar o corpo feminino da SEFAZ/RR tornando-as aptas para ocupar cargos de liderança dentro da estrutura administrativa da SEFAZ/RR.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.8
- Área Estratégica: 107

Dados:

- Quantidade de servidoras no quadro da SEFAZ/RR: x
- Quantidade de servidoras capacitadas para liderança: x

Fórmula de Cálculo:

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 0 % de servidoras capacitadas
44 cargos de liderança ao todo na SEFAZ/RR, no qual desses 13 são ocupados por mulheres em cargo de liderança. Na SEFAZ RR atualmente trabalham 110 servidoras num quadro total de 421 servidores.

Fonte: Plano de Capacitação da SEFAZ/RR (UGAM – Unidade Gestora de Atividades Meio)

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o número de servidoras capacitadas para ocuparem cargos de liderança.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados da SEFAZ/RR.
- Relevante: Relaciona-se com a promoção de igualdade de gênero e desenvolvimento de lideranças femininas na SEFAZ/RR.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de capacitar as servidoras da SEFAZ/RR em cursos de liderança, tornando-as aptas para ocupar cargos e funções de alta relevância dentro da estrutura administrativa da SEFAZ/RR, foi definida uma meta de 40%, que equivale a 44 servidoras, a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de ter um corpo técnico e diretivo capacitado para atender às demandas dos processos, gerenciamento de mudanças e a Reforma Tributária, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 0% (Meta Inicial)

Ano 2: 20%

Ano 3: 40% (Meta Intermediária)

Ano 4: 50%

Ano 5: 60% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Taxa de crescimento anual de empresa no Estado de Roraima

Descrição:
Com o objetivo de aumentar a produtividade e a competitividade da economia, através do fortalecimento dos ciclos produtivos, a SEFAZ/RR visa contribuir através da simplificação dos processos fiscais, possibilitando a construção de um ambiente mais propício ao empreendedorismo, permitindo o crescimento sustentável do número de empresas no Estado.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.3

- Área Estratégica: 205

Dados:

- Quantidade de empresas ativas no Estado de Roraima: 38.771(1º quadrimestre de 2024) e 41.713 (1º quadrimestre de 2025)

Fórmula de Cálculo:

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (1ª quad. 2025 / 1ª quad. 2024): 7,05%

- **Fonte**: Baseado em dados do Mapa das Empresas - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (1o quadrimestre 2025)
- https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-1o-quadrimestre-2024.pdf/view

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o crescimento anual de empresas ativas.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível:
- Relevante: Relaciona-se com o estímulo ao empreendedorismo.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de crescimento anual do número de empresas no estado, foi definida uma meta de 10,5% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 7,05% (Meta Inicial)

Ano 2: 7,05%

Ano 3: 8,0% (Meta Intermediária)

Ano 4: 9,2%

Ano 5: 10,5% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Aumento de Geração própia de energia

Descrição:
Para alcançar os resultados esperados, de crescimento anual do número de empresas no estado, foi definida uma meta de 10,5% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 7,05% (Meta Inicial)

Ano 2: 7,05%

Ano 3: 8,0% (Meta Intermediária)

Ano 4: 9,2%

Ano 5: 10,5% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de crescimento anual do número de empresas no estado, foi definida uma meta de 10,5% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 7,05% (Meta Inicial)

Ano 2: 7,05%

Ano 3: 8,0% (Meta Intermediária)

Ano 4: 9,2%

Ano 5: 10,5% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Reaproveitamento de águas pluviais

Descrição:
Com o objetivo de realizar o reaproveitamento de águas pluviais, será realizada ação para instalação no edifício sede e Posto Fiscal de Jundiá da SEFAZ/RR. Essa ação proporcionará uso racional das águas, promovendo a sustentabilidade ambiental através de medidas de segurança hídrica e incentivando o uso diversificado da água na estrutura física de unidades da SEFAZ/RR.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.7
- Área Estratégica: 212

Dados:

- Quantidade de m³ de águas pluviais armazenados em cisternas.

Fórmula de Cálculo: será medido em quantidade de m³ de capacidade de armazenamento de águas.

Unidade de Medida: m³

Linha de Base (2024): 0 m³

Fonte: UGAM – Unidade Gestora de Administração Meio - SEFAZ/RR

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o crescimento anual da capacidade de reaproveitamento de águas.
- Mensurável: Quantidade de m³ de águas reaproveitadas.
- Atingível: Baseado na construção de cisternas para atingir a meta.
- Relevante: Relaciona-se com a segurança hídrica do país.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados de níveis de reaproveitamento anual de m³, foi definida uma meta de 1.280 m³ a ser alcançadas ao final do 4º ano de execução do Projeto, com o objetivo de reaproveitamento de águas nas unidades da SEFAZ/RR, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 0 m³

Ano 2: 490 m³ (Meta Intermediária)

Ano 3: 1.280 m³ (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07- Indicadores Propostos.**

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Cumprimento das metas do planejamento estratégico da SEFAZ-RR

Descrição:
O aumento da relação entre as metas de planejamento estratégico cumpridas e o total de metas planejadas demonstra melhora na governança fiscal e na capacidade institucional da SEFAZ em todas as áreas administrativas e operativas, o que contribui para um melhor ambiente institucional para manter o equilíbrio fiscal.

A metodologia inclui a participação ativa das diversas áreas da Secretaria, além do alinhamento do planejamento aos objetivos estratégicos definidos pela instituição. Além disso, realiza-se um trabalho de difusão de conhecimento das macros diretrizes definidas pela Alta Gestão, incluindo o mapa estratégico da Sefaz, de forma a ampliar a integração e o engajamento de todas as áreas com os objetivos estratégicos definidos pela cúpula da Secretaria.

Dados:

Fórmula de Cálculo: Metas cumpridas / Total de metas planejadas) *100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2025): 0 pois o plano estratégico será construído no primeiro ano de projeto

Fonte: Relatório de Monitoramento do Planejamento Estratégico, elaborado pela SEFAZ/RR

Análise de características SMART:

- Específico: Melhoria da Nota de avaliação do Estado.
- Mensurável: Utiliza metodologia e unidade de medida.
- Atingível: As metas são incrementais e realistas, considerando a linha de base atual.
- Relevante: Relaciona-se com a governança fiscal e a transparência pública.
- Temporal: Medido conforme metas estabelecidas.

Meta:
Para alcançar os resultados após a elaboração do plano iniciará seu monitoramento, os resultados ocorrerão conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 0 % (Meta Inicial)

Ano 2: 30%

Ano 3: 45 %(Meta Intermediária)

Ano 4: 60%

Ano 5: 80% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Avanço na Avaliação do Radar da Transparência - ATRICON

Descrição:
Com o objetivo de melhorar os mecanismos de transparência e controle social, serão realizadas ações para a melhoria do Portal da Transparência do Governo do Estado de Roraima, fortalecendo a participação cidadã e o fortalecimento do controle social sobre as ações de governo. análise de quesitos de transparência ativa e outro para os quesitos de transparência passiva

Essa avaliação contempla a transparência passiva e a transparência ativa (publicação de informações na internet), conforme critérios estabelecidos pela Associação dos Tribunais de Contas - ATRICON, responsável pela metodologia de avaliação da transparência pública “Radar da Transparência Pública” para o monitoramento da transparência pública e acompanhamento das ações implementadas por estados e municípios na promoção do acesso à informação.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.6
- Área Estratégica: 301

Dados:

- Portal da Transparência do Governo do Estado de Roraima

Fórmula de Cálculo: ND

Unidade de Medida: Nota

Linha de Base (2024): 92,17 (Nota obtida pelo Poder Executivo do Estado de Roraima)

Fonte: https://radardatransparencia.atricon.org.br/panel.html

Análise de características SMART:

- Específico: Melhoria da Nota de avaliação do Estado.
- Mensurável: Utiliza metodologia e nota da Radar da Transparência Pública como unidade de medida.
- Atingível: As metas são incrementais e realistas, considerando a linha de base atual.
- Relevante: Relaciona-se com a governança fiscal e a transparência pública.
- Temporal: Medido conforme metas estabelecidas.

Meta:
Para alcançar os resultados da avaliação da transparência pública ““Radar da Transparência Pública”, pela Associação dos Tribunais de Contas - ATRICON , responsável pela metodologia de, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 92,17 (Meta Inicial)

Ano 2: 92,7

Ano 3: 94(Meta Intermediária)

Ano 4: 94,5

Ano 5: 95 (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Taxa de Atendimento On-line

Descrição:
Com o objetivo melhorar a prestação de serviços públicos de qualidade, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de aprimorar a relação fisco-contribuinte, através da ampliação dos canais de comunicação e de serviços disponibilizados on line.

Essa ação proporcionará a ampliação da capacidade da SEFAZ/RR em prestar serviços de qualidade aos seus contribuintes.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.5
- Área Estratégica: 303

Dados:

- Quantidade de atendimentos on line
- Quantidade de serviços de atendimento disponibilizados on line ao contribuinte.

Fórmula de Cálculo:

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 9,75%, pois de acordo com a Carta de Serviços são disponibilizados 41 serviços ao cidadão, sendo apenas 4 digitais.

Fonte: Unidade de Atendimento da SEFAZ/RR

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o crescimento anual do atendimento on line.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados de atendimento e serviços disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a prestação de serviço com qualidade.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados de crescimento anual da disponibilização de serviços on line foi definida uma meta de 95 % a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 9,75% (Meta Inicial)

Ano 2: 30%

Ano 3: 50% (Meta Intermediária)

Ano 4: 60%

Ano 5: 70% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Eficiência no custo para arrecadar tributos

Descrição:
Com o objetivo melhorar eficiência da gestão fiscal, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de implantar um Plano de Governança, com a capacitação, dimensionamento e realocação de servidores com foco em processos, e estabelecendo diretrizes estratégicas para a inovação e transformação digital.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

Dados:

R$ milhões

	2023	2024
Pessoal, encargos e custeio	89,02	88,65
Receita Tributária bruta própria (impostos, taxas e contribuições de melhoria)	1.551,87	1.624,00
(Execução orçamentária da SEFAZ com pessoal e custeio) / (Receita Tributária bruta) x 100	5,74%	5,46%

Fórmula de Cálculo:

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 5,46%

Fonte: Balanço orçamentário consolidado da SEFAZ - 2023/2024

Análise de características SMART:

- Específico: Foca a eficiência do custo para arrecadar.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis no Balanço Geral do Estado.
- Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de x% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 5,46% (Meta Inicial)

Ano 2: 5,38 %

Ano 3: 5,32 % (Meta Intermediária)

Ano 4: 5,27 %

Ano 5: 5,24 % (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Incremento de Arrecadação em relação ao PIB

Descrição:
Com o objetivo melhorar assegurar um regime fiscal e tributário sustentável, que promova maior justiça social e ampliação dos investimentos públicos, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de garantir um crescimento constante da arrecadação tributária.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Valor do PIB do Estado de Roraima
- Receita Tributária bruta.

Fórmula de Cálculo:

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 7,24%

PIB (2024): R$ 22,4 bilhões

Receita Tributária Bruta (2024): R$1,62 bilhão

Fonte: SEPLAN - Roraima e IBGE estimativa

Análise de características SMART:

- Específico: Foca a eficiência da gestão fiscal.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis no Balanço Geral do Estado e IBGE.
- Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal e a sustentabilidade.

Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 7,40% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 7,23% (Meta Inicial)

Ano 2: 7,27%

Ano 3: 7,30% (meta intermediária)

Ano 4: 7,36%

Ano 5: 7,40% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Taxa de recuperação da dívida ativa

Descrição:
Com o objetivo melhorar assegurar um regime fiscal e tributário sustentável, que promova maior justiça social e ampliação dos investimentos públicos, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de garantir uma maior recuperação dos créditos tributários inscritos em Dívida Ativa, contribuindo para o equilíbrio fiscal e o incremento de receitas.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.9
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Valor dos créditos inscritos em D.A. previstos de recuperação (desconsiderando anistia).
- Arrecadação anual projetada da D.A. (desconsiderando anistia).

Fórmula de Cálculo:

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2023): 0,34%
Valor do Estoque da Dívida Ativa Tributária 2023: R$ 2,99 bilhões
Valor arrecadado 2023: R$ 9,6 milhões

Fonte: Procuradoria Geral do Estado - PGE

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na recuperação de dívidas.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal e a sustentabilidade.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 65% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 0,34% (Meta Inicial)

Ano 2: 0,34%

Ano 3: 0,40% (Meta Intermediária)

Ano 4: 0,55%

Ano 5: 0,70% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Integração dos sistemas da SEFAZ/RR ao Comitê Gestor do IBS

Descrição:
Com a implantação da Reforma Tributária sobre o Consumo e, consequentemente, do IBS em substituição ao ICMS, será necessário um conjunto de ações, envolvendo a três esferas de governo para adequação dos processos,

dimensão tecnológica dos sistemas a serem utilizados e integração ao ambiente do Comitê Gestor Nacional do IBS. Este indicador visa acompanhar a evolução da integração dos sistemas da SEFAZ/RR ao Comitê Gestor do IBS para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Sistemas da SEFAZ/RR integrados ao Comitê Gestor do IBS.

Fórmula de Cálculo:

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 0%

Dados:

- Lista de sistemas estruturantes a serem desenvolvidos e integrados ao Comitê Gestor do IBS.
- Em 2025 há 0 sistemas integrados num universo avaliado em 12 sistemas a integrar, conforme tabela abaixo:
  1. Integração do Cadastro de Contribuintes com outras bases de dados nacionais
  2. Preparação da retaguarda de validação e autorização do DFe
  3. Declaração assistida
  4. Sistema de apuração
  5. Integração com o sistema financeiro e bancário
  6. Módulo de gestão do Cashback
  7. Adaptação do sistema de Cobrança Administrativa
  8. Integração ao Token Comitê Gestor para tratar a concomitância e o interesse de fiscalizar um contribuinte
  9. Ferramentas de suporte ao auditor
  10. Monitoramento e Malhas Fiscais
  11. Portal do Contribuinte integrado e padronizado conforme ambiente do Comitê Gestor
  12. Plataforma integrada de gestão tributária que facilite o compartilhamento de dados entre estados, municípios

Fonte: Centro de Tecnologia e Informação Fazendária-CETIF

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na integração dos sistemas da SEFAZ/RR ao Comitê Gestor do IBS.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com integração dos Sistemas.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 100% de integração dos sistemas a serem alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 0% (Meta Inicial)

Ano 2: 10%

Ano 3: 50% (Meta Intermediária)

Ano 4: 70%

Ano 5: 100% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos**

1. 4. 14. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Taxa anual de julgamento de processos em 1ª instância

Descrição:
Com o objetivo de agilizar a apreciação dos processos administrativos tributários, serão realizadas ações no Projeto orientadas à inovação e resultados com o objetivo de disponibilizar sistema para julgamento, com peças processuais produzidos automaticamente, para serem utilizados pelos julgadores na produção de relatórios e votos eletrônicos, com o auxílio de Inteligência Artificial, contribuindo para a transformação digital da SEFAZ/RR.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.5
- Área Estratégica: 303

Dados:

- Processos julgados em 1ª Instância Administrativa

$$\left(\frac{Processos\ julgados\ no\ exercício}{Quantidade\ de\ processos\ em\ estoque + recebidos\ no\ exercício}\right) x\ 100$$

Fórmula de Cálculo:

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 29,17%

Estoque final em 2023: 292

Entrada de novos processos em 2024: 61
Processos julgados: 103
Fonte: Divisão de Procedimentos Administrativos-Fiscais – DPAF

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na agilidade dos PAT.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a modernização da gestão.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 45,00% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 29,17% (Meta Inicial)

Ano 2: 29,17%

Ano 3: 40,00% (Meta Intermediária)

Ano 4: 45,00%

Ano 5: 45,00% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 15. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Implantação das funcionalidades de Integração ao Portal Único do Comércio Exterior - PUCOMEX

Descrição:
Com o objetivo de contribuir para a melhoria do ambiente de negócios e aumentar a competitividade da economia nacional, através do projeto nacional PCCE-PUCOMEX, via redução do tempo de liberação de mercadorias no processo de importação, o produto prevê a realização 5(cinco) funcionalidades de integração da SEFAZ ao PCCE (Pagamento Centralizado do Comércio Exterior) PUCOMEX:

1. Integração API DUIMP;
2. Integração API PCCE;
3. Integração API Anexação;
4. Cálculo ICMS Pagamento; e
5. Cálculo ICMS Exoneração

Vinculação:
- Objetivo Específico Complementar: 2.2, 2.3
- Área Estratégica: 302

Dados: Nota Técnica - Documento de Especificações/Requisitos Funcionais para a Avaliação de Cumprimento de Produto Obrigatório do PROFISCO II (**Anexo 19 - Integração ao PCCE**) e Pesquisas realizadas pela OMA - Organização Mundial das Aduanas e Receita Federal do Brasil - RFB. Segundo este estudo o tempo médio de liberação de mercadorias no processo de importação no país é de 7,4 dias, incluindo os modais aéreo, terrestre e marítimo. O mesmo estudo estima a meta de redução média no país de 2,0 dias considerando todas as fases que compreendem o desembaraço aduaneiro: registro da Declaração Única de Importação (DUIMP), parametrização, apuração dos tributos, envio para a Alfândega, inspeção e liberação. Portanto, a integração dos sistemas da Administração Tributária estadual ao PCCE - PUCOMEX contribui para a meta global do país. Maiores detalhes podem ser obtidos em https://www.gov.br/siscomex/pt-br/informacoes/demais-noticias-de-comercio-exterior/importacao/projeto-piloto-do-pagamento-centralizado-de-comercio-exterior-pcce

Fórmula de Cálculo: Cinco funcionalidades do PUCOMEX implantadas.

Unidade de Medida: Quantidade de funcionalidades

Linha de Base (2023): Zero

Fonte: Relatório da Centro de Tecnologia da Informação fazendária (CETIF)

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na implantação de funcionalidades nos sistemas da SEFAZ para a integração ao PUCOMEX
- Mensurável: Avalia quantidade de funcionalidades a serem implantadas.
- Atingível: A meta é realista baseada na competência técnica de execução da CETIF.
- Relevante: Relaciona-se com a melhoria do ambiente de negócios e a competitividade nacional.
- Temporal: Define uma meta final específica de implantação até o 3º ano do projeto.

Meta:

Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 100% das cinco funcionalidades de integração dos sistemas da SEFAZ RR ao PUCOMEX a ser alcançada até o 3º ano de execução do Projeto. Deve-se destacar que essa iniciativa contribui para a melhoria do ambiente de negócios e o aumento da competitividade da economia nacional, mediante a agilização dos procedimentos de liberação de mercadorias com redução de 2 dias, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 20% (Meta Inicial)

Ano 2: 70%

Ano 3: 100% (Meta final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 16. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos - Poupança Corrente da CAPAG

Descrição:
Com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia do gasto público, serão realizadas ações no Projeto para o acompanhamento da evolução da poupança corrente, permitindo avaliar o impacto dessas ações na saúde fiscal do estado. Uma redução consistente nesse indicador, resultante de uma gestão mais eficiente, reflete o sucesso das políticas implementadas pelo PROFISCO III RR, evidenciando um compromisso com a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das finanças públicas.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

$$\left(\frac{Despesa\ corrente}{Receita\ corrente\ ajustada}\right) x\ 100$$

Dados:

- Receitas e Despesas correntes

Fórmula de Cálculo:

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 91,55%

Despesa Corrente: R$ 7,8 bilhões

Receita corrente ajustada: R$8,5 bilhões

Fonte: Balanços anuais, Demonstrativos de Contas Anuais e os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária Tesouro Estadual) e Portaria Normativa MF nº 1.583/2023 do Ministério da Fazenda obtido nos sites: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-mf-n-1.583-de-13-de-dezembro-de-2023-530597625 e https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na eficácia da gestão dos gastos públicos.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a eficiência na gestão pública.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 92,0% da poupança corrente a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme a faixa de valor definida no Art. 3º da Portaria Normativa MF nº 1.583/2023, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal e garantir a sustentabilidade fiscal e a capacidade de pagamentos do Estado de Roraima, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 91,55% (Meta Inicial)

Ano 2: 91,35%

Ano 3: 91,22% (Meta Intermediária)

Ano 4: 91,08%

Ano 5: 90,97% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III RR, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: C1- GESTÃO FAENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 9.885.000,00

Descrição:
Este componente da SEFAZ/RR promove a modernização da gestão pública por meio da melhoria do planejamento, monitoramento e avaliação de resultados, capacitação dos servidores, fortalecimento da governança alinhada à Reforma Tributária e à inovação digital. Inclui a reestruturação tecnológica com foco em sustentabilidade, ampliação da comunicação institucional e expansão da Educação Fiscal voltada a grupos sociais específicos, como mulheres empreendedoras. Utiliza a política de compras públicas como instrumento de fomento à economia local, priorizando pequenos negócios e empresas sustentáveis. Os resultados esperados envolvem uma governança fiscal mais eficiente, processos orientados a resultados, infraestrutura de TI segura e sustentável, comunicação ampliada, ações educativas voltadas à cidadania e transição energética com uso de tecnologias limpas. A criação de um escritório de projetos e a consolidação da transformação digital posicionam a SEFAZ/RR como referência em inovação, inclusão e excelência na administração pública.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P1.1. Governança Pública fortalecida – US$ 820.000

Este produto objetiva a revisão dos processos organizacionais para adequá-los à implementação das diretrizes da Reforma Tributária, aperfeiçoando a governança fiscal com um planejamento estratégico que incorpore diretrizes sustentáveis e ambientais e aprimore os métodos de gestão para resultados, com a implementação de um modelo de gerenciamento de riscos dos processos. Suas ações incluem a implantação de escritório de projetos e processos, fortalecimento da gestão da mudança e a implementação de um modelo de transformação digital e uso avançado de dados, alinhados à estratégia da organização.

P1.2. Gestão de Pessoas aprimorada – US$ 1.590.000,00

O objetivo desse produto é implementar um plano de capacitação para os servidores direcionado para a gestão da mudança, em processos, em uso avançado de dados, nos aspectos ambiental e de gênero. Será elaborado estudo para redimensionar o contingente, o perfil e as necessidades da força de trabalho, estabelecendo um programa de gestão do conhecimento, com banco de talentos e metodologia para realocação interna de servidores, baseada em perfil, processos e habilidades. Em complemento, será estabelecida uma política de fomento e formação de lideranças femininas nos quadros da SEFAZ/RR.

P1.3 Gestão de Tecnologia da Informação fortalecida – US$ 6.115.000

O propósito deste produto é possibilitar à SEFAZ/RR atualizar seu parque tecnológico com soluções certificadas em baixo consumo de energia, ajustando sua infraestrutura de TI de acordo com os impactos da Reforma Tributária;

formular o Plano Diretor, de acordo com o planejamento estratégico institucional e os desafios e necessidades de transformação digital e inovação; e estabelecer um Modelo de Gestão de Riscos otimizando os recursos destinados a TI. Visa, também, melhorar a segurança da informação e gestão de dados, conforme a política estabelecida para sua proteção e armazenamento, incluindo conservação, armazenamento e eliminação apropriada, bem como adequar o datacenter para implantar política de segurança da informação sólida, de acordo com as normas (LGPD, LAI, LRF) e fortalecimento das competências técnicas de uso de dados avançados.

P1.4. Gestão Sustentável de Aquisições e Materiais– US$ 650.000

A atualização da política de compras do Estado de Roraima visa fortalecer a economia local por meio do fomento à inclusão de microempreendedores nos processos licitatórios, com estímulo à participação de grupos historicamente subrepresentados, como mulheres e comunidades tradicionais. A iniciativa promoverá práticas sustentáveis, com critérios que valorizem responsabilidade ambiental e social, além de incorporar diretrizes de equidade e diversidade de gênero. Essa abordagem busca não apenas ampliar a competitividade e a transparência nas aquisições públicas, mas também fomentar a inclusão econômica e o desenvolvimento regional.

P1.5. Gestão da Transparência e Educação Fiscal – US$ 710.000

Este produto visa o aprimoramento do Portal da Transparência, através da implementação de uma estrutura de *Business Intelligence* para a produção de dados sobre as receitas e despesas. Do mesmo modo busca a melhoria dos processos de comunicação institucional, tanto interna quanto externa, introduzindo novos canais de consulta e repositório de informações com assuntos de interesse coletivo, e coleta de opiniões dos cidadãos, criando fóruns de debate e atualizando o cidadão sobre suas solicitações. Adicionalmente implementará iniciativas de Educação Fiscal, sobretudo com mulheres empreendedoras que serão capacitadas para estimular a sua formalização e inclusão no mercado, inclusive para a emissão de Notas Fiscais Avulsas, habilitando-as para participar dos processos de compras públicas e, consequentemente, contribuindo para o aumento da renda e autonomia financeira das mulheres.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: C2 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 16.930.000,00

Descrição:
As ações deste componente visam a simplificação de procedimentos tributários, para apuração da brecha tributária e dos benefícios concedidos; a readequação dos processos de trabalho e estrutura organizacional da administração tributária para o novo ambiente resultante da Reforma Tributária; o aperfeiçoamento dos procedimentos de cobrança, através do estímulo à regularidade tributária; o aperfeiçoamento do controle da arrecadação através da gestão da Dívida Ativa Administrativa e sua integração com o Contencioso Administrativo e a Procuradoria Tributária; o aperfeiçoamento dos procedimentos de atualização do cadastro (REDESIM), com inclusão de novos dados; a melhoria da gestão do contencioso fiscal e sua adequação à reforma tributária; e, o aprimoramento da relação fisco-contribuinte, com novos canais de atendimento e serviços disponibilizados,

A implementação dessas ações trarão, como resultado: uma Administração tributária aperfeiçoada, com processos fiscais simplificados, benefícios concedidos melhor acompanhados e mais transparentes; processos de estímulos à conformidade fiscal, estrutura organizacional, normativos legais e sistemas adaptados ao novo ambiente de negócios decorrente da Reforma Tributária; procedimentos de cobrança aperfeiçoados, com estímulo ao contribuinte para a regularidade fiscal por meio do processo de autorregularização; melhoria dos processos do Contencioso Administrativo e a Procuradoria Fiscal; melhoria dos processos de atualização do cadastro (REDESIM), com sua depuração e incorporação de novas informações; e, melhoria da relação fisco-contribuinte através da ampliação dos canais de atendimento e serviços oferecidos, visando a simplificação e a melhoria do ambiente de negócios.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P2.1 Modelo de Gestão Tributária aprimorada para melhoria do Ambiente de Negócios – USD 840.000

A iniciativa contempla o desenvolvimento de mecanismos de controle sobre os benefícios fiscais concedidos através da implantação do Portal de Registro dos Incentivos e Benefícios de Natureza Tributária - *produto obrigatório Profisco III*. Isso permitirá maior transparência e avaliação contínua dos impactos desses incentivos sobre a arrecadação. Uma segunda iniciativa contemplará a integração dos sistemas da AT ao módulo PCCE-PUCOMEX – Portal do Comércio Exterior. Isso permitirá maior rapidez e precisão no processo de desembaraço aduaneiro contribuindo para melhoria da competitividade do Brasil em comércio exterior - *produto obrigatório Profisco III*.

P2.2. Harmonização da AT com a Reforma Tributária – US$ 7.800.000,00

O propósito deste produto é ajustar os processos, a estrutura da AT, sistemas e infraestrutura tecnológica viabilizando a integração ao ambiente nacional. Serão desenvolvidos e integrados ao Comitê gestor do IBS um conjunto de 12 sistemas, vide lista desses sistemas no **Anexo 07 - Indicadores Propostos**, indicador 11. Os benefícios esperados incluem a redução da complexidade e custos para as empresas, estímulo ao ambiente de negócios e implementação de tecnologias como o *split payment*, que evita evasão fiscal, e o *cashback*, que devolve tributos para a população de baixa renda. Essas medidas promovem um sistema tributário mais justo e eficiente, fortalecem a cooperação federativa, permitem a troca de melhores práticas e aumentam a competitividade econômica de todo o país.

P2.3 Gestão Cadastral e Obrigações Acessórias Modernizadas – USD 1.110.000

O produto inclui a integração ao PNR – Portal de Negócios Redesim (RFB), uso do Identificador Único (CNPJ alfanumérico), garantindo maior consistência e rastreabilidade dos dados empresariais - *produto obrigatório Profisco III*. Paralelamente, serão adotadas soluções de inteligência artificial para identificação de padrões suspeitos e combate às empresas “noteiras”, fortalecendo a integridade do cadastro nacional. A simplificação das obrigações acessórias será trabalhada com a dispensa da declaração mensal de movimentação econômica (GIM) - *produto obrigatório Profisco III*, que será substituída pelo uso da EFD – Escrituração Fiscal Digital, reduzindo a burocracia e os custos operacionais para os contribuintes.

P2.4 Aperfeiçoar os Procedimentos de Cobrança – USD 1.290.000

Modernizar a gestão da cobrança administrativa e judicial, por meio da implantação de uma sistemática estruturada, capaz de segmentar devedores, priorizar ações de cobrança e automatizar rotinas operacionais. A proposta inclui a capacitação dos servidores envolvidos, com foco em estratégias de recuperação de crédito e uso de ferramentas analíticas. Será criado um portal para acompanhamento da dívida ativa, oferecendo aos contribuintes e gestores públicos uma interface transparente, acessível e eficiente para consulta, negociação e regularização de débitos.

P2.5 Fiscalização Tributária e a Inteligência Fiscal Modernizada – USD 3.500.000

Inclui o desenvolvimento de malhas fiscais para avaliação do cumprimento das obrigações fiscais, com e permissão para autorregularização. Serão utilizados modelos de gestão avançada de dados e inteligência artificial contribuindo para uma fiscalização orientada a dados. Do mesmo modo, será estruturado laboratório de análise forense para as ações de combate ao crime tributário estruturado. Finalmente, ações para fortalecer o controle de mercadorias em trânsito que adentram ao Estado de Roraima, com uso de instrumentos como reconhecimento de placas com câmeras OCR e cruzamento massivo de dados permitindo uma fiscalização mais assertiva.

P2.6 Contencioso Fiscal Modernizado – USD 1.470.000

Desenvolver e implementar uma plataforma integrada para administração dos processos administrativos tributários, com uso intensivo de inteligência artificial para triagem, classificação e priorização das demandas. O sistema será alinhado às diretrizes da Reforma Tributária, promovendo maior celeridade, transparência e segurança jurídica na resolução de conflitos entre Fisco e contribuintes. A iniciativa também contempla a digitalização de documentos, integração com sistemas jurídicos e geração de relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão.

P.2.7 Atendimento ao Contribuinte Aperfeiçoado – USD 920.000

Ampliar e diversificar os canais de atendimento, com foco na digitalização dos serviços e na simplificação das interações. A proposta inclui o desenvolvimento de novos serviços no Portal do Contribuinte, chatbot, aplicativos móveis e atendimento personalizado, promovendo maior confiança e colaboração entre os agentes econômicos e a Administração Tributária. Essa abordagem visa melhorar o ambiente de negócios, reduzir a burocracia e aumentar a conformidade voluntária, tornando o relacionamento fiscal mais transparente, ágil e eficiente.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: C3 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO
Valor estimado em Dólar (USD): 5.435.000,00

Descrição:
As ações deste componente visam o aprimoramento da gestão do planejamento e execução orçamentária e financeira, a gestão contábil, os mecanismos de gestão de convênios e transferências governamentais; a gestão de custos e despesas públicas, com monitoramento e controle de gastos, mediante o redesenho de processos e atualização tecnológica do sistema FIPLAN e ainda alinhando esses processos às demandas da Reforma Tributária sobre o Consumo. Ainda estão previstos o desenvolvimento de um Plano de Sustentabilidade com foco na eficiência energética, capacitação, reaproveitamento de águas pluviais e implantação da usina fotovoltaica no prédio sede da SEFAZ.

A implementação dessas ações trará, como resultado, maior eficiência na gestão financeira e orçamentária, com processos integrados e alinhados à Reforma Tributária. A modernização do sistema FIPLAN e o controle de custos trarão decisões mais precisas. O Plano de Sustentabilidade promoverá economia de recursos, uso de energia limpa e capacitação dos servidores, fortalecendo a responsabilidade ambiental da SEFAZ.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P3.1. Planejamento e Orçamento aprimorados para a Sustentabilidade Fiscal – US$ 4.135.000

A proposta de modernização da Sistemática Financeira visa transformar profundamente a gestão fiscal, promovendo maior eficiência, transparência e integração entre processos. O primeiro passo consiste na realização de uma avaliação detalhada do cenário atual, com diagnóstico técnico e institucional, seguido da elaboração de normas, processos e fluxos padronizados que garantam uniformidade e conformidade às práticas financeiras.

A iniciativa contempla a customização estratégica do sistema FIPLAN, ampliando suas funcionalidades para atender às demandas contemporâneas da administração pública. Entre os principais aprimoramentos estão: a conciliação automatizada, que reduz erros e aumenta a confiabilidade dos dados contábeis; o módulo de planejamento financeiro e fluxo de caixa, essencial para a previsibilidade e equilíbrio fiscal; e o controle de obrigações, que assegura o cumprimento tempestivo de compromissos legais e contratuais – *produto obrigatório Profisco III*.

Além disso, será incorporado o módulo de gestão de emendas parlamentares, permitindo rastreabilidade e controle dos recursos vinculados; a gestão de custos, voltada à análise da eficiência do gasto público; e a integração com sistemas corporativos, promovendo interoperabilidade e evitando retrabalho. O projeto inclui ainda a implementação de um painel de indicadores da gestão fiscal, que oferece visão estratégica para tomada de decisão, e o módulo de gestão da dívida pública, fundamental para o acompanhamento e planejamento da sustentabilidade financeira.

Essa abordagem integrada fortalece a governança financeira, melhora a qualidade da informação gerencial e contribui para uma administração mais inteligente, orientada por dados e resultados.

P3.2. Infraestrutura Física Ambientalmente Sustentável – US$ 1.300.000

A SEFAZ/RR desenvolverá o projeto “SEFAZ Verde”, voltado à implantação de práticas sustentáveis em seus prédios administrativos. O plano contempla três eixos principais: geração fotovoltaica, reaproveitamento de águas pluviais e eficiência energética. A instalação de uma usina solar no prédio sede visa reduzir a dependência de fontes fósseis, já que Roraima é o único estado fora do Sistema Interligado Nacional, com suprimento baseado em termelétricas a óleo diesel e energia importada da Venezuela, o que acarreta altos custos e impactos ambientais.

O reaproveitamento de águas pluviais será viabilizado por meio da instalação de calhas, cisternas e adaptações no sistema hidráulico, permitindo o uso da água captada em descargas sanitárias, limpeza de áreas comuns e irrigação de jardins. Essa medida aproveita o elevado índice pluviométrico da região e contribui para a redução do consumo de água potável.

Além disso, o projeto prevê ações de eficiência energética, como modernização de equipamentos, uso racional de energia, correção de fator de potência, eficiência nas principais cargas como: ar-condicionado e iluminação. Também serão realizadas campanhas de sensibilização e capacitação dos servidores, promovendo uma cultura institucional voltada à responsabilidade ambiental e à gestão consciente dos recursos públicos.

Com essas iniciativas, a SEFAZ/RR busca alinhar-se às diretrizes de desenvolvimento sustentável, reduzir custos operacionais e servir de referência para outras instituições públicas da região.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROJETO
Valor estimado em Dólar (USD): 750.000,00

Descrição:
As ações deste componente visam fornecer os recursos necessários para que a Unidade de Coordenação do Projeto - UCP possa realizar as atividades de execução do PROFISCO III PI, através da capacitação e visitas técnicas dos servidores envolvidos; da contratação de serviços especializados; da realização de Avaliação Intermediária do Projeto; e, da realização de eventos.

A implementação dessas ações trarão, como resultado, os membros da UCP e servidores envolvidos na execução do Projeto melhor capacitados; necessidades de áreas específicas do projeto atendidas por consultores especializados; Avaliação Intermediária do Projeto realizada; participação de membros em reuniões ordinárias da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ), do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (GEFIN) ou do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (ENCAT); e, a realização de Seminário de divulgação dos resultados do PROFISCO III.

Descrição de subcomponentes e produtos:
A1 – Monitoramento e Avaliação – USD 500.000

Este produto tem por objetivo fornecer os recursos necessários para que a Unidade de Coordenação do Projeto - UCP possa realizar as atividades de execução do Projeto, através da capacitação e visitas técnicas dos servidores envolvidos; da contratação de consultores especializados para atender necessidades de áreas específicas do projeto como: apoio em aquisições, administração e finanças do projeto e gestão e monitoramento dos produtos; para a realização de serviço de consultoria para Avaliação Intermediária do Projeto; para a participação de reuniões da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ), Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (ENCAT) no Estado; e, para a realização de Seminário de divulgação dos resultados do PROFISCO III RR.

A2 – Auditoria – US$ 250.000

Este produto visa a contratação de serviço especializado de consultoria para a realização de Auditoria Externa Independente das demonstrações financeiras, registros, transações e atividades ocorridas durante a execução do PROFISCO III

1. 6. **Beneficiários**

O Projeto PROFISCO III RR tem como objetivo melhorar a sustentabilidade fiscal do Estado de Roraima, incentivando um sistema tributário mais equitativo e eficaz, além de intensificar a transformação digital para aprimorar os serviços prestados à população.

Localizado no Norte do Brasil, Roraima ocupa uma área de 224.303 km^2, com 15 municípios e uma população total de 717.000 habitantes (2024, IBGE), devendo as medidas propostas no Projeto impactar a sociedade inteira do Estado com benefícios que garantirão a sustentabilidade fiscal do Estado de Roraima, através de um sistema fiscal e tributário confiável, previsível e justo, quer estimule a expansão de investimentos e com processos de transformação digital que tragam a melhoria dos serviços públicos e a entrega de resultados à população.

As ações do PROFISCO III RR também deverão impactar segmentos da população, que serão favorecidos pelo projeto, conforme descrito as seguir:

1. Órgãos Públicos:

Os servidores da Secretaria da Fazenda (SEFAZ/RR), Procuradoria Geral do Estado (PGE/RR), Secretaria de Estado de Licitação e Contratação (SELC) e Controladoria Geral do Estado (CGE) serão capacitados e contarão com melhores ferramentas de trabalho, aumentando a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados.

2. Empresas do Estado de Roraima:

Um total de 29.947 empresas cadastradas como contribuintes ativos dos tributos estaduais serão beneficiadas pelas ações do projeto, que busca simplificar as obrigações fiscais, reduzir a burocracia e oferecer suporte tecnológico, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias, com a melhoria do ambiente de negócios, bem como um total de

41.713 empresas ativas do Estado de Roraima serão beneficiadas pela mudando do ICMS para o IBS, com a implantação da Reforma Tributária sobre o Consumo. Fonte - mapa-de-empresas-boletim-1o-quadrimestre-2025.pdf — Empresas & Negócios

3. Beneficiários do CadÚnico

Em agosto de 2025, Roraima possuía 146.891 famílias de baixa renda registradas no Cadastro Único para Programas Sociais, com um total de 388.415 pessoas cadastradas, que terão suas condições socioeconômicas avaliadas, visando habilitá-los para políticas fiscais mais justas e inclusivas, como *Cashback* previsto no novo regime tributário do IBS, permitindo uma redução da despesa pública pela depuração desse cadastro. A implantação o mecanismo do *Cashback* , previsto na Reforma Tributária, atuará como um benefício econômico e socialmente relevante pois prevê um aumento de renda para populações de baixa renda e vulneráveis mediante a devolução parcial ou total do valor do imposto, especialmente com a inclusão de filtros sociais e de renda. Fonte - https://cecad.cidadania.gov.br/painel01.php?p_ibge=14&mu_ibge=#

4. Outros beneficiários

Também deverão ser impactados pelas ações do PROFISCO III RR outros segmentos da população, como:

- Professores e estudantes da rede de ensino estadual, pelas ações da Educação Fiscal, que abrangerá, também, as mulheres empreendedoras.
- Os servidores da Secretaria da Fazenda (SEFAZ/RR), principalmente os lotados em unidade no interior do estado ou em Postos Fiscais de fronteira, pelas melhorias relativas a implantação de usinas fotovoltaicas para geração de energia e de cisterna para o armazenamento de águas pluviais.

1. 7. **Anexos**

Anexo 01 - Diagnóstico econômico e social Roraima - 2025

Anexo 02 - Marco de Referência_PROFISCO III

Anexo 03 - Relatório MD-GEFIS 2025 - RR

Anexo 04 - Estudo de Avaliação de Impacto PROFISCO I

Anexo 05 - Lógica Horizontal de Resultado do PROFISCO III RR

Anexo 06 - Avaliação de Maturidade de Análise de Dados Avançada na AT-RR

Anexo 07_Indicadores Propostos Profisco III RR

Anexo 19 - NT para Integração ao PCCE - PUCOMEX - Pagamento Centralizado do Comercio Exterior

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O PROFISCO III RR está estruturado em três componentes — Gestão Fazendária e Transparência Fiscal (GF), Administração Tributária e Contencioso Fiscal (AT), e Administração Financeira e Gasto Público (AF) — que se desdobram em 13 produtos e 14 indicadores. Esses elementos se conectam diretamente a oito Áreas Estratégicas (AE) do PPA Federal 2024–2027, conforme demonstrado no Anexo 08, que detalha os vínculos entre os objetivos específicos complementares (OEC), os produtos e os indicadores, evidenciando como cada ação contribui para o fortalecimento da gestão fiscal e a entrega de resultados à sociedade.

O Anexo 09 aprofunda essa análise ao apresentar a distribuição percentual dos investimentos por área estratégica. A AE 306 — "Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade" — concentra 53,15% do valor total do projeto (US$ 17,54 milhões), refletindo o foco na modernização da arrecadação, na gestão de gastos e na adaptação ao novo modelo tributário nacional *(IBS)*. A AE 303 — "Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo" — absorve 18,69% dos recursos (US$ 6,17 milhões), com ações voltadas à automação de processos, integração de sistemas e uso de inteligência artificial para melhorar a prestação de serviços públicos. Já a AE 302 — "Capacidades Estatais e Cooperação Federativa" — representa 10,15% dos investimentos (US$ 3,35 milhões), com iniciativas que promovem a integração ao Portal Nacional Redesim, ao PCCE-PUCOMEX e ao Comitê Gestor do IBS.

O Anexo 10 complementa essa visão ao apresentar o diagrama de conexão lógica entre os objetivos específicos complementares (OEC), os componentes e as áreas estratégicas. Essa estrutura evidencia a coerência interna do projeto, demonstrando como o objetivo geral — contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado — se desdobra em dois objetivos específicos (melhoria da gestão das receitas próprias e dos gastos públicos), que por sua vez se ramificam em sete OECs. Cada OEC está vinculado a um ou mais componentes e produtos, formando uma rede lógica que conecta diretamente os esforços do projeto às metas do PPA Federal.


Por exemplo, o OEC 2 — Harmonizar a gestão fiscal entre os entes federados — está diretamente ligado à AE 302 e aos componentes GF e AT, com destaque para os produtos P2.2 (Harmonização da AT com a Reforma Tributária) e P2.1 (Integração ao PCCE-PUCOMEX). Já o OEC 5 — Intensificar a transformação digital — se conecta à AE 303 e permeia todos os componentes, com produtos como P1.3 (Gestão de TI), P2.6 (Contencioso Fiscal Modernizado) e P3.1 (Gestão Financeira para Sustentabilidade Fiscal). O OEC 7 — Sustentabilidade ambiental — está vinculado às AE 208 e 212, com ações como instalação de usinas fotovoltaicas e reaproveitamento de águas pluviais (P3.2).

Importante destacar que o PROFISCO III RR não se limita ao atendimento exclusivo de uma única prioridade da Administração Pública. Trata-se de um projeto?**multidimensional**, que contribui simultaneamente para diversas áreas estratégicas, alinhando-se às diretrizes federais e estaduais de desenvolvimento sustentável, transformação institucional e justiça fiscal. Essa abordagem integrada reforça o papel do projeto como vetor de modernização da gestão pública e de promoção de resultados concretos para a sociedade.

Os Anexos 08, 09 e 10 apresentam em formato tabular, financeiro e gráfico a correlação entre os componentes e produtos do projeto com cada área estratégica, detalhando os objetivos vinculados, os indicadores de desempenho, os impactos esperados e os recursos financeiros alocados. Esses documentos são essenciais para compreender a profundidade e a abrangência da contribuição do PROFISCO III RR para o fortalecimento da gestão pública e o desenvolvimento do Estado de Roraima.

O Projeto PROFISCO III RR apresenta uma arquitetura lógica e estratégica fortemente alinhada às prioridades da Administração Pública Federal, promovendo avanços concretos em diversas dimensões do desenvolvimento institucional, fiscal, econômico, social e ambiental. Essa aderência é evidenciada pelos documentos complementares — Anexo 08, Anexo 09 e Anexo 10 — que, em formatos tabular, financeiro e gráfico, demonstram com precisão a correlação entre os componentes e produtos do projeto e as áreas estratégicas do PPA 2024–2027, detalhando os objetivos vinculados, os indicadores de desempenho, os impactos esperados e os recursos alocados. Juntos, esses instrumentos oferecem uma visão abrangente e integrada da relevância do projeto para o fortalecimento da gestão fiscal e o progresso sustentável do Estado de Roraima.

Profisco III RR - Diagrama de Conexão Lógica entre Áreas Estratégicas, Objetivos Específicos Complementares e Componentes

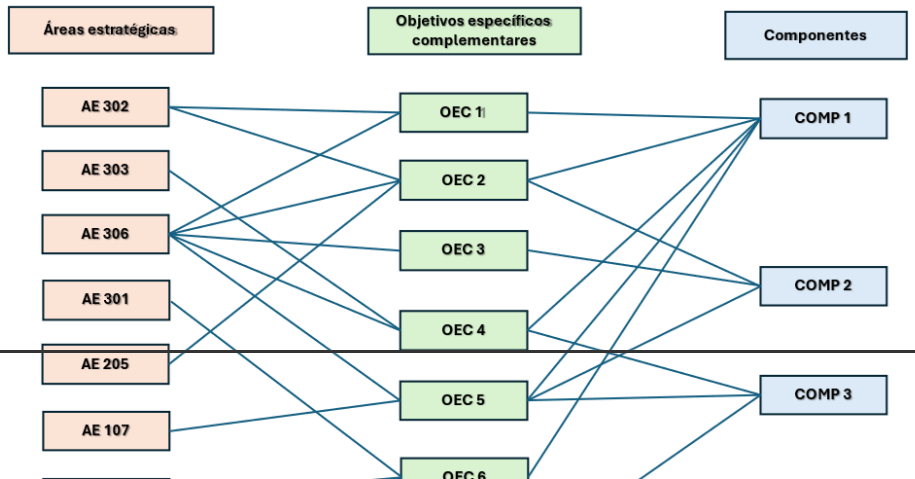

O diagrama acima visa demonstrar que o Profisco III RR apresenta uma rede de conexões lógicas entre os seus 7 objetivos específicos complementares, 3 componentes com 8 áreas estratégicas do PPA Federal, 2024-2027.

2. 2. **Anexos**

Anexo 08_Mapa de Aderência AE PPA 2024-2027 x Componentes e Produtos

Anexo 09_Relevancia Financeira dos Produtos nas AE PPA 2024-2027


Anexo 10_Diagrama de Conexão Lógica entre AE x OEC x Componentes

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A execução do PROFISCO III RR envolverá a atuação de diversos órgãos, cabendo a cada um destes um papel institucional em relação ao cumprimento atividades específicas em cada etapa da execução do Projeto, conforme o descrito no Organograma do Arranjo Institucional abaixo.

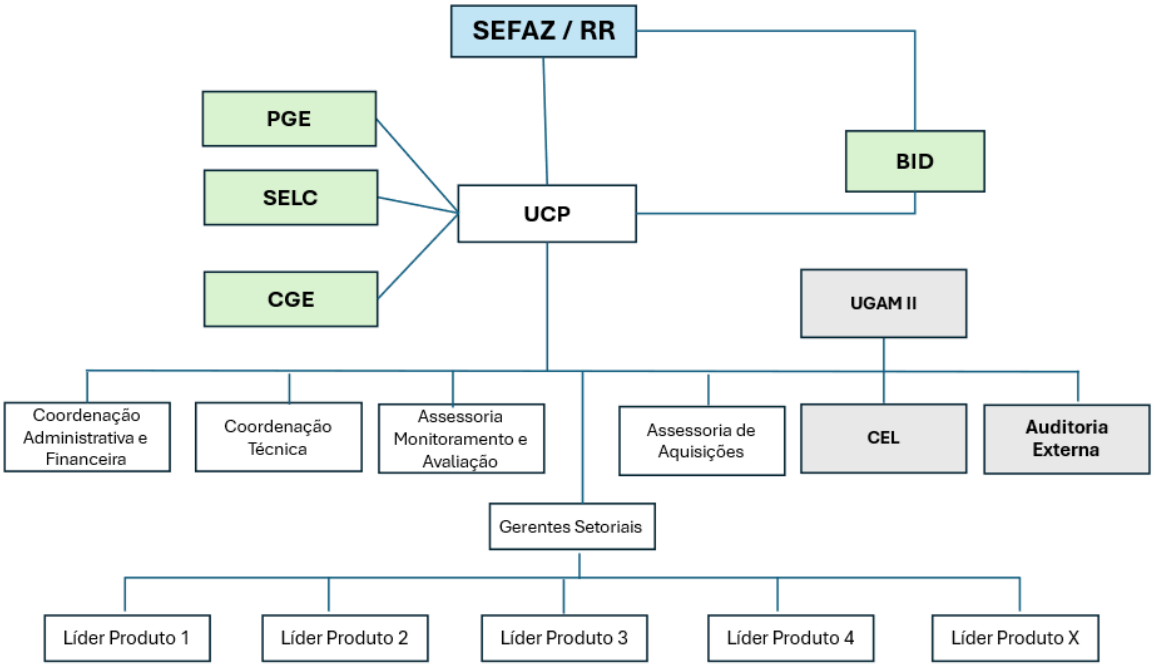

1. Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima – SEFAZ / RR

O Governo do Estado de Roraima será o mutuário da operação de crédito, sendo a Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima o Órgão Executor do Projeto. A execução do PROFISCO III RR contará com o apoio de unidades do órgão no desempenho de funções no Projeto.

A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP será responsável pela execução de Componentes e Produtos da SEFAZ/RR no PROFISCO III RR, pelas atividades de apoio na elaboração de TdR – termos de referências, pela prestação de contas, solicitação de desembolso e apresentação do relatório de auditoria ao BID, bem como pelo acompanhamento dos trabalhos das unidades da SEFAZ/RR responsáveis: pelas licitações de bens e serviços no âmbito do PROFISCO III RR; o recebimento e tombamento dos bens do Projeto e transferência para o Órgão Parceiro (PGE – Procuradoria Geral do estado); pela gestão dos contratos do Projeto; pelo registro contábil e pagamento das despesas do Projeto; pela análise técnica e jurídica dos processos licitatórios e de pagamentos.

2. Órgãos Parceiros – PGE, SELC e CGE

Procuradoria Geral do Estado de Roraima - PGE/RR será beneficiada no PROFISCO III RR através da execução dos produtos P2.4 – Contencioso Fiscal e P2.7- Cobrança e Arrecadação.

Para execução desses produtos será celebrado Termo de Cooperação entre a SEFAZ/RR e a PGE/RR, cabendo a responsabilidade pela execução dos produtos e atividades, conforme cronograma de execução e matriz de responsabilidades estabelecidos.

3. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID será o organismo financiador do PROFISCO III RR, através de linha de financiamento no âmbito do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO), pois possui expertise no tema da gestão fiscal e já prestado apoio a programas fiscais aos estados brasileiros desde 1996, pelos programas PNAFE e PROFISCO I e II, oferecendo amplo suporte técnico na implantação dos projetos, no acompanhamento da execução e avaliação dos resultados alcançados pelo Projeto.

O Banco manterá um relacionamento institucional com a SEFAZ/RR e um relacionamento operacional com a Unidade de Coordenação do Projeto – UCP, para o acompanhamento da execução do Projeto

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima – SEFAZ / RR
Órgãos parceiros:
Procuradoria Geral do Estado de Roraima
Secretaria de Estado de Licitação e Contratação
Controladoria Geral do Estado de Roraima

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

1. Unidade de Coordenação do Projeto - UCP

A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP será a unidade responsável pela execução do PROFISCO III RR, cuja equipe técnica será capacitada nas políticas de aquisições e salvaguardas do BID, na elaboração de Termos de Referência ou Especificações Técnicas, e desempenhará as seguintes atividades: i) Planejar, coordenar, monitorar e avaliar a execução dos produtos e atividades do Projeto. ii) Representar o Mutuário junto ao organismo financiador e órgãos federais de acompanhamento. iii) Participar de reuniões institucionais e de avaliação do Projeto. iv) Elaborar os instrumentos de monitoramento do Projeto, relatórios financeiros e de Progresso e outros. v) Realizar a prestação de contas dos recursos do Projeto e a solicitação de aporte de recursos financeiros; vi) Encaminhar ao BID o relatório de auditoria externa.

A UCP será responsável pela execução de todos os Componentes e Produtos do PROFISCO III RR e será composta por servidores da SEFAZ/RR, cujas competências e responsabilidades estão descritas no **Anexo 11 - Arranjo Operacional**.

2. Estrutura organizacional da SEFAZ/RR

A estrutura organizacional da SEFAZ/RR possui fluxos processuais bem definidos, cabendo a cada unidade a responsabilidade por determinada função na contratação de bens e serviços para o Projeto, conforme descrito a seguir:

2.1. Comissão Especial de Licitações - CEL: será constituída exclusivamente para realizar as licitações no âmbito do PROFISCO III RR, de acordo com as políticas de aquisições e salvaguardas do BID, o Plano de Aquisições e as modalidades de licitação definidas, utilizando os sistemas Licitações-e (BB) ou ComprasNet, credenciados pelo Banco.

2.2. Unidade de Gestão de Atividade Meio (UGAM II): será responsável pelo recebimento e tombamento dos bens do Projeto, que integrarão o patrimônio da SEFAZ/RR, gestão dos contratos do Projeto, pelo registro contábil e pagamento de despesas do Projeto. A PGE assinará em conjunto com a SEFAZ/RR os contratos de serviços sob sua responsabilidade de gestão.

2.3 Controle Interno: será responsável pela análise técnica dos processos licitatórios e de pagamentos.

3. Auditoria Externa

Contratação de empresa para realizar Auditoria Externa Independente das demonstrações financeiras, registros, transações e atividades do PROFISCO III RR, pois o Tribunal de Contas do Estado de Roraima - TCE/RR não é credenciado pelo Banco para a realização desse serviço.

A equipe da UCP, os Líderes de Produtos e os membros da CEL/RR serão formalmente designados para a execução do PROFISCO III RR, cujas ações referentes a execução do Projeto estão descritas no **Anexo 12 - Matriz de Responsabilidades Institucionais – Matriz RACI.**

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 12 - Matriz de Responsabilidades Institucionais - Matriz RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Na execução do PROFISCO III RR estão previstos investimentos em bens (hardware, software, veículos) serviços técnicos, consultorias e realização de obras de infraestrutura. Esses investimentos necessitarão de investimentos para a sua manutenção e reposição futura, uma vez que haverá o desgaste natural pelo uso e obsolescência. Os gastos para a sustentabilidade estão associados à manutenção do projeto e serão financiados com recursos da operação e especificado no TdR, definindo a transferência de conhecimento técnico, a melhoria na produtividade e a redução no custeio.

Com base no valor de investimento do PROFISCO III RR foi estimado um valor de US$ 466.750,00 /ano de custo anual de manutenção, calculada sobre o valor dos investimentos previstos no PROFISCO III RR para essas categorias de gastos, acima citadas, e baseado na taxa anual de depreciação de bens e infraestrutura, conforme demonstrado no **Anexo 13 - Custos de Sustentação do Projeto**, que representa 1,41% do valor total do Projeto.

Considerando a previsão de custos estimados de manutenção mencionada, esta SEFAZ/RR já realiza ações para a manutenção dos bens e infraestrutura referentes aos investimentos realizados fontes do Tesouro Estadual, cujos contratos anuais para a manutenção de bens e sistemas em operação estão descritos no **Anexo 14 - Contratos de Manutenção**. Os recursos para manutenção estão previstos no orçamento de custeio da SEFAZ/RR para o exercício de 2025, conforme demonstrado no detalhamento da Lei Orçamentária Anual para 2025, no **Anexo 15 - LOA 2025 - SEFAZ-FUNSEFAZ**, obtida no site: https://seplan.rr.gov.br/loa-2025/

Em complemento ao planejamento e realização de ações para garantir a manutenção dos investimentos que a ser realizados no âmbito do PROFISCO III RR, a SEFAZ/RR constituiu, em 2004, o Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária - FUNSEFAZ (**Anexo 16 - Lei 5429-04 - FUNSEFAZ**), constituído com recursos oriundos da arrecadação de Taxas de Serviço da Secretaria da Fazenda e que tem por objetivo financiar o reaparelhamento e o reequipamento da SEFAZ/RR, e cujos recursos estão assegurados na Lei Orçamentária Anual para 2025.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Plano Plurianual do Estado de Roraima (PPA), aprovado pela Lei nº 1.914/2024, estabelece as ações que definem as diretrizes, metas e objetivos do governo para o período 2024-2027, disponível no site: https://seplan.rr.gov.br/ppa-cgplan-2024-2027/

No “Anexo II - ATRIBUTOS DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS” do PPA (**Anexo 17 - PPA 2024-2027 - SEFAZ-RR**), estão descritas as ações da Unidade Orçamentária 13101 - SECRETARIA DA FAZENDA, as quais as ações do Projeto PROFISCO III RR se encontram alinhadas, através dos seguintes Programas:

EIXO: Gestão e Economia (pág. 23)
Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado
PROGRAMA: 51 - Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal
OBJETIVO: Fortalecer a Administração Tributária, modernizar o Sistema de Arrecadação e promover a justiça fiscal do Estado.
PÚBLICO ALVO: Governo do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Fazenda

EIXO: Gestão e Economia (pág. 16)
Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas
PROGRAMA: 61 - Operações Especiais
OBJETIVO: Amortizar Encargos das Dívidas Públicas, Contribuir Para a Formação do Patrimônio Público do Servidor - PASEP e Promover a Melhor Distribuição de Recursos Destinados aos Municípios.
PÚBLICO ALVO: Órgãos e Entidades Públicas
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Fazenda

As ações do PROFISCO III RR possuem aderência com o Planejamento Estratégico de longo prazo do Estado de Roraima – SEFAZ/RR 2020-2030 (**Anexo 18 - Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Roraima - Roraima 2030**), com ações de médio e longo prazo voltadas aprimorar a gestão administrativa e fiscal e a transparência das informações, a fim de oferecer serviços públicos de qualidade e um ambienta de negócios atrativos que resulte na melhoria da qualidade de vida da população e: https://seplan.rr.gov.br/roraima2030-cgplan/.

3. 4. **Anexos**

Anexo 13_Custos de Sustentação do Projeto

Anexo 14_Contratos de Manutenção

Anexo 15 - LOA_2025_Lei_n_2.107

ANEXO 16 - Lei nº 496 Institui o FUNSEFAZ

ANEXO 17 - PPA RR.pdf

Anexo 18 - Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Roraima - Roraima 2030

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Não aprovação dos atos legais da Operação de Crédito
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima que permita ao Estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a Carta Consulta pela COFIEX.

Na análise da mensagem para a contratação da operação de crédito a Assembleia Legislativa observará a situação das receitas e despesas da administração estadual, quanto aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a conformidade e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

A não aprovação legislação resultará na não continuidade do processo de contratação da operação de crédito pleiteada.

Prevenção e Mitigação:
A equipe de governo do estado possui um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para a melhoria da arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

A Secretaria da Fazenda, a cada quadrimestre, participa de audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, apresentando a situação das receitas e despesas estaduais e o cumprimento das metas fiscais exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Poder Executivo Estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando com equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e redação. A UCP será criada no âmbito da SEFAZ/RR por Decreto Estadual.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Execução das atividades do Projeto
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução de atividades dos Componentes e Produtos do Projeto pela SEFAZ/RR ou pela PGE, que provoque atrasos na tramitação interna dos processos, em especial na realização das licitações e, consequentemente, atrasem a execução do Projeto.

Outro fator de problema seria a UCP não contar com um corpo de técnicos qualificados para preparar os Termos de Referência ou as Especificações Técnicas requeridas.

Prevenção e Mitigação:
A equipe técnica da UCP e líderes de produtos atuarão como pontos focais responsáveis pela execução das atividades relacionadas ao seu Produto.

Como ações mitigadoras para solucionar problema relacionado ao atraso na execução de atividades dos Componentes e Produtos do Projeto, destacamos:

- Constituir comissões internas para elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas dos produtos mais complexos ou prioritários;
- Contratar consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas sobre assuntos mais complexos;
- Realizar atividades de capacitação sobre as normas e procedimentos de aquisições do BID;
- Compor a Comissão Especial de Licitações com técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID, e que já participaram da execução dos Programas PROFISCO I e II;

- Estreitar o relacionamento da equipe de licitações com as unidades de controle interno (CGE) e análise jurídica do estado (PGE), responsáveis pela análise e aprovação prévias dos processos de licitação.

Quanto ao fato de a UCP não contar com um corpo de técnicos qualificado para a elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas, haverá previsão em todos os Componentes do Projeto, principalmente no Componente “Gestão do Projeto”, para a contratação de pessoas físicas ou empresas para apoiar no diagnóstico, identificação e definição do objeto das contratações. Essas contratações seriam realizadas por meio de seleção de consultores individuais ou empresas de consultoria, conforme a modalidade de contratação e a política de aquisições definida pelo Banco.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Gestão Pública e Governabilidade
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução de atividades dos Componentes e Produtos do Projeto devido a mudança de gestão na SEFAZ, que possam causar atrasos ou descontinuidade na execução do projeto devido as eleições estaduais que resultem em mudança de gestão na SEFAZ/RR.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de descontinuidade decorrente de mudanças na gestão da SEFAZ/RR, será elaborado um Plano de Ação conjunto entre a UCP e o Banco, com foco na aceleração das principais aquisições e entregas estratégicas do Projeto. Esse plano incluirá etapas detalhadas, prazos definidos e responsabilidades claras, visando garantir avanços significativos antes do período eleitoral. Além disso, será promovido o alinhamento institucional com as lideranças da SEFAZ, reforçando o compromisso com a continuidade do Projeto independentemente de mudanças políticas. A documentação técnica e os registros de decisões serão sistematizados para facilitar a transição de gestão, assegurando que o novo corpo diretivo tenha pleno conhecimento dos objetivos, resultados esperados e compromissos assumidos. Essas ações visam preservar a governabilidade e a execução regular dos Componentes e Produtos, mesmo diante de cenários de instabilidade política.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Resistência às mudanças
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução do Projeto devido à resistência às mudanças promovidas pelos investimentos realizados, quando da execução das atividades dos Componentes e Produtos.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de resistência às mudanças, será adotada uma estratégia de comunicação clara e contínua, com ações voltadas à transparência na execução do Projeto e ao engajamento do corpo funcional. Serão promovidas campanhas informativas, capacitações e espaços de diálogo sobre os impactos da Reforma Tributária, da transformação digital e das inovações previstas. A participação ativa dos servidores será incentivada, fortalecendo o sentimento de pertencimento e reduzindo inseguranças. Também serão criados mecanismos de valorização de boas práticas e um comitê de acompanhamento da mudança, responsável por monitorar o clima organizacional e propor ajustes táticos ao longo da execução. Essas ações visam preparar os profissionais para os novos desafios e garantir maior adesão às transformações propostas.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Sustentabilidade dos investimentos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução do Projeto devido à manutenção dos investimentos realizados, que ocasionem a descontinuidade dos produtos, sistemas e progressos alcançados caso não sejam garantidos mecanismos para sua manutenção.

Prevenção e Mitigação:

A SEFAZ/RR vem prevendo nos instrumentos de planejamento legais a disponibilização de recursos, visando a manutenção e modernização da Administração Fazendária e irá fortalecer a previsão e disponibilização destes recursos, cujos recursos serão previstos no orçamento da SEFAZ/RR para cada exercício, através da Lei Orçamentária Anual.

A SEFAZ/RR constituiu em 2005, através da Lei nº 496/2005, o Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário - FUNSEFAZ, com finalidade de apoiar as atividades e programa de modernização, desenvolvimento e aprimoramento da Administração Fazendária na SEFAZ/RR, cujos recursos também estão assegurados na Lei Orçamentária Anual.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Fluxo Processual
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema no fluxo interno de processos que provoquem atrasos nas aquisições de bens e contratações de serviços, devido à falta de clareza nos fluxos internos na tramitação dos processos, e que resulte em atrasos na execução de atividades do Projeto.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atrasos causados por falhas no fluxo processual interno, serão adotadas ações que reforcem a articulação entre os setores envolvidos e promovam maior clareza nos procedimentos. A UCP e a SEFAZ/RR atuarão de forma integrada com os órgãos responsáveis pelas aquisições, acompanhando de perto a tramitação dos processos e identificando possíveis gargalos. A normatização vigente será utilizada como referência para padronizar os fluxos, e serão promovidas capacitações internas para garantir que todos os atores compreendam suas responsabilidades e prazos. A presença de Procuradores do Estado (PGE) lotados na SEFAZ/RR será estratégica para agilizar a análise jurídica dos processos, evitando retrabalho e garantindo maior celeridade. Além disso, será incentivado o uso de ferramentas digitais de acompanhamento processual, permitindo maior controle e transparência nas etapas de aquisição e contratação.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Contrapartida
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de atraso nas aquisições de bens e contratações de serviços devido a dificuldade do Estado em aportar a contrapartida local.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atraso nas aquisições e contratações devido à dificuldade de aporte da contrapartida local, o Governo do Estado manterá medidas rigorosas de controle financeiro e orçamentário, assegurando o equilíbrio fiscal necessário à execução do Projeto. As ações previstas serão incorporadas ao Plano Plurianual (PPA) e contempladas na Lei Orçamentária Anual, garantindo previsibilidade e disponibilidade dos recursos. Além disso, será reforçado o aporte ao Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário – FUNSEFAZ, instituído pela Lei nº 496/2005, como instrumento estratégico para viabilizar a contrapartida estadual. A UCP acompanhará de forma contínua a execução orçamentária, articulando com os setores responsáveis para antecipar ajustes e assegurar que os compromissos financeiros sejam cumpridos sem comprometer o cronograma do Projeto.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Monitoramento e Prestação de Contas
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de atraso na execução do Projeto devido à deficiência no planejamento e dificuldades no monitoramento das suas atividades e cumprimento de metas.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atrasos decorrentes de falhas no planejamento e monitoramento do Projeto, a equipe da SEFAZ/RR será capacitada em Gestão de Projetos, com foco na utilização eficiente do Módulo Projeto, ferramenta que permitirá o acompanhamento detalhado da execução orçamentária e financeira. Essa plataforma será responsável pela

geração dos relatórios de Prestação de Contas e das Solicitações de Desembolso ao organismo financiador, garantindo maior controle e transparência. Complementarmente, será desenvolvida uma planilha estruturada ou contratada uma solução tecnológica de mercado para apoiar o planejamento estratégico e o monitoramento contínuo das ações, metas e indicadores do Projeto. Essas medidas visam fortalecer a capacidade de gestão, reduzir riscos operacionais e assegurar o cumprimento dos prazos e compromissos estabelecidos.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Impactos Ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A gestão de riscos de impactos ambientais é relevante para a sustentabilidade Fiscal, devendo o Projeto do PROFISCO III RR adotar um olhar estratégico quanto aos temas ambientais, devido a importância da adoção do ESG (Environmental, Social and Governance), que são as medidas de responsabilidade ambiental, social e de governança, onde a gestão de riscos ambientais deve ser valorizada.

Os riscos ambientais podem afetar a saúde e a integridade dos funcionários ou mesmo causar danos ao meio ambiente, como resultado das atividades do órgão, sendo necessárias ações para a sua mitigação.

Os riscos ambientais são classificados em quatro categorias principais: I) Riscos ambientais, que são prejudiciais ao meio ambiente e aos indivíduos presentes nele; II) Riscos químicos, são os causados por agentes químicos dispersados no ambiente por meio de névoas, poeiras, fumaça ou similares, e absorvidos através da pele ou pela inalação; III) Riscos físicos, causados por vibrações, ruídos, impactos e exposição a altas temperaturas, radiação ou pressão anormal, causando danos físicos a indivíduos, fauna e/ou flora; e, IV) Riscos biológicos, os provenientes de exposição a agentes capazes de causar doenças aos seres humanos, animais e a vegetação nativa do local (fungos, bactérias, vírus ou outros).

Prevenção e Mitigação:
A SEFAZ irá executas ações na execução do PROFISCO III RR para mitigação dos riscos ambientais, para garantir o respeito ao meio ambiente e aos indivíduos presentes nele, desde a população geral até a fauna e a flora, através de:

a) Coleta seletiva de resíduos sólidos, através de lixeiras seletoras instaladas nas unidades da SEFAZ para separação de resíduos recicláveis do lixo não reciclável, com a instalação de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos.

b) Interligação do esgoto dos prédios da SEFAZ à rede de esgoto dos respectivos municípios (quando existente), ou a contratação de empresa especializada em limpeza e esgotamento de fossas sépticas, e limpeza de caixas d'água, nas demais unidades da SEFAZ no interior do estado.

c) Transferência de bens inservíveis para a Secretaria de Administração, que realizará os procedimentos legais para a destinação destes para venda em leilão público ou doação para entidades da sociedade civil que trabalham com reciclagem de materiais.

d) Implantação de sistema de armazenamento e reuso de águas pluviais na Unidade Sede da SEFAZ.

e) Instalação de usinas fotovoltaicas nos prédios da Sede, das Unidades de Atendimento e Postos Fiscais da SEFAZ no interior do estado, bem como a instalação de centrais de recarga de veículos elétricos.

A adoção de medidas ambientais no Projeto irá atuar de forma a minimizar os impactos das atividades sobre o meio ambiente, servidores e população, bem como a adoção de uma gestão ambiental sustentável trará benefícios à imagem da SEFAZ/RR, trazendo credibilidade como um órgão que trabalham para minorar os impactos de suas ações sobre o meio ambiente.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Catástrofe Ambiental e Saúde Pública
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de interrupção na execução do Projeto causado por catástrofe ambiental ou devido à problemas de saúde pública

Prevenção e Mitigação:

Quando da ocorrência de problemas causados por catástrofes ambientais, a SEFAZ/RR deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela Defesa Civil do Estado. A SEFAZ/RR realiza ações preventivas na sua infraestrutura para evitar qualquer dano ambiental, no tratamento de águas e esgotos, no combate a pragas etc., possuindo equipe de manutenção e equipamentos de reserva para atender a qualquer contingência.

Quando da ocorrência de problemas causados por epidemias, a SEFAZ/RR deverá seguir os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. Quando da ocorrência da COVID 19, a SEFAZ/RR disponibilizou acesso remoto aos servidores, bem como distribuiu álcool e equipamentos de EPI aos servidores que continuaram a trabalhar presencialmente nas suas unidades.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Desapropiação e Reassentamentos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de interrupção na execução do Projeto pela necessidade de realizar ações de desapropriação e reassentamento de populações que ali habitam quando da execução de serviço de infraestrutura (reforma ou construção) em imóveis novos, que não são de propriedade do Estado de Roraima.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de interrupções decorrentes de desapropriações e reassentamentos, o Projeto prevê que todos os serviços de infraestrutura, como reformas e construções, sejam realizados exclusivamente em imóveis já pertencentes ao Estado de Roraima e atualmente utilizados pela SEFAZ/RR para o funcionamento de suas Unidades de Atendimento e Postos Fiscais. Essa medida elimina a necessidade de aquisição de novos imóveis e evita impactos sociais relacionados ao deslocamento de populações. Além disso, será feito um levantamento prévio e detalhado dos imóveis contemplados, assegurando que estejam regularizados e livres de qualquer pendência jurídica ou ocupação indevida. Com isso, o Projeto garante maior segurança jurídica, previsibilidade na execução e respeito aos direitos das comunidades locais, mantendo o cronograma físico-financeiro sem riscos associados a processos de desapropriação.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Impacto Social
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de interrupção na execução do Projeto causado pela ocorrência de riscos sociais que possam impactar na imagem do órgão e do agente financeiro.

O risco social se refere à percepção da execução do projeto pela população, como: a) a forma como são tratadas questões relativas aos direitos humanos; b) o cumprimento dos direitos trabalhistas; c) o tratamento dos funcionários, parceiros, clientes e demais stakeholders; d) o relacionamento com a sociedade; e, e) as questões ambientais, como poluição, preservação da biodiversidade e uso de recursos naturais.

O risco social do projeto pode causar impacto nos órgãos envolvidos na sua execução e na sociedade, quanto ao aspecto reputacional, ou seja, como o mercado, os contribuintes e a sociedade enxergam os órgãos envolvidos na execução do projeto; e, quanto a relação dos órgãos e das empresas contratadas no âmbito do projeto com as pessoas e a sociedade, relacionadas com a exploração de trabalho infantil, condições análogas à escravidão, não pagamento de encargos sociais dos trabalhadores, não disponibilização de equipamentos de proteção; etc, e que impactam na reputação dos órgãos envolvidos na execução do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de impacto social, a UCP e os líderes de projetos atuarão diretamente no acompanhamento das ações de gestão social e ambiental, assegurando que todas as atividades estejam alinhadas com os princípios de responsabilidade socioambiental. Serão adotadas práticas que garantam o respeito aos direitos humanos, o cumprimento das normas trabalhistas e a proteção ambiental. As empresas contratadas deverão seguir critérios de conformidade. Também serão promovidas ações de comunicação com a sociedade, reforçando a transparência e o compromisso ético do Projeto, com foco na preservação da reputação institucional e na construção de uma imagem positiva junto aos stakeholders.

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Atraso na transição do ICMS para IBS na Reforma Tributária
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

Possibilidade de ocorrência atraso na transição do ICMS para o IBS no processo de implantação da Reforma Tributária, decorrente de problemas relacionados ao estabelecimento de normas e procedimentos operacionais; especificação de processos de implantação e integração entre os entes federados; definição, aquisição, desenvolvimento e implantação de soluções (hardware e software) para a interligação de sistemas, que poderão causar o descumprimento dos prazos estabelecidos na legislação para o início da transição, em 2026.

Esse risco pode causar impacto nas unidades tributárias de todos os entes federados envolvidos na execução dessa integração, na sociedade e empresas, quanto a relação dos órgãos tributários com as empresas e a sociedade, beneficiados pela Reforma Tributária.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atraso na transição do ICMS para o IBS, a SEFAZ/RR intensificará sua atuação técnica e institucional, ampliando a participação ativa nos grupos nacionais responsáveis pela regulamentação e harmonização da Reforma Tributária, como CONSEFAZ, CONFAZ, COGEF, ENCAT e GEFIN. Serão mobilizados mais áreas e servidores para acompanhar de forma integrada os avanços normativos e operacionais, garantindo alinhamento com os prazos legais. Além disso, serão realizados investimentos estratégicos na modernização dos sistemas tributário e financeiro, com foco na aquisição, desenvolvimento e implantação de soluções tecnológicas compatíveis com o sistema do Comitê Gestor do IBS. Essas ações visam assegurar a interoperabilidade entre os entes federados, reduzir riscos de descontinuidade e garantir uma transição eficiente e segura, preservando a confiança da sociedade e das empresas beneficiadas pela Reforma.

4. 14. **Informações do 14° risco:**
Nome: Baixa experiência da UCP e Líderes de Produtos na Gestão de Projetos Complexos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A execução do PROFISCO III RR envolve a gestão de múltiplos componentes e produtos, com elevado grau de complexidade técnica, institucional e operacional. A baixa experiência da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) e dos líderes de produtos na condução de projetos com múltiplos eixos estratégicos pode comprometer o planejamento, a integração entre atividades, o cumprimento de prazos e a qualidade dos entregáveis. Essa limitação pode resultar em retrabalho, baixa eficiência na alocação de recursos, dificuldades na articulação com órgãos parceiros e fragilidade na prestação de contas ao organismo financiador

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar os impactos da baixa experiência da UCP e dos líderes de produtos na gestão de projetos complexos, será adotado um conjunto articulado de ações voltadas ao fortalecimento técnico e institucional. A primeira frente envolve a capacitação técnica por meio de treinamentos em metodologias ágeis, gestão por resultados e ferramentas digitais de planejamento, promovendo maior domínio sobre práticas modernas de gerenciamento. Complementarmente, será contratada mentoria especializada para apoiar diretamente a estruturação dos planos de trabalho, cronogramas e indicadores, garantindo maior consistência e alinhamento estratégico desde as fases iniciais do projeto.

Além disso, será promovida uma integração interinstitucional contínua, com reuniões periódicas entre os líderes de produtos, a UCP e os órgãos parceiros, visando o alinhamento de expectativas, a troca de experiências e a resolução colaborativa de gargalos operacionais. Para sustentar essa articulação, serão implantadas ferramentas informatizadas de gestão que permitam o monitoramento em tempo real das atividades e metas, com alertas automáticos para desvios. A padronização dos processos será reforçada com a elaboração de um manual de procedimentos, enquanto a gestão do conhecimento será consolidada por meio de repositórios digitais com documentos, modelos e lições aprendidas dos ciclos anteriores do PROFISCO, promovendo a memória institucional e o apoio à tomada de decisão.

4. 15. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	30.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	300	360

Juros aplicáveis:
5,50% a.a. composta de: taxa SOFR diária: 4,29% a.a. + spread de 1,21% (margem de captação + margem de empréstimo)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,50% a.a.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

n/a

Outras Informações:

n/a

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
C1- GESTÃO FAENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
400.000,00	94.250,00	1.878.150,00	0,00	2.965.500,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.769.300,00	295.050,00	1.482.750,00	0,00		

Nome do componente					
C2 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
846.500,00	0,00	3.000.000,00	216.700,00	4.000.000,00	1.079.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
5.248.300,00	0,00	2.539.500,00	0,00		

Nome do componente					
C3 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
271.750,00	0,00	1.032.650,00	0,00	1.000.000,00	630.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.000.350,00	684.500,00	815.250,00	0,00		

Nome do componente					
GESTÃO DO PROJETO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
37.500,00	0,00	142.500,00	0,00	225.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
232.500,00	0,00	112.500,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Na SEFAZ/RR já estão sendo iniciadas as discussões internas e a estruturação de grupos de trabalho para a prospecção de soluções e geração de especificações para um conjunto de produtos e atividades. Além disto a perspectiva de contratação de novos servidores decorrente de concurso já realizado, reforçará o corpo técnico institucional.

Dentre as soluções já iniciadas, destacam-se:

a. Estudo para revisão de procedimentos de cobrança para facilitar a autorregularização dos contribuintes;

b. Melhoria de procedimentos no atendimento presencial nas unidades da SEFAZ, organizando os espaços físicos e capacitando os servidores para oferecer um atendimento mais cordial e eficiente;

c. Reestruturação dos postos fiscais com reformas básicas, aquisição de móveis, computadores, impressoras e acesso à internet, garantindo condições mínimas para o trabalho de fiscalização de mercadorias em trânsito;

d. Implantação controles para o acompanhamento das receitas e despesas do Tesouro Estadual, utilizando planilhas eletrônicas e capacitando os servidores em práticas básicas de planejamento financeiro e controle de fluxo de caixa;

e. Aquisição de equipamentos essenciais para o funcionamento do datacenter da SEFAZ/RR incluindo soluções de hyperconvergência, criando uma estrutura mínima para suportar os sistemas tributários e administrativos;

f. Promoção de treinamentos para os servidores, com foco em legislação tributária, atendimento ao público, uso de sistemas internos e rotinas administrativas, fortalecendo a capacidade técnica da equipe;

g. Participação de grupos técnicos nacionais como ENCAT, COGEF, GEFIN e GDFAZ, promovendo a troca de experiências com outros estados, aprendendo boas práticas e acompanhando as discussões sobre a Reforma Tributária;

h. Estabelecimento de parcerias com Secretaria de Estado de Licitações e Compras, CGE e PGE para uma preparação conjunta para o pleito do projeto Profisco III RR.

6. 2. Anexos

Sem anexos.
