PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Modernização Fiscal do Estado do Acre

Proponente: Estado do Acre
Processo SEI: 03101.002850/2025-69
Código do pleito: 9102009723/2025
Versão: 1

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 32.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 3.200.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 06
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 06
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 11
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 11
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 12
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 13
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 14
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 15
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 17
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 18
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 19
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 20
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 20
1. 5. Componentes 21
1. 5. 1. Informações do 1° componente 21
1. 5. 2. Informações do 2° componente 23
1. 5. 3. Informações do 3° componente 24
1. 5. 4. Informações do 4° componente 26
1. 5. 5. Informações do 5° componente 26
1. 6. Beneficiários 27
1. 7. Anexos 28
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 29
2. 1. Áreas estratégicas 29
2. 2. Anexos 30
3. GESTÃO 31
3. 1. Arranjo institucional 31
3. 1. 1. Descrição 31
3. 1. 2. Orgãos Executores 32
3. 1. 3. Estrutura Operacional 32
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 32
3. 2. Operacionalização e Manutenção 32
3. 3. Planejamento Estratégico 33
3. 4. Anexos 34
4. RISCOS 35
4. 1. Informações do 1° risco 35
4. 2. Informações do 2° risco 35
4. 3. Informações do 3° risco 36

4. 4. Informações do 4° risco 36
4. 5. Informações do 5° risco 36
4. 6. Informações do 6° risco 37
4. 7. Informações do 7° risco 37
4. 8. Informações do 8° risco 37
4. 9. Informações do 9° risco 37
4. 10. Informações do 10° risco 38
4. 11. Informações do 11° risco 38
4. 12. Informações do 12° risco 39
4. 13. Informações do 13° risco 39
4. 14. Informações do 14° risco 40
4. 15. Anexos 40
5. FINANCIAMENTO 41
5. 1. Condições Financeiras da Operação 41
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 41
5. 2. Cronograma de Desembolso 43
5. 3. Contragarantias 44
5. 4. Anexos 44
6. ETAPAS REALIZADAS 45
6. 1. Etapas realizadas 45
6. 2. Anexos 45
7. CONTATOS 46
7. 1. Contatos 46
7. 2. Anexos 46
8. Baixar todos os anexos 47

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Modernização Fiscal do Estado do Acre
Sigla: PROFISCO III AC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado do Acre

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Governo do Estado do Acre enfrenta desafios fiscais, sociais e econômicos que evidenciam a urgência de modernizar a gestão pública. Essa modernização é essencial para garantir a sustentabilidade financeira e viabilizar políticas que impulsionem o desenvolvimento social e econômico.

Segundo o IBGE, o Acre possui 22 municípios distribuídos em 152.581 km², sendo o 16º estado em extensão territorial. Com uma população de 830.018 habitantes, é a terceira unidade federativa com menor número de habitantes na Região Norte. Entre 2010 e 2022, o estado apresentou uma taxa de crescimento demográfico de 13,2%, superior à média nacional.

Apesar desse dinamismo populacional, os indicadores sociais ainda estão abaixo da média brasileira. Em 2024, 46,2% da população vivia abaixo da linha da pobreza, frente a 27,4% no país. De acordo com dados do IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – do Atlas Brasil, o IDH do Acre foi 0,710 em 2021, ano da última divulgação consolidada, inferior à média nacional (0,766), posicionando o Acre entre os oito piores estados nesse indicador. Por outro lado, a taxa de analfabetismo foi de apenas 3,9%, uma das mais baixas do Brasil, demonstrando avanços na educação.

A evolução do Produto Interno Bruto (PIB) também reflete oscilações importantes. Em 2019, o crescimento foi de 0,2% em relação a 2018. Já em 2020, houve retração de 4,2%, impactada pela pandemia. Em 2021, o estado registrou recuperação com crescimento de 6,7%. Nesse ano, o PIB alcançou R$ 21,4 bilhões, representando 0,24% do PIB nacional e 3,8% da Região Norte. O PIB per capita foi de R$ 23.569, ocupando o 17º lugar entre os estados e o 5º na região Norte. O IDH manteve-se em 0,710, o 16º do país. A composição do PIB em 2021 foi: Agropecuária (18,9%), Indústria (7,1%) e Serviços (74%).

Na avaliação de capacidade de pagamento (CAPAG, segundo nota técnica STN 4113 de 2025, o Acre obteve nota “C”, refletindo os seguintes indicadores: Endividamento (“A” – 34,95% - DC / RCL), Poupança Corrente (“B” – 92,29% da RCL) e Liquidez Relativa (“C” – -1,03%). A evolução da relação Dívida Consolidada/RCL foi positiva: 46,90% em 2022, 38,63% em 2023 e 34,95% em 2024.

No Ranking de Competitividade dos Estados (CLP, 2024 - https://rankingdecompetitividade.org.br/estados), o Acre ocupa a penúltima posição (26º lugar), reflexo de deficiências estruturais e baixo dinamismo econômico. Ainda assim, o estado apresenta avanços nos pilares de inovação, sustentabilidade ambiental e social.

Diante desse cenário, é fundamental modernizar a gestão fiscal e administrativa para ampliar a eficiência da arrecadação, qualificar os gastos públicos, reduzir a dependência de transferências federais e fortalecer setores estratégicos que diversifiquem a economia, promovam inclusão social e aumentem a competitividade.

O principal desafio fiscal é manter o crescimento da arrecadação própria, baseada majoritariamente no ICMS, e reduzir a dependência de recursos federais. As despesas com pessoal e previdência consomem grande parte do orçamento, limitando a capacidade de investimento. A Reforma Tributária sobre o Consumo (RTC) exigirá adaptações nas administrações tributária e financeira, com destaque para o novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ICMS e demandará mudanças institucionais e normativas.

No campo ambiental, o Acre preserva 85% de sua floresta e possui 90% do território registrado no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Ainda assim, enfrenta desafios como desmatamento e queimadas. Em 2023, foi responsável por 8% do desmatamento da Amazônia Legal, apesar da redução de 61% em relação ao ano anterior. Para enfrentar esses desafios, é essencial integrar a gestão fiscal às dimensões ambiental e social, com investimentos em planejamento, transformação digital e eficácia tributária.

Nesse contexto, o projeto Profisco III AC propõe soluções estratégicas. Entre elas, pode-se citar: a implantação de um sistema integrado de monitoramento ambiental, o aperfeiçoamento da certificação de créditos de carbono e a elaboração de um plano de redução de emissões na infraestrutura pública. Alinhado ao Plano de Recuperação Verde (PRV) e à Agenda Acre 10 anos, o projeto busca fortalecer a sustentabilidade fiscal e ambiental, promovendo inclusão produtiva e proteção da floresta.

Para viabilizar essas ações, o Estado pleiteia operação na linha de crédito do PROFISCO III, cujas diretrizes e desafios da gestão fiscal subnacional estão detalhados no Marco de Referência do Programa (Anexo II).

1. 2. 2. **Problema:**

O Estado do Acre tem enfrentado desafios estruturais de grande relevância. Com a alta dependência de repasses constitucionais, uma arrecadação ainda incipiente frente a necessidades das políticas públicas, o estado enfrente problemas na manutenção do equilíbrio fiscal e concentra grandes esforços na captação de recursos para investimentos.

Com base nos diagnósticos apresentados quando da aplicação Metodologia de Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal – MD-GEFIS, 2020 (Anexo III - Relatório da MD-GEFIS); no plano estratégico de longo prazo (Anexo IV - Agenda Acre 10 anos), no Plano Estratégico do Governo 4 anos, (Anexo V - Plano Estratégico de Governo) e no Plano Estratégico da SEFAZ (2023 – Anexo XV) foram produzidas, ao longo de 2024, as 18 notas técnicas de produtos que suportam esta Carta Consulta (Anexo VI - Notas Técnicas Profisco III AC). Assim, os principais problemas identificados e priorizados são:).

Nesse contexto foram identificados os seguintes desafios estratégicos:

D.1 A gestão estratégica, de projetos, pessoas e TI e riscos apresenta processos ineficientes, com baixa transparência nas relações com a sociedade e participação social limitada. Avaliada como “Iniciante -” na MD-GEFIS, essa condição compromete a eficiência tributária, a justiça social e a qualidade dos serviços públicos.

D.2 O sistema tributário sobre o consumo é excessivamente complexo, com legislações fragmentadas e múltiplas alíquotas. Isso gera cumulatividade, penalizando setores com cadeias produtivas extensas e impactando a população mais pobre. A tributação na origem desestimula investimentos e exportações, intensificando a “guerra fiscal”. A diversidade de alíquotas reduz a transparência ao consumidor e eleva a litigiosidade. Harmonizar a Administração Tributária estadual à Regra de Transição é um dos grandes desafios da gestão fiscal, essencial para criar um sistema mais eficiente, simplificar obrigações e fortalecer a cooperação federativa.

D.3 O ICMS continuará como principal fonte de receita estadual até 2032, quando será substituído pelo IBS. Sua complexidade atual — com múltiplas alíquotas e regras — onera contribuintes e a administração, elevando custos de conformidade, litigiosidade e evasão fiscal, com perdas significativas de arrecadação.
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/12/16/novos-tributos-comecam-a-sertestados-em-2026-e-transicao-vai-ate-2033.

D.4 A falta de integração e modernização dos sistemas de planejamento, execução orçamentária e gestão contábil-financeira compromete a produção de informações qualificadas, dificultando decisões e ameaçando a sustentabilidade fiscal. Isso resulta em alocação inadequada de recursos e aumento dos riscos fiscais.

D.5 A baixa adoção de tecnologias digitais e uma cultura de inovação ainda em construção limitam a eficiência da gestão fiscal, gerando serviços públicos de menor qualidade e custos adicionais ao contribuinte. Estudo do BID (2024) classificou o estado como “Iniciante” em maturidade digital, evidenciando a urgência de modernização. Vide Anexo 06 – Avaliação de Maturidade de Análise Avançada de Dados na AT – AC.

D.6 O ambiente de negócios é pouco amigável, tanto pela complexidade e custos das obrigações tributárias quanto pela limitada automação dos processos. Isso gera inconformidades, litigância e um contencioso fiscal de baixa recuperação.

D.7 A participação cidadã na gestão fiscal é restrita pela ausência de mecanismos digitais eficazes, dificultando comunicação, engajamento e fiscalização social. É essencial tornar as informações orçamentárias mais acessíveis para ampliar o debate público e a participação nas políticas públicas.

D.8 A baixa presença de mulheres em cargos de liderança na SEFAZ-AC e as dificuldades enfrentadas por produtoras rurais e microempreendedoras na emissão de NFe Avulsa evidenciam a necessidade de ações que promovam a inclusão econômica feminina e a autonomia financeira das empreendedoras.

D.9 O Fisco de Acre não utiliza fontes renováveis nem aplica programas estruturados de eficiência energética, elevando os custos com energia elétrica e não contribuindo para a meta nacional de 45% de renováveis até 2030. O estado ainda depende parcialmente de termelétricas a diesel.

D.10 Não há ações voltadas à segurança hídrica nos órgãos da gestão fiscal, o que prejudica políticas públicas voltadas ao uso sustentável da água — recurso essencial ao desenvolvimento socioeconômico.

D.11 Baixa aderência dos programas de gestão de ativos ambientais com a gestão fiscal, marcada pela ausência de integração sistêmica e limitado aproveitamento sustentável dos recursos.

Essas questões foram organizadas conforme a estrutura dos três componentes do PROFISCO III AC, conforme apresentado no Anexo 05 – Lógica Horizontal de Resultados do PROFISCO III AC, permitindo uma abordagem integrada e orientada à superação dos entraves que comprometem a eficiência da gestão fiscal estadual.

1. 2. 3. **Solução:**

Para enfrentar os desafios estruturais da Gestão Fiscal do Estado, especialmente diante das transformações impostas pela Reforma Tributária sobre o Consumo (RTC) e da adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, propõem-se as seguintes soluções, organizadas conforme os eixos estratégicos:

GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL (GF)

1. Aperfeiçoamento da governança fiscal pela implantação de um planejamento estratégico sustentável, pela melhoria da execução da estratégia e implementação de um plano de transformação digital;
2. implantação de programa de gestão de riscos e integridade considerando mitigação às mudanças climáticas;
3. Modernização da gestão de pessoas por meio da adoção de um modelo baseado em competências, aliado a um plano de capacitação focado na qualificação dos servidores, atendendo às exigências dos processos, à condução de mudanças, aos impactos da RTC e capacitação de mulheres fomentar uma maior participação em posições de liderança.
4. Atualizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação, observando diretrizes de eficiência no consumo de energia e a conformidade com os requisitos das regras de transição da RTC, incorporando avanços na governança, gestão de riscos e segurança da informação.
5. Desenvolver políticas e diretrizes voltadas à Educação Fiscal, ampliando sua atuação junto a pequenos produtores, comunidades e grupos sociais, com atenção especial às mulheres microempreendedoras.
6. Modernização do Portal de Transparência, da sistemática de Ouvidoria e da plataforma estadual do Balanço Cidadão.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)

1. Implantação de modelo de gestão de política tributária estadual que avalia os impactos econômicos, climáticos e ambientais e a implantação de mecanismos de controle sobre benefícios fiscais concedidos;
2. Integração do sistema de cadastro com o PNR – Portal Nacional REDESIM, consolidação das declarações mensais na EFD ICMS IPI e a integração ao Identificador Único (CNPJ alfanumérico);
3. Incorporação de novos processos de fiscalização fortalecendo a gestão de riscos, a percepção do risco subjetivo pelo contribuinte e a integração com o PUCOMEX – Portal Único do Comércio Exterior;
4. Implantação do processo administrativo tributário eletrônico que integrará desde a fiscalização até o julgamento em última instância administrativa e solução de consulta inteligente à legislação tributária, mediante o uso de inteligência artificial;
5. Expansão dos serviços de atendimento eletrônico aos contribuintes e a implantação de um programa de conformidade cooperativa tributária;
6. Evolução do modelo de gestão da cobrança considerando metodologias de avaliação de riscos; harmonização dos processos, sistemas e normas da AT às diretrizes da Reforma Tributária;
7. Desenvolver ações de integração dos sistemas e processos da Administração Tributária com o Comitê Gestor do IBS (CG-IBS).

3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO (AF)

1. Redesenho de processos e implantação de melhorias no sistema SICAF - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, contemplando os módulos de planejamento orçamentário, gestão contábil-financeira, dívida e custos.
2. Implementação de uma política orçamentária sensível às questões de gênero e raça na tentativa de melhorar índices socioeconômicos da população;
3. Implantação de um sistema integrado de monitoramento ambiental, aperfeiçoamento do processo de certificação de créditos de carbono, a elaboração de um plano de redução de emissões, programa de eficiência energética na infraestrutura pública e reaproveitamento de águas pluviais;
4. Desenvolvimento de modelo e implantação de sistema de compras públicas sustentáveis.

4. Gestão Jurídica para Sustentabilidade Fiscal –

1. Desenvolvimento de sistemática de gestão para precatórios e RPV;
2. Novo modelo de gestão da cobrança da dívida ativa incluindo redesenho de processos, metodologia de gestão de riscos, rating dos créditos e portal de gestão da dívida ativa.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do Projeto representa um avanço estratégico para a sustentabilidade fiscal do Estado de Acre, promovendo melhorias significativas na gestão das receitas próprias e na eficiência do gasto público. Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID, no **Anexo IV – Estudo de Avaliação de Impacto do Profisco I**, estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles sem projeto, como Acre.

Os resultados esperados estão organizados conforme os seguintes eixos:

1. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL (GF)

O aperfeiçoamento da governança fiscal pela implantação de um planejamento estratégico observando diretrizes sustentáveis, com a melhoria da execução da estratégia e implementação um plano de transformação digital.
A melhoria do modelo de gestão de pessoas, com implantação de gestão de competências focado em resultados, com a formação de lideranças femininas e fortalecendo as competências institucionais com trilhas de desenvolvimento, principalmente acerca da RTC.

A infraestrutura de tecnológica e governança aprimorados para atender as necessidades da gestão fiscal, observando às exigências da RTC e contará com modelos robustos de gestão de riscos e segurança da informação e fortalecimento da utilização avançada de dados na Administração Fazendária.

Melhoria dos processos da transparência e comunicação com a sociedade, com aumento dos canais de diálogo com a sociedade e fortalecimento do controle social. Maior inserção econômica de pequenos produtores e mulheres empreendedoras, incentivando a formalização de suas atividades e sua inserção em processos licitatórios, contribuindo para o fortalecimento da autonomia financeira desses grupos.

2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (AT)

A administração tributária será aperfeiçoada com a simplificação dos processos fiscais, monitoramento dos benefícios concedidos com a Implantação de modelo de gestão de política tributária estadual que considera e avalia os impactos econômicos, climáticos e ambientais.

Adaptação da Administração Tributária à RTC, promovendo simplificação na apuração e pagamento dos tributos, eliminação de distorções que afetam a competitividade e construção de um sistema tributário mais eficiente e integrado nacionalmente. Serão implementadas soluções inovadoras como o "*split payment*", que reduz a evasão fiscal, e o "*cashback*", que devolve tributos à população de baixa renda inscrita no CadÚnico. Tais medidas contribuirão para um sistema mais justo, eficiente e cooperativo, com impacto positivo na competitividade econômica nacional.

O fortalecimento de uso de dados nas AT, com melhoria de processos e sistemas na fiscalização, cobrança, contencioso administrativo, arrecadação e relação com o contribuinte, promovendo a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, com reflexos positivos na conformidade fiscal e no ambiente de negócios e contribuindo na maior eficiência arrecadatória

3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO (AF)

A modernização do planejamento orçamentário, gestão contábil-financeira e dos gestão recursos públicos com a adoção de sistemática integrada mediante melhorias no sistema SICAF, orientarão uma maior eficiência na gestão dos gastos públicos. Por meio da política orçamentária temática (orçamento sensível a gênero e ambiental) buscando consolidar e fortalecer estás políticas públicas visando a melhoria de indicadores socioeconômicos da população.

A modernização da política de processo de compras públicas, com aperfeiçoamento da legislação e das ferramentas de operacionalização do processo, trará maior eficiência e efetividade nos processos de compras e melhoria no gasto público. Além disto, a utilização das compras públicas como vetor econômico, através de estratégia de fortalecimento a pequenos empreendedores e incentivo a segmentos empresariais atuando como forte mecanismos de combate às desigualdades e desenvolvimento regional.

A adoção de práticas sustentáveis para a transição energética, reaproveitamento de águas, a implantação de sistema integrado de monitoramento ambiental e certificação dos créditos de carbono, contribuirão para a utilização recursos naturais como ativos e uma gestão fiscal sustentável.

Para uma visualização mais direta da conexão lógica envolvendo a Descrição do Problema versus Soluções Propostas versus Resultados Esperados vide Anexo V – Lógica Horizontal de Resultados do PROFISCO III AC**.**

4. GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL

Melhoria na gestão de precatórios e RPVs e melhoria na cobrança da dívida ativa, baseada no uso de dados, orientada à recuperação do crédito tributário e à otimização da defesa judicial, reduzindo riscos fiscais e promovendo a liquidez do crédito tributário e ampliação da comunicação com o contribuinte.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral:

O objetivo do projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado. Para alcançar este objetivo deve-se fortalecer uma gestão baseada em dados, fomento a inovação e alinhar a gestão fiscal às diretrizes estaduais para o alcance das metas de descarbonização e contribuir para a implantação das reformas estruturais como a tributária.

(ii) Objetivo Específicos:

1. Objetivos Específicos (OE)

1.1. Melhoria da eficácia da gestão das receitas próprias.

Aprimoramento da eficácia da gestão das receitas próprias, através da simplificação do cumprimento fiscal, da diminuição dos litígios fiscais, do incremento da arrecadação e da transformação digital, com estímulo à inovação, a transparência e à participação cidadã, contribuindo para o aprimoramento do ambiente de negócios e promoção da justiça fiscal.

1.2. Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos.

Aprimoramento da eficácia da gestão dos gastos públicos, através da melhoria dos procedimentos de planejamento, execução e avaliação dos gastos públicos, para a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos e o aumento dos investimentos.

2. Objetivos Específicos Complementares (OEC)

2.1. Melhorar a governança fiscal através de um maior alinhamento com a estratégia governamental e um modelo de administração de pessoas, tecnologia e inovação, reforçando as habilidades institucionais para uma entrega de resultados mais eficaz à população.

2.2. Melhorar a gestão fiscal entre os entes federados por meio da implementação da Reforma Tributária sobre o Consumo, consolidando a colaboração entre as entidades federativas e a unidade nacional na prestação de serviços públicos.

2.3. Incrementar a eficiência e competitividade da economia e aprimorar o ambiente de negócios através da simplificação fiscal, diminuição dos custos de conformidade fiscal e diminuição da contenda fiscal.

2.4. Melhorar a eficiência na aplicação de recursos públicos através do aprimoramento do planejamento, implementação e análise dos gastos, auxiliando na sustentabilidade do sistema fiscal e na excelência dos gastos públicos.

2.5. Intensificar a transformação digital e progredir no uso de dados para fortalecer receitas e despesas públicas, auxiliar na sustentabilidade do sistema fiscal e aprimorar o ambiente de negócios no Estado, expandindo a habilidade de entregar resultados à população.

2.6. Aprimorar a transparência fiscal, o controle social e a democracia participativa na administração fiscal, através da atualização do Portal da Transparência, do aumento da participação social nas decisões e das iniciativas de educação fiscal.

2.7.Promover a sustentabilidade ambiental através da eficiência energética e medidas de segurança hídrica, incentivando a introdução de fontes limpas e renováveis e o uso diversificado da água na estrutura física de unidades de administração fiscal.

2.8. Potencializar a política de igualdade de gênero, incentivando a presença feminina em posições de liderança na administração fiscal e fomentando a autonomia financeira de mulheres empreendedoras

O objetivo geral – OG - Contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado se desdobra em dois objetivos específicos – OE 1 Melhoria da eficácia da gestão das receitas próprias e OE 2- Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos, que se desdobram em sete objetivos específicos complementares e estes se conectam, de forma mais direta com os componentes e seus produtos. Ao longo deste documento será demonstrado com maior detalhamento a vinculação entre os objetivos, componentes, produtos, indicadores e as áreas estratégicas do PPA Federal 2024-2027.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Cumprimento das metas do planejamento estratégico da SEFAZ-AC

Descrição:

O aumento da relação entre as metas de planejamento estratégico cumpridas e o total de metas planejadas demonstra melhora na governança fiscal e na capacidade institucional da SEFAZ em todas as áreas administrativas e operativas, o que contribui para um melhor ambiente institucional para manter o equilíbrio fiscal.

A metodologia inclui a participação ativa das diversas áreas da Secretaria, além do alinhamento do planejamento aos objetivos estratégicos definidos pela instituição. Além disso, realiza-se um trabalho de difusão de conhecimento das macros diretrizes definidas pela Alta Gestão, incluindo o mapa estratégico da Sefaz, de forma a ampliar a integração e o engajamento de todas as áreas com os objetivos estratégicos definidos pela cúpula da Secretaria.

Dados:

Fórmula de Cálculo: (Metas cumpridas / Total de metas planejadas) *100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2025): 44% (7 metas cumpridas de um total de 16 metas)

Fonte: Relatório de Monitoramento do Planejamento Estratégico, elaborado pela SEFAZ/AC

Análise de características SMART:

- Específico: Melhoria da Nota de avaliação do Estado.
- Mensurável: Utiliza metodologia e unidade de medida.
- Atingível: As metas são incrementais e realistas, considerando a linha de base atual.
- Relevante: Relaciona-se com a governança fiscal e a transparência pública.
- Temporal: Medido conforme metas estabelecidas.

Meta:

Para alcançar os resultados após a elaboração do plano iniciará seu monitoramento, os resultados ocorrerão conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 50 % (Meta Inicial)

Ano 2: 55%

Ano 3: 65 %(Meta Intermediária)

Ano 4: 75%

Ano 5: 85% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Servidoras da SEFAZ/AC capacitadas para liderança

Descrição:
O fortalecimento da governança fiscal na SEFAZ/AC visa a implementação de uma política que valorize a diversidade e fomente a inclusão, com especial atenção à qualificação das servidoras para o exercício de cargos de liderança na administração. A proposta enfatiza a promoção de diferentes pontos de vista, experiências e trajetórias, contribuindo para decisões mais inovadoras e eficazes. Para alcançar esse objetivo, o projeto prevê a oferta de cursos e programas de formação específicos em liderança, de modo a preparar adequadamente as servidoras da SEFAZ/AC para atuarem em posições estratégicas dentro da organização.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.8
- Área Estratégica: 107

Dados:

Observa-se que SEFAZ/AC conta com 100 líderes, dos quais 25 são servidoras, que representam 25%.

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Quantidade\ de\ servidoras\ capacitadas\ para\ liderança}{Quantidade\ de\ servidoras\ no\ quadro\ da\ SEFAZ/AC}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 0 % de servidoras capacitadas

Fonte: Relatórios das ações de desenvolvimento promovidas pela Escola Fazendária da SEFAZ/AC.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de capacitar as servidoras da SEFAZ/AC em cursos de liderança, tornando-as aptas para ocupar cargos e funções de alta relevância dentro da estrutura administrativa da SEFAZ/AC, foi definida uma meta de 70%, que equivale a 44 servidoras capacitadas, a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, com o objetivo de ter um corpo técnico capacitado para assumir posições de liderança.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 25% (Meta Inicial)

Ano 2: 35%

Ano 3: 50% (Meta Intermediária)

Ano 4: 65%

Ano 5: 70% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Eficiência no custo para arrecadar tributos

Descrição:
A diminuição da relação entre o custo para arrecadar e a arrecadação tributária demonstra que foi alcançado um duplo esforço tanto em uma economia de recursos como no aumento da arrecadação. Ambos os resultados contribuem para o alcance da sustentabilidade fiscal, reflete a melhoria da gestão dos recursos públicos, bem como contribui para o aumento dos investimentos públicos.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

Forma de Cálculo:

$$\left(\frac{Execução\ orçamentária\ da\ SEFAZ/AC\ com\ pessoal\ e\ custeio}{Receita\ Tributária\ bruta\ própria}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 7,12. Orçamento de funcionamento da SEFAZ (2024) = R$ 177.80 milhões. Arrecadação tributária (2024) = R$ 2.4941 bilhões.

Fonte: Balanço orçamentário consolidado da SEFAZ - 2024/2024

Análise de características SMART:

- Específico: Foca a eficiência do custo para arrecadar.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis no Balanço Geral do Estado.
- Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de x% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 7,12% (Meta Inicial)

Ano 2: 7,10 %

Ano 3: 7,5 % (Meta Intermediária)

Ano 4: 7,0 %

Ano 5: 6,96 % (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Taxa de crescimento anual de empresa no Estado do Acre

Descrição:
Com o objetivo de aumentar a produtividade e a competitividade da economia, através do fortalecimento dos ciclos produtivos, a SEFAZ/AC visa contribuir através da simplificação dos processos fiscais, possibilitando a construção de um ambiente mais propício ao empreendedorismo, permitindo o crescimento sustentável do número de empresas no Estado.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.3
- Área Estratégica: 205

Dados:
Quantidade de empresas ativas no Estado do Acre: 47.223 (2025) e 41.041 (2024)

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\left(\frac{Quantidade\ de\ empresas\ ativas\ no\ ano}{Quantidade\ de\ empresas\ ativas\ no\ ano\ anterior}\right) - 1\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2025 / 2024): 15,06%
Fonte: Baseado em dados do Mapa das Empresas - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-1o-quadrimestre-2024.pdf/view

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o crescimento anual de empresas ativas.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível:
- Relevante: Relaciona-se com o estímulo ao empreendedorismo.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de crescimento anual do número de empresas no estado, foi definida uma meta de 17% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 15,06% (Meta Inicial)

Ano 2: 15,3%

Ano 3: 15,8% (Meta Intermediária)

Ano 4: 16 %

Ano 5: 17 % (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Aumentar a geração própria de energia

Descrição:
Este indicador acompanha o aumento da geração interna de energia elétrica, especialmente por meio da instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica nas unidades do prédio sede da SEFAZ/AC e nos postos fiscais, distribuídos pelo estado. O objetivo principal é mensurar, ao longo do ciclo do projeto, a evolução da autossuficiência energética, comparando a energia gerada por fontes renováveis com o consumo total anual das unidades. Dessa forma, o indicador possibilita avaliar o progresso em direção à redução da dependência de fontes externas de

energia, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e para a eficiência operacional do órgão.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.7
- Área Estratégica: 208

Dados:

- Quantidade de KWh gerados através de painéis fotovoltaicos: 0 KWh
- Quantidade de KWh consumido pelas unidades do prédio sede da SEFAZ/AC por ano 580.428 KWh (2023)

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Autogeração\ de\ energia\ elétrica\ ao\ final\ do\ Projeto}{Autogeração\ de\ energia\ elétrica\ atual}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: KWh

Linha de Base (2025): 0 KWh – sem geração fotovoltaica

Fonte: Estudo preliminar da Agência de Negócios do Acre e Secretaria de Administração do Estado do Acre

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o crescimento anual de geração de energia própria.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados da conta de energia elétrica.
- Relevante: Relaciona-se com a segurança energética do país.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados, de crescimento anual de KWh gerados, foi definida uma meta de 580.428 KWh a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

A estimativa de cálculo da produção de energia é apresentada a seguir.

Total de placas: 701

Capacidade de produção placa/dia: 550 W

Produção placa/ano: 828 KWh

Produção total ano: 580.428kwh KWh

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 3: 290.000 KWh ano ou 50% do consumo anual (meta final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo 07 - Indicadores Propostos.**

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Reaproveitamento de águas pluviais

Descrição:
Visando a implementação do indicador de reaproveitamento de águas pluviais, será executada a instalação de sistemas específicos no edifício sede e no Postos Fiscais da SEFAZ/AC. Essa iniciativa está alinhada ao propósito de promover a utilização racional dos recursos hídricos, fortalecendo práticas de sustentabilidade ambiental, assegurando a segurança hídrica e estimulando o uso diversificado da água dentro da infraestrutura das unidades da SEFAZ/AC.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.7
- Área Estratégica: 212

Dados:

- Quantidade de m³ de águas pluviais armazenados em cisternas.

Fórmula de Cálculo: Volume anual de água consumido e fornecido pela concessionária de águas e saneamento / Volume médio anual (últimos 3 anos) consumido, junto à concessionária de água e saneamento, em m3 de água.

Unidade de Medida: m³

Linha de Base (2023): 0 m³

Fonte: Concessionária de água e esgoto

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o crescimento anual da capacidade de reaproveitamento de águas.
- Mensurável: Quantidade de m³ de águas reaproveitadas.
- Atingível: Baseado na construção de cisternas para atingir a meta.
- Relevante: Relaciona-se com a segurança hídrica do país.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados de níveis de reaproveitamento anual de m³, foi definida uma meta de 5.460 m³ ao ano, a ser alcançadas ao final do 4º ano de execução do Projeto, com o objetivo de reaproveitamento de águas nas unidades da SEFAZ/RR, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 4: 5.460 m³ ao ano (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Avanço na Avaliação do Radar Transparência - ATRICON

Descrição:
Com o objetivo de melhorar os mecanismos de transparência e controle social, serão realizadas ações para a melhoria do Portal da Transparência do Governo do Estado de Roraima, fortalecendo a participação cidadã e o fortalecimento do controle social sobre as ações de governo. análise de quesitos de transparência ativa e outro para os quesitos de transparência passiva

Essa avaliação contempla a transparência passiva e a transparência ativa (publicação de informações na internet), conforme critérios estabelecidos pela Associação dos Tribunais de Contas - ATRICON, responsável pela metodologia de avaliação da transparência pública “Radar da Transparência Pública” para o monitoramento da transparência pública e acompanhamento das ações implementadas por estados e municípios na promoção do acesso à informação.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.6
- Área Estratégica: 301

Dados:

- Portal da Transparência do Governo do Estado de Acre

Fórmula de Cálculo: ND

Unidade de Medida: Nota

Linha de Base (2024): 73,02 (Nota obtida pelo Poder Executivo do Estado do Acre)

Fonte: https://radardatransparencia.atricon.org.br/panel.html

Análise de características SMART:

- Específico: Melhoria da Nota de avaliação do Estado.
- Mensurável: Utiliza metodologia e nota da Radar da Transparência Pública como unidade de medida.
- Atingível: As metas são incrementais e realistas, considerando a linha de base atual.
- Relevante: Relaciona-se com a governança fiscal e a transparência pública.
- Temporal: Medido conforme metas estabelecidas.

Meta:
Para alcançar os resultados da avaliação da transparência pública ““Radar da Transparência Pública”, pela Associação dos Tribunais de Contas - ATRICON , responsável pela metodologia de, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 73,02 (Meta Inicial)

Ano 2: 75,00

Ano 3: 78,00(Meta Intermediária)

Ano 4: 79,00

Ano 5: 85,00 (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Taxa de Atendimento on-line

Descrição:
A disponibilização de serviços online para os contribuintes aumenta a presença do fisco, auxiliando o cumprimento voluntário das obrigações tributárias e reduz a pressão de demanda sob os canais de atendimento presenciais, bem como consolida uma governança fiscal orientada à inovação.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.5
- Área Estratégica: 303

Dados:

- Quantidade de atendimentos on-line
- Quantidade de serviços de atendimento disponibilizados on-line ao contribuinte.

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Quantidade\ de\ serviços\ de\ atendimento\ ao\ Contribuinte\ on\ line}{Quantidade\ de\ serviços\ de\ atendimento\ disponibilizados\ ao\ Contribuinte}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Quantidade

Linha de Base (2025): 12 serviços online de um total de 60 serviços ofertados na Carta de Serviços ao Cidadão

Fonte: Unidade de Atendimento da SEFAZ/AC

Análise de características SMART:

- Específico: Monitora o crescimento anual do atendimento on line.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados de atendimento e serviços disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a prestação de serviço com qualidade.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados de crescimento anual da disponibilização de serviços on-line foi definida uma meta de 83% (50 serviços) a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 15 (Meta Inicial)

Ano 2: 20

Ano 3: 28 (Meta Intermediária)

Ano 4: 39

Ano 5: 50 (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Incremento da Arrecadação em relação ao PIB

Descrição:
Com o objetivo melhorar assegurar um regime fiscal e tributário sustentável, que promova maior justiça social e ampliação dos investimentos públicos, serão realizadas ações no Projeto com o objetivo de garantir um crescimento constante da arrecadação tributária.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

- Área Estratégica: 306

Dados:

- Valor do PIB do Estado de Acre
- Receita Tributária bruta.

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Receita\ Tributária\ bruta}{Produto\ Interno\ Bruto}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 7,59%

PIB (2024): R$ 26 bilhões

Receita Tributária Bruta (2024): R$1,974 bilhão – ICMS + IPVA+ ITCMD + TAXAS

Fonte: SEFAZ - Acre e IBGE estimativa

Análise de características SMART:

- Específico: Foca a eficiência da gestão fiscal.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis no Balanço Geral do Estado e IBGE.
- Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal e a sustentabilidade.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 7,80% a ser alcançada ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 7,59% (Meta Inicial)

Ano 2: 7,62%

Ano 3: 7,65% (meta intermediária)

Ano 4: 7,70%

Ano 5: 7,80% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Taxa de recuperação da dívida ativa

Descrição:
O aumento dos valores arrecadados na recuperação do crédito em dívida ativa é essencial tanto para contribuir diretamente para o equilíbrio fiscal, mediante o incremento da receita, como para transmitir aos contribuintes o incremento da percepção do risco subjetivo, contribuindo para uma mudança cultural do cumprimento voluntário da obrigação tributária.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.9
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Valor dos créditos inscritos em D.A. previstos de recuperação (desconsiderando anistia).
- Arrecadação anual projetada da D.A. (desconsiderando anistia).

Fórmula de Cálculo:

Valores recuperados em reais em 2023 / Valores recuperados em reais no ano anterior

Unidade de Medida: R$

Linha de Base (2023): 25,5 milhões

Fonte: Procuradoria Geral do Estado – PGE e SIAT - SEFAZ

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na recuperação de dívidas.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a eficácia da gestão fiscal e a sustentabilidade.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 65% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 25,50 milhões (Meta Inicial)

Ano 2: 27,00 milhões

Ano 3: 30,00 milhões (Meta Intermediária)

Ano 4: 32,00 milhões

Ano 5: 35,00 milhões (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Integração dos sistemas da SEFAZ/AC ao Comitê Gestor do IBS

Descrição:
Com a implantação da Reforma Tributária sobre o Consumo e, consequentemente, do IBS em substituição ao ICMS, será necessário um conjunto de ações, envolvendo a três esferas de governo para adequação dos processos, dimensão tecnológica dos sistemas a serem utilizados e integração ao ambiente do Comitê Gestor Nacional do IBS. Este indicador visa acompanhar a evolução da integração dos sistemas da SEFAZ/AC ao Comitê Gestor do IBS para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Sistemas da SEFAZ/AC integrados ao Comitê Gestor do IBS.

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Sistemas\ da\ SEFAZ/AC\ integrados\ ao\ IBS}{Sistemas\ do\ IBS}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 0%

Dados:

- Lista de sistemas estruturantes a serem desenvolvidos e integrados ao Comitê Gestor do IBS.
- Em 2025 há 0 sistemas integrados num universo avaliado em 12 sistemas a integrar, conforme tabela abaixo:
  1. Integração do Cadastro de Contribuintes com outras bases de dados nacionais
  2. Preparação da retaguarda de validação e autorização do DFe
  3. Declaração assistida
  4. Sistema de apuração
  5. Integração com o sistema financeiro e bancário
  6. Módulo de gestão do Cashback
  7. Adaptação do sistema de Cobrança Administrativa
  8. Integração ao Token Comitê Gestor para tratar a concomitância e o interesse de fiscalizar um contribuinte
  9. Monitoramento e Malhas Fiscais
  10. Portal do Contribuinte integrado e padronizado conforme ambiente do Comitê Gestor
  11. Plataforma integrada de gestão tributária que facilite o compartilhamento de dados entre estados, municípios

Fonte: Departamento de Sistemas Tributário - DESTRIN

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na integração dos sistemas da SEFAZ/AC ao Comitê Gestor do IBS.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com integração dos Sistemas.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 100% de integração dos 11 sistemas a serem alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 0% (Meta Inicial)

Ano 2: 20%

Ano 3: 50% (Meta Intermediária)

Ano 4: 80%

Ano 5: 100% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 14. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Taxa anual de Julgamento de processos em 1ª Instância

Descrição:
Com o objetivo de agilizar a apreciação dos processos administrativos tributários, serão realizadas ações no Projeto orientadas à inovação e resultados com o objetivo de disponibilizar sistema para julgamento, com peças processuais produzidos automaticamente, para serem utilizados pelos julgadores na produção de relatórios e votos eletrônicos, com o auxílio de Inteligência Artificial, contribuindo para a transformação digital da SEFAZ/AC.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.5
- Área Estratégica: 303

Dados:

- Processos julgados em 1ª Instância Administrativa

Fórmula de Cálculo:

(Total de Processos Julgados em 1ª Instância no PAT-e **/** Número de processos julgados) *100

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2025): 0

Total de Processos Julgados em 1ª Instância no PAT-e (2025) = 0.

Número de Processos Julgados (2025) = 0

Fonte: Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na agilidade dos PAT.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a modernização da gestão.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 100,00% a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 0% (Meta Inicial)

Ano 2: 0 %

Ano 3: 20,00% (Meta Intermediária)

Ano 4: 60,00%

Ano 5: 100,00% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 15. **Informações do 13° indicador:**
Nome: Implantação das funcionalidades de Integração ao Portal Único do Comércio Exterior - PUCOMEX

Descrição:
Com o objetivo de contribuir para a melhoria do ambiente de negócios e aumentar a competitividade da economia nacional, através do projeto nacional PCCE-PUCOMEX, via redução do tempo de liberação de mercadorias no processo de importação, o produto prevê a realização 5(cinco) funcionalidades de integração da SEFAZ ao PCCE (Pagamento Centralizado do Comércio Exterior) PUCOMEX:

1. Integração API DUIMP;
2. Integração API PCCE;
3. Integração API Anexação;
4. Cálculo ICMS Pagamento; e
5. Cálculo ICMS Exoneração

Vinculação:
- Objetivo Específico Complementar: 2.2, 2.3
- Área Estratégica: 302

Dados: Nota Técnica - Documento de Especificações/Requisitos Funcionais para a Avaliação de Cumprimento de Produto Obrigatório do PROFISCO II (**Anexo 19 - Integração ao PCCE**) e Pesquisas realizadas pela OMA - Organização Mundial das Aduanas e Receita Federal do Brasil - RFB. Segundo este estudo o tempo médio de liberação de mercadorias no processo de importação no país é de 7,4 dias, incluindo os modais aéreo, terrestre e marítimo. O mesmo estudo estima a meta de redução média no país de 2,0 dias considerando todas as fases que compreendem o desembaraço aduaneiro: registro da Declaração Única de Importação (DUIMP), parametrização, apuração dos tributos, envio para a Alfândega, inspeção e liberação. Portanto, a integração dos sistemas da Administração Tributária estadual ao PCCE - PUCOMEX contribui para a meta global do país. Maiores detalhes podem ser obtidos em https://www.gov.br/siscomex/pt-br/informacoes/demais-noticias-de-comercio-exterior/importacao/projeto-piloto-do-pagamento-centralizado-de-comercio-exterior-pcce

Fórmula de Cálculo: Cinco funcionalidades do PUCOMEX implantadas.

Unidade de Medida: Quantidade de funcionalidades

Linha de Base (2025): Zero

Fonte: Departamento de Sistemas Tributários - DESTRIN

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na implantação de funcionalidades nos sistemas da SEFAZ para a integração ao PUCOMEX
- Mensurável: Avalia quantidade de funcionalidades a serem implantadas.
- Atingível: A meta é realista baseada na competência técnica de execução da CETIF.
- Relevante: Relaciona-se com a melhoria do ambiente de negócios e a competitividade nacional.
- Temporal: Define uma meta final específica de implantação até o 3º ano do projeto.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 100% das cinco funcionalidades de integração dos sistemas da SEFAZ AC ao PUCOMEX a ser alcançada até o 3º ano de execução do Projeto. Deve-se destacar que essa iniciativa contribui para a melhoria do ambiente de negócios e o aumento da competitividade da economia nacional, mediante a agilização dos procedimentos de liberação de mercadorias com redução de 2 dias, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito.

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 20% (Meta Inicial)

Ano 2: 60%

Ano 3: 100% (Meta final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 16. **Informações do 14° indicador:**
Nome: Melhoria da eficácia da gestão dos gastos públicos - Poupança Corrente da CAPAG

Descrição:
Com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia do gasto público, serão realizadas ações no Projeto para o acompanhamento da evolução da poupança corrente, permitindo avaliar o impacto dessas ações na saúde fiscal do estado. Uma redução consistente nesse indicador, resultante de uma gestão mais eficiente, reflete o sucesso das políticas implementadas pelo PROFISCO III AC, evidenciando um compromisso com a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das finanças públicas.

Vinculação:

- Objetivo Específico Complementar: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Área Estratégica: 306

Dados:

- Receitas e Despesas correntes

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{Despesa\ corrente}{Receita\ corrente\ ajustada}\right) x\ 100$$

Unidade de Medida: Percentual

Linha de Base (2024): 91,55%

Despesa Corrente: R$ 7,8 bilhões

Receita corrente ajustada: R$8,5 bilhões

Fonte: Balanços anuais, Demonstrativos de Contas Anuais e os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária Tesouro Estadual) e Portaria Normativa MF nº 1.583/2023 do Ministério da Fazenda obtido nos sites: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-mf-n-1.583-de-13-de-dezembro-de-2023-530597625 e https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag

Análise de características SMART:

- Específico: Foca na eficácia da gestão dos gastos públicos.
- Mensurável: Percentual de variação anual com fórmula definida.
- Atingível: Baseado em dados disponíveis.
- Relevante: Relaciona-se com a eficiência na gestão pública.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 92,0% da poupança corrente a ser alcançadas ao final do 5º ano de execução do Projeto, conforme a faixa de valor definida no Art. 3º da Portaria Normativa MF nº 1.583/2023, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão fiscal e garantir a sustentabilidade fiscal e a capacidade de pagamentos do Estado de Roraima, conforme pode ser observado no cronograma abaixo descrito

Metas a serem alcançadas durante o Ciclo de Execução do Projeto:

Ano 1: 91,55% (Meta Inicial)

Ano 2: 91,35%

Ano 3: 91,22% (Meta Intermediária)

Ano 4: 91,08%

Ano 5: 90,97% (Meta Final)

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 17. **Informações do 15° indicador:**
Nome: Crédito de carbono de alta integridade certificado

Descrição:
Políticas orçamentárias efetivas para a melhoria de indicadores socioeconômicos da população e sensível às questões de gênero e raça, melhorias na governança dos ativos ambientais, redução das emissões de carbono na gestão fiscal, redução do consumo de energia não renovável, tratamento de efluentes e reaproveitamento de águas e maior eficiência no processo de compras públicas fomentando a economia regional.

Como sistema inovador, ainda em 2013 o Estado do Acre estabeleceu o SISA- Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais, ancorado por 7 programans, entre eles o ISA CARBONO.

Com isto, após a criação de por meio de um Regime REDD+ (Reduções de Emissões por Desmatamento e Degração Florestal), através do procesos de certificação dos créditos de carbono , foi possível obter junto ao Banco Alemão KFW a compensação da redução de emissões proveniente da redução de desmatamento bruto.

O Estado do Acre, obteve Acordo junto ao KFW do Programa REM, modalidade de acordo por resultados que ao todo beneficiou o estado ao equivalente de USD 100 milhões.

A certificação destes créditos ocorre por meio de comitê científico composto por cientistas nacionals e internacionais, seguindo protocolos acordados

Fórmula de cálculo: Valor (USD) dos Créditos de Carbonos de alta integridade Certificados

Unidade de medida: valor em dólar

Linha de Base: 100 milhões

Fonte: Instituto de Mudanças Climáticas do Acre - IMC

Análise de características SMART:

- Específico: Foca da mensuração dos créditos de carbono certificado
- Mensurável: Valor em dólares
- Atingível: Sim. Baseado em dados disponíveis do IMC.
- Relevante: Relaciona-se com a geração de receita corrente para o financiamento de manutenção das florestas.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 300 milhões de dólares certificados ao final do 5 ano de projeto.

Meta Intermediária 3º Ano: USD 200 milhões

Meta Final ao 5º ano: USD 300 milhões

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 4. 18. **Informações do 16° indicador:**

Nome: Capacitação em emissão da NFe Avulsa para mulheres empreendedoras e produtores rurais
Descrição:
A capacitação de empreendores e para estimular a participação de mulheres - artesãs, ribeirinhas, extrativistas, indígenas, produtoras rurais, microempresárias individuais, estudantes e empreendedoras - em licitações promovendo as suas inclusões econômicas, de acordo com programa de compras sustentáveis. Considerando gênero, raça e jovem idade impactar na melhoria de oportunidades, no emprego e na renda. Essa ação do projeto fomentará aos pequenos empresários oportunidades de se preparação para venda ao governo, ente que têm grande poder de compra no mercado local.
Desta forma, entendemos que haverá uma distribuição maior das oportunidades de venda no mercado interno, estimulando emprego e renda no estado.

Fórmula de cálculo: Quantidade de mulheres treinadas, observando os perfis estabelecidos. A meta será de 720 empreendedoras qualificadas em, pelo menos, 12 municípios, sendo cumulativamente distribuídas em 240 no ano 2, 450 no ano 3, 560 no ano 4 e 720 no ano 5.

Unidade de medida: Quantidade de empreendedores capacitados
Linha de Base: 0
Fonte: Escola Fazendária

Análise de características SMART:

- Específico: Foca da mensuração da quantidade de mulheres empreendedoras e produtores rurais capacitados
- Mensurável: Quantidade de treinandos
- Atingível: Sim. Baseado em dados compatíveis com a capacidade de execução pela Escola Fazendária
- Relevante: Relaciona-se com formalização e autonomia financeira para mulheres empreendedoras e produtores rurais.
- Temporal: Medido anualmente.

Meta:
Para alcançar os resultados esperados foi definida uma meta de 720 treinandos
Meta:
Ano 1: 0
Ano 2: 150
Ano 3: 450
Ano 4: 550
Ano 5: 720

Para um maior detalhamento dos Indicadores e sua vinculação com os Objetivos, Componentes e Produtos do PROFISCO III AC, vide o **Anexo VII - Indicadores Propostos.**

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 10.994.615,00

Descrição:
O componente *Governança Fiscal e Institucional Fortalecida* tem como objetivo central promover o alinhamento estratégico da SEFAZ às diretrizes do planejamento estadual, especialmente à Agenda Acre 10 Anos e à matriz produtiva do Estado. Busca garantir maior efetividade na execução das iniciativas públicas, fortalecendo a capacidade de adaptação frente às transformações de cenário e assegurando uma alocação eficiente de recursos e esforços. Além disso, promove uma mudança na cultura organizacional, com foco em liderança, controle e avaliação de resultados. Suas ações contribuem diretamente para o aprimoramento da governança pública, elevando a eficiência no planejamento, monitoramento e prestação de serviços, ao mesmo tempo em que fortalece a transparência, a comunicação com a sociedade e a mitigação de riscos fiscais e ambientais. O componente é composto por cinco produtos integrados: modernização da estrutura organizacional e uso avançado de dados; desenvolvimento de metodologias para gestão de riscos fiscais e climáticos; valorização dos servidores com gestão por competências e incentivo à liderança feminina; ampliação da transparência e educação fiscal inclusiva; e fortalecimento da tecnologia da informação, com segurança digital, infraestrutura moderna e uso de soluções como nuvem privada e mineração de dados. Juntas, essas iniciativas posicionam o Acre rumo a uma gestão pública mais eficiente, inovadora, inclusiva e sustentável.

Descrição de subcomponentes e produtos:

P1.1. Governança Pública Fortalecida – US$ 1.084.615

Este produto objetiva a revisão dos processos organizacionais para adequá-los à implementação das diretrizes da Reforma Tributária, aperfeiçoando a governança fiscal com um planejamento estratégico que incorpore diretrizes sustentáveis e ambientais e aprimore os métodos de gestão para resultados. Suas ações incluem sistemática de avaliação e monitoramento da estratégia, implantação de escritório de projetos e processos, fortalecimento da gestão da mudança e a implementação de um modelo de transformação digital e uso avançado de dados, alinhados à estratégia da organização.

P1.2. Modelo de Riscos da Gestão Fiscal Fortalecido - U$D 1.000.000

O desenvolvimento deste produto contribuirá para estruturar uma equipe alinhada às diretrizes estratégicas da SEFAZ, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais voltadas para a gestão de riscos fiscais, com ênfase no fortalecimento da integridade institucional e na observância dos riscos ambientais, bem como nas ações de mitigação às mudanças climáticas. Para isso, será formulada metodologia e revisão de processos visando a identificação dos riscos fiscais, ampliando o seu monitoramento e identificação de medidas para prevenção e mitigação desses riscos. Além disto, serão adotadas ações visando a prevenção de impactos decorrentes os desastres naturais e das mudanças climáticas.

P1.3 Gestão de Pessoas Aprimorada – US$ 1.710.000,00

O desenvolvimento deste produto contribuirá estruturar uma equipe alinhada às diretrizes estratégicas da SEFAZ, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. Para isso, será implementado um modelo de gestão por competências, incluindo o mapeamento das habilidades dos servidores, identificação e tratamento de lacunas, e elaboração de trilhas de capacitação específicas. Também será realizado um plano de capacitação voltado para toda a equipe, com foco na redução dessas lacunas. Além disso, estão previstas ações com capacitação para fomentar uma maior participação das mulheres em posição de lideranças. O projeto contempla ainda a implantação de ferramentas tecnológicas para apoiar a gestão de pessoas, integrando informações sobre competências, capacitações e banco de talentos ao SIGRH. Por fim, será desenvolvido um modelo de gestão do conhecimento, com uso de plataforma tecnológica para registro e disseminação de informações relevantes à organização.

P1.4. Gestão da Transparência e Educação Fiscal Aprimorada – US$ 600.000

Este produto visa o aprimoramento do Portal da Transparência, através da implementação de uma estrutura de *Business Intelligence* para a produção de dados sobre as receitas e despesas. Aprimoramento da comunicação institucional por meio de melhorias nos processos de Ouvidoria ações de transparência ativa e educação fiscal modernização do portal da transparência com novos layouts funcionalidades e integração em tempo real aos sistemas corporativos atualização do Sistema de Ouvidoria com solução tecnológica para atendimento das manifestações e pedidos de informação implantação de programas sobre assédio e discriminação. Adicionalmente implementará iniciativas de Educação Fiscal, sobretudo com mulheres empreendedoras que serão capacitadas para estimular a sua formalização e inclusão no mercado, inclusive para a emissão de Notas Fiscais Avulsas, habilitando-as para participar dos processos de compras públicas e, consequentemente, contribuindo para o aumento da renda e autonomia financeira das mulheres.

P1.5 Gestão de Tecnologia da Informação Fortalecida – US$ 6.600.000

O objetivo deste produto é garantir à SEFAZ, aos contribuintes e à sociedade um ambiente tecnológico seguro, eficiente e alinhado ao plano estratégico e ao modelo organizacional da SEFAZ Acre. Para isso, serão implementadas ações como a atualização do Plano Diretor de TI, revisão e adequação dos processos internos conforme melhores práticas e legislação vigente, implantação de políticas de governança e ferramentas de gerenciamento de serviços de TI. No âmbito da segurança da informação, serão adotadas medidas como plano de continuidade de negócios, site de contingência, centro de operações de segurança e soluções para gerenciamento de eventos, incluindo conservação, armazenamento e eliminação apropriada, bem como adequar o datacenter para implantar política de segurança da informação sólida, de acordo com as normas (LGPD, LAI, LRF) e fortalecimento das competências técnicas de uso de dados avançados.

A infraestrutura computacional será modernizada com a aquisição de equipamentos energeticamente eficientes, adoção de novas tecnologias como nuvem privada e mineração de dados. Por fim, a infraestrutura física do Data Center será requalificada, incluindo melhorias estruturais, elétricas e mecânicas para garantir a continuidade dos serviços.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 14.408.956,00

Descrição:
As ações deste componente visam melhorar o desempenho da administração tributária, melhorando a gestão dos benefícios fiscais concedidos, com uma melhoria nos processos na AT e estrutura organizacional, buscando adequação a Reforma Tributária de Consumo; o aperfeiçoamento dos procedimentos de cobrança, através do estímulo à regularidade tributária; o aperfeiçoamento do controle da a Arrecadação através da gestão da Dívida Ativa Administrativa e sua integração com o Contencioso Administrativo e a Procuradoria Tributária; o aperfeiçoamento dos procedimentos de atualização do cadastro (REDESIM), com inclusão de novos dados; a melhoria da gestão do contencioso fiscal e sua adequação à reforma tributária; e, o aprimoramento da relação fisco-contribuinte, com novos canais de atendimento e serviços disponibilizados.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P2.1 Modelo de Gestão Tributária aprimorada para melhoria do Ambiente de Negócios – USD 962.692

A iniciativa contempla o desenvolvimento de mecanismos de controle sobre os benefícios fiscais concedidos através da implantação do Portal de Registro dos Incentivos e Benefícios de Natureza Tributária - *produto obrigatório Profisco III*. Isso permitirá maior transparência e avaliação contínua dos impactos desses incentivos sobre a arrecadação e aperfeiçoamento de um modelo de gestão de gastos tributário que incluem aspectos sociais, econômicos e ambientais.

P2.2. Cadastro de Contribuinte integrado com a Reforma Tributária - USD 1.500.00

O produto inclui a integração ao PNR – Portal de Negócios Redesim (RFB), uso do Identificador Único (CNPJ alfanumérico), garantindo maior consistência e rastreabilidade dos dados empresariais - *produto obrigatório Profisco III*. Paralelamente, serão adotadas soluções de inteligência artificial para identificação de padrões suspeitos e combate às empresas “noteiras”, fortalecendo a integridade do cadastro nacional. A simplificação das obrigações acessórias será trabalhada na consolidação das declarações mensais na EFD ICMS IPI - *produto obrigatório Profisco III.*

P2.3 Fiscalização Tributária e a Inteligência Fiscal Modernizada – USD 2.211.923

O produto moderniza a fiscalização tributária ao incorporar gestão de riscos, novos processos e tecnologia, ampliando a eficiência das ações fiscais. Integra o sistema tributário ao Portal de Pagamentos do Comércio Exterior (PUCOMEX), agilizando desembaraço aduaneiro e pagamento do ICMS na importação, melhorando o ambiente de negócios - *produto obrigatório Profisco III*. Desenvolve ferramentas tecnológicas para investigar fraudes fiscais estruturadas, utilizando análise de vínculo, mineração de dados e cruzamento de informações, além de algoritmos preditivos para avaliar risco de contribuintes e combater inscrições fraudulentas. O produto adota técnicas avançadas de análise de dados, promovendo uma fiscalização orientada por informações e baseada em dados. Implanta o Centro de Comando Operacional para fiscalização de mercadorias em trânsito, com câmeras OCR/LPR, antenas conectadas e integração de dados fiscais eletrônicos ao DOF, fortalecendo o combate ao desmatamento ilegal em parceria com o IBAMA, contribuindo para uma maior eficiência fiscal, combate fraudes e desmatamento, e melhora o ambiente de negócios no Acre.

P2.4 Gestão do Contencioso Fiscal aperfeiçoado – USD 1.070.769

Desenvolver e implementar uma plataforma integrada para administração dos processos administrativos tributários, com uso intensivo de inteligência artificial para triagem, classificação e priorização das demandas. O sistema será alinhado às diretrizes da Reforma Tributária, promovendo maior celeridade, transparência e segurança jurídica na resolução de conflitos entre Fisco e contribuintes. A iniciativa também contempla a digitalização de documentos, o uso de IA para melhoria de produtividade dos julgadores e formulação de pareceres, integração com sistemas jurídicos e geração de relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão e consolidação de legislação para

consultas automatizadas.

P.2.5 Atendimento ao Contribuinte Aperfeiçoado – USD 1.000.000

Ampliar e diversificar os canais de atendimento, com foco na digitalização dos serviços e na simplificação das interações. A proposta inclui o desenvolvimento de novos serviços no Portal do Contribuinte, chatbot, aplicativos móveis e atendimento personalizado, promovendo maior confiança e colaboração entre os agentes econômicos e a Administração Tributária. Essa abordagem visa melhorar o ambiente de negócios, reduzir a burocracia e aumentar a conformidade voluntária, tornando o relacionamento fiscal mais transparente, ágil e eficiente.

P2.6 Cobrança e Arrecadação Modernizadas – USD 1.500.000

O produto propõe a modernização dos procedimentos de cobrança e arrecadação, com foco na recuperação eficiente e ágil dos créditos administrativos, por meio da implementação de uma metodologia de gestão baseada em riscos, diagnóstico das principais falhas nos processos atuais, padronização e automação das rotinas de cobrança, adoção de sistemas informatizados com módulos de avaliação de risco, monitoramento, restituição e resultados, desenvolvimento de mecanismos para cobrança massiva especialmente voltados para pequenos devedores, estabelecimento de um modelo operacional com contratação de call center especializado, aprimoramento do sistema de conta-corrente e integração das bases de dados e cadastros da frota de veículos para fortalecer a cobrança do IPVA.

P2.7 Harmonização da AT com a Reforma Tributária – US$ 6.163.572

O propósito deste produto é ajustar os processos, a estrutura da AT, sistemas e infraestrutura tecnológica viabilizando a integração ao ambiente nacional. Serão desenvolvidos e integrados ao Comitê gestor do IBS um conjunto de 12 sistemas, vide lista desses sistemas no Anexo 07 - Indicadores Propostos, indicador 11. Os benefícios esperados incluem a redução da complexidade e custos para as empresas, estímulo ao ambiente de negócios e implementação de tecnologias como o *split payment*, que evita evasão fiscal, e o cashback, que devolve o valor dos tributos para a população de baixa renda. Essas medidas promovem um sistema tributário mais justo e eficiente, fortalecem a cooperação federativa, permitem a troca de melhores práticas e aumentam a competitividade econômica de todo o país.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO
Valor estimado em Dólar (USD): 7.376.429,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo central aprimorar a gestão do planejamento, execução orçamentária, financeira e contábil, além de fortalecer os mecanismos de controle de convênios e transferências governamentais. Para alcançar maior eficiência e transparência, será realizado o redesenho dos processos internos e promovida a atualização tecnológica do sistema SICAF, alinhando todas as rotinas às exigências da Reforma Tributária sobre o Consumo. Também está prevista a implementação de um Plano de Sustentabilidade, que contempla ações voltadas à eficiência energética, capacitação de servidores, reaproveitamento de águas pluviais e instalação de uma usina fotovoltaica na sede da SEFAZ.

A execução dessas iniciativas proporcionará processos financeiros e orçamentários mais integrados, modernos e em conformidade com a nova legislação tributária, permitindo decisões gerenciais mais precisas e ágeis. A modernização do SICAF e o aprimoramento do controle de custos garantirão maior confiabilidade nas informações, enquanto o Plano de Sustentabilidade impulsionará a economia de recursos, o uso racional e limpo de energia e o desenvolvimento técnico dos servidores. O conjunto destas ações reforça o compromisso da SEFAZ com a responsabilidade ambiental e com a excelência na administração dos recursos públicos, promovendo uma gestão inovadora, eficiente e alinhada às melhores práticas de governança pública.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P3.1. Gestão Financeira para Sustentabilidade Fiscal– US$ 3.023.077

O produto *Gestão Financeira para a Sustentabilidade Fiscal* propõe uma transformação estratégica na administração pública, com foco na eficiência, transparência e inclusão. Estruturado em dois subprodutos complementares, busca modernizar a sistemática financeira e tornar o orçamento mais sensível às desigualdades sociais.

Promover uma avaliação detalhada do cenário atual, seguida da elaboração de normas, processos e fluxos padronizados. A modernização do SICAF é central, contemplando funcionalidades como conciliação automatizada, planejamento financeiro e fluxo de caixa, controle de obrigações, gestão de emendas parlamentares, gestão de custos, integração com sistemas corporativos e um painel de indicadores fiscais. Essa estrutura visa fortalecer a governança financeira, promovendo maior controle, previsibilidade e capacidade de resposta.

O segundo subproduto, *Orçamento Sensível à Igualdade Social*, foca na justiça distributiva e na inclusão. Prevê a criação de metodologias para implementação e avaliação das políticas públicas, tanto ex ante quanto ex post. Inclui a adequação de ferramentas para monitoramento, capacitações voltadas à sensibilização do tema e a ampliação do modelo OSG, incorporando recortes de raça e idade. Destaca-se a promoção de oportunidades de trabalho para jovens, reforçando o compromisso com a equidade e o desenvolvimento humano.

P3.2 Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental Implantada – USD 2.853.350

O Estado do Acre instituiu, em 2013, o Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (SISA), consolidando uma abordagem inovadora para a gestão de ativos ambientais. Estruturado em sete programas, o destaque recai sobre o ISA Carbono, voltado à valorização dos serviços ambientais relacionados à mitigação das emissões de gases de efeito estufa. A implementação do Regime REDD+ (Reduções de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), aliada a rigorosos processos de certificação de créditos de carbono, possibilitou ao Acre negociar reduções de emissões junto ao Banco Alemão KFW. Esse mecanismo viabilizou um acordo de resultados no âmbito do Programa REM, que gerou benefícios financeiros na ordem de USD 100 milhões, diretamente associados à diminuição do desmatamento bruto.

O SISA contribuiu para expressiva redução do desmatamento nos últimos dez anos, permitindo ao Acre ser pioneiro na captação de recursos do Programa REDD Early Movers, do governo alemão. Os valores recebidos são direcionados, em sua maioria, a comunidades locais por meio de subprogramas de repartição de benefícios, incentivando o desenvolvimento econômico e social, além de fortalecer ações de preservação ambiental. Apesar dos avanços, persiste o desafio de aprimorar a governança e a gestão dos ativos ambientais, especialmente os relacionados aos créditos de carbono, para maiores detalhes sobre o SISA vídeo Anexo XX – Ativos Ambientais Acre

Este produto visa aprimorar os estudos técnicos, metodologia e sistemática para a certificação dos créditos de carbono, visando fortalecer as políticas de conservação e manutenção da floresta em pé, atividade que será conduzida pelo Instituto de Mudanças Climáticas do Acre.

Neste contexto, visando a consolidação das políticas e ações integradas para o monitoramento dos ativos ambientais, adotaremos iniciativas como o aprimoramento do processo de certificação de créditos de carbono, com foco em projetos de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, utilizando laudos emitidos pelo Instituto de Mudanças Climáticas e relatórios oficiais do INPE. Além disso, será desenvolvido e implantado um sistema integrado de monitoramento e gestão desses ativos, bem como um plano voltado à redução dos gases de efeito estufa na infraestrutura pública.

Essas ações evidenciam o compromisso do Estado do Acre com a mitigação das mudanças climáticas e o apoio contínuo aos produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas, promovendo a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais.

Haverá a promoção da utilização de fontes de energia renovável nos órgãos de gestão fiscal. A principal ação prevista é a instalação de uma usina fotovoltaica na cobertura e estacionamento do prédio sede, com potencial de geração anual de 580.000 kWh. Essa iniciativa contribui para o aumento do consumo de energias limpas e renováveis, reduzindo o impacto ambiental das operações administrativas do Estado.

Complementarmente, serão implantadas ações de eficiência energética, envolvendo modernização dos sistemas de ar-condicionado e iluminação, ajuste do fator de potência, otimização da demanda contratada e análise da viabilidade de uso de baterias para o horário de ponta (BES – Battery Energy System). A gestão energética será reforçada com a análise automatizada das contas de energia, permitindo conciliação precisa com a concessionária e maior controle dos gastos públicos.

A requalificação do edifício também incluirá sistemas para reaproveitamento de águas pluviais, com a instalação de coletores, cisternas e integração à rede interna. A iniciativa promove o uso racional da água, reforça a segurança hídrica e estimula práticas sustentáveis, ampliando a eficiência ambiental e o aproveitamento inteligente dos recursos nas estruturas físicas da instituição.

P3.3 Gestão Sustentável de Aquisições e Materiais– US$ 1.500.002

O diagnóstico fiscal do Estado do Acre, conforme o Anexo II, evidencia a relevância do setor público, responsável por 34,4% do valor adicionado bruto, acima da média nacional. As compras públicas, que totalizaram R$ 2,5 bilhões em 2023, desempenham papel fundamental na inclusão socioeconômica da população. Nesse contexto, está prevista a implementação de uma metodologia e sistemática para uma política de compras públicas sustentáveis e inclusivas, orientada para o desenvolvimento regional e para a redução das desigualdades, promovendo maior equidade de oportunidades. A política visa fomentar a geração de emprego e a distribuição de renda por meio do estímulo à participação de micro e pequenas empresas locais e de fornecedores que adotem critérios de sustentabilidade ambiental, equidade e diversidade de gênero e raça. Como parte desse processo, será implantado um novo Sistema Integrado de Compras Públicas no executivo estadual, que contribuirá para tornar os procedimentos mais eficientes e transparentes. Paralelamente, serão realizados programas de capacitação voltados para servidores e empreendedores locais, fortalecendo sua inserção nas compras sustentáveis e incentivando práticas que promovam equidade, diversidade e sustentabilidade ambiental. Essas ações estão alinhadas ao objetivo de promover o desenvolvimento regional, com foco na ampliação das oportunidades e na distribuição mais justa dos benefícios econômicos.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL
Valor estimado em Dólar (USD): 1.620.000,00

Descrição:
Este componente visa aumentar a efetividade da gestão jurídica para a redução dos riscos fiscais e aumento da liquidez do crédito tributário. Baseia-se, em especial, no uso de novas tecnologias e capacitações, visando o aprimoramento da gestão para recuperação de ativos financeiros, redução do impacto econômico das demandas face ao Estado e melhor controle da legalidade dos atos da administração pública estadual.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P4.1 Gestão da Dívida Ativa aprimorada – US$ 900.00,00

Estabelecer procedimentos, normas e instrumentos de gestão e monitoramento das ações do Comitê Gestor do IBS, bem como a cobrança conjunta com outras Procuradorias dos créditos inscritos em dívida ativa. Identificar devedores suspeitos de sonegação fiscal, estabelecer rotinas e automatizar a identificação de devedores com indícios de crime tributário, com utilização de IA. Desenvolver estratégia diferenciadas de cobrança que leve em conta o risco do crédito, o perfil do contribuinte e a probabilidade de recebimento.

P4.2 Gestão de Riscos Fiscais, Precatórios e RPVs Aperfeiçoada – US$ 720.000,00

Este produto visa melhorar o processo de gestão do montante da dívida inscrita em precatórios, monitorando a progressão do montante da dívida ao longo do tempo e realizando acordos diretos. Aprimorar os procedimentos de cálculos judiciais, identificando, atualizando e verificando os valores presentes em processos legais. Este produto visa aprimorar a gestão dos processos ajuizados contra o Estado, categorizando os passivos contingentes em questões fiscais, cíveis e previdenciárias, e integrando-os com as demais instâncias judiciais. Estabelecer procedimentos para identificar temas que necessitam de mudanças legislativas imediatas para corrigir ilegalidades, além de facilitar a realização de acordos jurídicos processuais com o objetivo de solucionar conflitos de forma consensual.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROJETO
Valor estimado em Dólar (USD): 800.000,00

Descrição:
As ações deste componente visam fornecer os recursos necessários para que a Unidade de Coordenação do Projeto - UCP possa realizar as atividades de execução do PROFISCO III AC, através da capacitação e visitas técnicas dos servidores envolvidos; da contratação de serviços especializados; da realização de Avaliação Intermediária do Projeto; e, da realização de eventos.

A implementação dessas ações trarão, como resultado, os membros da UCP e servidores envolvidos na execução do Projeto melhor capacitados; necessidades de áreas específicas do projeto atendidas por consultores especializados; Avaliação Intermediária do Projeto realizada; participação de membros em reuniões ordinárias da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ), do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (GEFIN) ou do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (ENCAT); e, a realização de Seminário de divulgação dos resultados do PROFISCO III.

Descrição de subcomponentes e produtos:
A1 – Monitoramento e Avaliação – USD 600.000

Este produto tem por objetivo fornecer os recursos necessários para que a Unidade de Coordenação do Projeto - UCP possa realizar as atividades de execução do Projeto, através da capacitação e visitas técnicas dos servidores envolvidos; da contratação de consultores especializados para atender necessidades de áreas específicas do projeto como: apoio em aquisições, administração e finanças do projeto e gestão e monitoramento dos produtos; para a realização de serviço de consultoria para Avaliação Intermediária do Projeto; para a participação de reuniões da Comissão de Gestão Fazendária (COGEF), do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ), Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (ENCAT) no Estado; e, para a realização de Seminário de divulgação dos resultados do PROFISCO III AC.

A2 – Auditoria – US$ 200.000

Este produto visa a contratação de serviço especializado de Auditoria Externa Independente das demonstrações financeiras, registros, transações e atividades durante a execução do PROFISCO III.

1. 6. **Beneficiários**

O Projeto PROFISCO III AC tem como objetivo melhorar a sustentabilidade fiscal do Estado de Acre, incentivando um sistema tributário mais equitativo e eficaz, além de intensificar a transformação digital para aprimorar os serviços prestados à população.

Localizado no Norte do Brasil, Acre ocupa uma área de 224.303 km2, com 15 municípios e uma população total de **830.000** habitantes (2024, IBGE), devendo as medidas propostas no Projeto impactar a sociedade inteira do Estado com benefícios que garantirão a sustentabilidade fiscal do Estado de Acre, através de um sistema fiscal e tributário confiável, previsível e justo, quer estimule a expansão de investimentos e com processos de transformação digital que tragam a melhoria dos serviços públicos e a entrega de resultados à população.

As ações do PROFISCO III AC também deverão impactar segmentos da população, que serão favorecidos pelo projeto, conforme descrito as seguir:

1. Órgãos Públicos:

Os servidores da Secretaria da Fazenda (SEFAZ/AC), Procuradoria Geral do Estado (PGE/ AC), Secretaria de Administração (SEAD), Controladoria Geral do Estado (CGE) e Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) serão capacitados e contarão com melhores ferramentas de trabalho, aumentando a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados.

2. Empresas do Estado de Acre:

Um total de 51.948 empresas cadastradas, produtores rurais pessoas físicas e contribuintes do IPVA ativos cadastrados e ativos, sendo beneficiadas pelas ações do projeto, que busca simplificar as obrigações fiscais, reduzir a burocracia e oferecer suporte tecnológico, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias, com a melhoria do ambiente de negócios, bem como um total de 44.917 empresas ativas do Estado de Acre serão beneficiadas pela mudando do ICMS para o IBS, com a implantação da Reforma Tributária sobre o Consumo. Fonte:

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-1o-quadrimestre-2025-pdf.pdf.

3. Beneficiários do CadÚnico

Em setembro de 2025, Acre possuía 207.603 famílias de baixa renda registradas no Cadastro Único para Programas Sociais, com um total de 560.912 pessoas cadastradas, ou cerca de 67% da população do estado, de que terão suas condições socioeconômicas avaliadas, visando habilitá-los para políticas fiscais mais justas e inclusivas, como Cashback previsto no novo regime tributário do IBS, permitindo uma redução da despesa pública pela depuração desse cadastro. A implantação o mecanismo do Cashback, previsto na Reforma Tributária, atuará como um benefício econômico e socialmente relevante pois prevê um aumento de renda para populações de baixa renda e vulneráveis mediante a devolução parcial ou total do valor do imposto, especialmente com a inclusão de filtros sociais e de renda. Fonte - https://cecad.cidadania.gov.br/painel01.php?p_ibge=12&mu_ibge=#

4. Outros beneficiários

Também deverão ser impactados pelas ações do PROFISCO III AC outros segmentos da população, como:

- Professores e estudantes da rede de ensino estadual, pelas ações da Educação Fiscal, que abrangerá, também, as mulheres empreendedoras.
- 538 servidores da Secretaria da Fazenda (SEFAZ/AC), lotados na capital, em unidades no interior do estado ou em postos fiscais de fronteira, pelas melhorias relativas à implantação de usinas fotovoltaicas para geração de energia e de cisterna para o armazenamento de águas pluviais.

1. 7. **Anexos**

Anexo I Diagnóstico e Indicadores Fiscais do Estado do Acre

Anexo II - Marco de Referência PROFISCO III

Anexo III - Relatório da MD-GEFIS 2020 – AC

Anexo IV - Estudo de Avaliação de Impacto PROFISCO I

Anexo V - Lógica Horizontal de Resultado do PROFISCO III AC

Anexo VI - Avaliação de Maturidade de Análise de Dados Avançada na AT- AC

Anexo VII - Indicadores Profisco III AC

Anexo VIII- Integração ao PCCE - PUCOMEX - Pagamento Centralizado do Comercio Exterior

Anexo XX - Ativos Ambientais Acre

Manifestação de Interesse BID

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Profisco III AC demonstra aderência federativa e transversal às áreas estratégicas do PPA Federal 2024–2027, por meio de seus componentes e produtos que promovem modernização institucional, justiça fiscal, inclusão social e sustentabilidade. A seguir, destacam-se as conexões entre cada área estratégica e os respectivos produtos do projeto:

Área 107 – Equidade e atenção às mulheres:

Os produtos P1.3 e P1.4 promovem capacitação de servidoras em liderança e educação fiscal voltada a microempreendedoras, habilitando-as para participação em compras públicas. O P3.3 fortalece políticas de compras sustentáveis e inclusivas, ampliando renda, autonomia financeira e equidade de gênero.

Área 201 – Meio ambiente sustentável:

O P2.3 implanta o Centro de Comando Operacional com integração ao DOF – Documento de Origem Florestal, em parceria com o IBAMA, para combater o desmatamento ilegal. O P3.2 aprimora a certificação de créditos de carbono, com foco em projetos voltados à redução de emissões por desmatamento e degradação florestal.

Área 205 – Produtividade e competitividade econômica:

O P2.7 promove simplificação tributária, redução de custos e justiça fiscal com cashback. O P2.2 integra cadastros via PNR-REDESIM e combate empresas “noteiras”. O P2.3 aplica inteligência fiscal, moderniza a fiscalização e atrai investimentos. A simplificação das obrigações acessórias reduz custos operacionais e amplia a segurança jurídica, fortalecendo o ambiente de negócios.

Área 208 – Segurança energética e fontes renováveis:

O P3.2 prevê instalação de usina fotovoltaica no prédio sede da SEFAZ/AC, o uso de baterias no horário de ponta, controle de demanda e análise automatizada de contas, promovendo eficiência energética e redução da pegada de carbono.

Área 212 – Segurança hídrica e uso racional da água:
O projeto implanta sistema de reaproveitamento de águas pluviais no edifício sede da SEFAZ/AC, com coletores, cisternas e integração à rede interna. Essa ação é especialmente relevante diante das chuvas intensas e secas prolongadas no Acre, garantindo segurança hídrica e uso racional dos recursos públicos.

Área 214 – Redução das desigualdades regionais:
O P3.3 desenvolve política de compras públicas sustentáveis e inclusivas, voltada ao desenvolvimento regional. A iniciativa estimula a participação de micro e pequenas empresas locais e fornecedores com práticas responsáveis, promovendo equidade de oportunidades e redução das desigualdades territoriais.

Área 301 – Democracia participativa e controle social:
O P1.4 aprimora o Portal da Transparência com Business Intelligence, a Ouvidoria é modernizada e ações de transparência ativa são ampliadas. A educação fiscal promove a inclusão e participação cidadã, fortalecendo o controle social e o acesso à informação.

Área 302 – Capacidades estatais e cooperação federativa:

Destacam-se a integração ao PNR-REDESIM, uso do CNPJ alfanumérico com identificador único, integração ao PUCOMEX e o P2.7 de harmonização com a Reforma Tributária. A criação do IBS, gerido por Comitê Gestor com representantes dos entes federativos, reforça a coordenação, a coesão institucional e a qualidade dos serviços públicos, promovendo maior cooperação federativa.

Área 303 – Transformação digital nos três níveis de governo:
O projeto automatiza processos, conecta bases de dados e aplica IA para aprimorar cobrança, fiscalização, atendimento e gestão financeira. Destacam-se os produtos P1.1, P1.5, P2.3, P2.4, P2.5, P2.7 e P3.1, que promovem eficiência, transparência e inovação. A transformação digital é transversal e fortalece as capacidades institucionais da SEFAZ/AC.


Área 306 – Regime fiscal com credibilidade e justiça social:

Os produtos P1.1 a P3.2 estruturam um regime fiscal confiável, previsível e sustentável. A governança (P1.1), gestão de riscos (P1.2), capacitação (P1.3) e infraestrutura tecnológica (P1.5) qualificam a atuação estatal. A educação fiscal (P1.4) amplia a consciência cidadã. A transparência (P2.1) e o cadastro tributário (P2.2) fortalecem a base da Administração Tributária. A fiscalização inteligente (P2.3), automação de processos (P2.4), canais digitais (P2.5), cobrança modernizada (P2.6) e serviços digitais (P2.7) promovem justiça fiscal e confiança no sistema. O planejamento orçamentário (P3.1) e a certificação de créditos de carbono (P3.2) qualificam a gestão fiscal sustentável e ampliam a

capacidade de atração de investimentos.

Os anexos VIII, IX e X demonstram com detalhes a correlação entre os componentes e produtos do projeto e as áreas estratégicas do PPA 2024–2027, detalhando os objetivos vinculados, os indicadores de desempenho, os impactos esperados e os recursos alocados. Juntos, esses instrumentos oferecem uma visão abrangente e integrada da relevância do projeto para o fortalecimento da gestão fiscal e o progresso sustentável do Estado do Acre.

Anexo XI - Diagrama de Conexão Lógica entre Áreas Estratégicas, Objetivos Específicos Complementares e Componentes

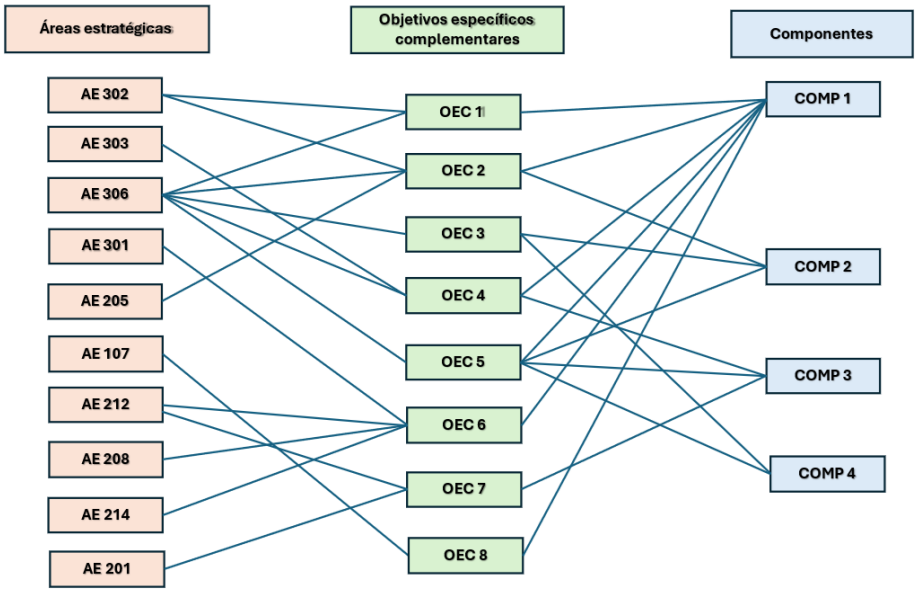

O diagrama abaixo visa demonstrar as conexões lógicas entre os seus 7 objetivos específicos complementares,4 componentes com 10 áreas estratégicas do PPA Federal, 2024-2027

2. 2. **Anexos**

Anexo IX - Mapa de Aderência AE PPA 2024-2027 x Componentes e Produtos

Anexo X -Relevância Financeira dos Produtos nas AE PPA 2024-2027


Anexo XI -Diagrama de conexão com Áreas Estratégicas

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A execução do PROFISCO III AC envolverá a atuação de diversos órgãos, cabendo a cada um destes um papel institucional em relação ao cumprimento atividades específicas em cada etapa da execução do Projeto, conforme o descrito no Organograma do arranjo Institucional abaixo.

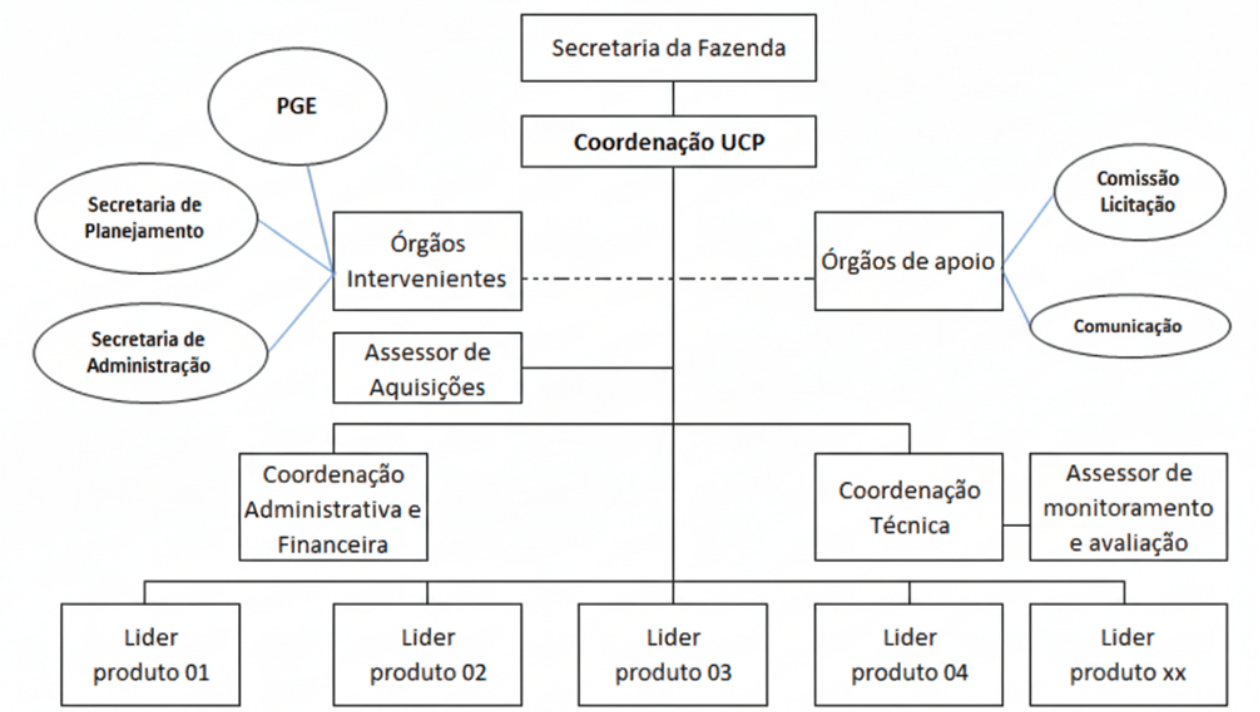

O Governo do Estado de Acre será o mutuário da operação de crédito, sendo a Secretaria da Fazenda do Estado de Acre o Órgão Executor do Projeto. A execução do PROFISCO III AC contará com o apoio de unidades do órgão no desempenho de funções no Projeto.

A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP será responsável pela execução de Componentes e Produtos da SEFAZ/AC no PROFISCO III AC, pelas atividades de apoio na elaboração de TdR – termos de referências, pela prestação de contas, solicitação de desembolso e apresentação do relatório de auditoria ao BID, bem como pelo acompanhamento dos trabalhos das unidades da SEFAZ/AC responsáveis: pelas licitações de bens e serviços no âmbito do PROFISCO III AC; o recebimento e tombamento dos bens do Projeto e transferência para os Órgão Parceiros; pela gestão dos contratos do Projeto; pelo registro contábil e pagamento das despesas do Projeto; pela análise técnica e jurídica dos processos licitatórios e de pagamentos.

2. Órgãos Parceiros – PGE, CGE, SEPLAN, SEAD E IMC

Procuradoria Geral do Estado de Acre - PGE/ AC será beneficiada no PROFISCO III AC através da execução dos produtos do Componente 4.
A CGE será beneficiada no PROFISCO III AC através da execução dos produtos do Componente 1, Produto 1.4 Gestão da Transparência e Educação Fiscal Aprimorada.

A SEPLAN será beneficiada no PROFISCO III AC através da execução dos produtos do Componente 3, Produto 3. 1. Gestão Financeira para Sustentabilidade Fiscal, subproduto Orçamento Sensível à Igualdade Social.

O IMC será beneficiado no PROFISCO III AC através da execução dos produtos do Componente 3, Produto 3.3 Políticas de Incentivo à Sustentabilidade Ambiental Implantada.

Para execução desses produtos será celebrado Termo de Cooperação entre a SEFAZ/AC, PGE/ AC, CGE/AC, SEPLAN/AC, SEAD/AC e IMC cabendo a responsabilidade pela execução dos produtos e atividades, conforme cronograma de execução e matriz de responsabilidades estabelecidos.

3. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID será o organismo financiador do PROFISCO III AC, através de linha de financiamento no âmbito do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO), pois possui expertise no tema da gestão fiscal e já prestado apoio a programas fiscais aos estados brasileiros desde 1996, pelos programas PNAFE e PROFISCO I e II, oferecendo amplo suporte técnico na implantação dos projetos, no acompanhamento da execução e avaliação dos resultados alcançados pelo Projeto.

O Banco manterá um relacionamento institucional com a SEFAZ/AC e um relacionamento operacional com a Unidade de Coordenação do Projeto – UCP, para o acompanhamento da execução do Projeto

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria da Fazenda do Estado de Acre – SEFAZ/AC
Órgãos parceiros:
Procuradoria Geral do Estado de Acre – PGE/ AC
Controladoria Geral do Estado de Acre – CGE/ AC
Secretaria de Estado de Administração – SEAD/ AC
Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN/ AC
Instituto de Mudanças Climáticas – IMC / AC

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

1. Unidade de Coordenação do Projeto - UCP

A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP será a unidade responsável pela execução do PROFISCO III AC, cuja equipe técnica será capacitada nas políticas de aquisições e salvaguardas do BID, na elaboração de Termos de Referência ou Especificações Técnicas, e desempenhará as seguintes atividades: i) Planejar, coordenar, monitorar e avaliar a execução dos produtos e atividades do Projeto. ii) Representar o Mutuário junto ao organismo financiador e órgãos federais de acompanhamento. iii) Participar de reuniões institucionais e de avaliação do Projeto. iv) Elaborar os instrumentos de monitoramento do Projeto, relatórios financeiros e de Progresso e outros. v) Realizar a prestação de contas dos recursos do Projeto e a solicitação de aporte de recursos financeiros; vi) Encaminhar ao BID o relatório de auditoria externa.

A UCP será responsável pela execução de todos os Componentes e Produtos do PROFISCO III AC e será composta por servidores da SEFAZ/AC, cujas competências e responsabilidades estão descritas no **Anexo XII - Arranjo Operacional**.

2. Estrutura organizacional da SEFAZ/AC

A estrutura organizacional da SEFAZ/AC possui fluxos processuais bem definidos, cabendo a cada unidade a responsabilidade por determinada função na contratação de bens e serviços para o Projeto, conforme descrito a seguir:

2.1. Comissão Especial de Licitações - CEL: será constituída exclusivamente para realizar as licitações no âmbito do PROFISCO III AC, de acordo com as políticas de aquisições e salvaguardas do BID, o Plano de Aquisições e as modalidades de licitação definidas, utilizando os sistemas Licitações-e (BB) ou ComprasNet, credenciados pelo Banco.

2.2 Controle Interno: será responsável pela análise técnica dos processos licitatórios e de pagamentos.

3. Auditoria Externa

Contratação de empresa para realizar Auditoria Externa Independente das demonstrações financeiras, registros, transações e atividades do PROFISCO III AC, pois o Tribunal de Contas do Estado de Acre - TCE/ AC não é credenciado pelo Banco para a realização desse serviço.

A equipe da UCP, os Líderes de Produtos e os membros da CEL/ AC serão formalmente designados para a execução do PROFISCO III AC, cujas ações referentes a execução do Projeto estão descritas no **Anexo XIII - Matriz de Responsabilidades Institucionais – Matriz RACI.**

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo XIII Matriz de Responsabilidades Institucionais.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Na execução do PROFISCO III AC estão previstos investimentos em bens (hardware, software, veículos) serviços técnicos, consultorias e realização de obras de infraestrutura. Esses investimentos necessitarão de investimentos para a sua manutenção e reposição futura, uma vez que haverá o desgaste natural pelo uso e obsolescência. Os gastos

para a sustentabilidade estão associados à manutenção do projeto e serão financiados com recursos da operação e especificado no TdR, definindo a transferência de conhecimento técnico, a melhoria na produtividade e a redução no custeio.

Com base no valor de investimento do PROFISCO III AC foi estimado um valor de US$ 466.750,00 /ano de custo anual de manutenção, calculada sobre o valor dos investimentos previstos no PROFISCO III AC para essas categorias de gastos, acima citadas, e baseado na taxa anual de depreciação de bens e infraestrutura, conforme demonstrado no **Anexo XIV - Custos Posteriores de Operação e Sustentação do Projeto**, que representa 1,41% do valor total do Projeto.

Considerando a previsão de custos estimados de manutenção mencionada, esta SEFAZ/AC já realiza ações para a manutenção dos bens e infraestrutura referentes aos investimentos realizados fontes dos Tesouro Estadual, cujos contratos anuais para a manutenção de bens e sistemas em operação estão descritos no **Anexo XV - Contratos de Manutenção**. Os recursos para manutenção estão previstos no orçamento de custeio da SEFAZ/AC para o exercício de 2025, conforme demonstrado no detalhamento da Lei Orçamentária Anual para 2025, no **Anexo XVI - LOA 2025**, obtida no site: https://seplan. AC.gov.br/loa-2025/

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Profisco III AC possui alinhamento com as diretrizes estratégicas do governo, que podem ser identificadas nos 5 principais instrumentos do planejamento estratégico estadual vigente, quais sejam: (i) o PRV – Plano de Recuperação verde, um projeto de desenvolvimento regional para a Amazônia Legal, por intermédio de uma estratégia de transição para uma economia verde; (ii) Agenda Acre 10 anos (2023) - o instrumento de planejamento de longo prazo, que se dedica a construir um caminho de desenvolvimento socioeconômico e ambiental; (iii) o Plano Estratégico de Governo de 4 anos (2024), que busca dar transparência e apresentar à sociedade as prioridades e compromissos assumidos pelo governo; (iv) o Planejamento Estratégico da SEFAZ e (v) o PPA - Plano Plurianual 2024-2027 que, dentre vários outros programas, estabelece a previsão de objetivo específico do Programa de Reestruturação e Desenvolvimento do Fisco Estadual (PROFISCO), o que coaduna com elemento previsto nos instrumentos de planejamento e garantirá recursos nas leis orçamentárias para suporte e manutenção das ações, após investimento do Projeto:

Programa 1458 – Gestão, Transparência e Serviços Públicos – página 66

Governo Digital

Implementação de Política de Transparência Pública, Ouvidoria, Integridade e Controle na Administração Pública

Programa 1433 – Valorização, Capacitação e cuidados dos servidores públicos – página 72

Capacitação e Qualificação do Servidor Público

Programa 1456 – Advocacia Pública, Diálogo e Cidadania – página 94

Melhoria, modernização e Inovação dos Serviços da PGE

Programa 1467 – Governança e Gestão da Administração Tributária - página 93

Programa 1466 – Modernização da Gestão tributária, fiscal, financeira - página 92

Melhoria, Modernização e Inovação dos Serviços da SEFAZ

Programa 1475 – Planejamento e Governança para resultado - página 99

Fortalecimento da Cultura de Planejamento e Avaliação

Programa 1460 – Ecossistema de inovação ambiental e adaptação climática - página 178

Incentivo e Regulação dos Serviços Ambientais _IMC

1447 – Programa – desenvolvimento do Negócios Acreanos – página 199

Promover o Processo de Legalização de Empresas, Simplificando, Integrando e Desburocratizando (Simplifica Mais)

As ações do PROFISCO III AC possuem aderência com o Agenda Acre 10 anos (**Anexo XVII – Agenda Acre 10 anos**), com ações de médio e longo prazo voltadas aprimorar a gestão administrativa e fiscal e a transparência das informações, a fim de oferecer serviços públicos de qualidade e um ambienta de negócios atrativos que resulte na melhoria da qualidade de vida da população e: https://seplan.ac.gov.br/agenda-acre-10-anos/

3. 4. **Anexos**

Anexo XII - Arranjo Operacional

Anexo XIII - Matriz Responsabilidades Institucionais – Matriz RACI

Anexo XIV - Custos Posteriores de Operação e Sustentação do Projeto

Anexo XV - Contratos de Manutenção

Anexo XVI - LOA 2025

Anexo XVII Agenda Acre10 anos

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Não aprovação dos ato legais da Operação
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado de Acre que permita ao Estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei observará o disposto no Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STNS) e será levado à apreciação e aprovação da Assembleia Estadual, uma vez aprovada a Carta Consulta pela COFIEX.

Na análise da mensagem para a contratação da operação de crédito a Assembleia Legislativa observará a situação das receitas e despesas da administração estadual, quanto aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a conformidade e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o estado deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

A não aprovação legislação resultará na não continuidade do processo de contratação da operação de crédito pleiteada.

Prevenção e Mitigação:
A equipe de governo do estado possui um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder, sobre a importância do financiamento para a melhoria da a arrecadação e aplicação dos recursos públicos.

A Secretaria da Fazenda, a cada quadrimestre, participa de audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, apresentando a situação das receitas e despesas estaduais e o cumprimento das metas fiscais exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto aos Decretos, Portarias e Instruções de Serviço, o Poder Executivo Estadual tem plena governabilidade sobre o processo necessário à sua edição, contando com equipes suficientemente capacitadas para proceder à sua concepção e redação. A UCP será criada no âmbito da SEFAZ/AC por Decreto Estadual.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Execução das atividades do Projeto
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução de atividades dos componentes e produtos pela SEFAZ/AC, PGE, CGE, SEAD ou IMC que provoque atrasos na tramitação interna dos processos, em especial na realização das licitações e, consequentemente, atrasem a execução do Projeto.

Outro fator de problema seria a UCP não contar com um corpo de técnicos qualificados para preparar os Termos de Referência ou as Especificações Técnicas requeridas.

Prevenção e Mitigação:
A equipe técnica da UCP e líderes de produtos atuarão como pontos focais responsáveis pela execução das atividades relacionadas ao seu Produto.

Como ações mitigadoras para solucionar problema relacionado ao atraso na execução de atividades dos Componentes e Produtos do Projeto, destacamos:

- Constituir comissões internas para elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas dos produtos mais complexos ou prioritários;
- Contratar consultores para apoiar a elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas sobre assuntos mais complexos;
- Realizar atividades de capacitação sobre as normas e procedimentos de aquisições do BID;
- Compor a Comissão Especial de Licitações com técnicos que já dispõem de conhecimento e experiência nas normas e procedimentos de aquisição do BID, e que já participaram da execução dos Programas PROFISCO I e II;

- Estreitar o relacionamento da equipe de licitações com as unidades de controle interno (CGE) e análise jurídica do estado (PGE), responsáveis pela análise e aprovação prévias dos processos de licitação.

Quanto ao fato de a UCP não contar com um corpo de técnicos qualificado para a elaboração dos Termos de Referência ou Especificações Técnicas, haverá previsão em todos os Componentes do Projeto, principalmente no Componente “Gestão do Projeto”, para a contratação de pessoas físicas ou empresas para apoiar no diagnóstico, identificação e definição do objeto das contratações. Essas contratações seriam realizadas por meio de seleção de consultores individuais ou empresas de consultoria, conforme a modalidade de contratação e a política de aquisições definida pelo Banco.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Gestão Pública e Governabilidade
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução de atividades dos componentes e produtos devido a mudança de gestão na SEFAZ, que possam causar atrasos ou descontinuidade na execução do projeto devido as eleições estaduais que resultem em mudança de gestão na SEFAZ/AC.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de descontinuidade decorrente de mudanças na gestão da SEFAZ/AC, será elaborado um Plano de Ação conjunto entre a UCP e o Banco, com foco na aceleração das principais aquisições e entregas estratégicas do Projeto. Esse plano incluirá etapas detalhadas, prazos definidos e responsabilidades claras, visando garantir avanços significativos antes do período eleitoral. Além disso, será promovido o alinhamento institucional com as lideranças da SEFAZ, reforçando o compromisso com a continuidade do Projeto independentemente de mudanças políticas. A documentação técnica e os registros de decisões serão sistematizados para facilitar a transição de gestão, assegurando que o novo corpo diretivo tenha pleno conhecimento dos objetivos, resultados esperados e compromissos assumidos. Essas ações visam preservar a governabilidade e a execução regular dos Componentes e Produtos, mesmo diante de cenários de instabilidade política.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Resistência às mudanças
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução do Projeto devido à resistência às mudanças promovidas pelos investimentos realizados, quando da execução das atividades dos componentes e produtos.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de resistência às mudanças, será adotada uma estratégia de comunicação clara e contínua, com ações voltadas à transparência na execução do Projeto e ao engajamento do corpo funcional. Serão promovidas campanhas informativas, capacitações e espaços de diálogo sobre os impactos da Reforma Tributária, da transformação digital e das inovações previstas. A participação ativa dos servidores será incentivada, fortalecendo o sentimento de pertencimento e reduzindo inseguranças. Também serão criados mecanismos de valorização de boas práticas e um comitê de acompanhamento da mudança, responsável por monitorar o clima organizacional e propor ajustes táticos ao longo da execução. Essas ações visam preparar os profissionais para os novos desafios e garantir maior adesão às transformações propostas.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Sustentabilidade dos investimentos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema na execução do Projeto devido à manutenção dos investimentos realizados, que ocasionem a descontinuidade dos produtos, sistemas e progressos alcançados caso não sejam garantidos mecanismos para sua manutenção.

Prevenção e Mitigação:
A SEFAZ/AC vem prevendo nos instrumentos de planejamento legais a disponibilização de recursos, visando a manutenção e modernização da Administração Fazendária e irá fortalecer a previsão e disponibilização destes

recursos, cujos recursos serão previstos no orçamento da SEFAZ/AC para cada exercício, através da Lei Orçamentária Anual.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Fluxo processual
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema no fluxo interno de processos que provoquem atrasos nas aquisições de bens e contratações de serviços, devido à falta de clareza nos fluxos internos na tramitação dos processos, e que resulte em atrasos na execução de atividades do Projeto.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atrasos causados por falhas no fluxo processual interno, serão adotadas ações que reforcem a articulação entre os setores envolvidos e promovam maior clareza nos procedimentos. A UCP e a SEFAZ/AC atuarão de forma integrada com os órgãos responsáveis pelas aquisições, acompanhando de perto a tramitação dos processos e identificando possíveis gargalos. A normatização vigente será utilizada como referência para padronizar os fluxos, e serão promovidas capacitações internas para garantir que todos os atores compreendam suas responsabilidades e prazos. A presença de Procuradores do Estado (PGE) lotados na SEFAZ/AC será estratégica para agilizar a análise jurídica dos processos, evitando retrabalho e garantindo maior celeridade. Além disso, será incentivado o uso de ferramentas digitais de acompanhamento processual, permitindo maior controle e transparência nas etapas de aquisição e contratação.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Contrapartida
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de atraso nas aquisições de bens e contratações de serviços devido à dificuldade do Estado em aportar a contrapartida local.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atraso nas aquisições e contratações devido à dificuldade de aporte da contrapartida local, o Governo do Estado manterá medidas rigorosas de controle financeiro e orçamentário, assegurando o equilíbrio fiscal necessário à execução do Projeto. As ações previstas serão incorporadas ao Plano Plurianual (PPA) e contempladas na Lei Orçamentária Anual, garantindo previsibilidade e disponibilidade dos recursos. A UCP acompanhará de forma contínua a execução orçamentária, articulando com os setores responsáveis para antecipar ajustes e assegurar que os compromissos financeiros sejam cumpridos sem comprometer o cronograma do Projeto.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Monitoramento e Prestação de Contas
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de atraso na execução do projeto devido à deficiência no planejamento e dificuldades no monitoramento das suas atividades e cumprimento de metas.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atrasos decorrentes de falhas no planejamento e monitoramento do Projeto, a equipe da SEFAZ/AC será capacitada em Gestão de Projetos, com foco na utilização eficiente do Módulo Projeto, ferramenta que permitirá o acompanhamento detalhado da execução orçamentária e financeira. Essa plataforma será responsável pela geração dos relatórios de Prestação de Contas e das Solicitações de Desembolso ao organismo financiador, garantindo maior controle e transparência. Complementarmente, será desenvolvida uma planilha estruturada ou contratada uma solução tecnológica de mercado para apoiar o planejamento estratégico e o monitoramento contínuo das ações, metas e indicadores do Projeto. Essas medidas visam fortalecer a capacidade de gestão, reduzir riscos operacionais e assegurar o cumprimento dos prazos e compromissos estabelecidos.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Impactos ambientais
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A gestão de riscos de impactos ambientais é relevante para a sustentabilidade Fiscal, devendo o Projeto do PROFISCO III AC adotar um olhar estratégico quanto aos temas ambientais, devido a importância da adoção do ESG (Environmental, Social and Governance), que são as medidas de responsabilidade ambiental, social e de governança, onde a gestão de riscos ambientais deve ser valorizada.

Os riscos ambientais podem afetar a saúde e a integridade dos funcionários ou mesmo causar danos ao meio ambiente, como resultado das atividades do órgão, sendo necessárias ações para a sua mitigação.

Os riscos ambientais são classificados em quatro categorias principais: I) Riscos ambientais, que são prejudiciais ao meio ambiente e aos indivíduos presentes nele; II) Riscos químicos, são os causados por agentes químicos dispersados no ambiente por meio de névoas, poeiras, fumaça ou similares, e absorvidos através da pele ou pela inalação; III) Riscos físicos, causados por vibrações, ruídos, impactos e exposição a altas temperaturas, radiação ou pressão anormal, causando danos físicos a indivíduos, fauna e/ou flora; e, IV) Riscos biológicos, os provenientes de exposição a agentes capazes de causar doenças aos seres humanos, animais e a vegetação nativa do local (fungos, bactérias, vírus ou outros).

Prevenção e Mitigação:
A SEFAZ irá executas ações na execução do PROFISCO III AC para mitigação dos riscos ambientais, para garantir o respeito ao meio ambiente e aos indivíduos presentes nele, desde a população geral até a fauna e a flora, através de:

a) Coleta seletiva de resíduos sólidos, através de lixeiras seletoras instaladas nas unidades da SEFAZ para separação de resíduos recicláveis do lixo não reciclável, com a instalação de sistemas de separação e destinação adequada de resíduos.

b) Interligação do esgoto dos prédios da SEFAZ à rede de esgoto dos respectivos municípios (quando existente), ou a contratação de empresa especializada em limpeza e esgotamento de fossas sépticas, e limpeza de caixas d'água, nas demais unidades da SEFAZ no interior do estado.

c) Transferência de bens inservíveis para a Secretaria de Administração, que realizará os procedimentos legais para a destinação destes para venda em leilão público ou doação para entidades da sociedade civil que trabalham com reciclagem de materiais.

d) Implantação de sistema de armazenamento e reuso de águas pluviais na Unidade Sede da SEFAZ.

e) Instalação de usinas fotovoltaicas nos prédios da Sede, das Unidades de Atendimento e Postos Fiscais da SEFAZ no interior do estado, bem como a instalação de centrais de recarga de veículos elétricos.

A adoção de medidas ambientais no Projeto irá atuar de forma a minimizar os impactos das atividades sobre o meio ambiente, servidores e população, bem como a adoção de uma gestão ambiental sustentável trará benefícios à imagem da SEFAZ/AC, trazendo credibilidade como um órgão que trabalham para minorar os impactos de suas ações sobre o meio ambiente.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Catástrofe Ambiental e Saúde Pública
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de interrupção na execução do projeto causado por catástrofe ambiental ou devido à problemas de saúde pública

Prevenção e Mitigação:
Quando da ocorrência de problemas causados por catástrofes ambientais, a SEFAZ/AC deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela Defesa Civil do Estado. A SEFAZ/AC realiza ações preventivas na sua infraestrutura para evitar qualquer dano ambiental, no tratamento de águas e esgotos, no combate a pragas etc., possuindo equipe de manutenção e equipamentos de reserva para atender a qualquer contingência.

Quando da ocorrência de problemas causados por epidemias, a SEFAZ/AC deverá seguir os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. Quando da ocorrência da COVID 19, a SEFAZ/AC disponibilizou acesso remoto aos servidores, bem como distribuiu álcool e equipamentos de EPI aos servidores que continuaram a trabalhar presencialmente nas suas unidades.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Desapropriações e reassentamentos
Impacto: Baixo

Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de interrupção na execução do projeto pela necessidade de realizar ações de desapropriação e reassentamento de populações que ali habitam quando da execução de serviço de infraestrutura (reforma ou construção) em imóveis novos, que não são de propriedade do Estado de Acre.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de interrupções decorrentes de desapropriações e reassentamentos, o Projeto prevê que todos os serviços de infraestrutura, como reformas e construções, sejam realizados exclusivamente em imóveis já pertencentes ao Estado de Acre e atualmente utilizados pela SEFAZ/AC para o funcionamento de suas Unidades de Atendimento e Postos Fiscais. Essa medida elimina a necessidade de aquisição de novos imóveis e evita impactos sociais relacionados ao deslocamento de populações. Além disso, será feito um levantamento prévio e detalhado dos imóveis contemplados, assegurando que estejam regularizados e livres de qualquer pendência jurídica ou ocupação indevida. Com isso, o Projeto garante maior segurança jurídica, previsibilidade na execução e respeito aos direitos das comunidades locais, mantendo o cronograma físico-financeiro sem riscos associados a processos de desapropriação.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Impacto Social
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de problema de interrupção na execução do Projeto causado pela ocorrência de riscos sociais que possam impactar na imagem do órgão e do agente financeiro.

O risco social se refere à percepção da execução do projeto pela população, como: a) a forma como são tratadas questões relativas aos direitos humanos; b) o cumprimento dos direitos trabalhistas; c) o tratamento dos funcionários, parceiros, clientes e demais stakeholders; d) o relacionamento com a sociedade; e, e) as questões ambientais, como poluição, preservação da biodiversidade e uso de recursos naturais.

O risco social do projeto pode causar impacto nos órgãos envolvidos na sua execução e na sociedade, quanto ao aspecto reputacional, ou seja, como o mercado, os contribuintes e a sociedade enxergam os órgãos envolvidos na execução do projeto; e, quanto a relação dos órgãos e das empresas contratadas no âmbito do projeto com as pessoas e a sociedade, relacionadas com a exploração de trabalho infantil, condições análogas à escravidão, não pagamento de encargos sociais dos trabalhadores, não disponibilização de equipamentos de proteção, etc. e que impactam na reputação dos órgãos envolvidos na execução do projeto

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de impacto social, a UCP e os líderes de projetos atuarão diretamente no acompanhamento das ações de gestão social e ambiental, assegurando que todas as atividades estejam alinhadas com os princípios de responsabilidade socioambiental. Serão adotadas práticas que garantam o respeito aos direitos humanos, o cumprimento das normas trabalhistas e a proteção ambiental. As empresas contratadas deverão seguir critérios de conformidade. Também serão promovidas ações de comunicação com a sociedade, reforçando a transparência e o compromisso ético do Projeto, com foco na preservação da reputação institucional e na construção de uma imagem positiva junto aos stakeholders.

4. 13. **Informações do 13° risco:**
Nome: Atraso na transição do ICMS para o IBS na Reforma Tributária
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Possibilidade de ocorrência atraso na transição do ICMS para o IBS no processo de implantação da Reforma Tributária, decorrente de problemas relacionados ao estabelecimento de normas e procedimentos operacionais; especificação de processos de implantação e integração entre os entes federados; definição, aquisição, desenvolvimento e implantação de soluções (hardware e software) para a interligação de sistemas, que poderão causar o descumprimento dos prazos estabelecidos na legislação para o início da transição, em 2026.

Esse risco pode causar impacto nas unidades tributárias de todos os entes federados envolvidos na execução dessa integração, na sociedade e empresas, quanto a relação dos órgãos tributários com as empresas e a sociedade, beneficiados pela Reforma Tributária.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar o risco de atraso na transição do ICMS para o IBS, a SEFAZ/AC intensificará sua atuação técnica e institucional, ampliando a participação ativa nos grupos nacionais responsáveis pela regulamentação e harmonização da Reforma Tributária, como CONSEFAZ, CONFAZ, COGEF, ENCAT e GEFIN. Serão mobilizados mais áreas e servidores para acompanhar de forma integrada os avanços normativos e operacionais, garantindo alinhamento com os prazos legais. Além disso, serão realizados investimentos estratégicos na modernização dos sistemas tributário e financeiro, com foco na aquisição, desenvolvimento e implantação de soluções tecnológicas compatíveis com o sistema do Comitê Gestor do IBS. Essas ações visam assegurar a interoperabilidade entre os entes federados, reduzir riscos de descontinuidade e garantir uma transição eficiente e segura, preservando a confiança da sociedade e das empresas beneficiadas pela Reforma.

4. 14. **Informações do 14° risco:**
Nome: Baixa Experiência da UCP e Líderes de Produtos na Gestão de Projetos Complexos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A execução do PROFISCO III AC envolve a gestão de múltiplos componentes e produtos, com elevado grau de complexidade técnica, institucional e operacional. A baixa experiência da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) e dos líderes de produtos na condução de projetos com múltiplos eixos estratégicos pode comprometer o planejamento, a integração entre atividades, o cumprimento de prazos e a qualidade dos entregáveis. Essa limitação pode resultar em retrabalho, baixa eficiência na alocação de recursos, dificuldades na articulação com órgãos parceiros e fragilidade na prestação de contas ao organismo financiador

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar os impactos da baixa experiência da UCP e dos líderes de produtos na gestão de projetos complexos, será adotado um conjunto articulado de ações voltadas ao fortalecimento técnico e institucional. A primeira frente envolve a capacitação técnica por meio de treinamentos em metodologias ágeis, gestão por resultados e ferramentas digitais de planejamento, promovendo maior domínio sobre práticas modernas de gerenciamento. Complementarmente, será contratada mentoria especializada para apoiar diretamente a estruturação dos planos de trabalho, cronogramas e indicadores, garantindo maior consistência e alinhamento estratégico desde as fases iniciais do projeto.

Além disso, será promovida uma integração interinstitucional contínua, com reuniões periódicas entre os líderes de produtos, a UCP e os órgãos parceiros, visando o alinhamento de expectativas, a troca de experiências e a resolução colaborativa de gargalos operacionais. Para sustentar essa articulação, serão implantadas ferramentas informatizadas de gestão que permitam o monitoramento em tempo real das atividades e metas, com alertas automáticos para desvios. A padronização dos processos será reforçada com a elaboração de um manual de procedimentos, enquanto a gestão do conhecimento será consolidada por meio de repositórios digitais com documentos, modelos e lições aprendidas dos ciclos anteriores do PROFISCO, promovendo a memória institucional e o apoio à tomada de decisão.

4. 15. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	32.000.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	3.200.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	300	360

Juros aplicáveis:
5,50% a.a. composta de: taxa SOFR diária: 4,29% a.a. + spread de 1,21% (margem de captação + margem de empréstimo)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,50% a.a.
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Não Aplicável

Outras Informações:

Não Aplicável

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
439.785,00	0,00	2.198.923,00	0,00	2.188.438,00	1.000.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.518.277,00	0,00	1.649.192,00	0,00		

Nome do componente					
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
576.359,00	0,00	2.381.791,00	500.000,00	4.178.597,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.610.866,00	1.000.000,00	2.061.343,00	100.000,00		

Nome do componente					
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
95.057,00	200.000,00	1.175.286,00	300.000,00	2.039.164,00	100.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.360.457,00	0,00	1.106.465,00	0,00		

Nome do componente					
GESTÃO JURÍDICA PARA SUSTENTABILIDADE FISCAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
51.000,00	0,00	320.000,00	0,00	481.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
538.000,00	0,00	230.000,00	0,00		

Nome do componente					
GESTÃO DO PROJETO					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
32.000,00	0,00	160.000,00	0,00	232.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
256.000,00	0,00	120.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Em decorrência da natureza do Projeto Profisco III, voltado para a modernização da gestão fiscal, não há necessidade de implementação de ações de desapropriação ou reassentamento. Entre as iniciativas estruturantes e preparatórias já realizadas para o desenvolvimento do projeto, destaca-se a elaboração do planejamento estratégico de governo para o ano de 2024, que deriva diretamente do desdobramento da Agenda Acre 10 Anos, aplicada ao contexto da administração pública estadual. Enquanto a Agenda Acre 10 Anos propõe um caminho de desenvolvimento com a participação de todos os atores atuantes no território acreano, o plano estratégico de governo tem como finalidade oferecer transparência e apresentar à sociedade as prioridades e compromissos assumidos pelo Governo do Estado, resumindo os principais compromissos, metas e projetos prioritários para o quadriênio seguinte.

O Estado do Acre, como integrante do Consórcio da Amazônia Legal, colaborou na elaboração do Plano de Recuperação Verde, cujas diretrizes foram incorporadas tanto à Agenda Acre 10 Anos quanto ao plano estratégico de governo. No âmbito da gestão fiscal, foi realizado em 2023 o planejamento estratégico da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), abrangendo as áreas de administração tributária, financeira e fazendária.

No primeiro semestre de 2024, promoveu-se uma ampla mobilização voltada para a revisão do diagnóstico de maturidade da gestão fiscal (MD-GEFIS revisado). O planejamento estratégico da SEFAZ teve como objetivo identificar problemas, suas causas, evidências e propor soluções, além de definir os produtos e subprodutos a serem entregues. Esse extenso trabalho resultou na elaboração de 18 notas técnicas, que fundamentam tecnicamente a carta consulta apresentada, conforme detalhado no Anexo VI – Notas Técnicas Profisco III Acre.

No ano de 2025, visando a melhoria de gestão financeira e contábil, foi implementado o SICAF – Sistema Integrado de Administração, Contábil, Financeiro e Orçamentário do Estado do Acre, trazendo evolução tecnológica do sistema anterior, porém ainda um sistema financeiro de segunda geração.

Além disto, foi iniciado o mapeamento e melhoria do processo administrativo tributário, visando a sua automação com recursos do Profisco III.
Foram desenvolvidas novas malhas fiscais, baseadas em documentos fiscais eletrônicos como forma de geração de indícios para ação de fiscalização.

Adicionalmente, destaca-se a constante troca de experiências entre os Estados da federação, realizada por meio dos grupos técnicos ENCAT (Encontro Nacional dos Administradores Tributários), COGEF (Comissão de Gestão Fazendária), GEFIN (Grupo de Gestão de Finanças) e GDFAZ (Grupo de Desenvolvimento do Servidor), todos vinculados ao CONFAZ/COMSEFAZ. A participação ativa dos servidores da SEFAZ nesses grupos nacionais permite o acesso a informações relevantes, que servem de subsídio tanto para a elaboração de termos de referência e editais de licitação pública quanto para a realização de visitas técnicas, possibilitando o aprendizado com os êxitos e equívocos de outros estados, especialmente aqueles que apresentam maior maturidade em determinados processos ou projetos.

6. 2. Anexos

Sem anexos.
